Flexibel Storten Vergunningsjaar 2025

Analyse monitoring stortactiviteiten onderhoudsbaggerwerken vaargeul Westerschelde: periode januari-december 2025

Vlaamse Overheid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Afdeling Maritieme Toegang

RAPPORT 10 februari 2026 - versie 1.0



Colofon

International Marine & Dredging Consultants

Adres: Van Immerseelstraat 66, 2018 Antwerpen, België

☎: + 32 3 270 92 95

Email: info@imdc.be

Website: www.imdc.be

Document Identificatie

Project	Flexibel Storten Vergunningsjaar 2025
Titel rapport	Analyse monitoring stortactiviteiten onderhoudsbaggerwerken vaargeul Westerschelde: periode januari-december 2025
Opdrachtgever	Vlaamse Overheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Afdeling Maritieme Toegang
Contactpersoon Opdrachtgever	Jürgen Suffis, jurgen.suffis@mow.vlaanderen.be
Datum	10/02/2026
Rapportref.	I/RA/11640/26.015/ROS/, I/RN/11640/23015/API
Rapportlocatie	K:\PROJECTS\11\11640_P018454-RO_AMT_Vwb_2021-2025\11640-004-Baggeroverleg_2023-2024\11640-00401_Maandrapportage 2023-2024\10-Rap\RA26.015_analyserapport_jan_dec_2025\RA26015_11640-004_Analyserapport jan-dec_2025_v1.0.docx
Besteknummer	MT/02323
Trefwoorden	-
Auteur(s)	Rob Schepper – Projectingenieur, Bart Roest – Projectingenieur.

Nazicht	Aline Pieterse	Senior Ingenieur	Aline Pieterse (Signature) Digitally signed by Aline Pieterse (Signature) Date: 2026.02.10 10:16:40 +01'00'
Goedgekeurd	Gijsbert van Holland	Hoofdingenieur	Gijsbert van Holland (Signature) Digitally signed by Gijsbert van Holland (Signature) Date: 2026.02.10 13:42:00 +01'00'

Copyright © IMDC 2026, Alle rechten voorbehouden. Deze publicatie of delen mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, digitaal of anderszins zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IMDC. De inhoud van deze publicatie zal door de klant vertrouwelijk worden behandeld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Verwijzing naar een deel van deze publicatie dat tot verkeerde interpretatie kan leiden, is verboden.

Classificatie			
[ ] niet geclassificeerd	[ ] intern	[x] beperkt	[ ] confidentieel

Versie	Datum	Omschrijving	Auteur	Nazicht	Goedgekeurd
1.0	10/02/2026	Analyserapport januari-december 2025	ROS	API	GVH

Samenvatting

Voorliggend rapport heeft betrekking op de rapportage en morfologische analyse van de monitoringsresultaten in de Westerschelde die zijn uitgevoerd in het vergunningsjaar 2025. Dit in het kader van de opvolging van de bagger- en stortwerkzaamheden binnen de stortstrategie Flexibel Storten.

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**14**
1.1	De opdracht	14
1.2	Doel van het rapport	14
1.3	Achtergrond	15
1.4	Opbouw van het rapport	16
1.5	Gegevens en methode	16
2	**Overzicht activiteiten**	**17**
2.1	Bagger- en stortactiviteiten	17
2.2	Uitgevoerde peilingen	26
3	**Hooge Platen West (HPW)**	**28**
3.1	Resultaten lopend vergunningsjaar	28
3.2	Resultaten maandrapportages	29
3.2.1	Analyse januari	29
3.2.2	Analyse februari en maart	30
3.2.3	Analyse april en mei	30
3.2.4	Analyse juni en juli	32
3.2.5	Analyse augustus en september	34
3.2.6	Analyse oktober en november	35
3.2.7	Analyse december	38
4	**Plaat van Walsoorden (PWA)**	**39**
4.1	Resultaten lopend vergunningsjaar	39
4.2	Resultaten maandrapportages	40
4.2.1	Analyse januari	40
4.2.2	Analyse februari en maart	41
4.2.3	Analyse april en mei	42
4.2.4	Analyse juni en juli	43
4.2.5	Analyse augustus en september	44
4.2.6	Analyse oktober en november	45
4.2.7	Analyse december	48
5	**SH31**	**49**
5.1	Resultaten lopend vergunningsjaar	49
5.2	Resultaten maandrapportages	51
5.2.1	Analyse januari	51
5.2.2	Analyse februari en maart	53
5.2.3	Analyse april en mei	53
5.2.4	Analyse juni en juli	56
5.2.5	Analyse augustus en september	56
5.2.6	Analyse oktober en november	59

5.2.7	Analyse december	59
6	**Put van Hansweert (PVH)**	**60**
6.1	Resultaten lopend vergunningsjaar	60
6.2	Resultaten maandrapportages	63
6.2.1	Analyse januari	63
6.2.2	Analyse februari en maart	63
6.2.3	Analyse april en mei	65
6.2.4	Analyse juni en juli	68
6.2.5	Analyse augustus en september	70
6.2.6	Analyse oktober en november	73
6.2.7	Analyse december	76
7	**SH61**	**77**
7.1	Resultaten lopend vergunningsjaar	77
7.2	Resultaten maandrapportages	78
7.2.1	Analyse januari	78
7.2.2	Analyse februari en maart	79
7.2.3	Analyse april en mei	79
7.2.4	Analyse juni en juli	81
7.2.5	Analyse augustus en september	83
7.2.6	Analyse oktober en november	84
7.2.7	Analyse december	85
8	**SH71**	**87**
8.1	Resultaten lopend vergunningsjaar	87
8.2	Resultaten maandrapportages	88
8.2.1	Analyse januari	88
8.2.2	Analyse februari en maart	89
8.2.3	Analyse april en mei	90
8.2.4	Analyse juni en juli	90
8.2.5	Analyse augustus en september	92
8.2.6	Analyse oktober en november	94
8.2.7	Analyse december	94
9	**Overige stortzones**	**95**
9.1	SN11	95
9.1.1	Analyse juli 2024 – december 2025	95
9.2	SN31	96
9.2.1	Analyse juli 2024 – januari 2025	98
9.2.2	Analyse februari 2025 – mei 2025	100
9.2.3	Analyse juni – september 2025	102
9.2.4	Analyse oktober – december 2025	105

9.3	SH41	108
9.3.1	Analyse juli 2024 – januari 2025	110
9.3.2	Analyse februari 2025 – mei 2025	111
9.3.3	Analyse juni 2025 – juli 2025	112
9.3.4	Analyse augustus – september 2025	113
9.3.5	Analyse oktober – november 2025	115
9.3.6	Analyse december 2025	116
9.4	SN51	117
9.4.1	Analyse juli 2024 – december 2025	117
9.5	SH51	119
9.5.1	Analyse juli 2024 – januari 2025	119
9.5.2	Analyse februari 2025 – juli 2025	120
9.5.3	Analyse augustus – december 2025	121
10	**Conclusie**	**123**
11	**Referenties**	**125**

Bijlagen

Bijlage A	**Kaartmateriaal**	**126**
A.1	Kaartmateriaal januari 2025	127
A.2	Kaartmateriaal februari en maart 2025	128
A.3	Kaartmateriaal april en mei 2025	129
A.4	Kaartmateriaal juni en juli 2025	130
A.5	Kaartmateriaal augustus en september 2025	131
A.6	Kaartmateriaal oktober en november 2025	132
A.7	Kaartmateriaal december 2025	133
Bijlage B	**Tripgegevens**	**134**

Lijst van Tabellen

Tabel 2-1: Samenvatting gestorte *in-situ* volumes (in m³) tussen 1 januari 2025 en 31 december 2025 (totaal vergunningsjaar 2025), per macrocel. 17

Tabel 2-2: Ruimtelijke relatie tussen bagger- en stortvolumes in vergunningsjaar 2025 (tussen 1 januari 2025 en 31 december 2025). *In-situ* volumes (in m³). 18

Tabel 2-3: Overzicht van baggeractiviteiten per week in 2025. 19

Tabel 2-4: *In-situ* baggervolumes (in m³) per baggerlocatie in 2025. 24

Tabel 2-5: *In-situ* stortvolumes (in m³) per stortzone in 2025. 25

Tabel 2-6: Overzicht uitgevoerde en verwerkte bathymetrische gegevens voor 2025. Grote peilingen worden in het cursief aangeduid. Het achtervoegsel "D" wordt aangegeven bij de stortzone voor peilingen die enkel de drempel bij de zone beslaan, en niet de volledige stortzone. Het achtervoegsel "W" wordt aangegeven bij de peilingen van stortzone SN31 die enkel het westelijke deel van de zone beslaan. 26

Tabel 3-1: Feitelijke informatie voor HPW in januari 2025. 29

Tabel 3-2: Feitelijke informatie voor HPW in februari en maart 2025. 30

Tabel 3-3: Feitelijke informatie voor HPW in april en mei 2025. De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking. 30

Tabel 3-4: Feitelijke informatie voor HPW in juni en juli 2025. 32

Tabel 3-5: Feitelijke informatie voor HPW in augustus en september 2025. 35

Tabel 3-6: Feitelijke informatie voor HPW in oktober en november 2025. 35

Tabel 3-7: Feitelijke informatie voor HPW in december 2025. 38

Tabel 4-1: Feitelijke informatie voor PWA in januari 2025. 40

Tabel 4-2: Feitelijke informatie voor PWA in februari en maart 2025. De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking. 41

Tabel 4-3: Feitelijke informatie voor PWA in april en mei 2025. 42

Tabel 4-4: Feitelijke informatie voor PWA in juni en juli 2025. 43

Tabel 4-5: Feitelijke informatie voor PWA in augustus en september 2025. 44

Tabel 4-6: Feitelijke informatie voor PWA in oktober en november 2025. 45

Tabel 4-7: Feitelijke informatie voor PWA in december 2025. 48

Tabel 5-1: Feitelijke informatie voor SH31 in januari 2025. De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking. 51

Tabel 5-2: Feitelijke informatie voor SH31 in februari en maart 2025. 53

Tabel 5-3: Feitelijke informatie voor SH31 in april en mei 2025. 53

Tabel 5-4: Feitelijke informatie voor SH31 in juni en juli 2025. 56

Tabel 5-5: Feitelijke informatie voor SH31 in augustus en september 2025. 56

Tabel 5-6: Feitelijke informatie voor SH31 in oktober en november 2025. 59

Tabel 5-7: Feitelijke informatie voor SH31 in december 2025. 59

Tabel 6-1: Feitelijke informatie voor PVH in januari 2025. 63

Tabel 6-2: Feitelijke informatie voor PVH in februari en maart 2025. De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking. 63

Tabel 6-3: Feitelijke informatie voor PVH in april en mei 2025. 66

Tabel 6-4: Feitelijke informatie voor PVH in juni en juli 2025. 68

Tabel 6-5: Feitelijke informatie voor PVH in augustus en september 2025. 70

Tabel 6-6: Feitelijke informatie voor PVH in oktober en november 2025. 73

Tabel 6-7: Feitelijke informatie voor PVH in december 2025. 76

Tabel 7-1: Feitelijke informatie voor SH61 in januari 2025. 78

Tabel 7-2: Feitelijke informatie voor SH61 in februari en maart 2025. 79

Tabel 7-3: Feitelijke informatie voor SH61 in april en mei 2025. De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking. 79

Tabel 7-4: Feitelijke informatie voor SH61 in juni en juli 2025. 81

Tabel 7-5: Feitelijke informatie voor SH61 in augustus en september 2025. 83

Tabel 7-6: Feitelijke informatie voor SH61 in oktober en november 2025. 84

Tabel 7-7: Feitelijke informatie voor SH61 in december 2025. 86

Tabel 8-1: Feitelijke informatie voor SH71 in januari 2025. 88

Tabel 8-2: Feitelijke informatie voor SH71 in februari en maart 2025. 89

Tabel 8-3: Feitelijke informatie voor SH71 in april en mei 2025. 90

Tabel 8-4: Feitelijke informatie voor SH71 in juni en juli 2025. 90

Tabel 8-5: Feitelijke informatie voor SH71 in augustus en september 2025. 92

Tabel 8-6: Feitelijke informatie voor SH71 in oktober en november 2025. 94

Tabel 8-7: Feitelijke informatie voor SH71 in december 2025. 94

Tabel 9-1: Feitelijke informatie voor SN31 tussen juli 2024 en januari 2025. De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking. 98

Tabel 9-2: Feitelijke informatie voor SN31 tussen februari 2025 – mei 2025. De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking. 100

Tabel 9-3: Feitelijke informatie voor SN31 tussen juni 2025 – september 2025. 102

Tabel 9-4: Feitelijke informatie voor SN31 tussen oktober 2025 – december 2025. 105

Tabel 9-5: Feitelijke informatie voor SH41 tussen juli 2024 en januari 2025. 110

Tabel 9-6: Feitelijke informatie voor SH41 tussen januari 2025 en mei 2025. 111

Tabel 9-7: Feitelijke informatie voor SH41 tussen juni 2025 en juli 2025. 112

Tabel 9-8: Feitelijke informatie voor SH41 in augustus en september 2025. 113

Tabel 9-9: Feitelijke informatie voor SH41 tussen oktober en november 2025. 115

Tabel 9-10: Feitelijke informatie voor SH41 in december 2025. 116

Tabel 9-11: Feitelijke informatie voor SH51 tussen juli 2024 en januari 2025. 119

Tabel 9-12: Feitelijke informatie voor SH51 tussen februari 2025 en juli 2025. 120

Tabel 9-13: Feitelijke informatie voor SH51 tussen augustus 2025 en december 2025. 121

Lijst van Figuren

Figuur 1-1: Stortzones in de Westerschelde die gemonitord worden in het kader van de opvolging van de bagger- en stortwerkzaamheden binnen de stortstrategie Flexibel Storten. 15

Figuur 3-1: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen voor de complete stortzone voor Hooge Platen West. De dichte cirkels geven de grote peilingen weer (gemeten tot +1 m NAP), de open cirkels zijn de reguliere peilcampagnes (gemeten tot -2 m NAP). De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking. 28

Figuur 3-2: Evolutie van de bathymetrie voor vergunningsjaar 2025 langs doorsnedes HPWb en HPWc bij stortzone Hooge Platen West. 29

Figuur 3-3: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes HPWb en HPWc aan stortzone Hooge Platen West sinds 2010. 31

Figuur 3-4: Morfologische veranderingen bij Hooge Platen West tussen T164 en T163. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 32

Figuur 3-5: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes HPWb en HPWc aan stortzone Hooge Platen West sinds 2010. 33

Figuur 3-6: Morfologische veranderingen bij Hooge Platen West tussen T165 en T164. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 34

Figuur 3-7: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes HPWb en HPWc aan stortzone Hooge Platen West sinds 2010. 36

Figuur 3-8: Morfologische veranderingen bij Hooge Platen West tussen T166 en T165. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 37

Figuur 3-9: Bathymetrie van grote peiling T166 (boven) en verschilkaart tussen grote peilingen T160 en T166 (onder). 38

Figuur 4-1 Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen voor de complete stortzone voor Plaat van Walsoorden. De dichte cirkels geven de grote peilingen weer (gemeten tot +1 m NAP), de open cirkels zijn de reguliere peilcampagnes (gemeten tot -2 m NAP). De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking. 39

Figuur 4-2: Evolutie van de bathymetrie voor vergunningsjaar 2025 langs doorsnede PWAa, PWAb, PWAc en PWAd bij stortzone Plaat van Walsoorden. 40

Figuur 4-3: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes PWAa, PWAb, PWAc en PWAd bij stortzone Plaat van Walsoorden sinds 2010. 41

Figuur 4-4: Morfologische veranderingen bij plaatrandstortzone Plaat van Walsoorden tussen T170 en T171. In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 42

Figuur 4-5: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes PWAa, PWAb, PWAc en PWAd bij stortzone Plaat van Walsoorden sinds 2010. 43

Figuur 4-6: Morfologische veranderingen bij plaatrandstortzone Plaat van Walsoorden tussen T171 en T172. In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 44

Figuur 4-7: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes PWAa, PWAb, PWAc en PWAd bij stortzone Plaat van Walsoorden sinds 2010. 46

Figuur 4-8: Morfologische veranderingen bij plaatrandstortzone Plaat van Walsoorden tussen T172 en T173. In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 47

Figuur 4-9: Bathymetrie van grote peiling T173 in de omgeving van de Plaat van Walsoorden (links) en bodemhoogteverschil tussen T168 en T173 (rechts). 48

Figuur 5-1: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen voor de complete stortzone voor SH31. Merk op dat de peilingen aangeleverd door Sassevaart in

het kader van het project NST (grijze cirkels) een verticale afwijking vertonen. De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking. 49

Figuur 5-2: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen voor de deelzones van SH31 inclusief de stortingen uitgevoerd door Sassevaart (SSV) in het kader van het project NST. De peilingen worden weergegeven als cirkels (genomen door aMT) en driehoeken (aangeleverd door Sassevaart in het kader van het project NST). Merk op dat die laatste een verticale afwijking vertonen. 50

Figuur 5-3: Evolutie van de bathymetrie voor vergunningsjaar 2025 langs doorsnede SH31a en SH31b bij stortzone SH31. De overzichtskaart toont zowel deelzone SH31-zuid (oranje), SH31-noord (geel), de volledige zone (blauw) en de ankergebieden (noodanker (groen) en anker (blauw)). 50

Figuur 5-4: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes SH31a en SH31b bij stortzone SH31 sinds 2016. 51

Figuur 5-5: Morfologische veranderingen bij SH31 tussen T83 en T82. In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 52

Figuur 5-6: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes SH31a en SH31b bij stortzone SH31 sinds 2016. 54

Figuur 5-7: Morfologische veranderingen bij SH31 tussen T84 en T83. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 55

Figuur 5-8: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes SH31a en SH31b bij stortzone SH31 sinds 2016. 57

Figuur 5-9: Morfologische veranderingen bij SH31 tussen T85 en T84. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 58

Figuur 6-1: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen voor de complete stortzone voor Put van Hansweert. De grote volumeverandering tussen T74 en T75 is het gevolg van lokale plaatvallen. De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking. 60

Figuur 6-2: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen voor de deelzones van de Put van Hansweert. De blauwe cirkels geven de reguliere peilingen weer (gemeten tot -2 m NAP), de rode cirkels vertegenwoordigen de volumeveranderingen van de deelzone PVHoost. 61

Figuur 6-3: Evolutie van de bathymetrie voor vergunningsjaar 2025 langs doorsnedes PVHa, PVHb en PVHc bij stortzone Put van Hansweert (enkel peilingen van de volledige zone). 62

Figuur 6-4: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes PVHa, PVHb en PVHc bij stortzone Put van Hansweert sinds 2016. 64

Figuur 6-5: Morfologische veranderingen bij de Put van Hansweert tussen T87 en T88. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 65

Figuur 6-6: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes PVHa, PVHb en PVHc bij stortzone Put van Hansweert sinds 2016. 66

Figuur 6-7: Morfologische veranderingen bij de Put van Hansweert tussen T89 en T88. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 67

Figuur 6-8: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes PVHa, PVHb en PVHc bij stortzone Put van Hansweert sinds 2016. 68

Figuur 6-9: Morfologische veranderingen bij de Put van Hansweert tussen T90 en T89. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 69

Figuur 6-10: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes PVHa, PVHb en PVHc bij stortzone Put van Hansweert sinds 2016. 71

Figuur 6-11: Morfologische veranderingen bij de Put van Hansweert tussen T91 en T90. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 72

Figuur 6-12: Morfologische veranderingen bij de Put van Hansweert tussen T92 en T91. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 73

Figuur 6-13: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes PVHa, PVHb en PVHc bij stortzone Put van Hansweert sinds 2016. 74

Figuur 6-14: Morfologische veranderingen bij de Put van Hansweert tussen T93 en T92. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 75

Figuur 7-1: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen voor de complete stortzone voor SH61. De peiling in grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking. 77

Figuur 7-2: Evolutie van de bathymetrie voor vergunningsjaar 2025 langs doorsnedes SH61a, SH61b en SH61c bij stortzone SH61. 78

Figuur 7-3: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes SH61a, SH61b en SH61c bij stortzone SH61 sinds 2021. 80

Figuur 7-4: Morfologische veranderingen bij SH61 tussen T21 en T20. 81

Figuur 7-5: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes SH61a, SH61b en SH61c bij stortzone SH61 sinds 2021. 82

Figuur 7-6: Morfologische veranderingen bij SH61 tussen T22 en T21. 83

Figuur 7-7: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes SH61a, SH61b en SH61c bij stortzone SH61 sinds 2021. 84

Figuur 7-8: Morfologische veranderingen bij SH61 tussen T23 en T22. 85

Figuur 8-1: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen voor de complete stortzone voor SH71. 87

Figuur 8-2: Evolutie van de bathymetrie voor vergunningsjaar 2025 langs doorsnedes SH71a, SH71b en SH71c bij stortzone SH71. 88

Figuur 8-3: Evolutie van de bathymetrie voor vergunningsjaar 2025 langs doorsnedes SH71a, SH71b en SH71c bij stortzone SH71 sinds 2021. 89

Figuur 8-4: Morfologische veranderingen bij SH71 tussen T40 en T41. In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 90

Figuur 8-5: Evolutie van de bathymetrie voor vergunningsjaar 2025 langs doorsnedes SH71a, SH71b en SH71c bij stortzone SH71 sinds 2021. 91

Figuur 8-6: Morfologische veranderingen bij SH71 tussen T41 en T42. In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 92

Figuur 8-7: Evolutie van de bathymetrie voor vergunningsjaar 2025 langs doorsnedes SH71a, SH71b en SH71c bij stortzone SH71 sinds 2021. 93

Figuur 8-8: Morfologische veranderingen bij SH71 tussen T42 en T43. In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 93

Figuur 9-1: Bathymetrie van T3 bij SN11 (boven), morfologische veranderingen bij SN11 tussen T3 en T2 (midden) en stortvakgemiddelde bodemhoogteverandering (onder) In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 95

Figuur 9-2: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen in de complete stortzone SN31. De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking. 96

Figuur 9-3: Deelzones SN31-WestZ, SN31-WestN (groen) en SN31-Oost (oranje) van de stortzone SN31, ankergebieden zijn aangeduid in rood. 97

Figuur 9-4: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen voor de complete stortzone en deelzones van SN31. 97

Figuur 9-5: Morfologische veranderingen bij SN31 tussen T3 en T1. In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 99

Figuur 9-6: Morfologische veranderingen bij SN31 tussen T4 en T3. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 101

Figuur 9-7: Morfologische veranderingen bij SN31 tussen T5 en T4. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 103

Figuur 9-8: Morfologische veranderingen bij SN31 tussen T6 en T5. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 104

Figuur 9-9: Deelpeiling T7 en morfologische veranderingen in het westelijke deel van stortzone SN31 tussen deelpeilingen T6 en T7. 106

Figuur 9-10: Deelpeiling T8 en morfologische veranderingen in het westelijke deel van stortzone SN31 tussen deelpeilingen T7 en T8. Geen stortingen. 107

Figuur 9-11: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen in de complete stortzone SH41. 108

Figuur 9-12: Deelzones SH41-noord (groen) en SH41-zuid (oranje) van de stortzone SH41. 109

Figuur 9-13: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen voor de deelzones SH41noord en SH41zuid in stortzone SH41. 109

Figuur 9-14: Morfologische veranderingen in stortzone SH41 tussen T2 en T3. In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 111

Figuur 9-15: Morfologische veranderingen in stortzone SH41 tussen T4 en T3. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 112

Figuur 9-16: Morfologische veranderingen in stortzone SH41 tussen T5 en T4. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 113

Figuur 9-17: Morfologische veranderingen in stortzone SH41 tussen T6 en T5. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 114

Figuur 9-18: Morfologische veranderingen in stortzone SH41 tussen T7 en T6. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 115

Figuur 9-19: Morfologische veranderingen in stortzone SH41 tussen T8 en T7. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 116

Figuur 9-20: Morfologische veranderingen in stortzone SH41 tussen T9 en T8. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 117

Figuur 9-21: Bathymetrie van T3 bij SN51 (boven), morfologische veranderingen bij SN51 tussen T3 en T2 (midden) en stortvakgemiddelde bodemhoogteverandering (onder). 118

Figuur 9-22: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen in de complete stortzone SH51. 119

Figuur 9-23: Morfologische veranderingen bij SH51 tussen T3 en T4. In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 120

Figuur 9-24: Morfologische veranderingen bij SH51 tussen T4 en T5. In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 121

Figuur 9-25: Morfologische veranderingen bij SH51 tussen T5 en T6. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje. 122

1 Inleiding

1.1 De opdracht

In 2022 werd een nieuwe vergunning bekomen voor het onderhoud van de vaargeul van de Westerschelde voor de periode 1 januari 2022 – 31 december 2028. Voorliggend rapport geeft een verslag, beschrijving en analyse van de gegevens geleverd in vergunningsjaar 2025 (01/01/2025 - 31/12/2025) in het kader van de opvolging van de bagger- en stortwerkzaamheden binnen de stortstrategie Flexibel Storten.

Deelopdracht 4 "Data-analyse en rapportering van toepassing binnen het formeel Baggeroverleg voor de vergunning van het vaargeulonderhoud van de Westerschelde" binnen het project "Meervoudige raamovereenkomst plan- en projectvoorbereiding infrastructuur en baggerwerken in en aan de vaarweg" (Bestek MT/02323) voorziet in het voorbereiden en leveren van analyses en rapportering van monitoring- en modelleringsgegevens in het kader van het proces vaarwegbeheer. Binnen dit proces worden alle activiteiten verricht die nodig zijn om lopende en geplande omgevingsvergunningen te verwerven en behouden met betrekking tot alle onderhoudsbaggeractiviteiten die gebeuren in en langs de vaargeul waarvoor Maritieme Toegang bevoegd is.

Sinds de derde verruiming in 2010 vindt het verspreiden van baggerspecie in de Westerschelde plaats volgens het Beslisproces Flexibel Storten. Hierbij wordt de flexibele stortstrategie toegepast, waarbij tweemaandelijks op basis van recente monitoringsresultaten, wordt nagegaan of de stortactiviteiten bijsturing behoeven.

1.2 Doel van het rapport


Dit rapport maakt deel uit van de jaarlijkse rapportage waarin elke twee maanden een analyse van de laatst aangeleverde data is toegevoegd. De relevante rapporten zijn online te raadplegen op de website van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie[1].

[1] https://www.vnsc.eu/projecten/flexibel-storten/

1.3 Achtergrond

De stortstrategie is gericht op het optimaal verspreiden van de onderhoudsbaggerspecie uit de vaargeul in de Westerschelde. Zoals vastgelegd in de vergunning 2022-2028, baseert de nieuwe stortstrategie zich op de volgende uitgangspunten:

1. een doorlooptijd van 7 jaar en de gemiddelde jaarlijkse onderhoudshoeveelheden van 11,7 Mm³.
2. een flexibele stortstrategie voor wat betreft de verdeling van de beschikbare stortcapaciteit (71% in de hoofdgeul, 14% in de nevengeulen en 15% aan de plaatranden), het minimaliseren van de vaarafstand, het minimaliseren van een baggervolumetoename en het beschikbaar stortvolume per zone.
3. de stortzones die in het kader van de opvolging van de bagger- en stortwerkzaamheden binnen de stortstrategie Flexibel Storten worden gemonitord onder de noemer van projectmonitoring zijn weergegeven in Figuur 1-1. Het betreffen de plaatrandstortzones: Hooge Platen West (HPW) en de Plaat van Walsoorden (PWA), en de Hoofdgeulzones: SH31, de Put van Hansweert (PVH), en SH61. Analyse van SH71 en overige stortzones kunnen evenwel mee opgenomen worden in onderhavige rapportage.

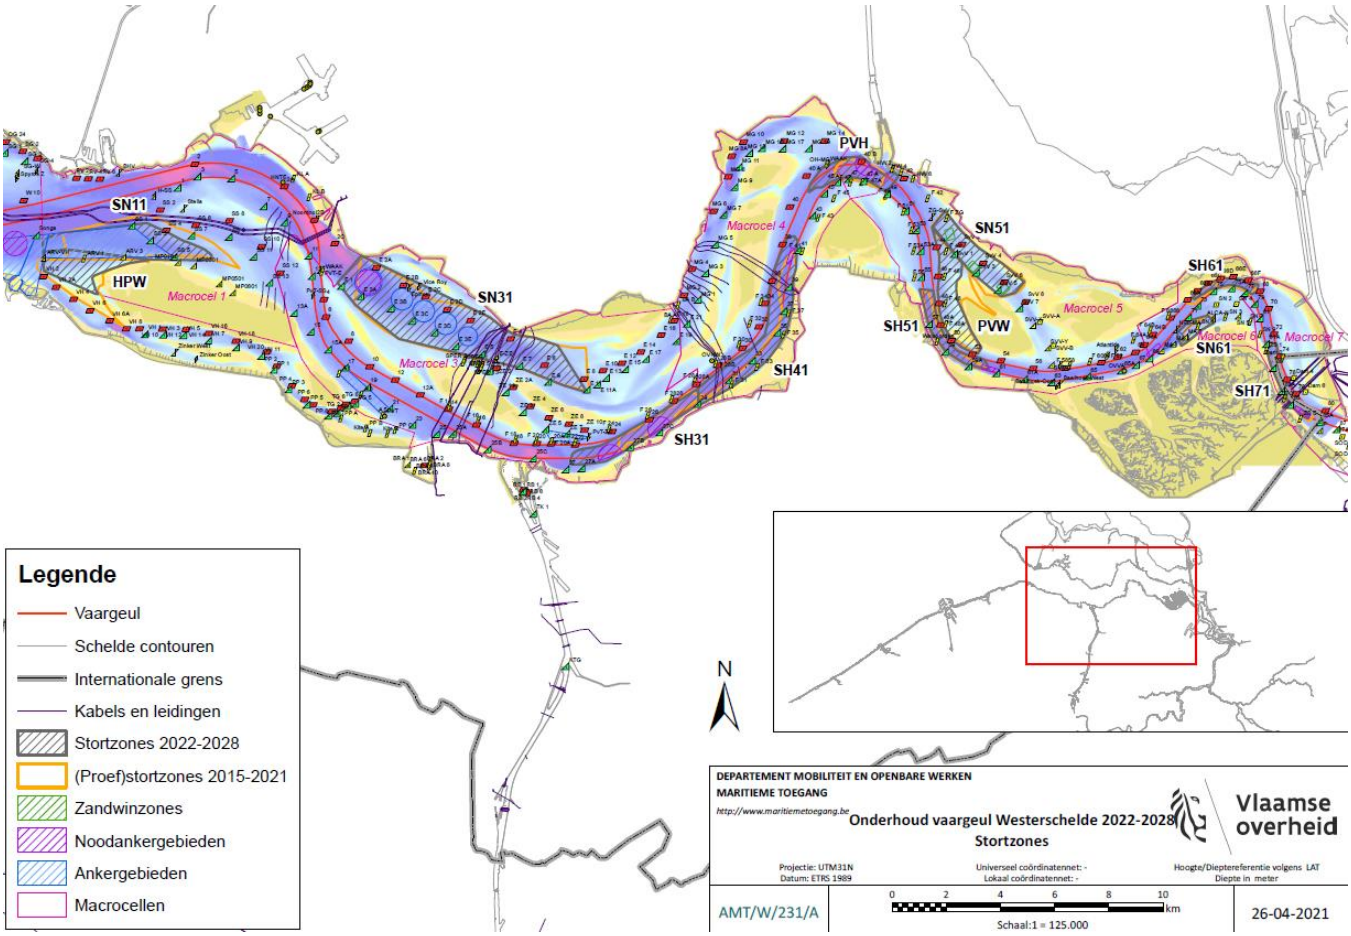

Figuur 1-1: Stortzones in de Westerschelde die gemonitord worden in het kader van de opvolging van de bagger- en stortwerkzaamheden binnen de stortstrategie Flexibel Storten.

1.4 Opbouw van het rapport

Dit rapport is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken waar elke twee maanden een analyse van de laatst aangeleverde data aan toegevoegd wordt. Op deze manier wordt gewerkt naar een volledig overzicht van een vergunningsjaar en dus, een jaarrapportage.

Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk dat in het kort de opdracht, het doel, de achtergrond, de opbouw en de methodologie van dit rapport beschrijft.

Hoofdstuk 2 bevat samenvattende tabellen betreffende het lopende vergunningsjaar 2025. Meer bepaald, de gestorte *in-situ* volumes en de ruimtelijke relatie tussen bagger- en stortvolumes.

In hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 9 wordt de relatieve volumeverandering van de stortzone (in %) en de morfologische (detail)analyse (verschilkaarten en profielen) van de verschillende zones gepresenteerd.

Hoofdstuk 10 bevat een algemene conclusie en hoofdstuk 11 bevat de referenties.

De bijlagen bevatten zowel het geselecteerd kaartmateriaal alsook de metadata van de aangeleverde data.

1.5 Gegevens en methode

Voor de uitvoering van de opdracht wordt per rapportageperiode een dataset aangeleverd aan IMDC. Deze bestaat uit verschillende onderdelen:

- Baggeropdrachten;
- Tripgegevens van de baggergegevens;
- Peilgegevens.

De methodologie voor de maandrapportage is oorspronkelijk gebaseerd op IMDC (2010). De huidige toegepaste methodologie is beschreven in de nota Methodologie Maandrapportages 2017 (IMDC, 2017) die integraal bij voorliggend rapport hoort.

De aangeleverde baggergegevens worden in beunvolumes gerapporteerd, terwijl deze in het voorliggend rapport uitgedrukt worden als *in-situ* volume (tenzij anders vermeld). Het *in-situ* volume wordt verkregen door het beunvolume te delen met een correctiefactor van 1,12 (Consortium Arcadis-Technum, 2007).

2 Overzicht activiteiten

2.1 Bagger- en stortactiviteiten

Een overzicht van de sedimentvolumes per bagger- en stortlocatie voor het vergunningsjaar 2025 (01/01/2025 tot 31/12/2025) wordt hier weergegeven.

De samenvatting voor de binnen de vergunning gestorte volumes voor vergunningsjaar 2025 zijn weergegeven in Tabel 2-1. De ruimtelijke relaties tussen de bagger- en stortvolumes worden weergegeven in Tabel 2-2.

Tabel 2-1: Samenvatting gestorte *in-situ* volumes (in m³) tussen 1 januari 2025 en 31 december 2025 (totaal vergunningsjaar 2025), per macrocel.

01-01-2025 tot en met 31-12-2025 (vergunningsjaar 2025)				
Macrocel	**Hoofdgeul**	**Nevengeul**	**Plaatrand(en)**	**Totaal**
1	-	1 140 352	264 403	1 404 756
3	1 646 889	558 562	-	2 205 451
4	2 954 654	-	-	2 954 654
PVH	1 366 886	-	-	1 366 886
5	1 414 320	-	828 509	2 242 828
6	-	-	-	-
7	392 657	-	-	392 657
Totaal	**7 775 405**	**1 698 914**	**1 092 912**	**10 567 231**

Tabel 2-2: Ruimtelijke relatie tussen bagger- en stortvolumes in vergunningsjaar 2025 (tussen 1 januari 2025 en 31 december 2025). *In-situ* volumes (in m³).

	MC1			MC3			MC4	PVH	MC5			MC6			MC7	Totaal gebaggerd
Baggerlocatie	**HPW**	**SN11**	**Som**	**SN31**	**SH31**	**Som**	**SH41**	**PVH**	**SH51**	**PWA**	**Som**	**SH61**	**SN61**	**Som**	**SH71**	
Macrocel 1	**169 388**		**169 388**													**169 388**
Drempel van Vlissingen	31 853		31 853													31 853
Honte	137 535		137 535													137 535
Macrocel 3	**95 015**	**1 140 352**	**1 235 367**	**558 562**	**230 082**	**788 644**	**69 439**									**2 093 450**
Drempel van Borssele		1 074 804	1 074 804	122 527		122 527										1 197 331
Pas van Terneuzen		65 548	65 548	436 036	2 201	438 237										503 785
Put van Terneuzen	95 015		95 015		227 881	227 881	69 439									392 335
Macrocel 4					**546 606**	**546 606**	**628 311**	**44 044**								**1 218 961**
Gat van Ossenisse					249 888	249 888	108 694									358 582
Overloop van Hansweert					296 718	296 718	519 617	44 044								860 379
Macrocel 5					**870 200**	**870 200**	**2 216 929**	**872 855**	**623 011**	**828 509**	**1 451 520**				**12 178**	**5 423 682**
Drempel van Hansweert					870 200	870 200	2 099 190	317 020		718 736	718 736					4 005 146
Walsoorden								33 025		17 862	17 862					50 887
Overloop van Valkenisse							117 739	522 810	623 011	91 911	714 922				12 178	1 367 648
Macrocel 6							**39 975**	**449 987**	**791 309**		**791 309**				**307 813**	**1 589 084**
Drempel van Valkenisse							39 975	449 987	431 574		431 574				5 720	927 257
Drempel van Bath									359 734		359 734				302 093	661 827
Macrocel 7															**72 666**	**72 666**
Vaarwater boven Bath															72 666	72 666
Totaal gestort	**264 403**	**1 140 352**	**1 404 756**	**558 562**	**1 646 889**	**2 205 451**	**2 954 654**	**1 366 886**	**1 414 320**	**828 509**	**2 242 828**				**392 657**	**10 567 231**

Tabel 2-3 geeft een overzicht van de baggeractiviteiten in 2025 per bagger- en stortlocatie. In totaal werd er tussen 1 januari en 31 december **10 567 231 m³** specie gebaggerd.

Tabel 2-3: Overzicht van baggeractiviteiten per week in 2025.

Maand	Week	Baggerlocatie	Schip	Stortzone	*In-situ* volume (in m³)
Januari	1	Drempel van Borssele	Diogo Cão	SN31	33 331
		Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	22 313
		Gat van Ossenisse	Diogo Cão	SH31	30 842
		Overloop van Hansweert	Scheldt River	SH41	38 140
		Overloop van Valkenisse	Diogo Cão	SH51	19 843
				SH71	6 610
	2	Drempel van Borssele	Diogo Cão	SN31	1 782
		Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	11 237
		Overloop van Valkenisse	Diogo Cão	SH51	2 278
	3	Drempel van Borssele	Diogo Cão	SN31	80 957
	4	Drempel van Borssele	Diogo Cão	SN31	6 456
		Drempel van Hansweert	Diogo Cão	SH41	11 332
				PWA	85 658
				PVH	13 278
Totaal januari					**364 058**
Februari	4	Drempel van Hansweert	Diogo Cão	PWA	30 403
	5	Drempel van Hansweert	Diogo Cão	PWA	6 599
	6	Overloop van Valkenisse	Scheldt River	SH51	77 158
				PVH	138 828
	7	Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	80 957
		Overloop van Valkenisse	Scheldt River	SH51	16 341
				PVH	27 514
	8	Drempel van Valkenisse	Scheldt River	SH51	5 391
		Gat van Ossenisse	Scheldt River	SH31	7 883
Totaal februari					**520 580**
Maart	8	Gat van Ossenisse	Scheldt River	SH31	81 024
		Overloop van Hansweert	Scheldt River	SH31	5 398
	9	Overloop van Hansweert	Scheldt River	PVH	29 691
				SH31	274 743
	10	Drempel van Valkenisse	Scheldt River	SH51	5 560
				PVH	95 026
		Overloop van Hansweert	Scheldt River	SH31	16 577
		Overloop van Valkenisse	Scheldt River	PVH	15 285
		Walsoorden	Scheldt River	PVH	33 025
	11	Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	188 987
		Drempel van Valkenisse	Scheldt River	PVH	93 095
	12	Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	230 342
	13	Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	32 993
		Drempel van Valkenisse	Scheldt River	PVH	11 098
Totaal maart					**1 112 844**
April	13	Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	235 034
		Drempel van Valkenisse	Scheldt River	PVH	22 399

Maand	Week	Baggerlocatie	Schip	Stortzone	*In-situ* volume (in m³)
April	14	Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	210 155
		Overloop van Valkenisse	Scheldt River	SH51	5 677
				SH71	5 567
	15	Drempel van Bath	Scheldt River	SH51	55 454
				SH71	38 493
		Drempel van Borssele	Sanderus	SN11	84 929
		Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	32 357
		Overloop van Hansweert	Scheldt River	SH41	15 776
		Overloop van Valkenisse	Scheldt River	SH51	75 422
				PVH	81 395
	16	Drempel van Bath	Scheldt River	SH51	50 216
				SH71	38 118
		Drempel van Borssele	Sanderus	SN11	175 753
		Overloop van Valkenisse	Scheldt River	SH51	32 676
				PVH	32 564
	17	Drempel van Borssele	Sanderus	SN11	55 896
		Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	88 769
		Put van Terneuzen	Sanderus	SH31	35 912
Totaal april					**1 372 565**
Mei	17	Drempel van Borssele	Sanderus	SN11	5 932
		Put van Terneuzen	Sanderus	SH31	183 698
	18	Drempel van Borssele	Sanderus	SN11	59 091
		Pas van Terneuzen	Sanderus	SN31	149 397
				SH31	2 201
	19	Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	16 008
		Pas van Terneuzen	Sanderus	SN31	10 962
		Vaarwater boven Bath	Scheldt River	SH71	15 710
Totaal mei					**442 999**
Juni	22	Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	43 863
				SH31	49 585
	23	Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	82 270
				SH31	93 620
	24	Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	123 820
				SH31	129 409
	25	Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	127 748
				SH31	139 497
	26	Drempel van Borssele	Scheldt River	SN11	21 538
		Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	5 560
				SH31	11 193
Totaal juni					**828 104**
Juli	26	Drempel van Borssele	Scheldt River	SN11	146 164
		Put van Terneuzen	Scheldt River	SH31	5 151
	27	Drempel van Valkenisse	Scheldt River	SH41	39 975
				SH51	45 796
				SH71	5 720
		Overloop van Valkenisse	Scheldt River	SH41	89 727

Maand	Week	Baggerlocatie	Schip	Stortzone	*In-situ* volume (in m³)
Juli				SH51	100 861
		Put van Terneuzen	Scheldt River	SH31	3 120
	28	Drempel van Valkenisse	Scheldt River	SH51	167 866
				PVH	72 894
		Overloop van Valkenisse	Scheldt River	SH41	22 372
				SH51	38 897
	29	Drempel van Borssele	Scheldt River	SN11	19 704
		Drempel van Valkenisse	Scheldt River	SH51	107 211
				PVH	67 219
		Gat van Ossenisse	Scheldt River	SH41	21 909
		Overloop van Valkenisse	Scheldt River	SH41	5 640
			Scheldt River	SH51	28 085
	30	Drempel van Borssele	Scheldt River	SN11	53 970
		Honte	Scheldt River	HPW	24 058
		Overloop van Hansweert	Scheldt River	PVH	14 353
Totaal juli					**1 080 693**
Augustus	30	Drempel van Borssele	Scheldt River	SN11	75 418
	31	Drempel van Borssele	Scheldt River	SN11	21 933
		Overloop van Hansweert	Meuse River	SH41	150 126
		Pas van Terneuzen	Scheldt River	SN31	161 522
	32	Overloop van Hansweert	Meuse River	SH41	171 344
		Pas van Terneuzen	Meuse River	SN31	95 628
	33	Drempel van Bath	Meuse River	SH51	68 405
				SH71	68 587
		Drempel van Hansweert	Meuse River	SH41	5 509
				SH31	22 202
		Gat van Ossenisse	Meuse River	SH31	5 320
		Pas van Terneuzen	Meuse River	SN31	18 527
	34	Drempel van Bath	Meuse River	SH51	11 417
				SH71	5 785
		Drempel van Hansweert	Meuse River	SH41	153 734
				SH31	131 014
Totaal augustus					**1 166 470**
September	35	Drempel van Hansweert	Meuse River	SH41	49 848
				SH31	56 187
		Drempel van Vlissingen	Meuse River	HPW	31 853
		Honte	Meuse River	HPW	113 478
	36	Drempel van Hansweert	Meuse River	SH41	5 634
				SH31	5 488
	37	Gat van Ossenisse	Meuse River	SH31	45 009
		Overloop van Valkenisse	Scheldt River	SH51	5 472
				PVH	11 113
	38	Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	5 472
				SH31	21 472
		Gat van Ossenisse	Scheldt River	SH31	65 250
		Overloop van Valkenisse	Scheldt River	SH51	116 466

Maand	Week	Baggerlocatie	Schip	Stortzone	*In-situ* volume (in m³)
				PVH	111 022
	39	Drempel van Borssele	Scheldt River	SN11	47 896
		Gat van Ossenisse	Scheldt River	SH31	14 560
Totaal september					**706 219**
Oktober	39	Drempel van Borssele	Scheldt River	SN11	52 696
		Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	33 534
				SH31	38 427
	40	Drempel van Borssele	Scheldt River	SN11	117 778
		Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	5 771
				SH31	5 633
		Pas van Terneuzen	Scheldt River	SN11	41 440
		Vaarwater boven Bath	Sanderus	SH71	56 956
	41	Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	56 394
				PVH	104 806
				SH31	49 756
		Pas van Terneuzen	Scheldt River	SN11	21 518
	42	Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	16 120
				PVH	27 278
				SH31	10 878
	43	Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	66 000
				PVH	115 504
				SH31	77 340
Totaal oktober					**897 830**
November	43	Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	22 179
				PVH	44 888
				SH31	22 909
	44	Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH41	5 742
				PVH	11 266
				SH31	5 589
		Overloop van Valkenisse	Scheldt River	SH51	82 669
				PVH	83 336
	45	Drempel van Hansweert	Diogo Cão	PWA	188 628
		Drempel van Hansweert	Scheldt River	SH51	99 750
				PVH	88 256
		Overloop van Valkenisse	Scheldt River	SH51	21 166
				PVH	21 753
	46	Drempel van Hansweert	Diogo Cão	PWA	99 062
		Gat van Ossenisse	Sanderus	SH41	86 785
		Overloop van Valkenisse	Diogo Cão	PWA	66 752
		Walsoorden	Diogo Cão	PWA	17 862
	47	Drempel van Bath	Scheldt River	SH51	83 842
				SH71	72 316
		Overloop van Valkenisse	Diogo Cão	PWA	25 158
		Put van Terneuzen	Sanderus	SH41	69 439
Totaal november					**1 219 349**

Maand	Week	Baggerlocatie	Schip	Stortzone	*In-situ* volume (in m³)
December	48	Drempel van Bath	Scheldt River	SH51	90 400
				SH71	78 793
		Drempel van Borssele	Scheldt River	SN11	63 024
	49	Drempel van Borssele	Scheldt River	SN11	70 238
		Drempel van Hansweert	Diogo Cão	PWA	104 618
		Put van Terneuzen	Scheldt River	HPW	95 015
	50	Drempel van Borssele	Scheldt River	SN11	2 843
		Drempel van Hansweert	Diogo Cão	PWA	194 450
		Overloop van Hansweert	Scheldt River	SH41	127 646
		Pas van Terneuzen	Scheldt River	SN11	2 590
	51	Drempel van Hansweert	Diogo Cão	PWA	9 317
		Overloop van Hansweert	Scheldt River	SH41	16 584
Totaal december					**855 520**
Totaal vergunningsjaar 2025					**10 567 231**

Tabel 2-4 geeft een overzicht van de *in-situ* volumes gebaggerd in 2025 en sinds het begin van de vergunning 2022-2028.

Tabel 2-4: *In-situ* baggervolumes (in m³) per baggerlocatie in 2025.

Baggerlocatie	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal Vergunnings-jaar 2025	Totaal vergunning 2022-2028 (Sinds 12/02/22)
Drempel van Bath	-	-	-	182 282	-	-	-	154 193	-	-	156 158	169 194	661 827	2 264 031
Drempel van Borssele	122 527	-	-	316 578	65 023	21 538	219 838	97 351	47 896	170 474	-	136 105	1 197 331	4 579 744
Drempel van Hansweert	143 819	247 466	452 322	566 316	16 008	806 565	-	312 459	144 101	607 442	400 264	308 385	4 005 146	13 317 040
Drempel van Valkenisse	-	5 391	204 779	22 399	-	-	506 682	-	-	-	188 006	-	927 257	4 009 415
Drempel van Vlissingen	-	-	-	-	-	-	-	-	31 853	-	-	-	31 853	127 021
Gat van Ossenisse	30 842	7 883	81 024	-	-	-	21 909	5 320	124 819	-	86 785	-	358 582	1 061 472
Honte	-	-	-	-	-	-	24 058	-	113 478	-	-	-	137 535	992 577
Overloop van Hansweert	38 140	-	326 410	15 776	-	-	14 353	321 470	-	-	-	144 231	860 379	3 149 251
Overloop van Valkenisse	28 731	259 841	15 285	233 301	-	-	285 583	-	244 073	-	300 834	-	1 367 648	6 042 243
Pas van Terneuzen	-	-	-	-	162 560	-	--	275 677	-	62 958	-	2 590	503 785	2 720 575
Put van Terneuzen	-	-	-	35 912	183 698	-	8 271	-	-	-	69 439	95 015	392 335	1 315 935
Vaarwater boven Bath	-	-	-	-	15 710	-	-	-	-	56 956	-	-	72 666	325 738
Walsoorden	-	-	33 025	-	-	-	-	-	-	-	17 862	-	50 887	50 887
Totaal	**364 058**	**520 580**	**1 112 844**	**1 372 565**	**442 999**	**828 104**	**1 080 693**	**1 166 470**	**706 219**	**897 830**	**1 219 349**	**855 520**	**10 567 231**	**39 955 929**

Tabel 2-5 geeft een overzicht van de *in-situ* volumes gestort in 2025, en sinds het begin van de vergunning 2022-2028.

Tabel 2-5: *In-situ* stortvolumes (in m³) per stortzone in 2025.

Stortzone	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal Vergunnings-jaar 2025	Totaal vergunning 2022-2028 (Sinds 12/02/22)
DOW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168 786
GwGvO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539 631
HPW	-	-	-	-	-	-	24 058	-	145 331	-	-	95 015	264 403	1 959 182
HVB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 333
PVH	13 278	166 342	277 220	136 358	-	-	154 466	-	122 135	247 589	249 498	-	1 366 886	5 470 902
PWA	85 658	37 003		-	-	-	-	-	-	-	397 463	308 385	828 509	2 745 677
SH31	30 842	7 883	377 742	35 912	185 899	423 304	8 271	158 536	207 967	182 035	28 499	-	1 646 889	5 638 457
SH41	83 022	210 463	452 322	582 092	16 008	383 261	179 623	480 713	60 954	177 819	184 145	144 231	2 954 654	11 025 476
SH51	22 121	98 890	5 560	219 445	-	-	488 717	79 822	121 938	-	287 427	90 400	1 414 320	4 760 656
SH61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538 775
SH71	6 610	-	-	82 179	15 710	-	5 720	74 371	-	56 956	72 316	78 793	392 657	1 776 768
SN11	-	-	-	316 578	65 023	21 538	219 838	97 351	47 896	233 432	-	138 696	1 140 352	3 356 512
SN31	122 527	-	-	-	160 359	-	-	275 677	-	-	-	-	558 562	1 958 772
SN61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	**364 058**	**520 580**	**1 112 844**	**1 372 565**	**442 999**	**828 104**	**1 080 693**	**1 166 470**	**706 219**	**897 830**	**1 219 349**	**855 520**	**10 567 231**	**39 955 929**

2.2 Uitgevoerde peilingen

Tabel 2-6 geeft de uitgevoerde peilingen weer in 2025.

Tabel 2-6: Overzicht uitgevoerde en verwerkte bathymetrische gegevens voor 2025. Grote peilingen worden in het cursief aangeduid. Het achtervoegsel "D" wordt aangegeven bij de stortzone voor peilingen die enkel de drempel bij de zone beslaan, en niet de volledige stortzone. Het achtervoegsel "W" wordt aangegeven bij de peilingen van stortzone SN31 die enkel het westelijke deel van de zone beslaan.


Datum ontvangst	Peiling	Peildatum	Stortzone	Tx (IMDC)
Januari				
29/01/2025	20250113_246_STBORSG_MB	13/01/2025	SN31	T3
29/01/2025	20250122_248_STIOSSG_MB	22/01/2025	SH31	T83
Februari				
03/02/0025	20250125_250_STOSS_MB	25/01/2025	SH41	T3
03/02/2025	20250127_252_STHW_MB	27/01/2025	PVH	T88
03/02/2025	20250130_254_WALS_MB	30/01/2025	SH51	T4
24/02/2025	20250210_262_STWALS_MB	10/02/2025	PWA	T171
Maart				
03/03/2025	20250206_260_STMC7_MB	06/02/2025	SH71	T41
April				
03/04/2025	20250224_264_STHPW_MB	24/02/2025	HPW	T164
11/04/2025	20250408_266_BT_MB	08/04/2025	SH61	T21
15/04/2025	20250409_268_STHW_MB	09/04/2025	PVH	T89
Mei				
26/05/2025	20250505_270_STBORSG_MB	05/05/2025	SN31	T4
26/05/2025	20250512_272_STIOSSG_MB	12/05/2025	SH31	T84
26/05/2025	20250513_274_OSS_MB	13/05/2025	SH41	T4
Juni				
03/06/2025	20250523_276_WALS_MB	23/05/2025	SH51	T5
03/06/2025	20250527_278_STHW_MB	27/05/2025	PVH	T90
04/06/2025	20250602_280_BT_MB	02/06/2025	SH61	T22
12/06/2025	20250603_282_STMC7_MB	03/06/2025	SH71	T42
12/06/2025	20250604_284_STWALS_MB	04/06/2025	PWA	T172
Juli				
10/07/2025	20250701_286_STHPW_MB	01/07/2025	HPW	T165
28/07/2025	20250722_288_SVN_MB_DET	22/07/2025	SVN	T19
28/07/2025	20250722_290_SVN_MB_DET	22/07/2025	SVDN	T19
28/07/2025	20250723_292_OSS_MB	23/07/2025	SH41-D	T5
Augustus				
06/08/2025	20250724_294_STHW_MB	24/07/2025	PVH	T91
September				
23/09/2025	20250805_296_STBORSG_MB_DET	05/08/2025	SN31-W	T5
23/09/2025	20250818_298_OSS_MB	18/08/2025	SH41-D	T6

23/09/2025	20250904_300_STBORSG_MB_DET	04/09/2025	SN31-W	T6
29/09/2025	20250917_304_STIOSSG_MB	17/09/2025	SH31	T85
29/09/2025	20250917_306_OSS_MB	17/09/2025	SH41	T7
29/09/2025	20250921_308_STHW_MB	21/09/2025	PVH	T92
29/09/2025	20250923_310_STMC7_MB	23/09/2025	SH71	T43
Oktober				
14/10/2025	20250924_312_BT_MB	24/09/2025	SH61	T23
14/10/2025	*20250930_314_STWALSG_MB*	30/09/2025	PWA (+SH51, SN51)	T173
14/10/2025	20251007_316_STBORSG_MB_DET	07/10/2025	SN31-W	T7
November				
06/11/2025	*20251014_320_STHP_MB*	14/10/2025	HPW (+SN11)	T166
19/11/2025	20251105_322_STBORSG_MB_DET	05/11/2025	SN31-W	T8
19/11/2025	20251113_324_OSS_MB	13/11/2025	SH41-D	T8
26/11/2025	20251117_326_STHW_MB	17/11/2025	PVH	T93
December				
16/12/2025	20251208_328_OSS_MB	08/12/2025	SH41	T9

3 Hooge Platen West (HPW)


3.1 Resultaten lopend vergunningsjaar

De relatieve volumeverandering van de stortzone (in %) wordt geëvalueerd door het (cumulatieve) stortvolume te vergelijken met het gepeilde volume op de bodem ten opzichte van de referentiepeiling (T146, 17/04/2022) (Figuur 3-1).

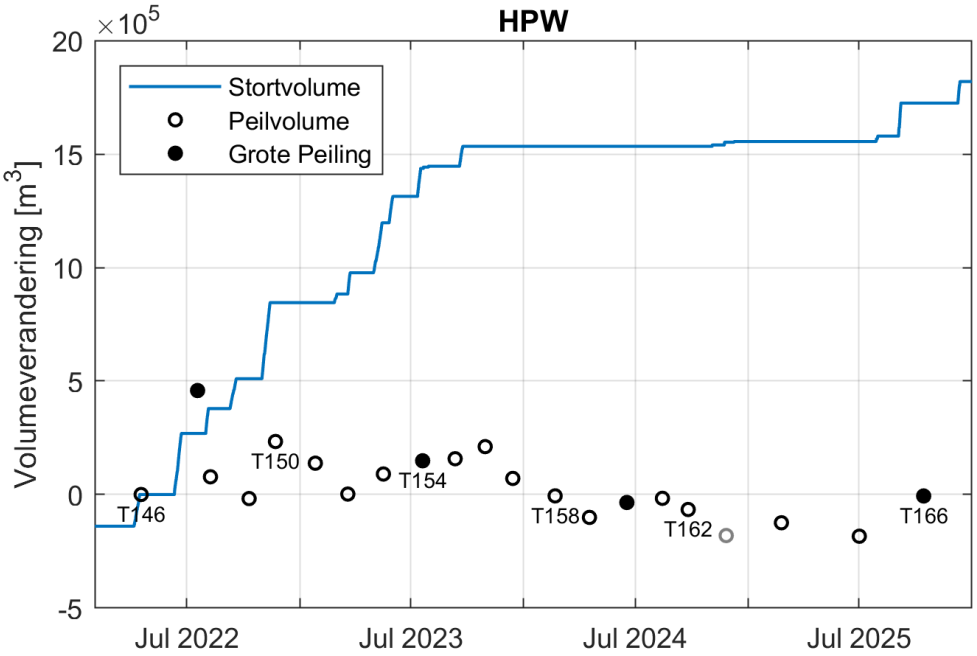

Figuur 3-1: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen voor de complete stortzone voor Hooge Platen West. De dichte cirkels geven de grote peilingen weer (gemeten tot +1 m NAP), de open cirkels zijn de reguliere peilcampagnes (gemeten tot -2 m NAP). De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking.

Voor HPW wordt de bodemontwikkeling op basis van profielen opgevolgd en voor het volledig vergunningsjaar 2025 weergegeven in Figuur 3-2. De nieuwe referentiepeiling T146 (17/04/2022) wordt eveneens opgenomen om de bodemontwikkeling op lange termijn op te volgen.

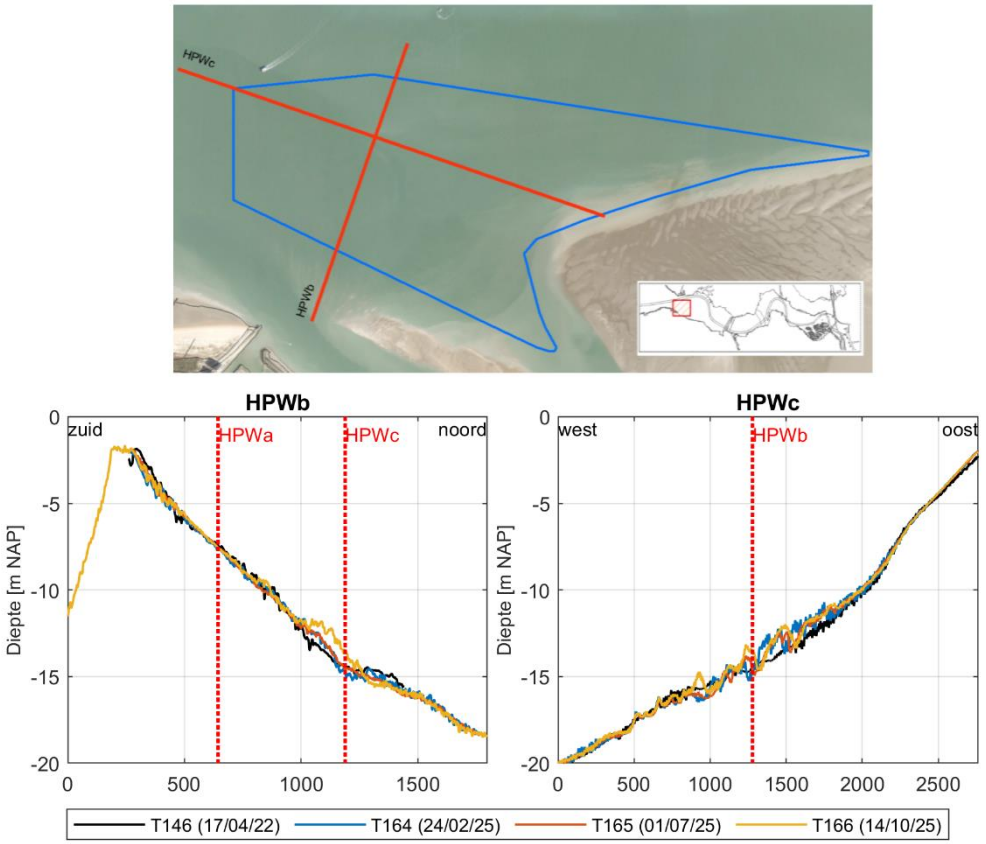

Figuur 3-2: Evolutie van de bathymetrie voor vergunningsjaar 2025 langs doorsnedes HPWb en HPWc bij stortzone Hooge Platen West.

3.2 Resultaten maandrapportages

3.2.1 Analyse januari

In Tabel 3-1 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 3-1: Feitelijke informatie voor HPW in januari 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Januari: geen stortingen	Figuur 3-1
Peilingen	-	-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	-	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	-	-

Er werden in deze periode geen peilingen aangeleverd.

3.2.2 Analyse februari en maart

In Tabel 3-2 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 3-2: Feitelijke informatie voor HPW in februari en maart 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Februari: geen stortingen Maart: geen stortingen	Figuur 3-1
Peilingen	-	-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	-	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	-	-

Er werden in deze periode geen peilingen aangeleverd.


3.2.3 Analyse april en mei

In Tabel 3-3 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 3-3: Feitelijke informatie voor HPW in april en mei 2025. De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking.


Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	April: geen stortingen Mei: geen stortingen	Figuur 3-1
Peilingen	T164 (24/02/2025)	Figuur 3-4; Bijlage A.3
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T164 (24/02/2025) – T146 (17/04/2022): -8%	Figuur 3-1
Profielen	Langs doorsnedes HPWb en HPWc	Figuur 3-2; Figuur 3-3
Verschilkaarten	T164 – 146 (24/02/2025 – 17/04/2022) T164 – 163 (24/02/2025 – 26/11/2024): • Stortvolume: ca. 3 000 m³ • Peilvolume: ca. 56 000 m³	Figuur 3-4; Bijlage A.3

Voor deze periode worden de aangeleverde profielen getoond in Figuur 3-3. Om de bodemontwikkeling in een breder historisch kader te plaatsen wordt de nieuwe peiling vergeleken met de voorafgaande peiling, de nieuwe referentiepeiling (T146), alsook met de voorgaande referentiepeillingen T0 en T63.

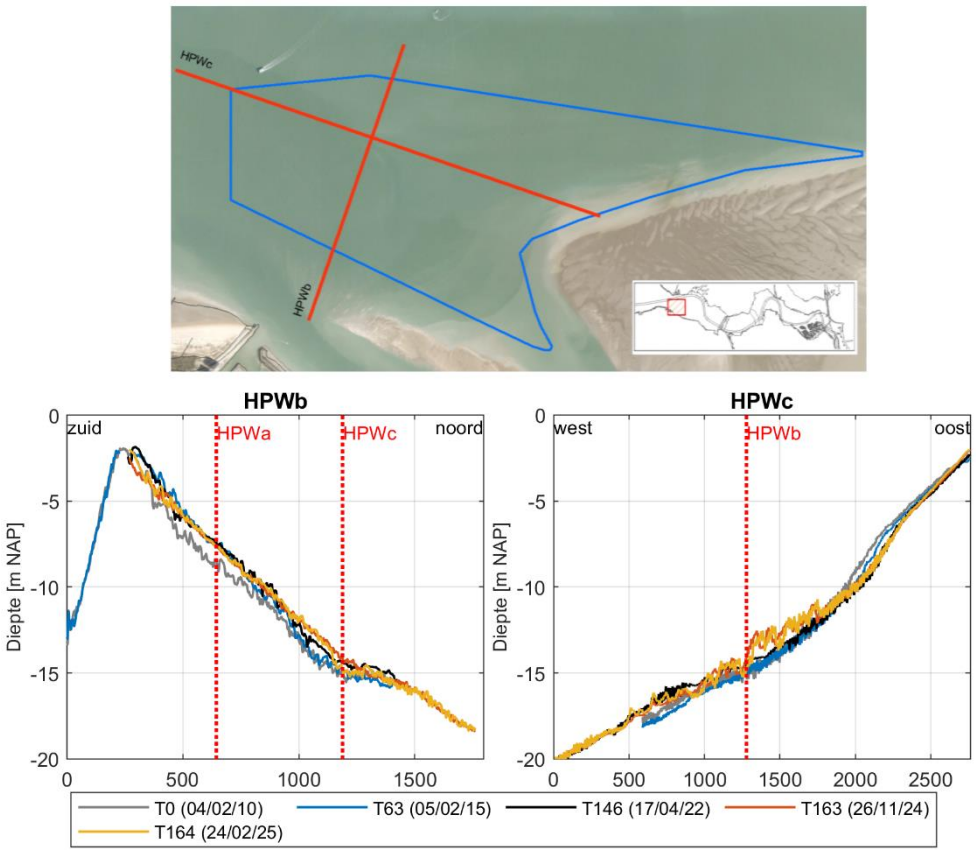

Figuur 3-3: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes HPWb en HPWc aan stortzone Hooge Platen West sinds 2010.

In de stortzone **Hooge Platen West** is er in de periode T164-T163 een klein volume (ca. 3 000 m³) gestort. Op de verschilkaart is centraal in de stortzone migratie van bodemvormen zichtbaar (Figuur 3-4). De morfologische veranderingen zijn verder beperkt tot voornamelijk lichte verondieping in het noordwesten van de stortzone (zie raai HPWc in Figuur 3-3). Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat deze verondieping waarschijnlijk een overschatting is o.w.v. de afwijkende peiling T163 (Figuur 3-1). Ter hoogte van de eerder gebruikte stortvakken is lichte verdieping zichtbaar. De relatieve volumeverandering van de stortzone (ten opzichte van de referentiepeiling T146) is opnieuw gestegen en bedraagt -8 % (Figuur 3-1).

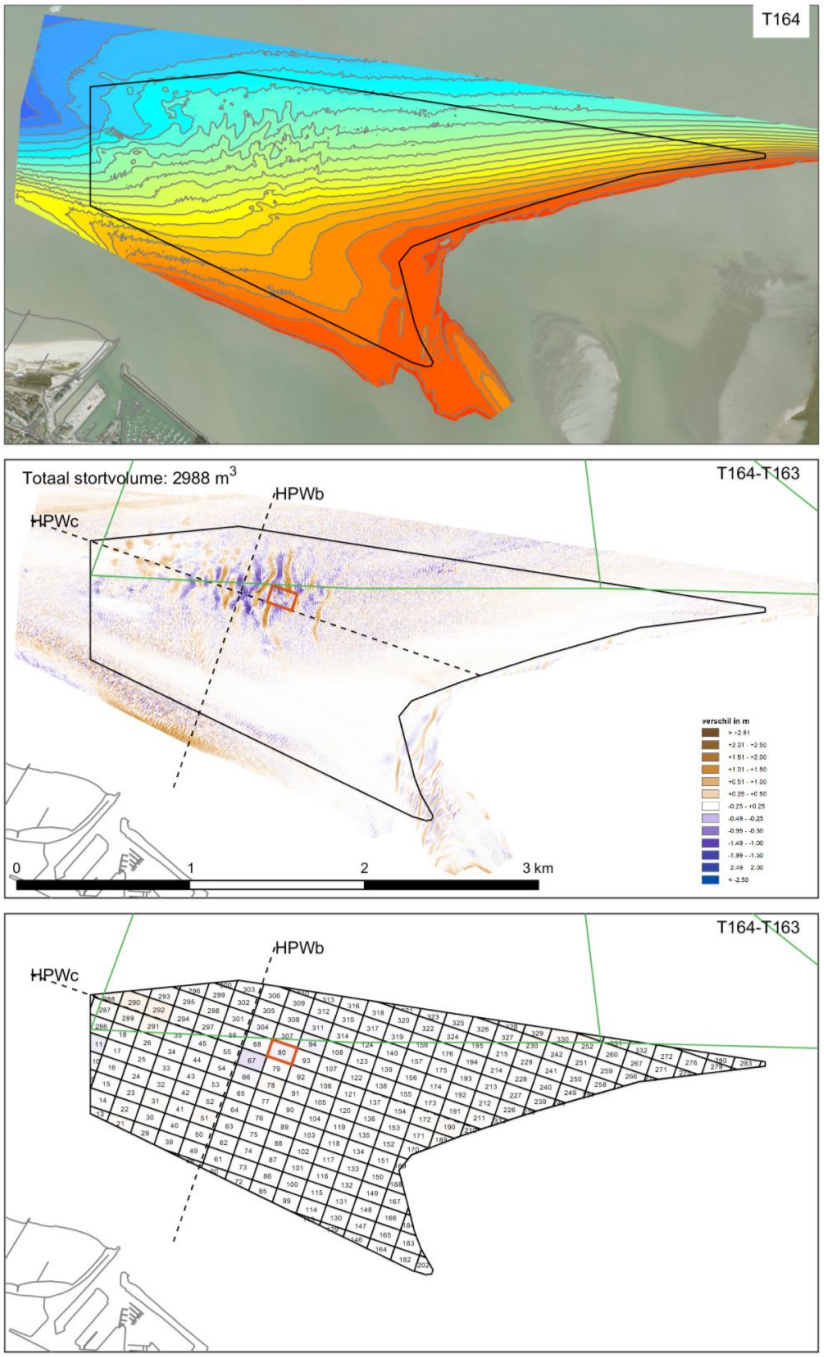

Figuur 3-4: Morfologische veranderingen bij Hooge Platen West tussen T164 en T163. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

3.2.4 Analyse juni en juli


In Tabel 3-4 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 3-4: Feitelijke informatie voor HPW in juni en juli 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur


Stortingen	Juni: geen stortingen Juli: ca. 24 000 m³	Figuur 3-1
Peilingen	T165 (01/07/2025)	Figuur 3-6; Bijlage A.4
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T165 (01/07/2025) – T146 (17/04/2022):-12%	Figuur 3-1
Profielen	Langs doorsnedes HPWb en HPWc	Figuur 3-2; Figuur 3-5
Verschilkaarten	T165 – 146 (01/07/2025 – 17/04/2022) T165 – 164 (01/07/2025– 24/02/2025): • Stortvolume: geen stortingen • Peilvolume: ca. -59 000 m³	Figuur 3-6; Bijlage A.4

Voor deze periode worden de aangeleverde profielen getoond in Figuur 3-5. Om de bodemontwikkeling in een breder historisch kader te plaatsen wordt de nieuwe peiling vergeleken met de voorafgaande peiling, de nieuwe referentiepeiling (T146), alsook met de voorgaande referentiepeilingen T0 en T63.

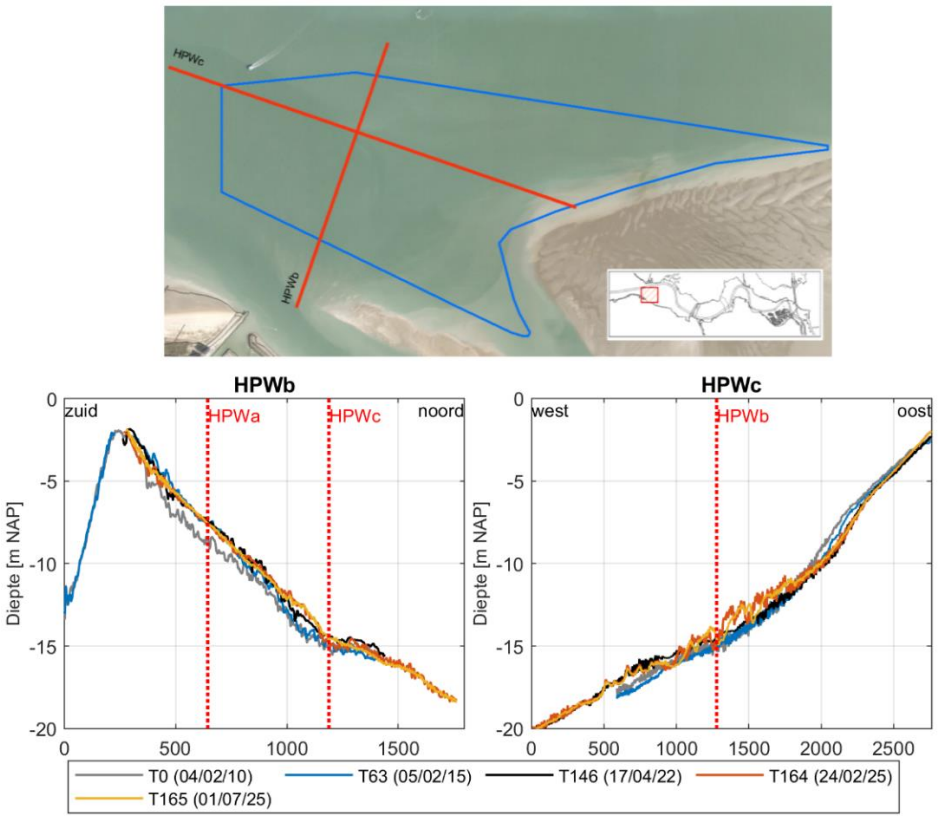

Figuur 3-5: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes HPWb en HPWc aan stortzone Hooge Platen West sinds 2010.

In de stortzone **Hooge Platen West** is er in de periode T165-T164 niet gestort. Op de verschilkaart is centraal in de stortzone migratie van bodemvormen zichtbaar (Figuur 3-6). Deze migrerende bodemvormen werden ook waargenomen bij de voorgaande peiling (T164), en lijken zich dus verder te zetten (zie raai HPWc in Figuur 3-5). Ter hoogte van de eerder gebruikte stortvakken is lichte verdieping zichtbaar. De relatieve volumeverandering van de stortzone (ten opzichte van de referentiepeiling T146) is gedaald en bedraagt -12 % (Figuur 3-1).

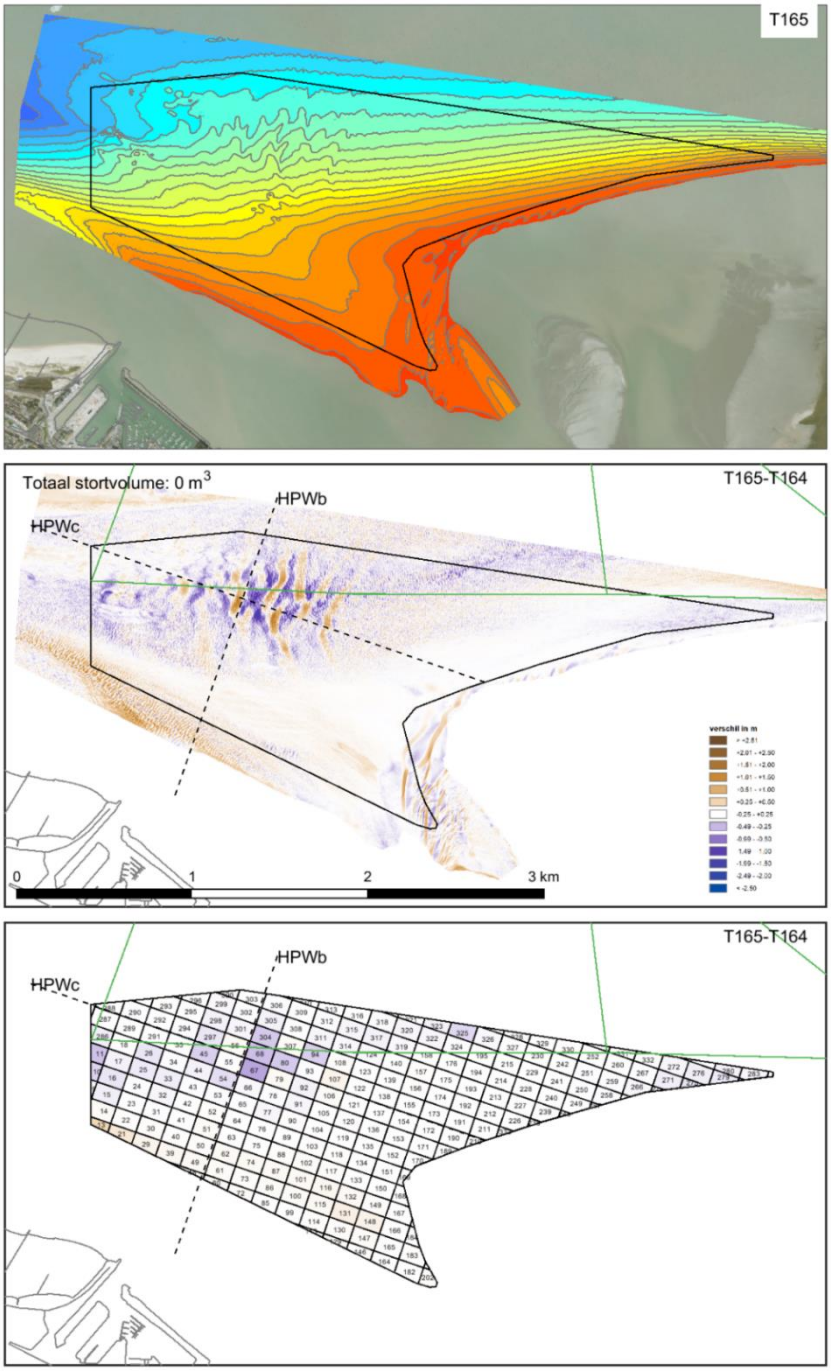

Figuur 3-6: Morfologische veranderingen bij Hooge Platen West tussen T165 en T164. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

3.2.5 Analyse augustus en september

In Tabel 3-5 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 3-5: Feitelijke informatie voor HPW in augustus en september 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Augustus: geen stortingen September: ca. 145 000 m³	Figuur 3-1
Peilingen	-	-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	-	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	-	-

Er werden in deze periode geen peilingen aangeleverd.


3.2.6 Analyse oktober en november

In Tabel 3-6 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 3-6: Feitelijke informatie voor HPW in oktober en november 2025.


Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Oktober: geen stortingen November: geen stortingen	Figuur 3-1
Peilingen	T166 (grote peiling, 14/10/2025)	Figuur 3-8; Bijlage A.6
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T166 (14/10/2025) – T146 (17/04/2022): 0%	Figuur 3-1
Profielen	Langs doorsnedes HPWb en HPWc	Figuur 3-2; Figuur 3-7
Verschilkaarten	T166 – 146 (14/10/2025– 17/04/2022) T166 – 165 (14/10/2025– 01/07/2025): • Stortvolume: ca. 169 000 m³ • Peilvolume: ca. 177 000 m³ T166 – 160 (14/10/2025– 17/06/2024) • Stortvolume: ca. 190 000 m³ • Peilvolume: ca. 29 000 m³	Figuur 3-8; Bijlage A.6; Figuur 3-9

Voor deze periode worden de aangeleverde profielen getoond in Figuur 3-7. Om de bodemontwikkeling in een breder historisch kader te plaatsen wordt de nieuwe peiling vergeleken met de voorafgaande peiling, de nieuwe referentiepeiling (T146), alsook met de voorgaande referentiepeilingen T0 en T63.

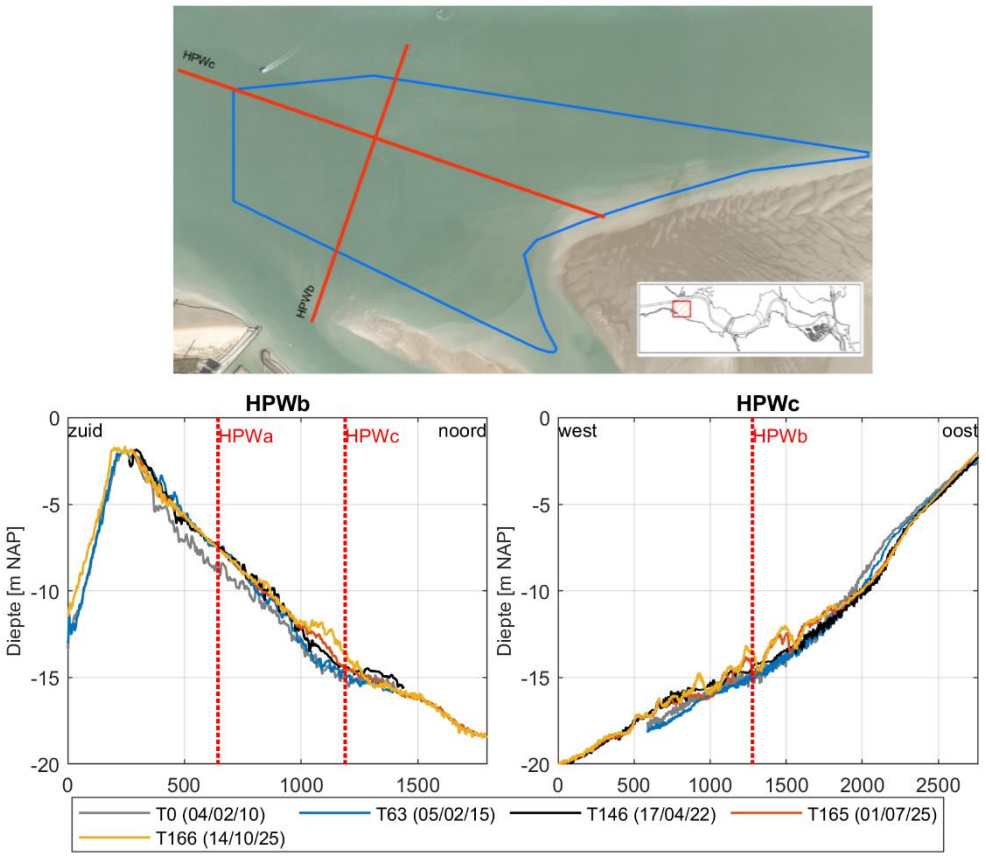

Figuur 3-7: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes HPWb en HPWc aan stortzone Hooge Platen West sinds 2010.


In de stortzone **Hooge Platen West** is er in de periode T166-T165 ca. 169 000 m^3 gestort. Op de verschilkaart is ten oosten van de gebruikte stortvakken migratie van bodemvormen zichtbaar (Figuur 3-8). Deze migrerende bodemvormen werden ook waargenomen bij alle voorgaande peilingen dit jaar (T164 en T165), en lijken zich dus verder te zetten (zie raai HPWc in Figuur 3-5). Het gaat hier om verspreiding van gestort sediment in oostelijke richting langs de plaatrand. Ter hoogte van de gebruikte stortvakken in het centraal-westelijke deel van de stortzone is verondieping zichtbaar. De relatieve volumeverandering van de stortzone (ten opzichte van de referentiepeiling T146) is gestegen en bedraagt 0 % (Figuur 3-1).

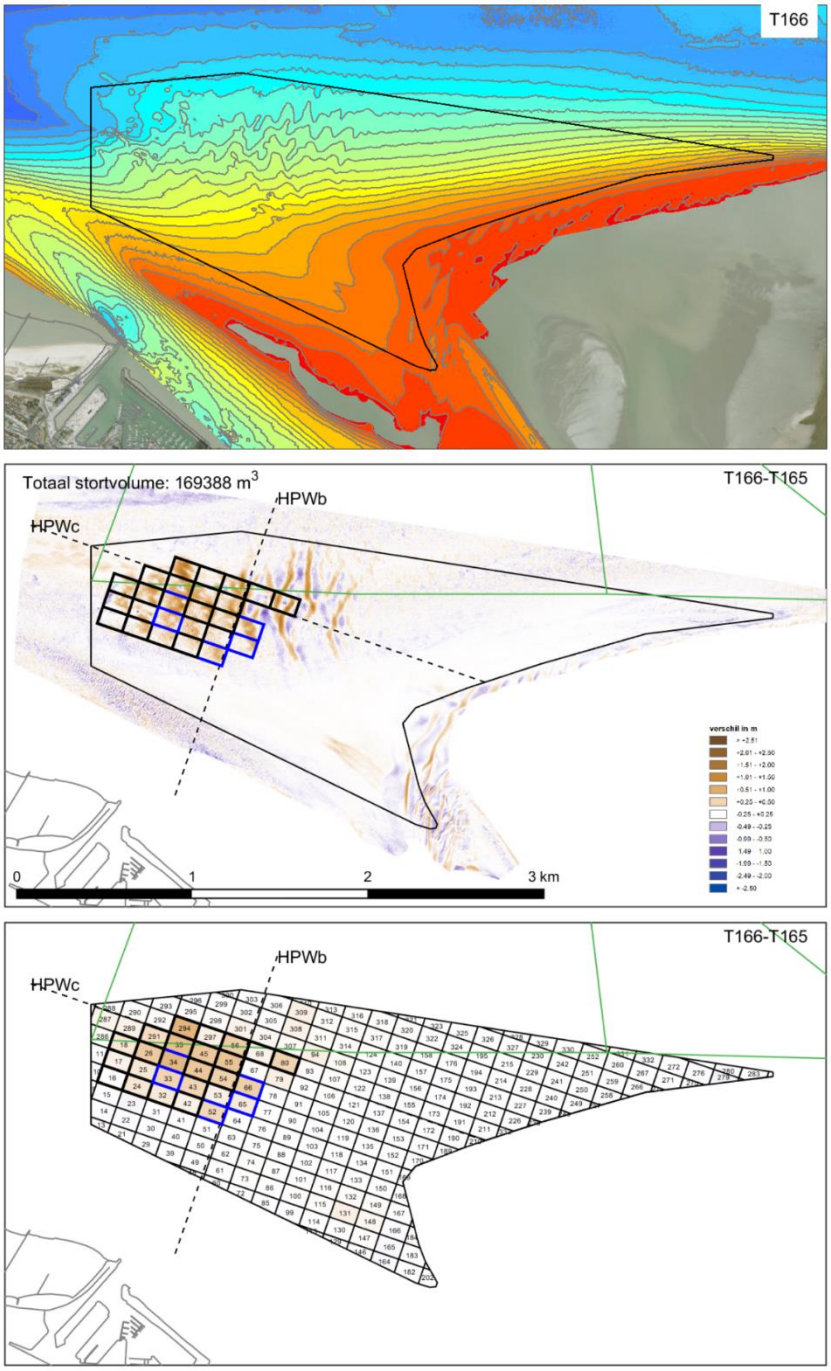

Figuur 3-8: Morfologische veranderingen bij Hooge Platen West tussen T166 en T165. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

Peiling T166 (14/10/2025) is een zogenaamde 'grote peiling', die een groter gebied beslaat en wordt opgenomen tot -1 m NAP. Dit gebied strekt zich uit langs de west- en noordkant van de Hooge Platen en bevat ook het westelijke deel van het Vaarwater langs Hoofdplaat. In Figuur 3-9 worden de bathymetrie en bodemhoogteveranderingen tussen de grote peilingen getoond. Tussen T160 (17/06/2024) en T166 (14/10/2025) is er aanzanding opgetreden aan de noordzijde van de Hooge Platen. Deels door migratie van gestort sediment uit HPW en deels door autonome migratie van de vloedschaar van de Schaar van Spijkerplaat. In de noordelijke punt van SN11 is verondieping opgetreden door

de recente stortingen (zie ook sectie 9.1). Er is ook verondieping zichtbaar in het meest westelijke deel van de peiling, ten westen van stortzone SN11.

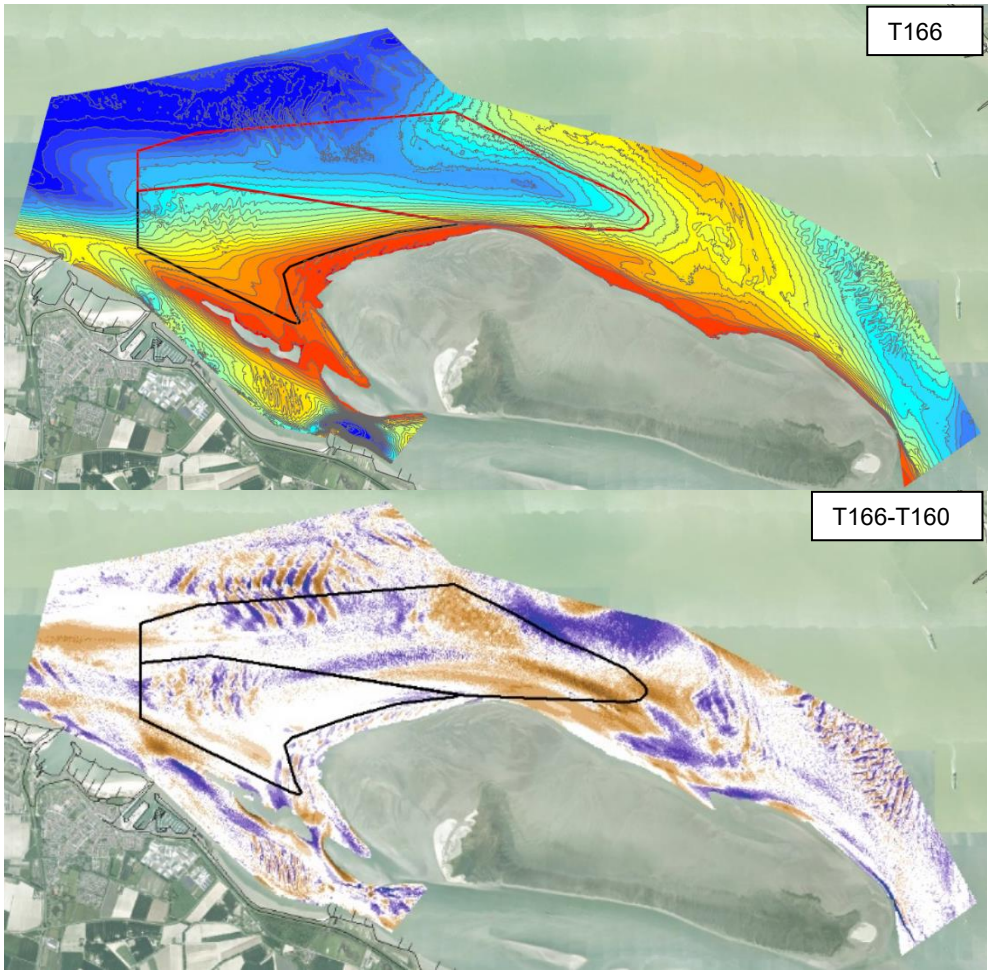

Figuur 3-9: Bathymetrie van grote peiling T166 (boven) en verschilkaart tussen grote peilingen T160 en T166 (onder).

3.2.7 Analyse december

In Tabel 3-7 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode. Er werden in deze periode geen peilingen aangeleverd.


Tabel 3-7: Feitelijke informatie voor HPW in december 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	December: ca. 95 000 m^3	Figuur 3-1
Peilingen	-	-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	-	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	-	-

4 Plaat van Walsoorden (PWA)


4.1 Resultaten lopend vergunningsjaar

De relatieve volumeverandering van de stortzone (in %) wordt geëvalueerd door het (cumulatieve) stortvolume te vergelijken met het gepeilde volume op de bodem ten opzichte van de referentiepeiling (T155, 12/04/2022) (Figuur 4-1).

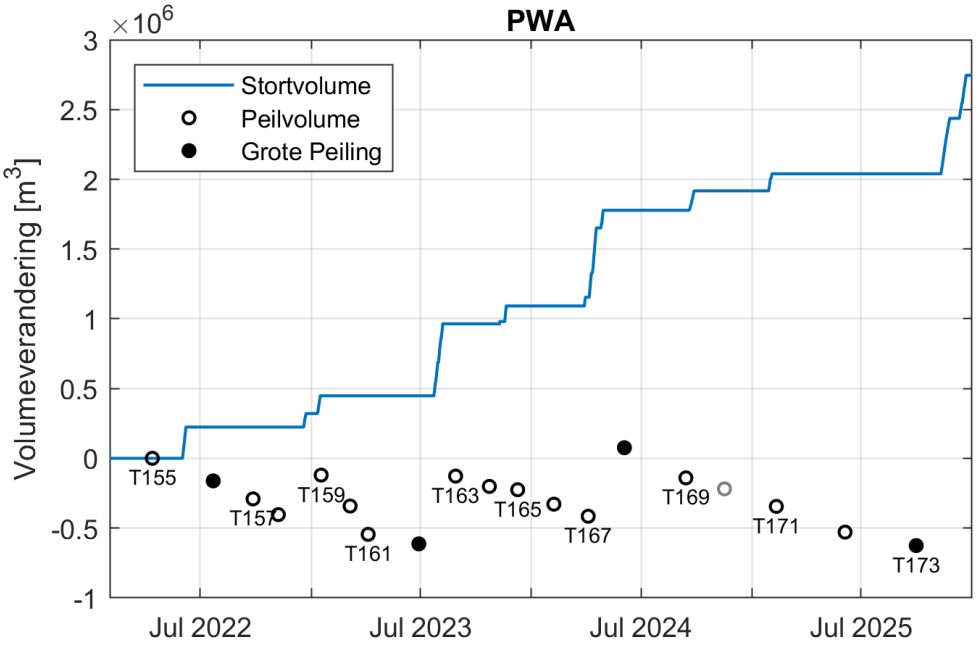

Figuur 4-1 Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen voor de complete stortzone voor Plaat van Walsoorden. De dichte cirkels geven de grote peilingen weer (gemeten tot +1 m NAP), de open cirkels zijn de reguliere peilcampagnes (gemeten tot -2 m NAP). De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking.

Voor stortzone Plaat van Walsoorden wordt de bodemontwikkeling op basis van profielen opgevolgd en voor alle peilingen uit het vergunningsjaar 2025 weergegeven in Figuur 4-2. De referentiepeiling (T155, 12/04/2022) wordt eveneens opgenomen om de bodemontwikkeling op lange termijn op te volgen.

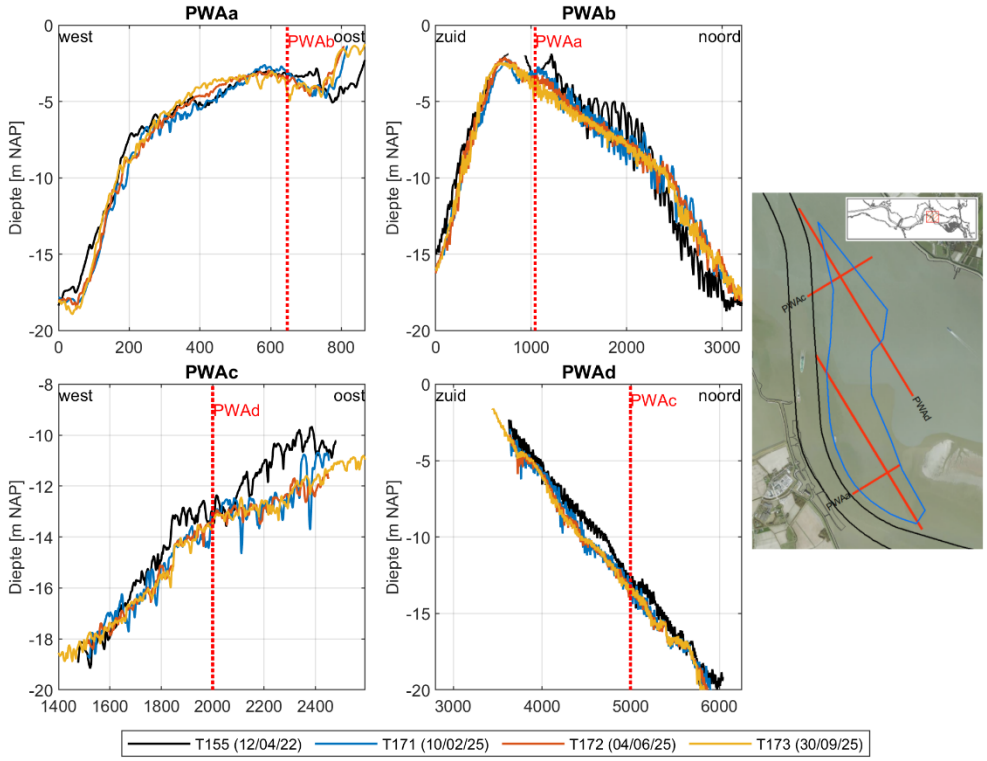

Figuur 4-2: Evolutie van de bathymetrie voor vergunningsjaar 2025 langs doorsnede PWAa, PWAb, PWAc en PWAd bij stortzone Plaat van Walsoorden.

4.2 Resultaten maandrapportages

4.2.1 Analyse januari

In Tabel 4-1 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 4-1: Feitelijke informatie voor PWA in januari 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Januari: ca. 86 000 m³	Figuur 4-1
Peilingen	-	-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	-	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	-	-

Er werden in deze periode geen peilingen aangeleverd.


4.2.2 Analyse februari en maart

In Tabel 4-2 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 4-2: Feitelijke informatie voor PWA in februari en maart 2025. De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking.


Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Februari: ca. 37 000 m³ Maart: geen stortingen	Figuur 4-1
Peilingen	T171 (10/02/2025)	Figuur 4-4; Bijlage A.2
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T171-T155 (10/02/2025 – 12/04/2022): -17%	Figuur 4-1
Profielen	Langs doorsnedes PWAa, PWAb, PWAc en PWAd	Figuur 4-2; Figuur 4-3
Verschilkaarten	T171 – 155 (10/02/2025 – 12/04/2022) T171 – 170 (10/02/2025 – 16/11/2024): • Stortvolume: ca. 123 000 m³ • Peilvolume: ca. -106 000 m³	Figuur 4-4; Bijlage A.2

Voor deze periode worden de aangeleverde profielen getoond in Figuur 4-3. Om de bodemontwikkeling in een breder historisch kader te plaatsen wordt de nieuwe peiling vergeleken met de voorgaande peiling, de referentiepeiling (T155), alsook met de voorgaande referentiepeilingen T0 en T100.

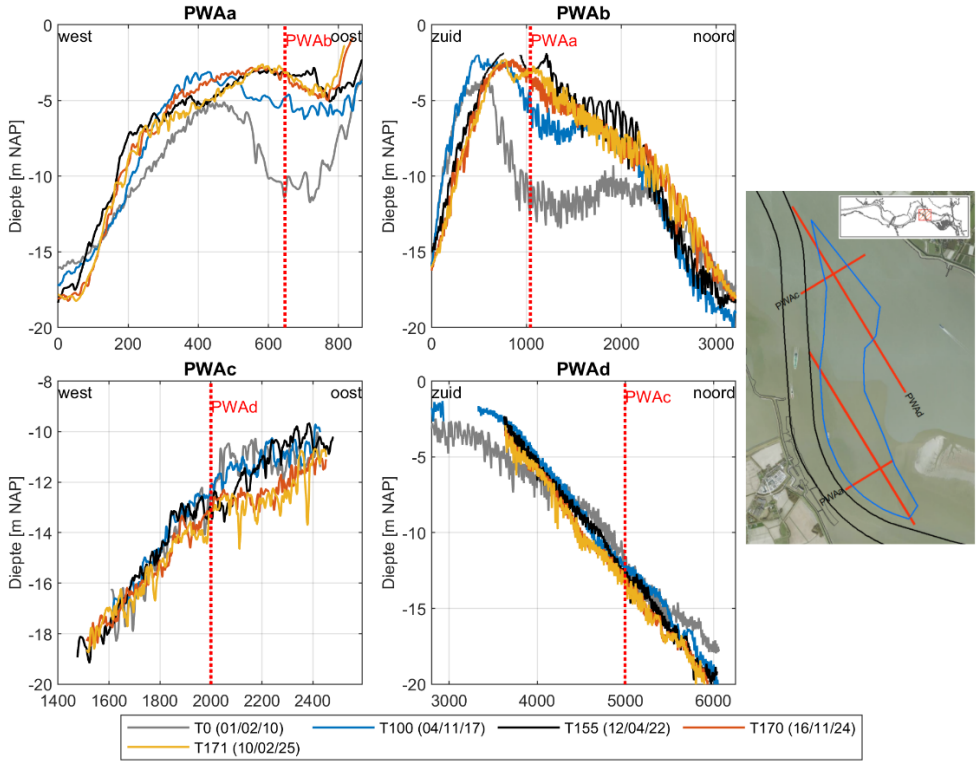

Figuur 4-3: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes PWAa, PWAb, PWAc en PWAd bij stortzone Plaat van Walsoorden sinds 2010.

In de stortzone **Plaat van Walsoorden** is er in de periode T170-T171 ter hoogte van de gebruikte stortvakken hoofdzakelijk verdieping zichtbaar (Figuur 4-4). In de hele stortzone zijn migrerende bodemvormen zichtbaar. De noordelijke punt van de stortzone lijkt langzaam te verdiepen. Ter hoogte van de zuidwestelijke zandtong is aanzanding zichtbaar aan de noordzijde en erosie aan de zuidzijde. Tijdens de vorige twee peilintervallen was het omgekeerde patroon daar zichtbaar (IMDC, 2025a). Algemeen kan vastgesteld worden dat de zandtong ondieper wordt en verder richting de vaargeul migreert, meer bepaald tot in het fietspad. Aangezien er langs de plaatrand een dominant vloed-gedreven sedimenttransport aanwezig is, kan verwacht worden dat de zandrug wordt gevoed met het gestorte zand in de plaatrand zone. Echter, ook langs de zuidrand van de Plaat van Walsoorden treden veranderingen op, gedreven door een dominant eb-gericht sedimenttransport. Beide bewegingen convergeren op de zandrug, die hierdoor richting de vaargeul uitbouwt. Eventueel kan onderzocht worden of meer noordelijk gelegen stortvakken gebruikt kunnen worden om de uitbouw van de zandrug te verminderen.

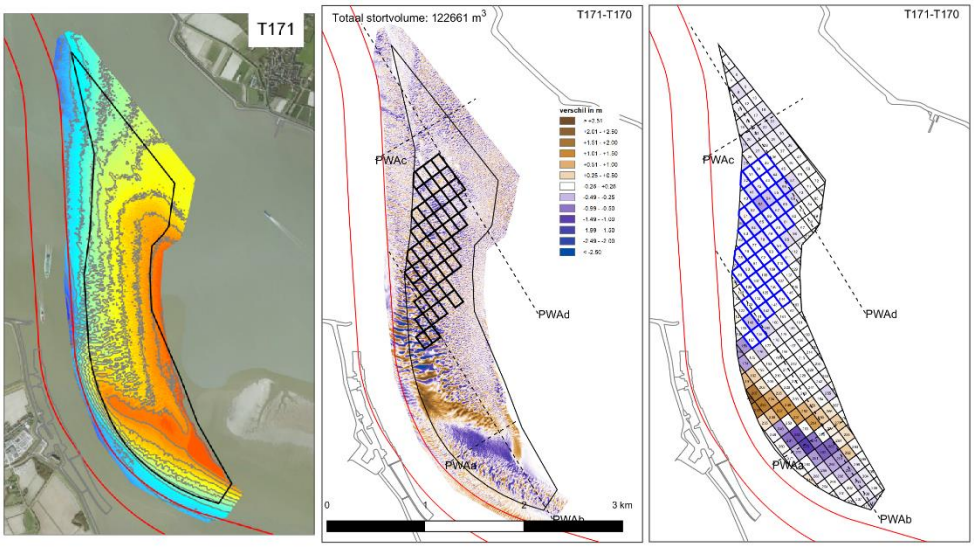

Figuur 4-4: Morfologische veranderingen bij plaatrandstortzone Plaat van Walsoorden tussen T170 en T171. In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

4.2.3 Analyse april en mei

In Tabel 4-3 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode. Er werden in deze periode geen peilingen aangeleverd.

Tabel 4-3: Feitelijke informatie voor PWA in april en mei 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	April: geen stortingen Mei: geen stortingen	Figuur 4-1
Peilingen	-	-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	-	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	-	-


4.2.4 Analyse juni en juli

In Tabel 4-4 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 4-4: Feitelijke informatie voor PWA in juni en juli 2025.


Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Juni: geen stortingen Juli: geen stortingen	Figuur 4-1
Peilingen	T172 (04/06/2025)	Figuur 4-6; Bijlage A.4
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T172-T155 (04/06/2025– 12/04/2022): -26%	Figuur 4-1
Profielen	Langs doorsnedes PWAa, PWAb, PWAc en PWAd	Figuur 4-2; Figuur 4-5
Verschilkaarten	T172 – 155 (04/06/2025– 12/04/2022) T172 – 171 (04/06/2025– 10/02/2025): • Stortvolume: geen stortingen • Peilvolume: ca. -177 000 m³	Figuur 4-6; Bijlage A.4

Voor deze periode worden de aangeleverde profielen getoond in Figuur 4-5. Om de bodemontwikkeling in een breder historisch kader te plaatsen wordt de nieuwe peiling vergeleken met de voorgaande peiling, de referentiepeiling (T155), alsook met de voorgaande referentiepeilingen T0 en T100.

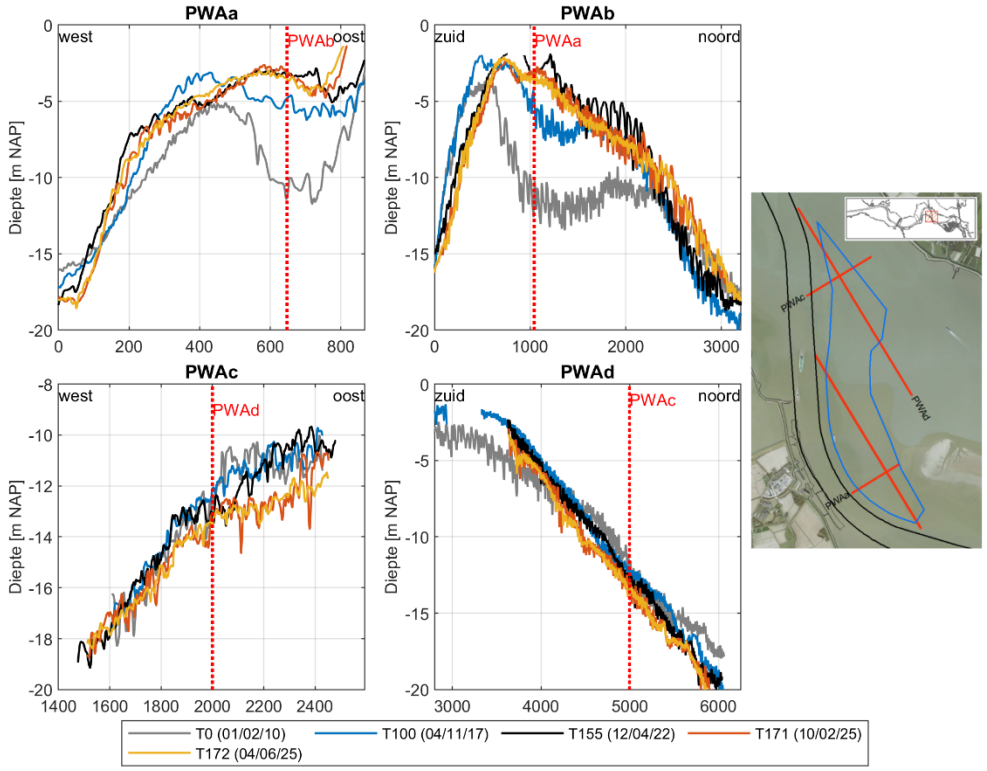

Figuur 4-5: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes PWAa, PWAb, PWAc en PWAd bij stortzone Plaat van Walsoorden sinds 2010.

In de stortzone **Plaat van Walsoorden** is er in de periode T171-T172 niet gestort. Er is met name verdieping zichtbaar in het midden en noorden van de stortzone (Figuur 4-6). Bovendien zijn er in de gehele stortzone migrerende bodemvormen zichtbaar. De noordelijke punt van de stortzone lijkt langzaam te verdiepen. Ter hoogte van de zuidwestelijke zandtong is aanzanding zichtbaar aan de zuidzijde en erosie aan de noordzijde. Tijdens het vorige peilinterval was het omgekeerde patroon daar zichtbaar (sectie 4.2.4). Algemeen kan vastgesteld worden dat de zandtong ondieper wordt en verder richting de vaargeul migreert, meer bepaald tot in het fietspad. Aangezien er langs de plaatrand een dominant vloed-gedreven sedimenttransport aanwezig is, kan verwacht worden dat de zandrug wordt gevoed met het (in vorige perioden) gestorte zand in de plaatrand zone. Echter, ook langs de zuidrand van de Plaat van Walsoorden treden veranderingen op, gedreven door een dominant eb-gericht sedimenttransport. Beide bewegingen convergeren op de zandrug, die hierdoor richting de vaargeul uitbouwt (IMDC, 2025b).

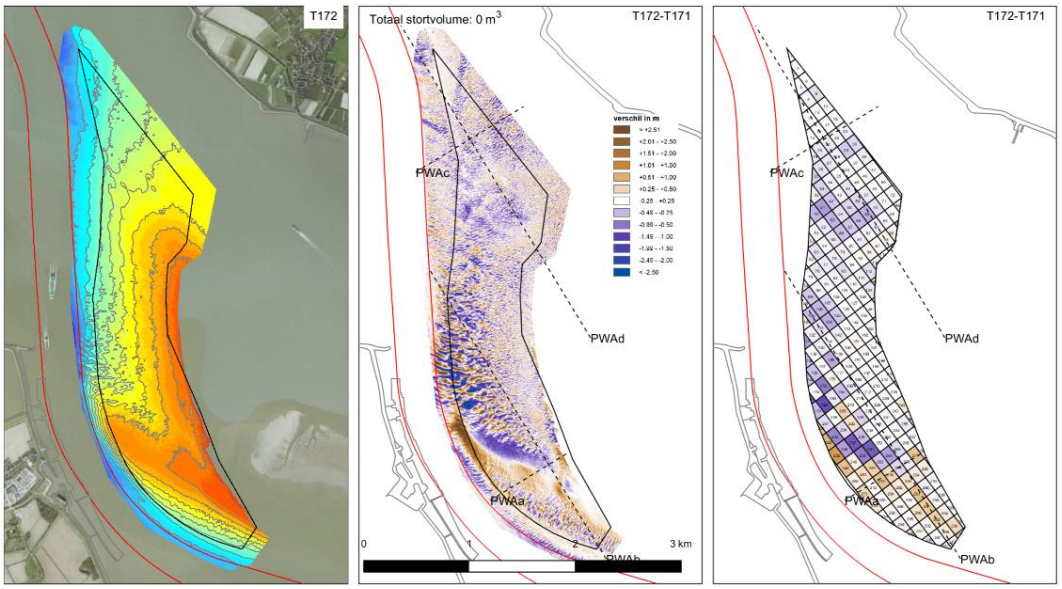

Figuur 4-6: Morfologische veranderingen bij plaatrandstortzone Plaat van Walsoorden tussen T171 en T172. In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

4.2.5 Analyse augustus en september

In Tabel 4-5 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 4-5: Feitelijke informatie voor PWA in augustus en september 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Augustus: geen stortingen September: geen stortingen	Figuur 4-1
Peilingen	-	-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	-	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	-	-

Er werden in deze periode geen peilingen aangeleverd.


4.2.6 Analyse oktober en november

In Tabel 4-6 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 4-6: Feitelijke informatie voor PWA in oktober en november 2025.


Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Oktober: geen stortingen November: ca. 397 000 m³	Figuur 4-1
Peilingen	T173 (30/09/2025)	Figuur 4-8; Bijlage A.6
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T173-T155 (30/09/2025– 12/04/2022): -31%	Figuur 4-1
Profielen	Langs doorsnedes PWAa, PWAb, PWAc en PWAd	Figuur 4-2; Figuur 4-7
Verschilkaarten	T173 – 155 (30/09/2025– 12/04/2022) T173 – 172 (30/09/2025– 04/06/2025): • Stortvolume: geen stortingen • Peilvolume: ca. -141 000 m³ T173 – 168 (30/09/2025– 03/06/2024) • Stortvolume: ca. 262 000 m³ • Peilvolume: c a. -688 000 m³	Figuur 4-8; Bijlage A.6; Figuur 4-9

Voor deze periode worden de aangeleverde profielen getoond in Figuur 4-7. Om de bodemontwikkeling in een breder historisch kader te plaatsen wordt de nieuwe peiling vergeleken met de voorgaande peiling, de referentiepeiling (T155), alsook met de voorgaande referentiepeilingen T0 en T100.

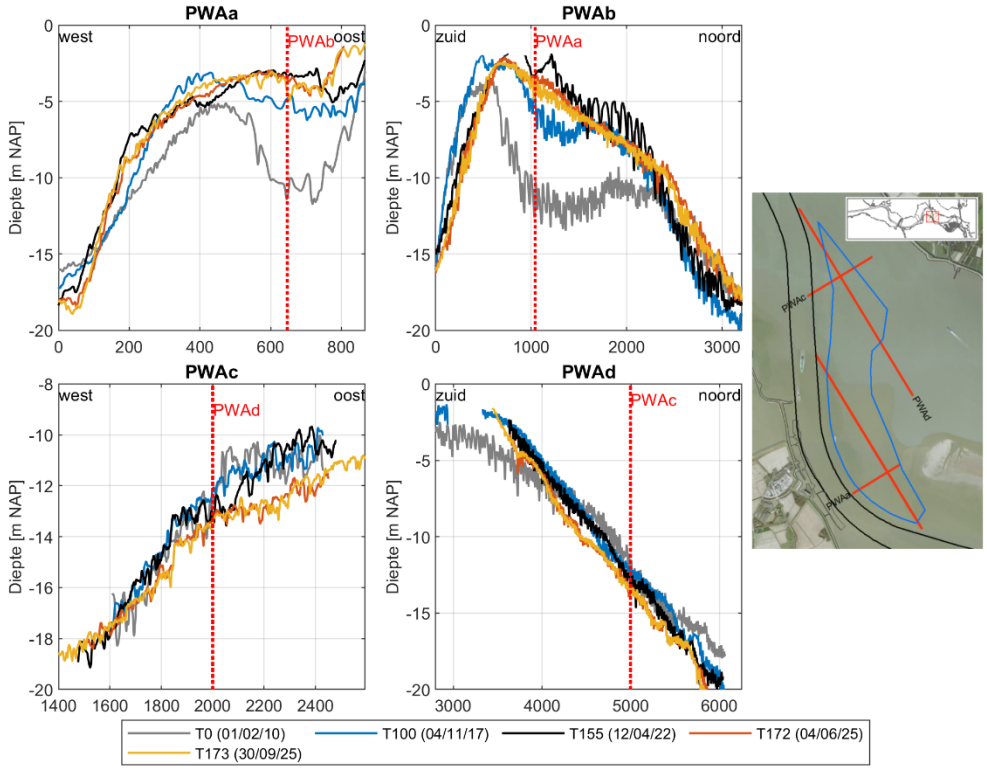

Figuur 4-7: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes PWAa, PWAb, PWAc en PWAd bij stortzone Plaat van Walsoorden sinds 2010.


In de stortzone **Plaat van Walsoorden** is er in de periode T172-T173 niet gestort. Er is met name verdieping zichtbaar in het centraal-westelijke deel van de stortzone (Figuur 4-8). Bovendien zijn er in de gehele stortzone (met name het westelijke deel) migrerende bodemvormen zichtbaar. De verdieping van de noordelijke punt van de stortzone die eerder werd waargenomen, lijkt nu af te nemen. Ter hoogte van de zuidwestelijke zandtong is aanzanding zichtbaar aan de zuidzijde en erosie aan de noordzijde. Tijdens het vorige peilinterval was dit patroon eveneens zichtbaar. Zie sectie 4.2.5 en (IMDC, 2025b) voor meer duiding rond het gedrag van de zandtong.

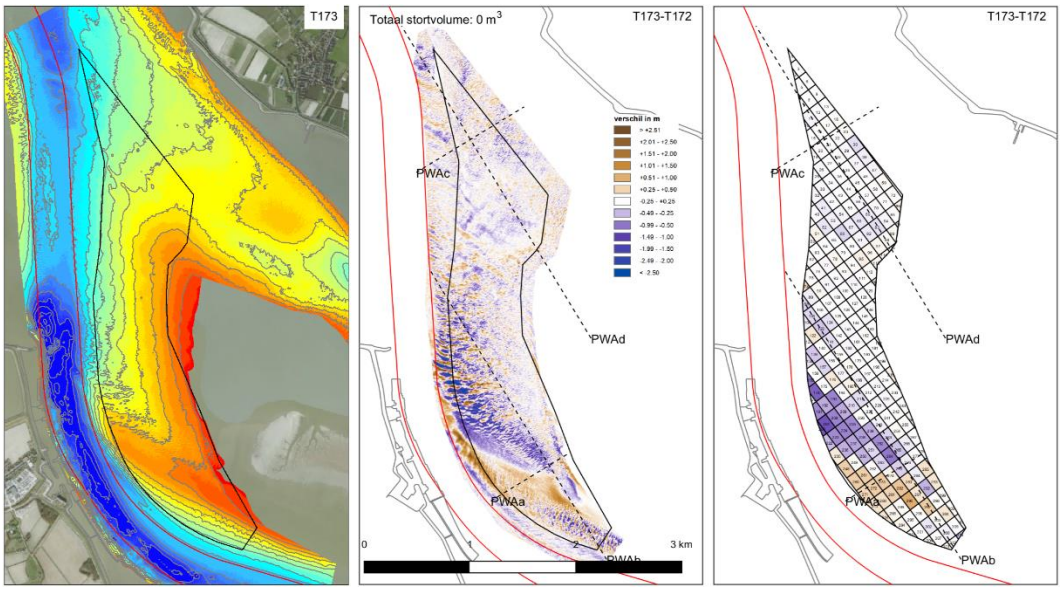

Figuur 4-8: Morfologische veranderingen bij plaatrandstortzone Plaat van Walsoorden tussen T172 en T173. In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

Peiling T173 (30/09/2025) is een zogenaamde 'grote peiling' die een groter gebied beslaat en wordt opgenomen tot -1 m NAP. Dit gebied strekt zich uit langs de west en noordoostkant van de Plaat van Walsoorden en bevat ook het Zuidergat, Overloop van Valkenisse (westelijk deel) en de Schaar van Waarde. In Figuur 4-9 worden de bathymetrie en bodemhoogteveranderingen tussen de grote peilingen getoond. Tussen T173 (03/06/2024) en T168 (30/09/2025) is de plaatrandstortzone PWA hoofdzakelijk verdiept, met uitzondering van de zuidwestelijke plaatpunt. Er was in de periode voor T173 al enkele maanden niet meer gestort in PWA, terwijl er in de periode voor T168 juist veel was gestort (Figuur 4-1 en Tabel 4-6). Uitbreiding van de plaatpunt richting de vaargeul en het 'fietspad' heeft al geleid tot baggeren aan de rand van de vaargeul.

Ook de inloop van de Schaar van Waarde (noordelijk deel PWA en SN51) is enigszins verdiept. Verder opwaarts in de Schaar van Waarde (zuidelijk deel SN51) is er juist verondieping. Ook bouwt de Plaat van Walsoorden daar verder uit richting de Schaar van Valkenisse. In het zuidelijke deel van stortzone SH51 is verondieping opgetreden door de stortingen, die zich ook opwaarts uitstrekt. In het noordelijke deel van SH51 wordt minder intensief gestort, waardoor er daar verdieping is opgetreden (zie in meer detail in secties 9.4 en 9.5).

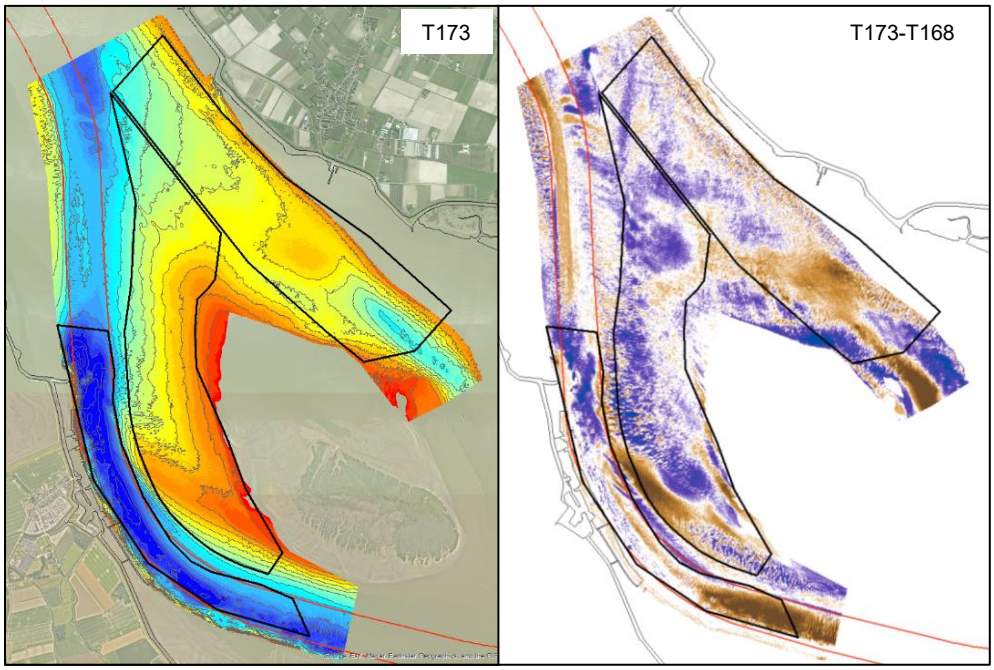

Figuur 4-9: Bathymetrie van grote peiling T173 in de omgeving van de Plaat van Walsoorden (links) en bodemhoogteverschil tussen T168 en T173 (rechts).

4.2.7 Analyse december

In Tabel 4-7 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 4-7: Feitelijke informatie voor PWA in december 2025.


Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	December: ca. 308 000 m³	Figuur 4-1
Peilingen	-	-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	-	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	-	-

Er werden in deze periode geen peilingen aangeleverd.

5 SH31


5.1 Resultaten lopend vergunningsjaar

De relatieve volumeverandering van de stortzone (in %) wordt geëvalueerd door het (cumulatieve) stortvolume te vergelijken met het gepeilde volume op de bodem ten opzichte van de referentiepeiling (T62, 26/04/2022) (Figuur 5-1). De stortingen in het kader van het project Nieuwe Sluis Terneuzen (door consortium Sassevaart (SSV)) zijn beëindigd, de laatste stortingen dateren van juli 2024.

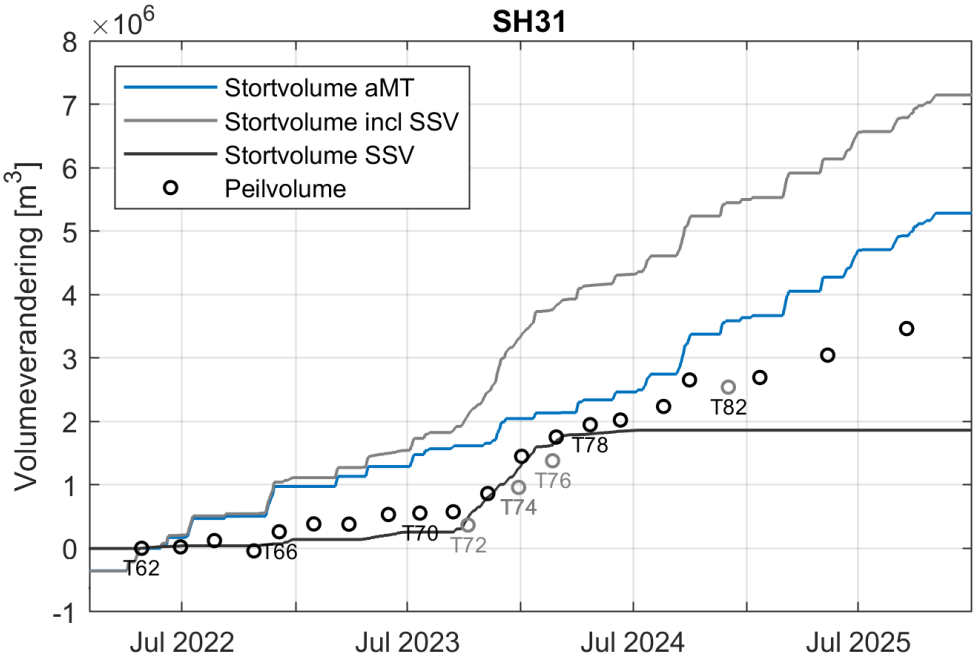


Figuur 5-1: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen voor de complete stortzone voor SH31. Merk op dat de peilingen aangeleverd door Sassevaart in het kader van het project NST (grijze cirkels) een verticale afwijking vertonen. De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking.

In Figuur 5-2 wordt de relatieve volumeverandering voor verschillende delen van de stortzone weergegeven. Specifiek werden de stortvakken verdeeld in een noordelijke en een zuidelijke helft.

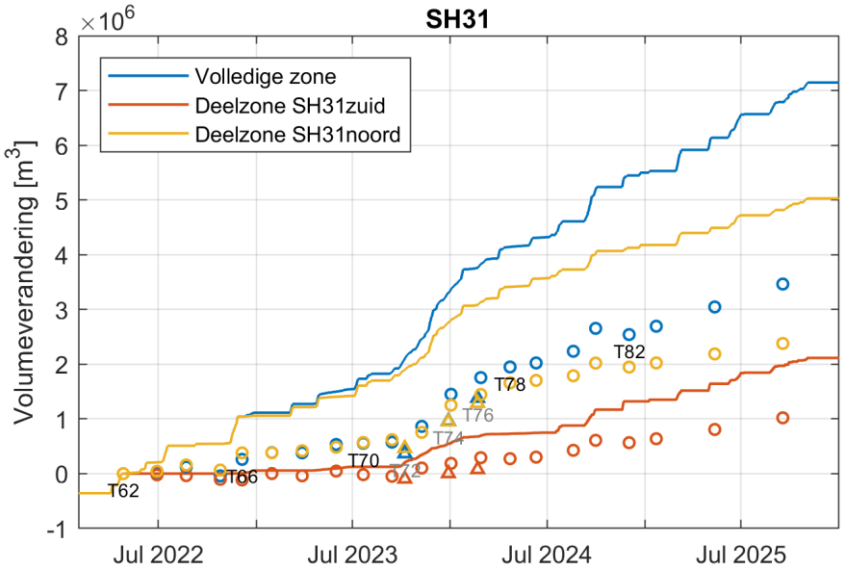

Figuur 5-2: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen voor de deelzones van SH31 inclusief de stortingen uitgevoerd door Sassevaart (SSV) in het kader van het project NST. De peilingen worden weergegeven als cirkels (genomen door aMT) en driehoeken (aangeleverd door Sassevaart in het kader van het project NST). Merk op dat die laatste een verticale afwijking vertonen.

Voor SH31 wordt de bodemontwikkeling op basis van profielen opgevolgd en voor het volledig vergunningsjaar 2025 weergegeven in Figuur 5-3. De referentiepeiling (T62, 26/04/2022) wordt eveneens opgenomen om de bodemontwikkeling op lange termijn op te volgen.

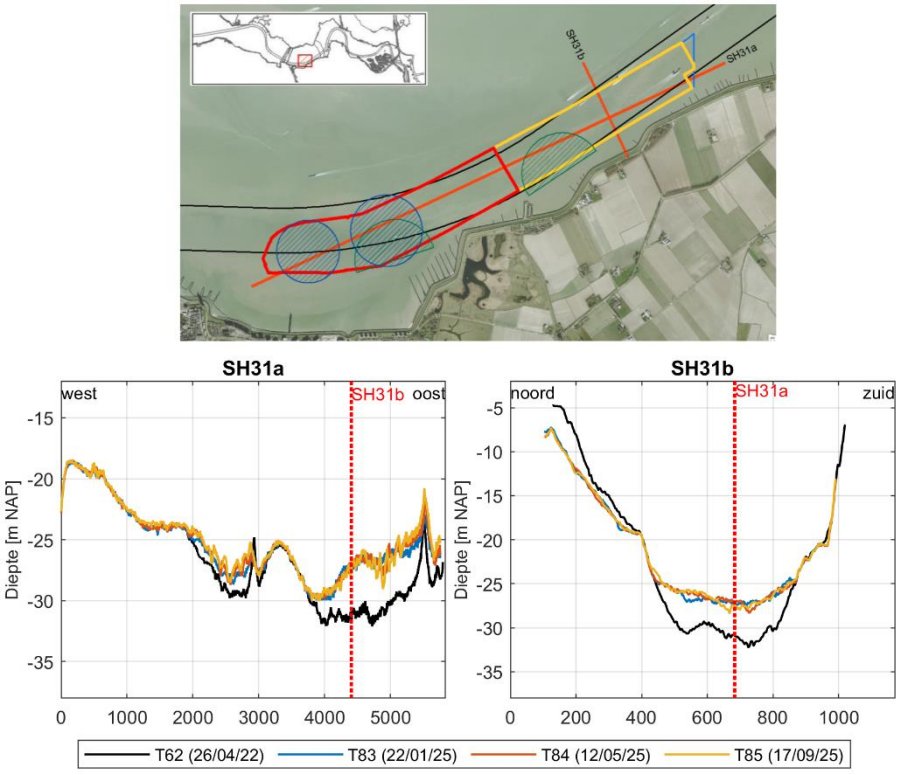

Figuur 5-3: Evolutie van de bathymetrie voor vergunningsjaar 2025 langs doorsnede SH31a en SH31b bij stortzone SH31. De overzichtskaart toont deelzone SH31-zuid (oranje), SH31-noord (geel), de volledige zone (blauw) en de ankergebieden (noodanker (groen) en anker (blauw)).

5.2 Resultaten maandrapportages


5.2.1 Analyse januari

In Tabel 5-1 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 5-1: Feitelijke informatie voor SH31 in januari 2025. De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking.


Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Januari: ca. 31 000 m³	Figuur 5-1
Peilingen	T83 (22/01/2025)	Figuur 5-5; Bijlage A.1
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T83 (22/01/2025) – T62 (26/04/2022): 49%	Figuur 5-1; Figuur 5-2
Profielen	Langs doorsnedes SH31a en SH31b	Figuur 5-3; Figuur 5-4
Verschilkaarten	T83 – 62 (22/01/2025 – 26/04/2022) T83 – 82 (22/01/2025 – 02/12/2024): • Stortvolume: ca. 82 000 m³ • Peilvolume: ca. 153 000 m³	Figuur 5-5; Bijlage A.1

Voor deze periode worden de aangeleverde profielen getoond in Figuur 5-4. Om de bodemontwikkeling in een breder historisch kader te plaatsen wordt de nieuwe peiling vergeleken met de voorafgaande peiling, de referentiepeiling (T62), alsook met de voorgaande referentiepeilingen T0 en T43.

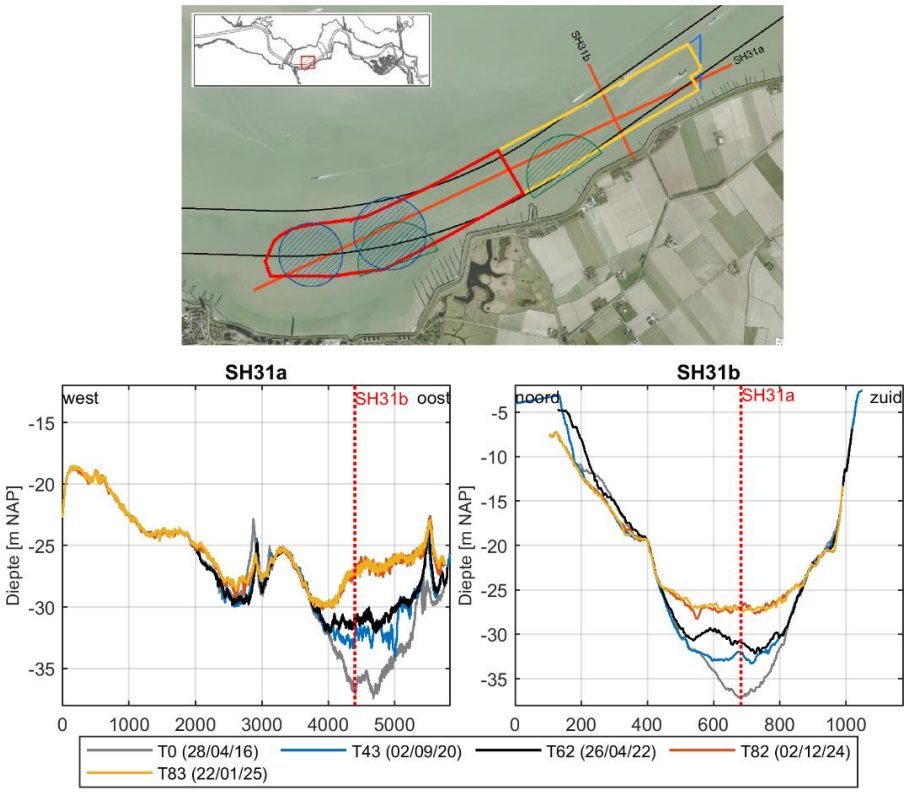

Figuur 5-4: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes SH31a en SH31b bij stortzone SH31 sinds 2016.

In de periode T83-T82 is er in **SH31** in zowel het noorden als centraal in de stortzone ca. 82 000 m³ gestort. Ter hoogte van de gebruikte stortvakken is duidelijke verondieping zichtbaar (Figuur 5-5). Ook ten westen van de centrale stortvakken is lichte verondieping zichtbaar. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat deze verondieping waarschijnlijk een overschatting is o.w.v. de afwijkende peiling T82 (Figuur 5-1).

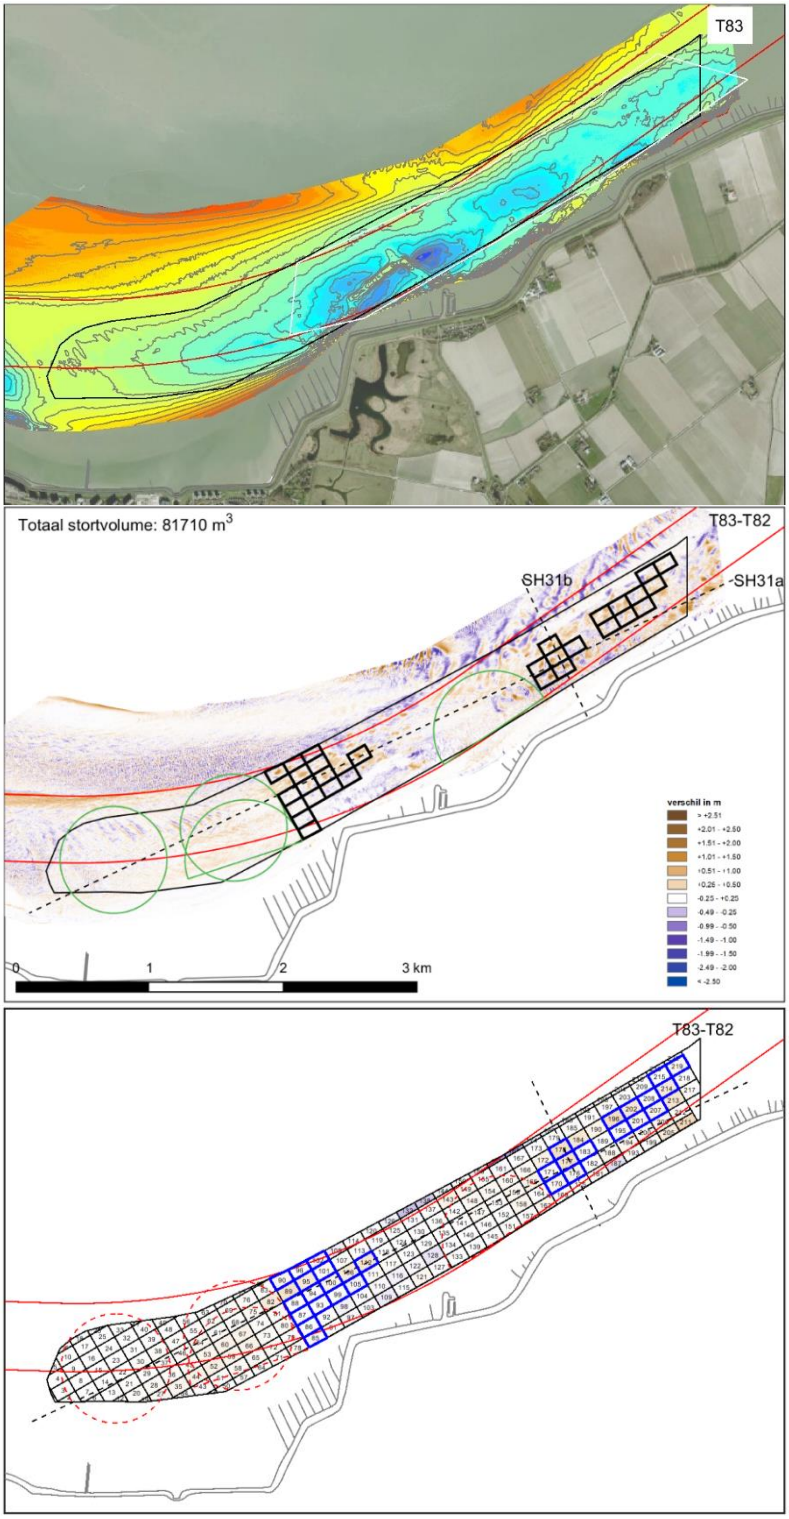

Figuur 5-5: Morfologische veranderingen bij SH31 tussen T83 en T82. In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

5.2.2 Analyse februari en maart

In Tabel 5-2 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 5-2: Feitelijke informatie voor SH31 in februari en maart 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Februari: ca. 8 000 m³ Maart: ca. 378 000 m³	Figuur 5-1
Peilingen	-	-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	-	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	-	-

Er werden in deze periode geen peilingen aangeleverd.


5.2.3 Analyse april en mei

In Tabel 5-3 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 5-3: Feitelijke informatie voor SH31 in april en mei 2025.


Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	April: ca. 36 000 m³ Mei: ca. 186 000 m³	Figuur 5-1
Peilingen	T84 (12/05/2025)	Figuur 5-7; Bijlage A.3
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T84 (12/05/2025) – T62 (26/04/2022): 50%	Figuur 5-1; Figuur 5-2
Profielen	Langs doorsnedes SH31a en SH31b	Figuur 5-3; Figuur 5-6
Verschilkaarten	T84 – 62 (12/05/2025 – 26/04/2022) T84 – 83 (12/05/2025 – 22/01/2025): • Stortvolume: ca. 607 000 m³ • Peilvolume: ca. 352 000 m³	Figuur 5-7; Bijlage A.3

Voor deze periode worden de aangeleverde profielen getoond in Figuur 5-4. Om de bodemontwikkeling in een breder historisch kader te plaatsen wordt de nieuwe peiling vergeleken met de voorafgaande peiling, de referentiepeiling (T62), alsook met de voorgaande referentiepeilingen T0 en T43.

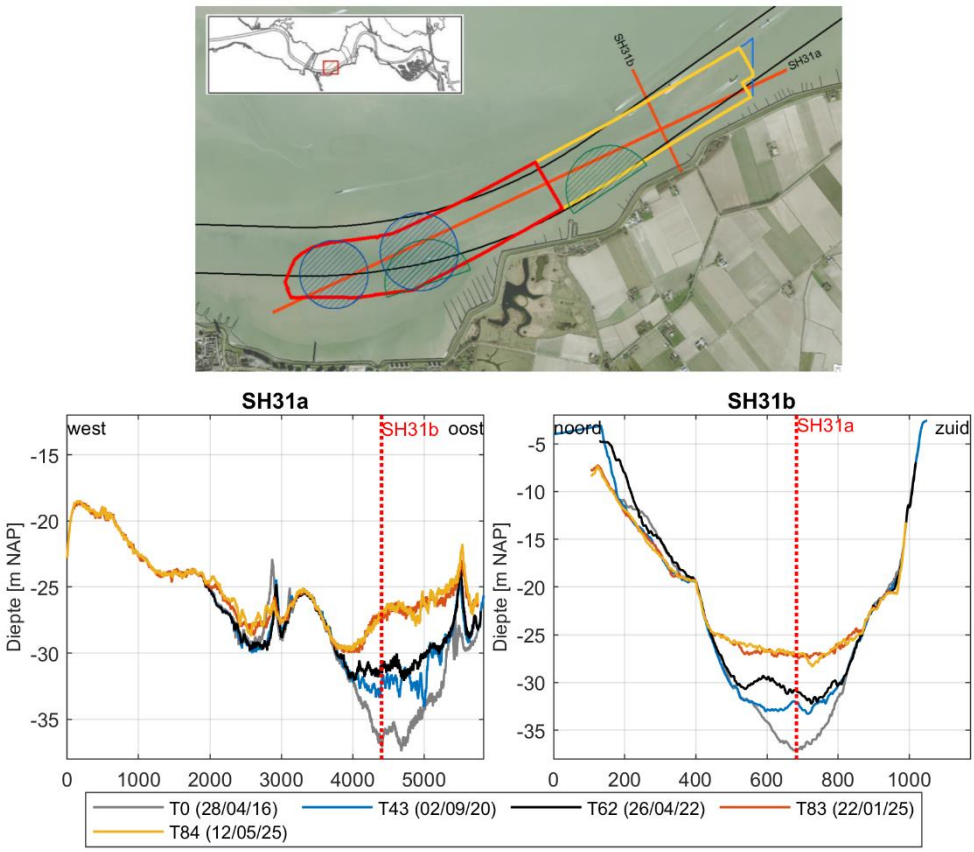

Figuur 5-6: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes SH31a en SH31b bij stortzone SH31 sinds 2016.

In de stortzone **SH31** is er in de periode T84-T83 een groot volume sediment (ca. 607 000 m³) gestort. Ter hoogte van de gebruikte stortvakken is dit duidelijk zichtbaar als sterke verondieping (Figuur 5-7). Ten noordoosten van de noordelijk gebruikte stortvakken is eveneens duidelijke verondieping zichtbaar. Het sediment gestort in de noordelijke stortvakken lijkt zich dan ook stroomopwaarts buiten de stortzone te verplaatsen (Figuur 5-7). Er dient hier wel bij opgemerkt te worden dat de verondieping ten noordoosten van de noordelijk gebruikte stortvakken ook deels verklaard kunnen worden door de stortingen in SH41 (zie sectie 9.3).

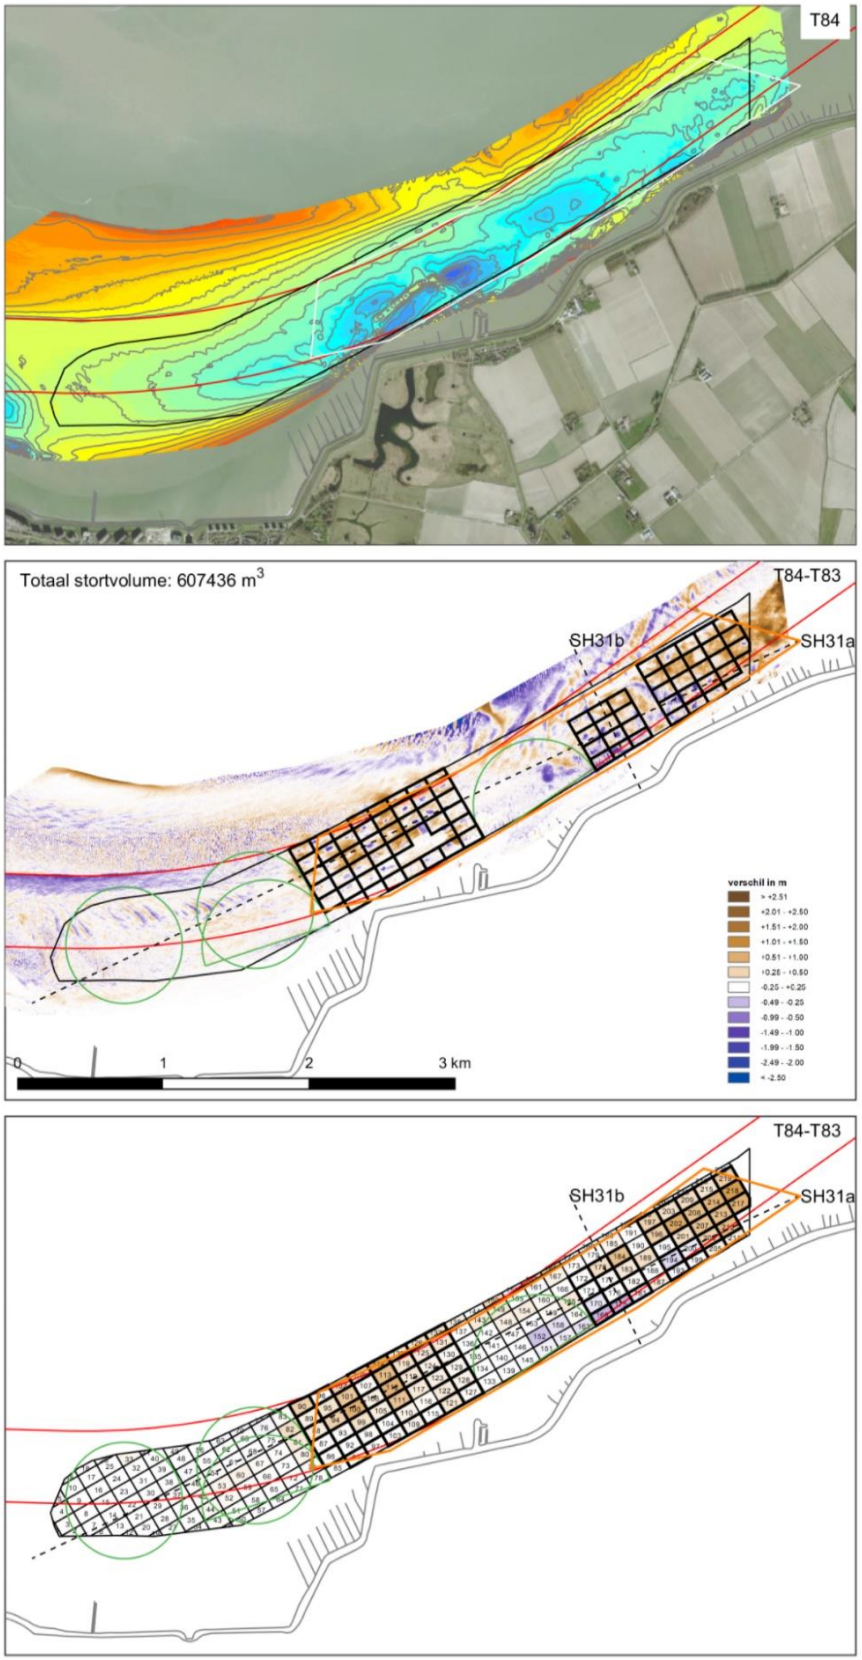

Figuur 5-7: Morfologische veranderingen bij SH31 tussen T84 en T83. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

5.2.4 Analyse juni en juli

In Tabel 5-4 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 5-4: Feitelijke informatie voor SH31 in juni en juli 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Juni: ca. 423 000 m³ Juli: ca. 8 000 m³	Figuur 5-1
Peilingen	-	-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	-	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	-	-

Er werden in deze periode geen peilingen aangeleverd.


5.2.5 Analyse augustus en september

In Tabel 5-5 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 5-5: Feitelijke informatie voor SH31 in augustus en september 2025.


Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Augustus: ca. 159 000 m³ September: ca. 208 000 m³	Figuur 5-1
Peilingen	T85 (17/09/2025)	Figuur 5-9; Bijlage A.5
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T85 (17/09/2025) – T62 (26/04/2022): 51%	Figuur 5-1; Figuur 5-2
Profielen	Langs doorsnedes SH31a en SH31b	Figuur 5-3; Figuur 5-8
Verschilkaarten	T85 – 62 (17/09/2025 – 26/04/2022) T85 – 84 (17/09/2025 – 12/05/2025): • Stortvolume: ca. 652 000 m³ • Peilvolume: ca. 419 000 m³	Figuur 5-9; Bijlage A.5

Voor deze periode worden de aangeleverde profielen getoond in Figuur 5-8. Om de bodemontwikkeling in een breder historisch kader te plaatsen wordt de nieuwe peiling vergeleken met de voorafgaande peiling, de referentiepeiling (T62), alsook met de voorgaande referentiepeilingen T0 en T43.

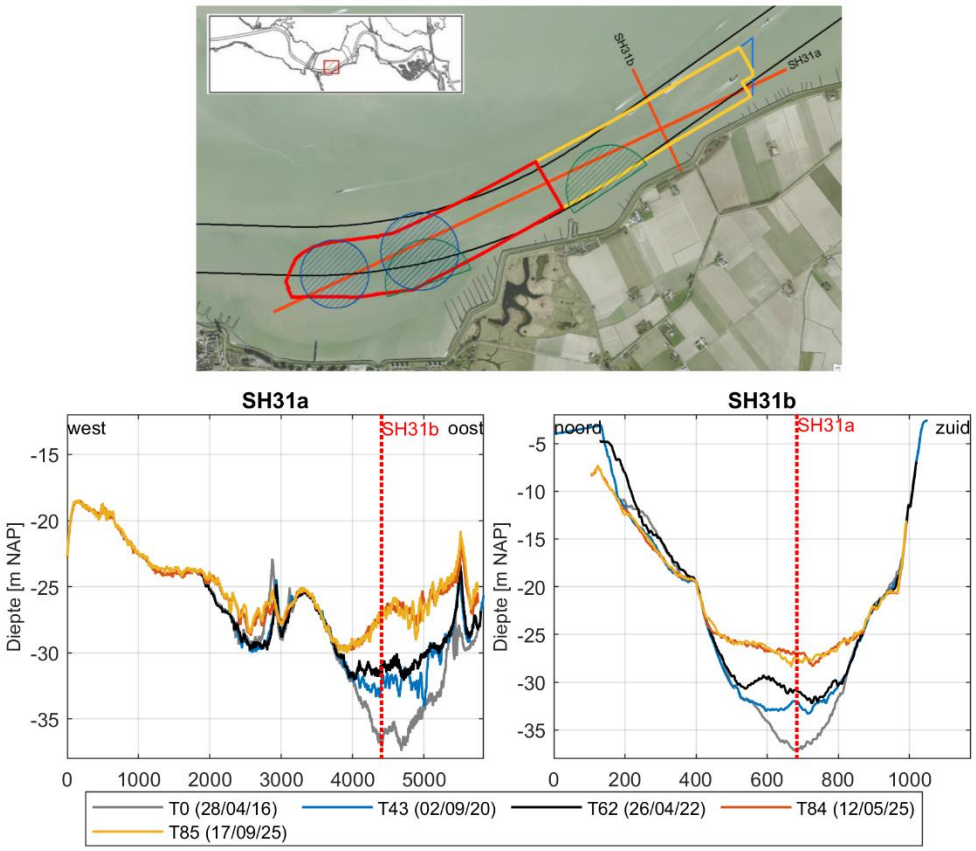

Figuur 5-8: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes SH31a en SH31b bij stortzone SH31 sinds 2016.

In de stortzone **SH31** is er in de periode T85-T84 een groot volume sediment (ca. 652 000 m³) gestort. Ter hoogte van de gebruikte stortvakken aan de binnenbocht is dit duidelijk zichtbaar als sterke verondieping (Figuur 5-9). Bij de stortvakken in de buitenbocht is eerder verdieping zichtbaar ten opzichte van de voorgaande peiling, ondanks de stortingen in deze zone. Langs de volledige noordelijke rand van de stortzone is eveneens duidelijke verondieping zichtbaar. Het gestorte sediment lijkt zich dus voornamelijk langsheen de noordelijke rand van de vaargeul, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts (deels) buiten de stortzone te verplaatsen (Figuur 5-9). Er dient hier wel bij opgemerkt te worden dat de verondieping, voornamelijk in het noordoostelijke deel van de zone, ook verklaard kunnen worden door de (afwaartse verplaatsing van) stortingen in SH41 (zie sectie 9.3). Daarnaast is hier in de binnenbocht van de vaargeul ook sprake van invloed van de morfologische ontwikkeling van het drempelgebied vanuit de nevengeul.

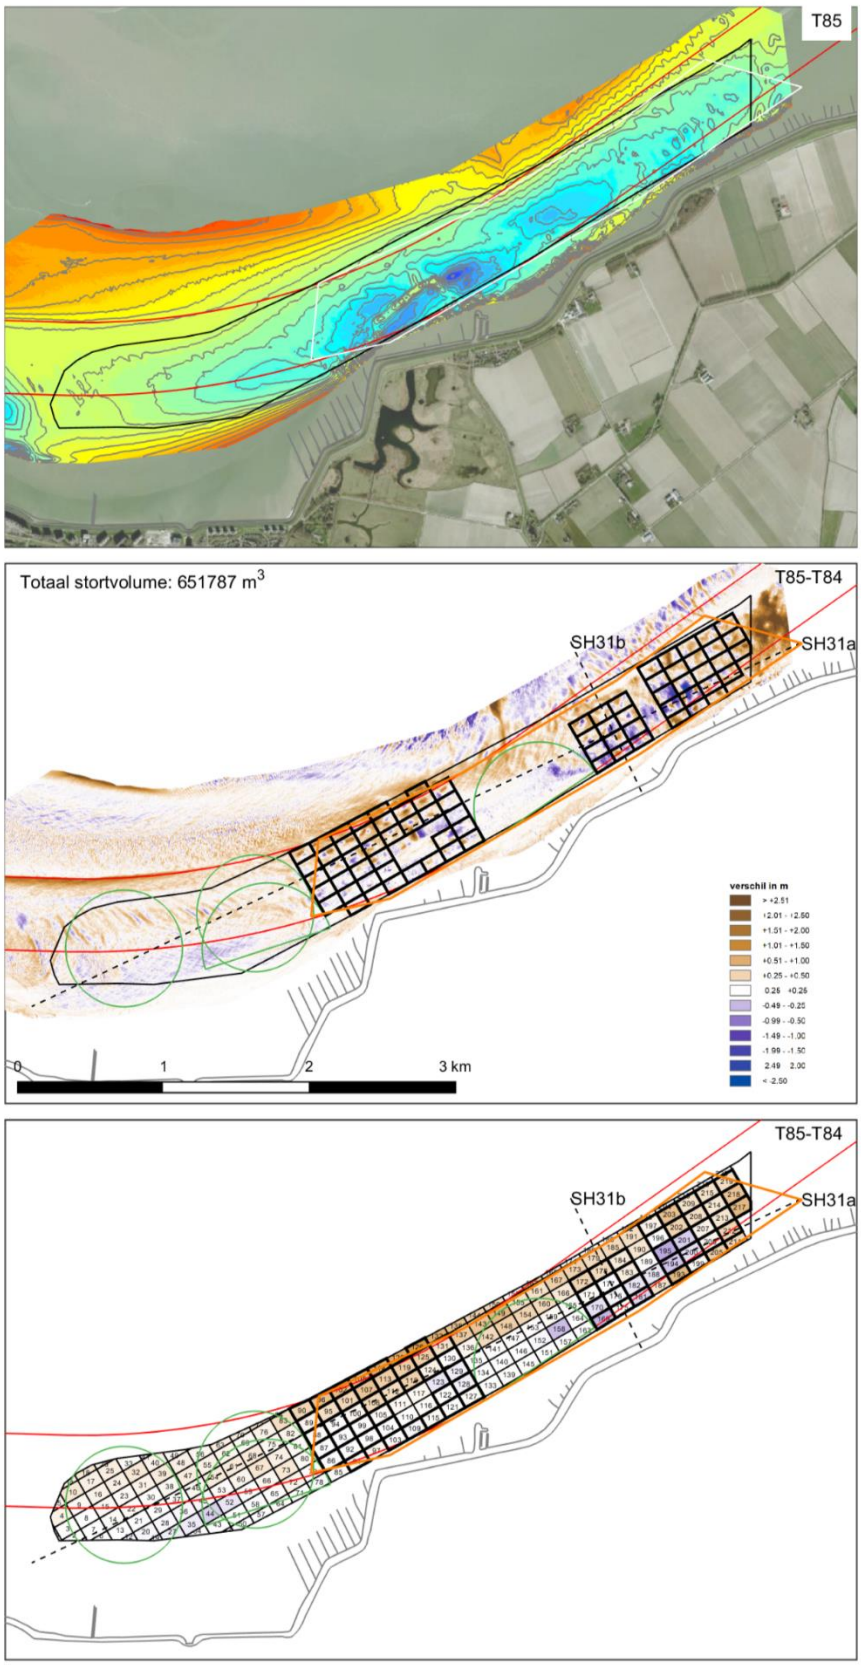

Figuur 5-9: Morfologische veranderingen bij SH31 tussen T85 en T84. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

5.2.6 Analyse oktober en november

In Tabel 5-6 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 5-6: Feitelijke informatie voor SH31 in oktober en november 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Oktober: ca. 182 000 m³ November: ca. 28 000 m³	Figuur 5-1
Peilingen	-	-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	-	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	-	-

Er werden in deze periode geen peilingen aangeleverd.

5.2.7 Analyse december

In Figuur 5-7 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 5-7: Feitelijke informatie voor SH31 in december 2025.


Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	December: geen stortingen	Figuur 5-1
Peilingen	-	-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	-	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	-	-

Er werden in deze periode geen peilingen aangeleverd.

6 Put van Hansweert (PVH)


6.1 Resultaten lopend vergunningsjaar

De relatieve volumeverandering van de stortzone (in %) wordt geëvalueerd door het (cumulatieve) stortvolume te vergelijken met het gepeilde volume op de bodem ten opzichte van de referentiepeiling (T65, 02/05/2022) (Figuur 6-1).

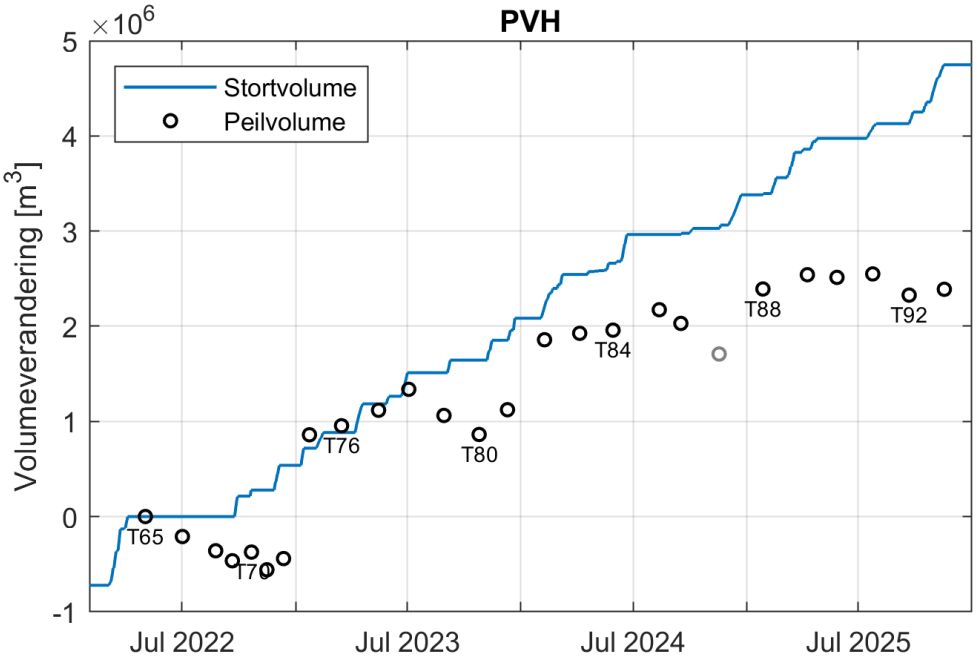


Figuur 6-1: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen voor de complete stortzone voor Put van Hansweert. De grote volumeverandering tussen T74 en T75 is het gevolg van lokale plaatvallen. De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking.

In september 2022 zijn de reguliere stortingen terug verdergezet voor PVH. Deze wordt lokaal opgevolgd met deelpeilingen (de volumeveranderingen van de deelzone PVHoost worden met rode cirkels weergegeven in Figuur 6-2). De laatste (volledige) reguliere peiling vóór de aanvang van deze nieuwe stortcampagne was T68 (20/09/2022) en is de nieuwe referentiepeiling voor de deelzone PVHoost. Sinds september 2023 wordt er niet meer in deelzone PVHoost gestort.

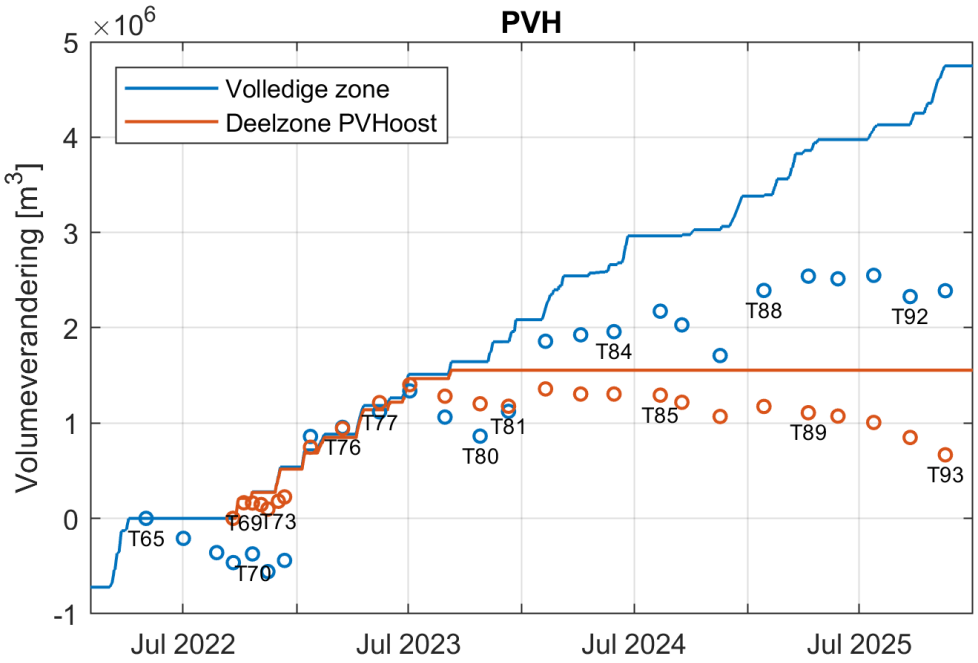

Figuur 6-2: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen voor de deelzones van de Put van Hansweert. De blauwe cirkels geven de reguliere peilingen weer (gemeten tot -2 m NAP), de rode cirkels vertegenwoordigen de volumeveranderingen van de deelzone PVHoost.

Voor PVH wordt de bodemontwikkeling op basis van profielen opgevolgd en voor het volledig vergunningsjaar 2025 weergegeven in Figuur 6-3. De referentiepeiling (T65, 02/05/2022) wordt eveneens opgenomen om de bodemontwikkeling op lange termijn op te volgen.

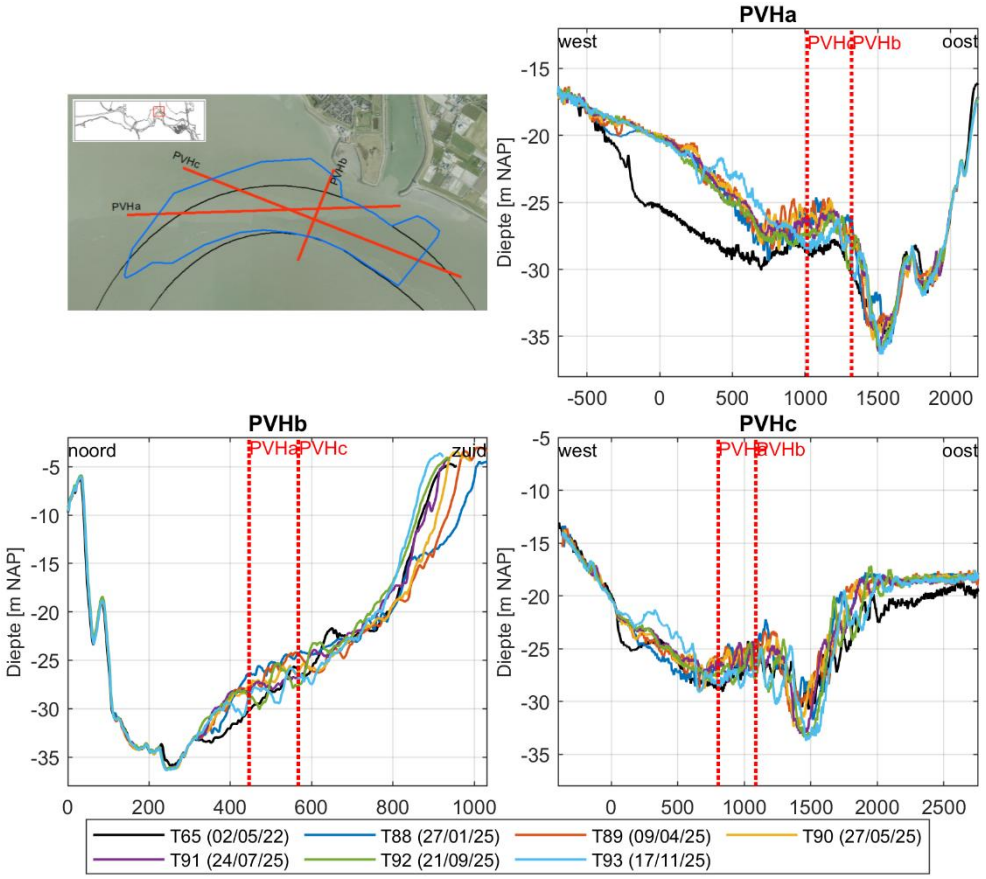

Figuur 6-3: Evolutie van de bathymetrie voor vergunningsjaar 2025 langs doorsnedes PVHa, PVHb en PVHc bij stortzone Put van Hansweert (enkel peilingen van de volledige zone).

De Put van Hansweert wordt gekenmerkt door het regelmatig voorkomen van plaatvallen ter hoogte van de binnenbocht. Hieronder worden de waargenomen plaatvallen sinds de nieuwe vergunningsperiode (12/02/2022) opgelijst met een inschatting van de grootteorde[2]:

- T66 (01/07/2022) – T67 (24/08/2022): 1 plaatval, ca. 75 000 m³,
- T74 (12/12/2022) – T75 (23/01/2023): 2 plaatvallen, ca. 1 000 000 m³,
- T77 (15/05/2023) – T78 (03/07/2023): plaatval 400 m ZO van de stortzone, ca 17 000 m³,
- T80 (25/10/2023) – T81 (10/12/2023): 1 plaatval, ca. 93 000 m³,
- T81 (10/12/2023) – T82 (08/02/2024): 2 plaatvallen, ca. 192 000 m³,
- T85 (12/08/2024) – T84 (29/05/2024): 1 plaatval, ca. 42 000 m³,
- T88 (27/01/2025) – T87 (17/11/2024): 1 plaatval, ca. 287 000 m³.
- T91 (24/07/2025) – T92 (21/09/2025): 1 plaatval, ca. 15 000 m³

[2] Voor deze inschatting is een polygoon getrokken o.b.v. de visuele verdieping (donkerblauwe kleur in de verschilkaarten). Het volume van die verdieping is berekend en hier gepresenteerd als een inschatting van de grootteorde.

6.2 Resultaten maandrapportages

6.2.1 Analyse januari

In Tabel 6-1 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 6-1: Feitelijke informatie voor PVH in januari 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Januari: ca. 13 000 m³	Figuur 6-1
Peilingen	-	-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	-	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	-	-

Er werden in deze periode geen peilingen aangeleverd.


6.2.2 Analyse februari en maart

In Tabel 6-1 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 6-2: Feitelijke informatie voor PVH in februari en maart 2025. De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Februari: ca. 166 000 m³ Maart: ca. 277 000 m³	Figuur 6-1
Peilingen	T88 (27/01/2025)	Figuur 6-5; Bijlage A.2
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T88 – T65 (27/01/2025 – 02/05/2022): 71% Deelzone PVHoost: • T88-T68: 76%	Figuur 6-1; Figuur 6-2
Profielen	Langs doorsnedes PVHa, PVHb, en PVHc.	Figuur 6-3; Figuur 6-4
Verschilkaarten	T88 – T65 (27/01/2025 – 02/05/2022) T88 – T68 (27/01/2025 – 20/09/2022) T88 – T87 (27/01/2025 – 17/11/2024): • Stortvolume: ca. 353 000 m³ • Peilvolume: ca. 683 000 m³	Figuur 6-5; Bijlage A.2

Voor deze periode worden de aangeleverde profielen getoond in Figuur 6-4. Om de bodemontwikkeling in een breder historisch kader te plaatsen wordt de nieuwe peiling vergeleken met de voorafgaande peiling, de referentiepeiling (T65), alsook met de voorgaande referentiepeilingen T0 en T52.

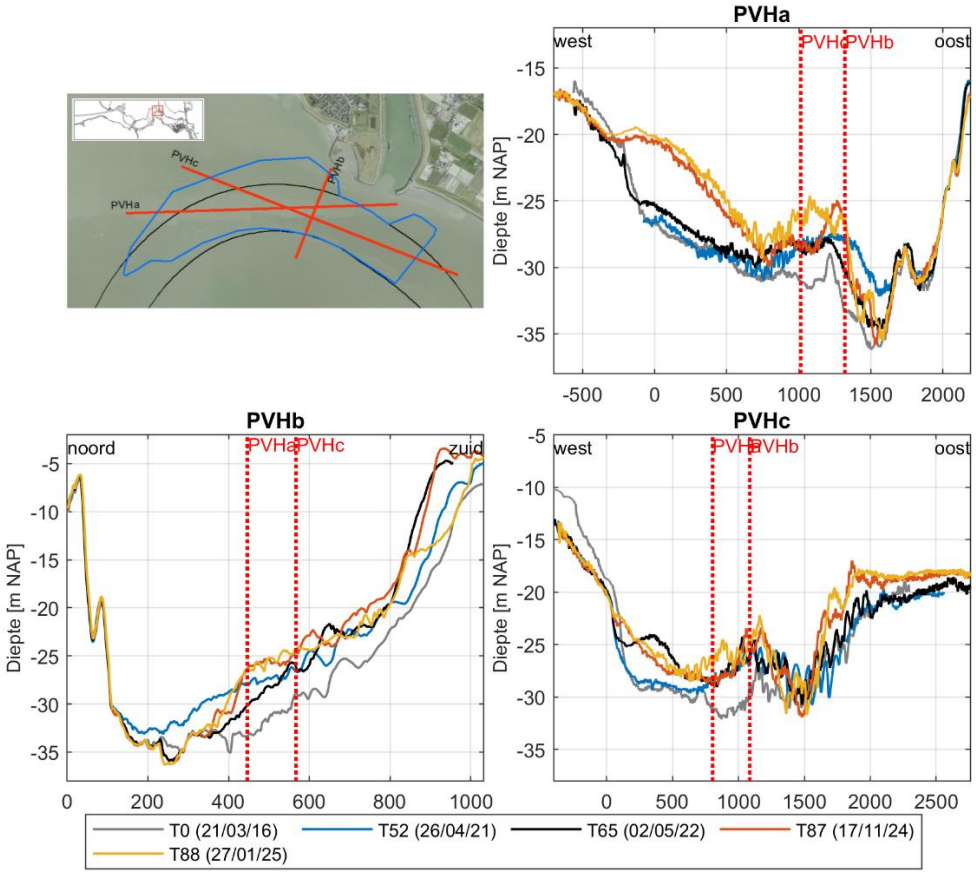


Figuur 6-4: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes PVHa, PVHb en PVHc bij stortzone Put van Hansweert sinds 2016.

In de periode T88-T87 is er in de **Put van Hansweert** gestort in het westen van de stortzone. Ook is er opnieuw een plaatval opgetreden aan de noordzijde van de Plaat van Ossenisse (i.e. in de binnenbocht van de vaarweg) (Figuur 6-5 en raai PVHb in Figuur 6-4). Het volume van deze plaatval is geschat op ca. 287 000 m³.

Door de combinatie van stortingen en de plaatval is het peilvolume in de stortzone sterk toegenomen (Figuur 6-1). Op de verschilkaart is er verondieping te zien ter hoogte van de gebruikte stortvakken (Figuur 6-5). De stortingen in het westelijke deel vinden plaats sinds November 2023. De bodem is hier sinds het begin van de stortingen ten opzichte van de referentiepeiling sterk verondiept (zie ook raai PVHa in Figuur 6-4). Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de algemene verondieping van deze stortzone een overschatting is o.w.v. de afwijkende peiling T87 (Figuur 6-1).

In het diepe deel van de put ter hoogte van de plaatval is eveneens verondieping waar te nemen. Het afgegleden zand is hierbij in het midden van de vaargeul terecht gekomen (Figuur 6-5 en raai PVHb in Figuur 6-4). Verder migreren er in het oostelijke deel van de stortzone onderwaterduinen in opwaartse richting. Deze migratie van zandduinen is een trend die waarneembaar is sinds het begin van de vergunning. Het oostelijke deel van de stortzone dat zich uitstrekt richting de drempel, is ten opzichte van de referentiepeiling verondiept (zie raai PVHc in Figuur 6-4). Ook in de laatste peiling is verdere verondieping zichtbaar (Figuur 6-5). Naar verwachting zal ook het zand uit de plaatval zich in oostelijke richting bewegen en de aanwezige bodemvormen versterken.

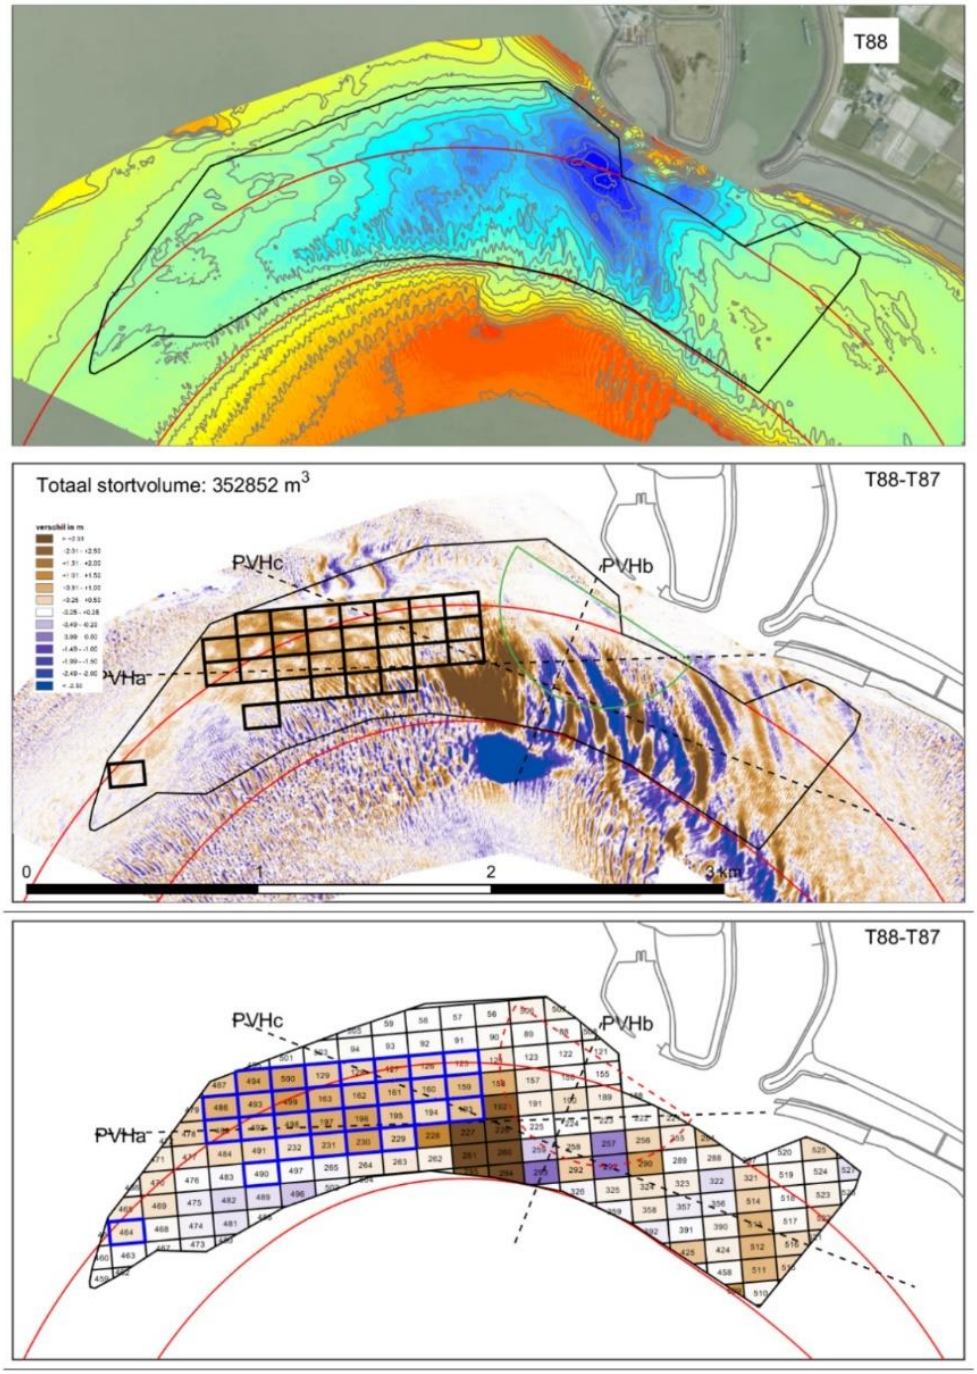

Figuur 6-5: Morfologische veranderingen bij de Put van Hansweert tussen T87 en T88. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.


6.2.3 Analyse april en mei

In Tabel 6-3 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 6-3: Feitelijke informatie voor PVH in april en mei 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	April: ca. 136 000 m³ Mei: geen stortingen	Figuur 6-1
Peilingen	T89 (09/04/2025)	Figuur 6-7; Bijlage A.3
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T89 – T65 (09/04/2025– 02/05/2022): 66% Deelzone PVHoost: • T89-T68: 71%	Figuur 6-1; Figuur 6-2
Profielen	Langs doorsnedes PVHa, PVHb, en PVHc.	Figuur 6-3; Figuur 6-6
Verschilkaarten	T89 – T65 (09/04/2025– 02/05/2022) T89 – T68 (09/04/2025– 20/09/2022) T89 – T88 (09/04/2025 – 27/01/2025): • Stortvolume: ca. 479 000 m³ • Peilvolume: ca. 150 000 m³	Figuur 6-7; Bijlage A.3


Voor deze periode worden de aangeleverde profielen getoond in Figuur 6-6. Om de bodemontwikkeling in een breder historisch kader te plaatsen wordt de nieuwe peiling vergeleken met de voorafgaande peiling, de referentiepeiling (T65), alsook met de voorgaande referentiepeilingen T0 en T52.

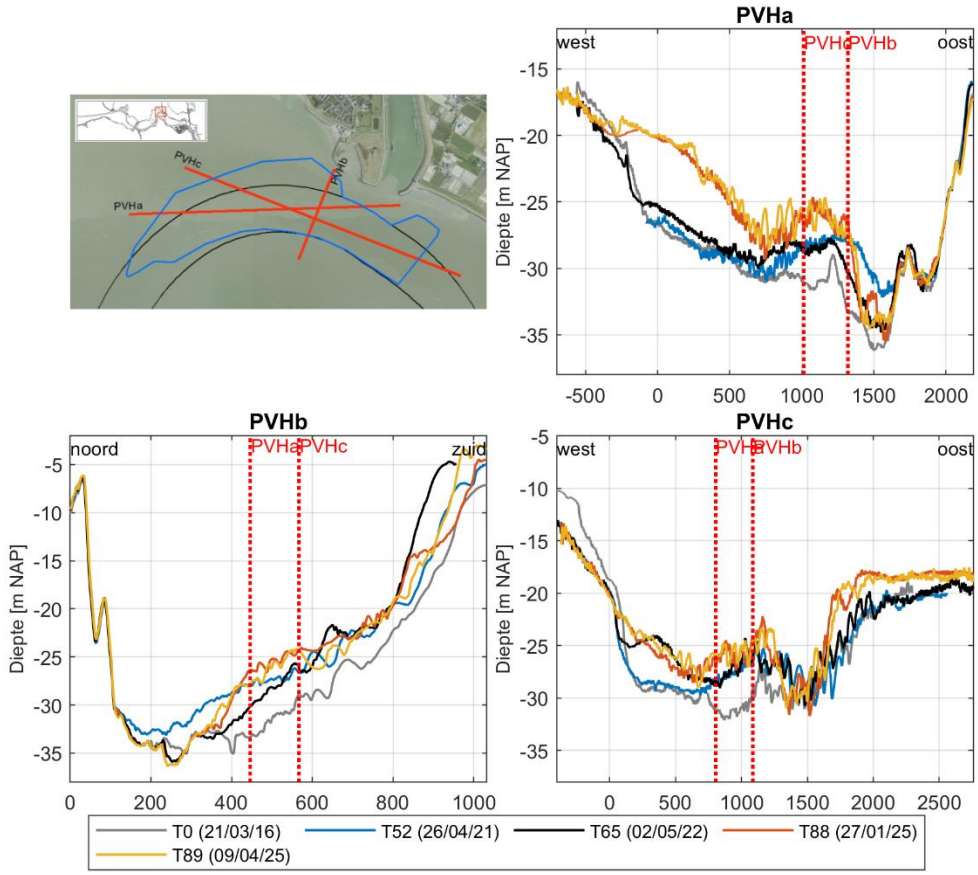

Figuur 6-6: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes PVHa, PVHb en PVHc bij stortzone Put van Hansweert sinds 2016.

In de stortzone **Put van Hansweert** is er in de periode T89-T88 een groot volume sediment gestort (ca. 479 000 m³) in het westen van de stortzone. Ter hoogte van de gebruikte stortvakken is in het westelijke deel van de stortzone duidelijke verondieping zichtbaar (Figuur 6-7). In het oostelijke deel speelt nog steeds dezelfde evolutie die reeds bij vorige peilingen is waargenomen. Meer bepaald, het stroomopwaarts bewegen van grote onderwaterduinen.

Verder is er in de periode T89-T88 in het oostelijk deel overwegend verdieping zichtbaar (Figuur 6-7). Dit blijkt eveneens uit de relatieve volumeverandering van deze deelzone (t.o.v. T68), die licht is afgenomen sinds de vorige peiling (Figuur 6-2). Deze volumeafname in het oostelijke deel van de stortzone is mogelijk te wijten aan erosie van het sediment afkomstig van de plaatval uit de periode T88-T87. Buiten de stortzone is namelijk ook herstel zichtbaar van de plaatval (zie raai PVHb in Figuur 6-3 en Figuur 6-6).

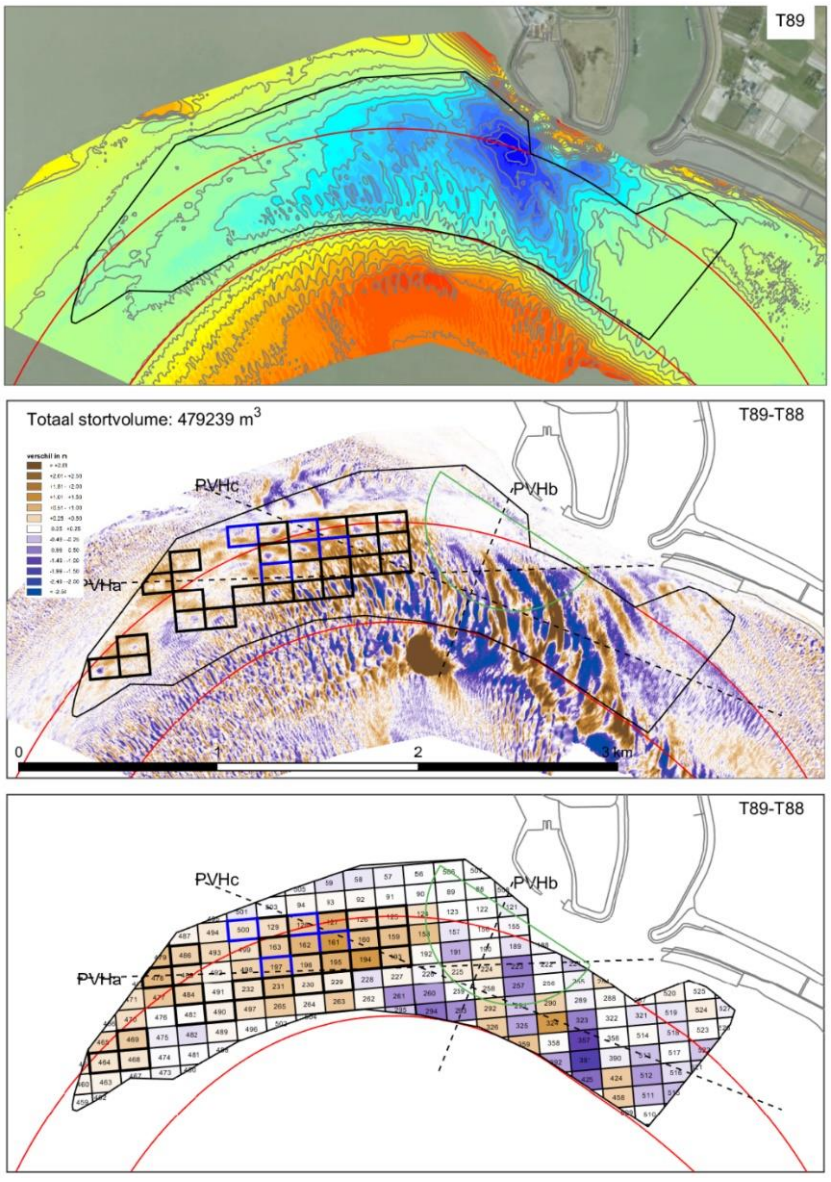

Figuur 6-7: Morfologische veranderingen bij de Put van Hansweert tussen T89 en T88. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.


6.2.4 Analyse juni en juli

In Tabel 6-4 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 6-4: Feitelijke informatie voor PVH in juni en juli 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Juni: geen stortingen Juli: ca. 154 000 m³	Figuur 6-1
Peilingen	T90 (27/05/2025)	Figuur 6-9; Bijlage A.4
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T90 – T65 (27/05/2025 – 02/05/2022): 64% Deelzone PVHoost: • T90-T68: 69%	Figuur 6-1; Figuur 6-2
Profielen	Langs doorsnedes PVHa, PVHb, en PVHc.	Figuur 6-3; Figuur 6-8
Verschilkaarten	T90 – T65 (27/05/2025 – 02/05/2022) T90 – T68 (27/05/2025 – 20/09/2022) T90 – T89 (27/05/2025 – 09/04/2025): • Stortvolume: ca. 114 000 m³ • Peilvolume: ca. -28 000 m³	Figuur 6-9; Bijlage A.4


Voor deze periode worden de aangeleverde profielen getoond in Figuur 6-8. Om de bodemontwikkeling in een breder historisch kader te plaatsen wordt de nieuwe peiling vergeleken met de voorafgaande peiling, de referentiepeiling (T65), alsook met de voorgaande referentiepeilingen T0 en T52.

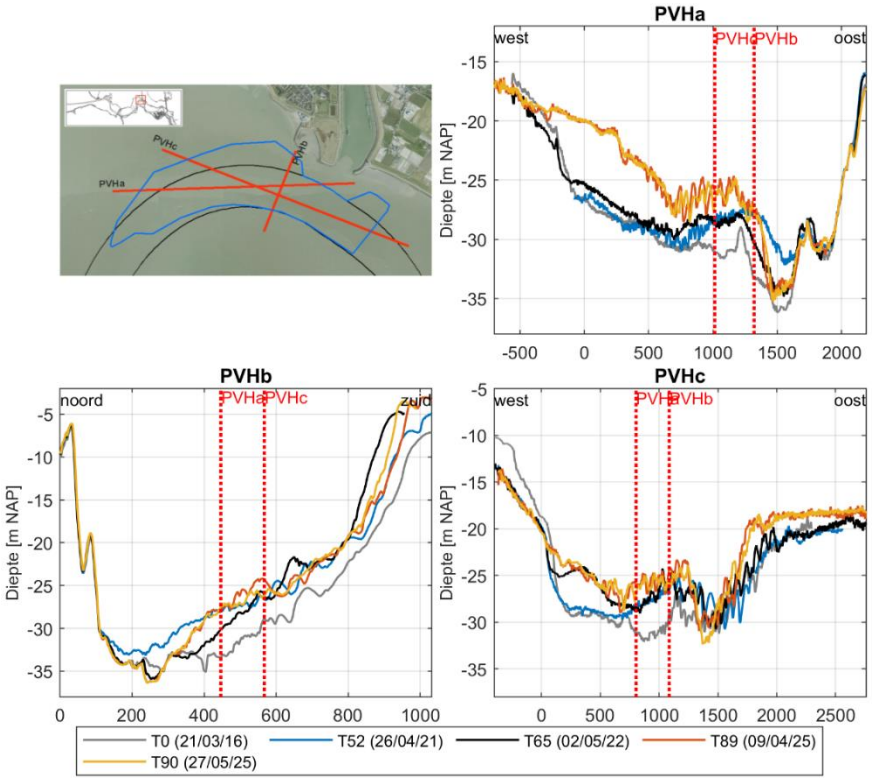

Figuur 6-8: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes PVHa, PVHb en PVHc bij stortzone Put van Hansweert sinds 2016.

In de stortzone **Put van Hansweert** is er in de periode T90-T89 een volume van ca. 114 000 m³ sediment in het centraal-westelijke deel van de stortzone gestort. Ter hoogte van de gebruikte stortvakken is lichte verondieping zichtbaar (Figuur 6-9). In het oostelijke deel speelt nog steeds dezelfde evolutie die reeds bij vorige peilingen is waargenomen. Meer bepaald, het stroomopwaarts bewegen van grote onderwaterduinen.

Verder is er in de periode T90-T89 in het oostelijk deel overwegend verdieping zichtbaar (Figuur 6-9). Dit blijkt eveneens uit de relatieve volumeverandering van deze deelzone (t.o.v. T68), die licht is afgenomen sinds de vorige peiling (Figuur 6-2). Deze volumeafname in het oostelijke deel van de stortzone is mogelijk te wijten aan het migreren van de grote onderwaterduinen zoals hierboven vermeldt. In eerdere periodes was deze volumeafname gelinkt aan erosie van het sediment afkomstig van de plaatval uit de periode T88-T87, maar uit de laatste peiling is dit niet of nauwelijks zichtbaar. Echter, buiten de stortzone is nog wel een herstel zichtbaar van de plaatval (zie raai PVHb in Figuur 6-3 en Figuur 6-8).

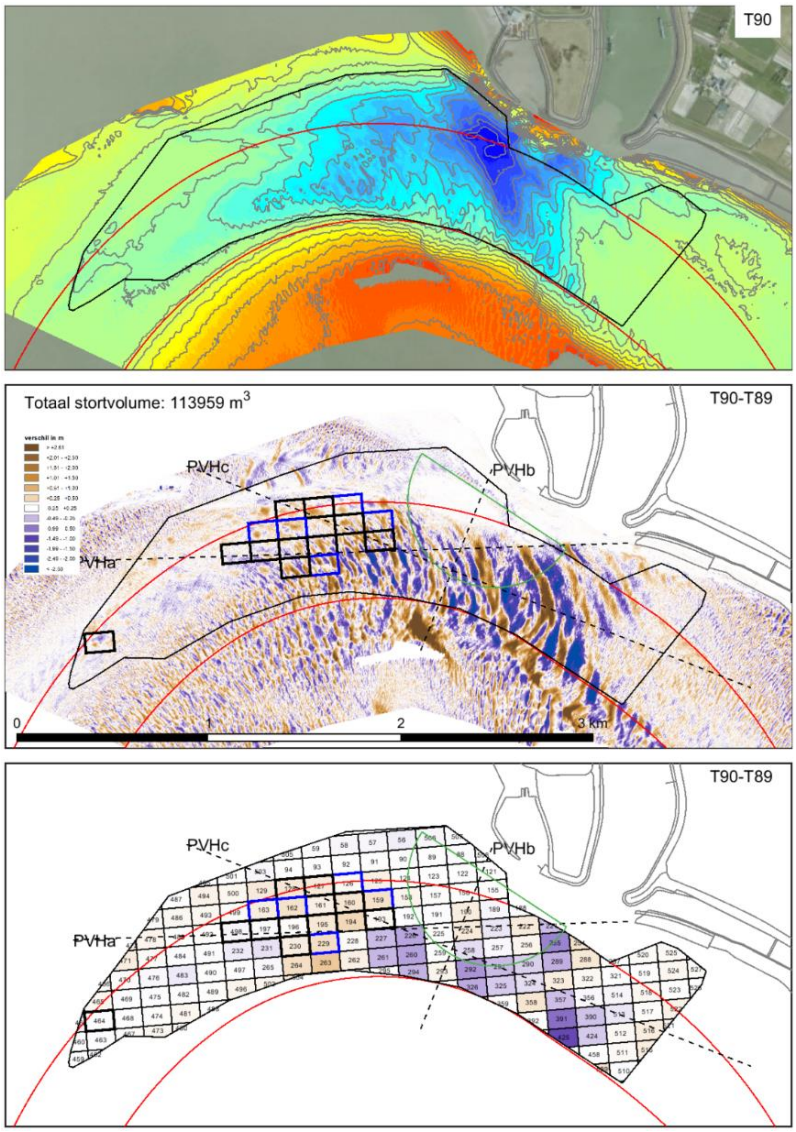

Figuur 6-9: Morfologische veranderingen bij de Put van Hansweert tussen T90 en T89. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.


6.2.5 Analyse augustus en september

In Tabel 6-5 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 6-5: Feitelijke informatie voor PVH in augustus en september 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Augustus: geen stortingen September: ca. 122 000 m³	Figuur 6-1
Peilingen	T91 (24/07/2025) T92 (21/09/2025)	Figuur 6-11; Figuur 6-12; Bijlage A.5
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T91 – T65 (24/07/2025 – 02/05/2022): 63% T92 – T65 (21/09/2025 – 02/05/2022): 57% Deelzone PVHoost: 55%	Figuur 6-1; Figuur 6-2
Profielen	Langs doorsnedes PVHa, PVHb, en PVHc.	Figuur 6-3; Figuur 6-10
Verschilkaarten	T91 – T65 (24/07/2025 – 02/05/2022) T91 – T68 (24/07/2025 – 20/09/2022) T91 – T90 (24/07/2025 – 27/05/2025): • Stortvolume: ca. 112 000 m³ • Peilvolume: ca. 36 000 m³ T92 – T65 (21/09/2025 – 02/05/2022) T92 – T68 (21/09/2025 – 20/09/2022) T92 – T91 (21/09/2025 – 24/07/2025): • Stortvolume: ca. 43 000 m³ • Peilvolume: ca. -223 000 m³	Figuur 6-11; Figuur 6-12; Bijlage A.5


Voor deze periode worden de aangeleverde profielen getoond in Figuur 6-10. Om de bodemontwikkeling in een breder historisch kader te plaatsen wordt de nieuwe peiling vergeleken met de voorafgaande peiling, de referentiepeiling (T65), alsook met de voorgaande referentiepeilingen T0 en T52.

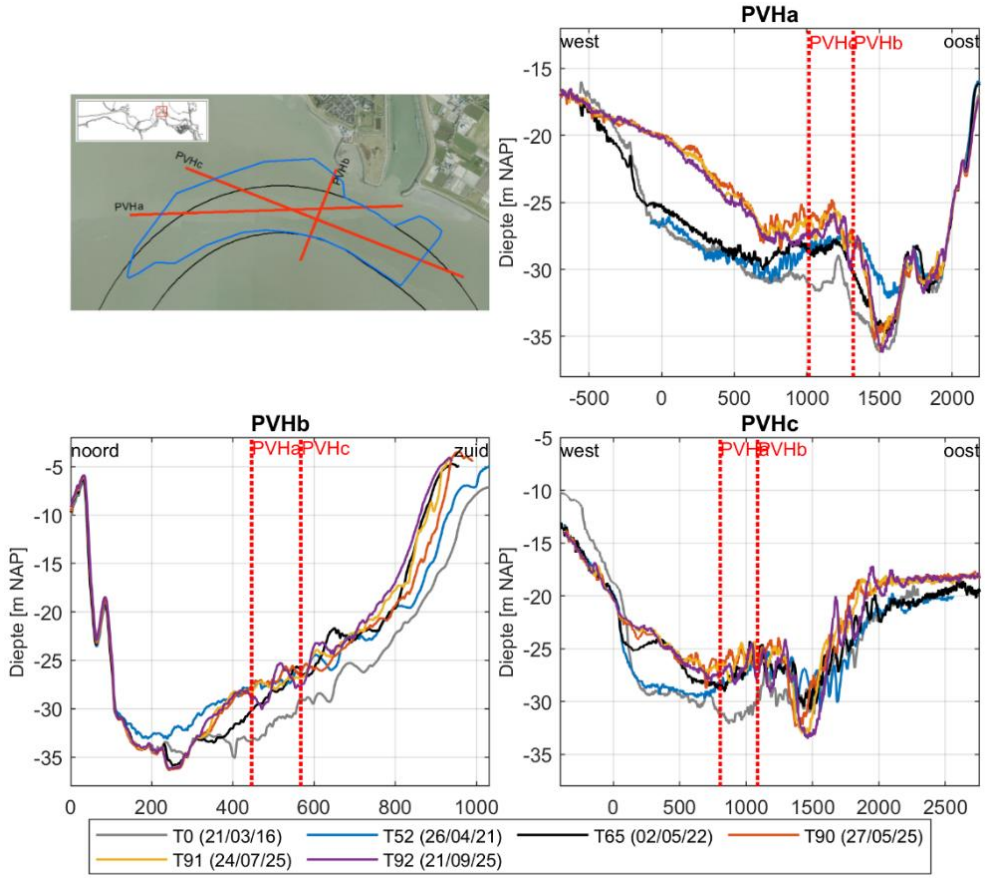


Figuur 6-10: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes PVHa, PVHb en PVHc bij stortzone Put van Hansweert sinds 2016.

In de stortzone **Put van Hansweert** is er in de periode T91-T90 een volume van ca. 112 000 m³ sediment in het centraal-westelijke deel van de stortzone gestort, terwijl in de periode T92-T91 ca. 43 000 m³ werd gestort. Ter hoogte van de gebruikte stortvakken is tussen T90 en T91 over het algemeen lichte verondieping zichtbaar, met uitzondering van de meest zuidwestelijke vakken (Figuur 6-11), resulterend in een beperkte volumetoename in de zone van ca. 36 000 m³. Tussen T91 en T92 werd slechts beperkt gestort en is centraal tussen de gebruikte stortvakken voornamelijk verdieping zichtbaar (Figuur 6-12), dit is ook goed zichtbaar in raai PVHc in Figuur 6-10. Het peilvolume neemt in deze periode met ca. 223 000 m³ af. In het oostelijke deel speelt nog steeds dezelfde evolutie die reeds bij vorige peilingen is waargenomen. Meer bepaald, het stroomopwaarts bewegen van grote onderwaterduinen. De patronen in de periode T92-T91 lijken sterker te zijn dan die tussen T91-T90.

Daarnaast is langs de noordoostelijke rand van de Plaat van Ossenisse tussen T91 en T92 is kleine plaatval zichtbaar, in de vorm van een ronde verdieping buiten de vaargeul. Gezien de kleine omvang hiervan, is er als gevolg hiervan geen duidelijke bodemverandering opgetreden binnen de zone PVH (Figuur 6-12). Meer centraal-noordelijk langs de plaatrand is nog altijd herstel zichtbaar van de plaatval die tussen T87 en T88 plaatsvond (zie raai PVHb in Figuur 6-3 en Figuur 6-11/Figuur 6-12).

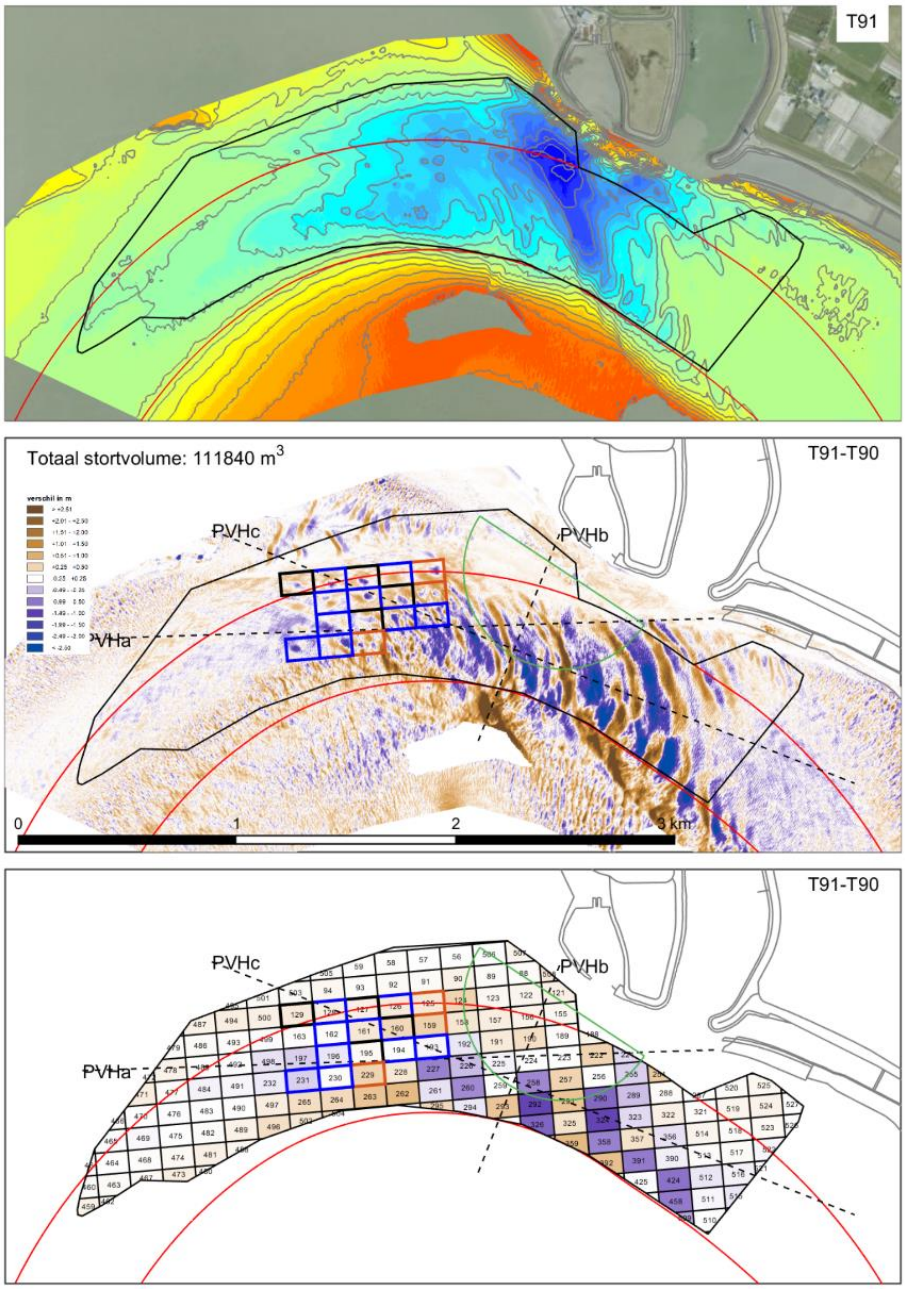

Figuur 6-11: Morfologische veranderingen bij de Put van Hansweert tussen T91 en T90. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

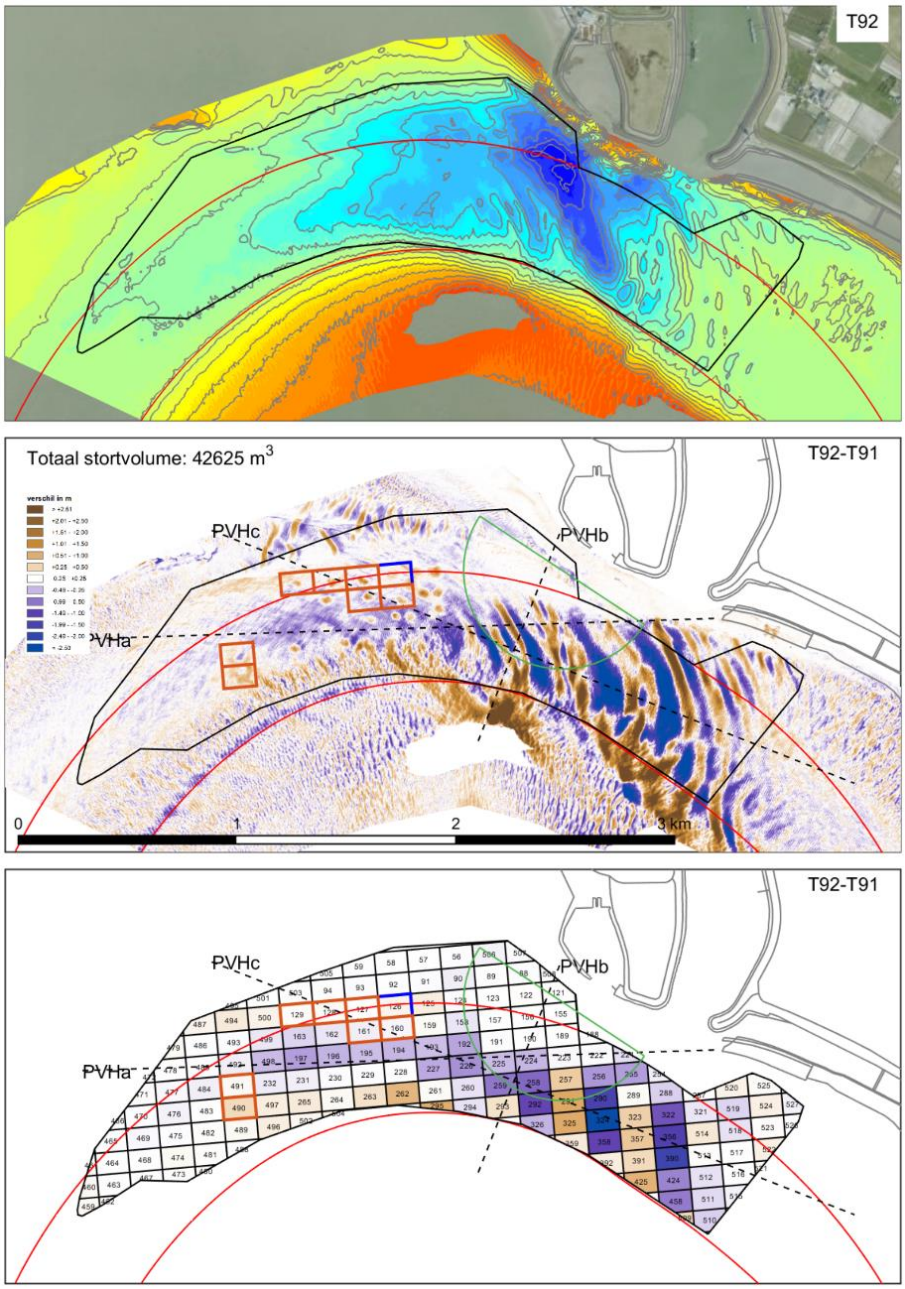

Figuur 6-12: Morfologische veranderingen bij de Put van Hansweert tussen T92 en T91. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

6.2.6 Analyse oktober en november


In Tabel 6-6 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 6-6: Feitelijke informatie voor PVH in oktober en november 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Oktober: ca. 248 000 m³ November: ca. 249 000 m³	Figuur 6-1

Parameter	Commentaar	Figuur
Peilingen	T93 (17/11/2025)	Figuur 6-14; Bijlage A.6
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T93 – T65 (17/11/2025 – 02/05/2022): 50% Deelzone PVHoost: • T93-T68: 43%	Figuur 6-1; Figuur 6-2
Profielen	Langsdoorsnedes PVHa, PVHb, en PVHc.	Figuur 6-3; Figuur 6-13
Verschilkaarten	T93 – T65 (17/11/2025 – 02/05/2022) T93 – T68 (17/11/2025 – 20/09/2022) T93 – T92 (17/11/2025 – 21/09/2025): • Stortvolume: ca. 619 000 m³ • Peilvolume: ca. 61 000 m³	Figuur 6-14; Bijlage A.6

Voor deze periode worden de aangeleverde profielen getoond in Figuur 6-13. Om de bodemontwikkeling in een breder historisch kader te plaatsen wordt de nieuwe peiling vergeleken met de voorafgaande peiling, de referentiepeiling (T65), alsook met de voorgaande referentiepeilingen T0 en T52.

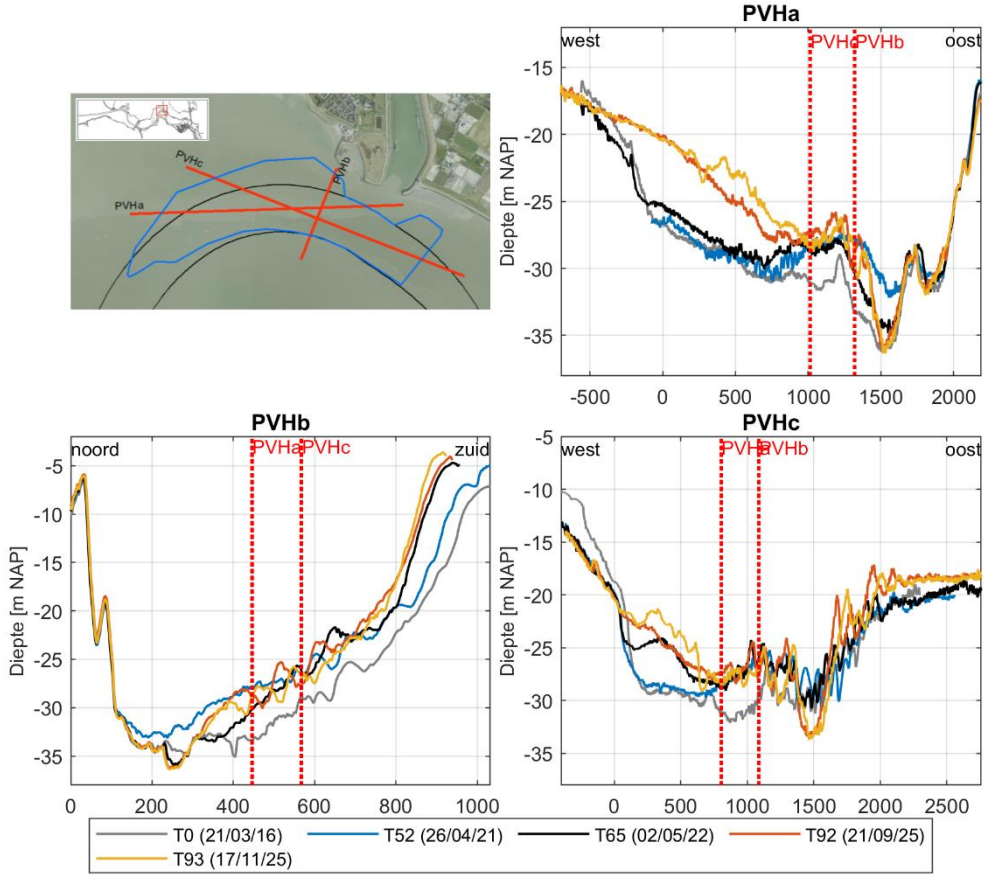


Figuur 6-13: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes PVHa, PVHb en PVHc bij stortzone Put van Hansweert sinds 2016.

In de stortzone **Put van Hansweert** is er in de periode T93-T92 een volume van ca. 619 000 m³ sediment in het centraal-westelijke deel van de stortzone gestort. Ter hoogte van de gebruikte stortvakken is verondieping zichtbaar (Figuur 6-14). In het

oostelijke deel speelt nog steeds dezelfde evolutie die reeds bij vorige peilingen is waargenomen. Meer bepaald, het stroomopwaarts bewegen van grote onderwaterduinen, waarbij wel de verdieping overheerst.

Verder is er in de periode T93-T92 in het oostelijk deel overwegend verdieping zichtbaar (Figuur 6-14). Dit blijkt eveneens uit de relatieve volumeverandering van deze deelzone (t.o.v. T68), die licht is afgenomen sinds de vorige peiling (Figuur 6-2). Het peilvolume in de deelzone PVHoost neemt langzaam af (toename watervolume), sinds het stoppen van de stortingen aldaar. Enkel na een grote plaatval neemt het peilvolume weer toe. Uiteindelijk zorgen de migrerende bodemvormen dus voor een afname van het sedimentvolume in het oostelijk deel van de stortzone. Juist opwaarts van de stortzone is er juist een aanzandende trend en moet de zandgolven soms gebaggerd worden.

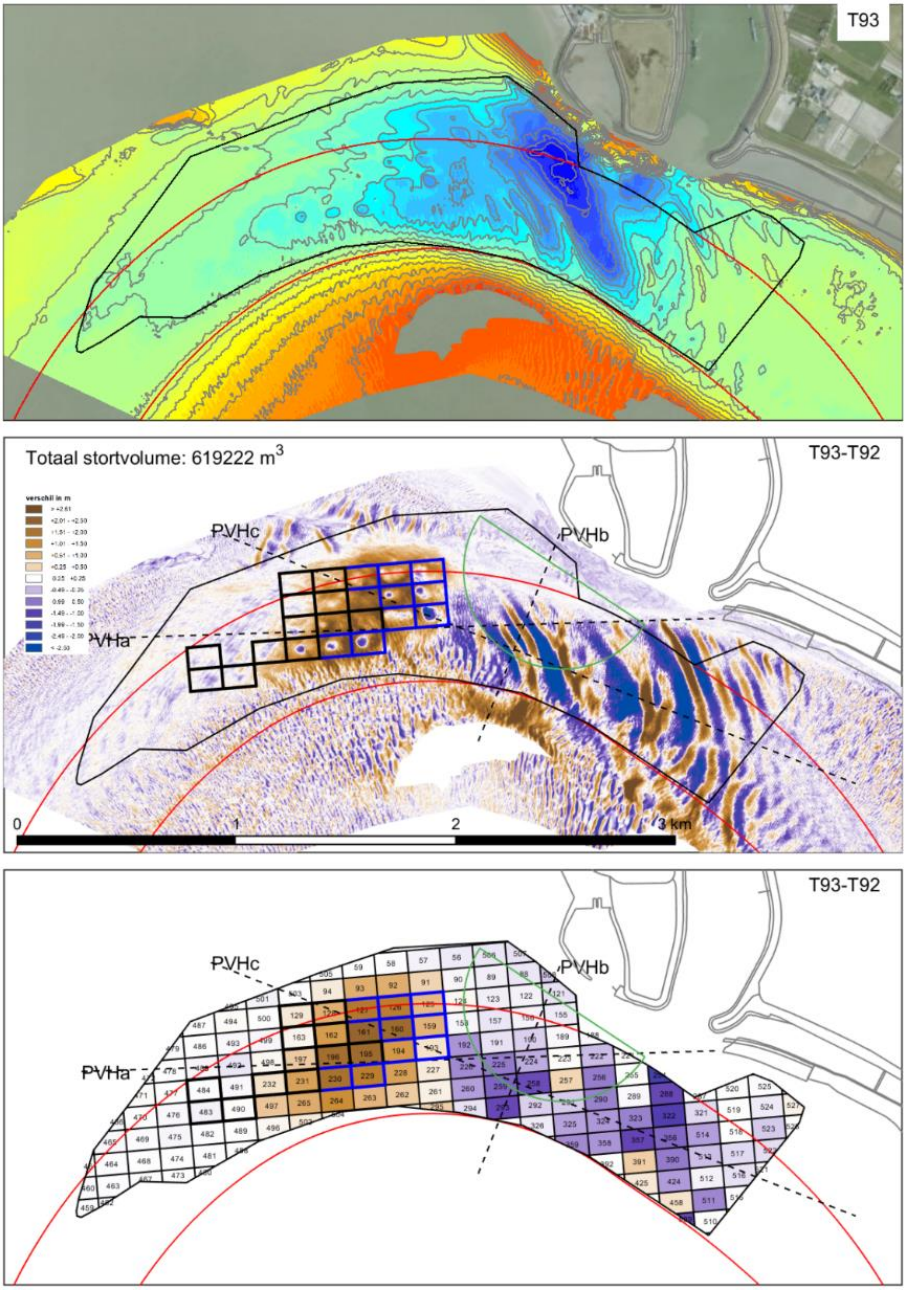

Figuur 6-14: Morfologische veranderingen bij de Put van Hansweert tussen T93 en T92. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

6.2.7 Analyse december

In Tabel 6-7 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 6-7: Feitelijke informatie voor PVH in december 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	December: geen stortingen	Figuur 6-1
Peilingen	-	-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	-	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	-	-


Er werden in deze periode geen peilingen aangeleverd.

7 SH61

7.1 Resultaten lopend vergunningsjaar


De relatieve volumeverandering van de stortzone (in %) wordt geëvalueerd door het (cumulatieve) stortvolume te vergelijken met het gepeilde volume op de bodem ten opzichte van een referentiepeiling.

De relatieve volumeverandering van de stortzone SH61 is weergegeven in Figuur 7-1. Als referentiepeiling is de eerste peiling To (08/03/2021) geselecteerd (uit het GOPS-project). De relatieve volumeverandering van de stortzone SH61 wordt berekend ten opzichte van dit referentiepeil.

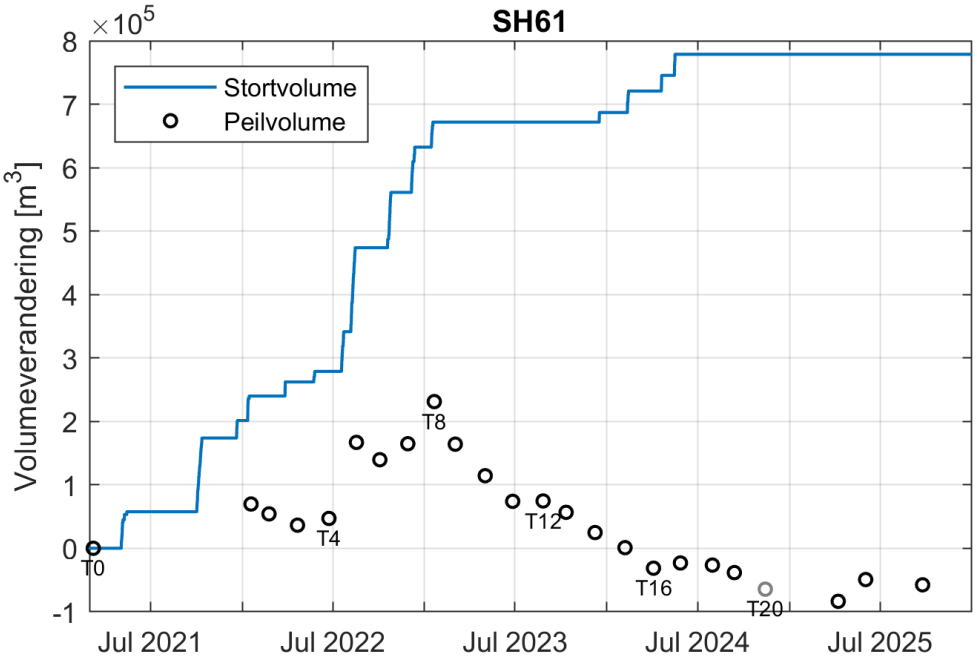

Figuur 7-1: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen voor de complete stortzone voor SH61. De peiling in grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking.

Voor SH61 wordt de bodemontwikkeling op basis van profielen opgevolgd en voor het volledig vergunningsjaar 2025 weergegeven in Figuur 7-2. De referentiepeiling To (08/03/2021) wordt eveneens opgenomen om de bodemontwikkeling op lange termijn op te volgen.

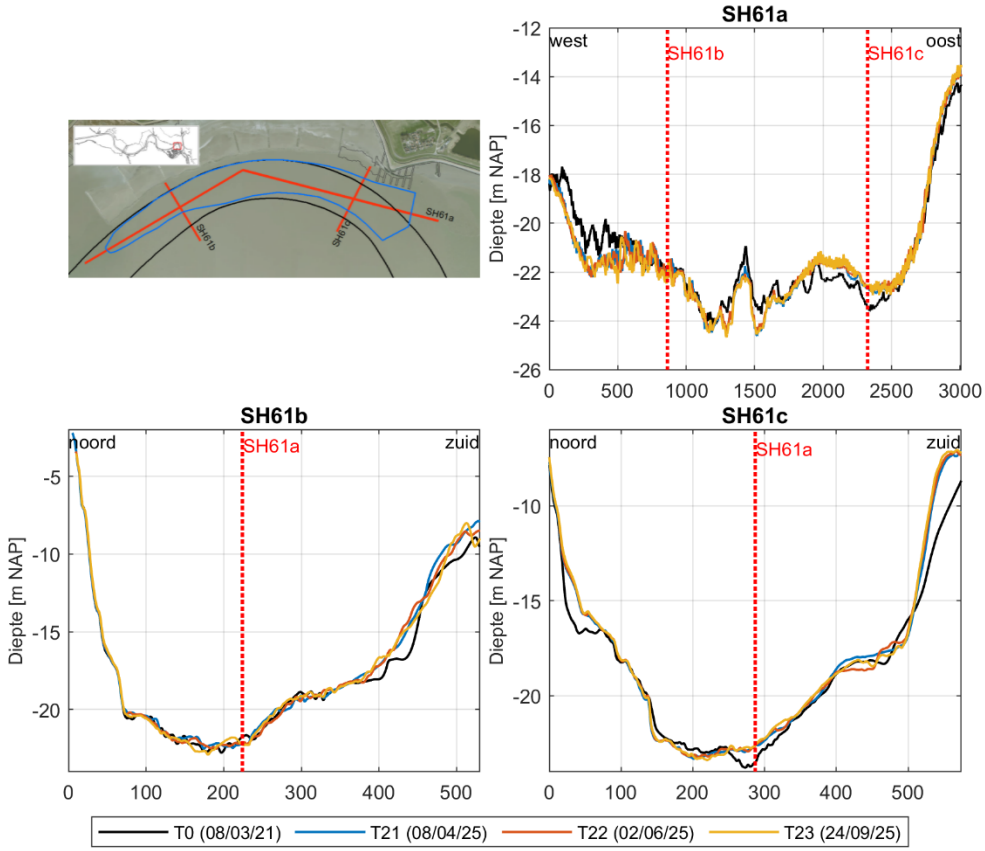

Figuur 7-2: Evolutie van de bathymetrie voor vergunningsjaar 2025 langs doorsnedes SH61a, SH61b en SH61c bij stortzone SH61.

7.2 Resultaten maandrapportages

Er is besloten, op basis van de verschillende elementen (o.a. nautisch), dat het gebruik van stortzone SH61 actueel niet langer wenselijk is. Verder onderzoek dient duidelijkheid te brengen of delen van deze zone nog ingezet kunnen worden. Zolang de zone deel uitmaakt van de vergunning wordt de aangeleverde data hier nog steeds verder opgevolgd.

7.2.1 Analyse januari

In Tabel 7-1 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 7-1: Feitelijke informatie voor SH61 in januari 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Januari: geen stortingen	Figuur 7-1
Peilingen	-	-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	-	-
Profielen	-	-

Parameter	Commentaar	Figuur
Verschilkaarten	-	-

Er werden in deze periode geen peilingen aangeleverd.

7.2.2 Analyse februari en maart

In Tabel 7-2 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 7-2: Feitelijke informatie voor SH61 in februari en maart 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Februari: geen stortingen Maart: geen stortingen	Figuur 7-1
Peilingen	-	-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	-	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	-	-

Er werden in deze periode geen peilingen aangeleverd.


7.2.3 Analyse april en mei

In Tabel 7-3 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 7-3: Feitelijke informatie voor SH61 in april en mei 2025. De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	April: geen stortingen Mei: geen stortingen	Figuur 7-1
Peilingen	T21 (08/04/2025)	Figuur 7-4, Bijlage A.3
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T21 (08/04/2025) – T0 (08/03/2021): -11%	Figuur 7-1
Profielen	Langs doorsnedes SH61a, SH61b en SH61c	Figuur 7-2, Figuur 7-3
Verschilkaarten	T21 – 0 (08/04/2025 – 08/03/2021) T21 – 20 (08/04/2025 – 13/11/2024): • Stortvolume: geen stortingen • Peilvolume: ca. -19 000 m³	Figuur 7-4, Bijlage A.3


Voor deze periode worden de aangeleverde profielen getoond in Figuur 7-3. Om de bodemontwikkeling in een breder historisch kader te plaatsen wordt de nieuwe peiling vergeleken met de voorafgaande peiling, alsook met het referentiepeil T0.

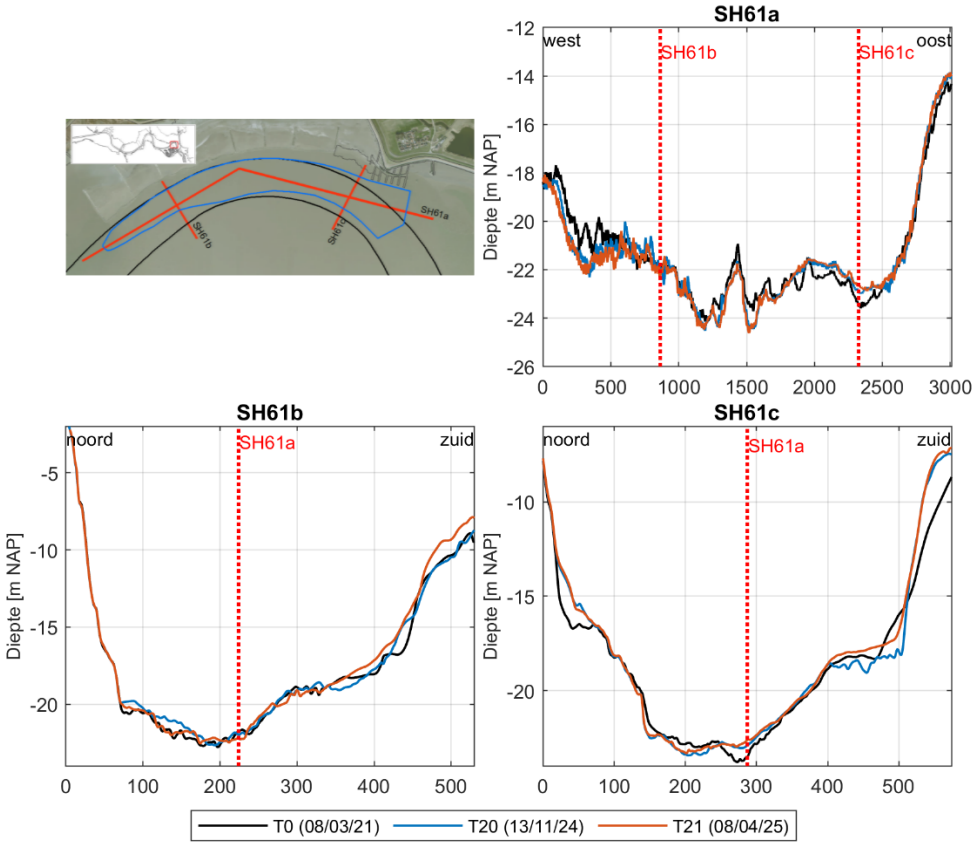

Figuur 7-3: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes SH61a, SH61b en SH61c bij stortzone SH61 sinds 2021.

In stortzone **SH61** wordt sinds mei 2024 niet meer gestort. Op de verschilkaart T21-T20 is in het westelijk deel van de stortzone verdieping zichtbaar (Figuur 7-4). Eveneens is in Figuur 7-3 bij raai SH61b waar te nemen dat de bodem is verdiept. Deze ligt nu terug op hetzelfde niveau als bij de referentiepeiling T0. In het oostelijk deel van de stortzone zijn de morfologische veranderingen zeer beperkt. De relatieve volumeverandering tussen de laatste peiling (T21) en de referentiepeiling (T0) is daarmee ook verder afgenomen en bedraagt -11% (Figuur 7-1).

In het kader van het onderhouden van de vaargeul worden regelmatig baggerwerken uitgevoerd. Na de laatste baggerwerken is de plaatrand van de Plaat van Saeftinghe opnieuw uitgebreid waardoor er buiten de stortzone langs de binnenbocht verondiepingen zichtbaar zijn (Figuur 7-3).

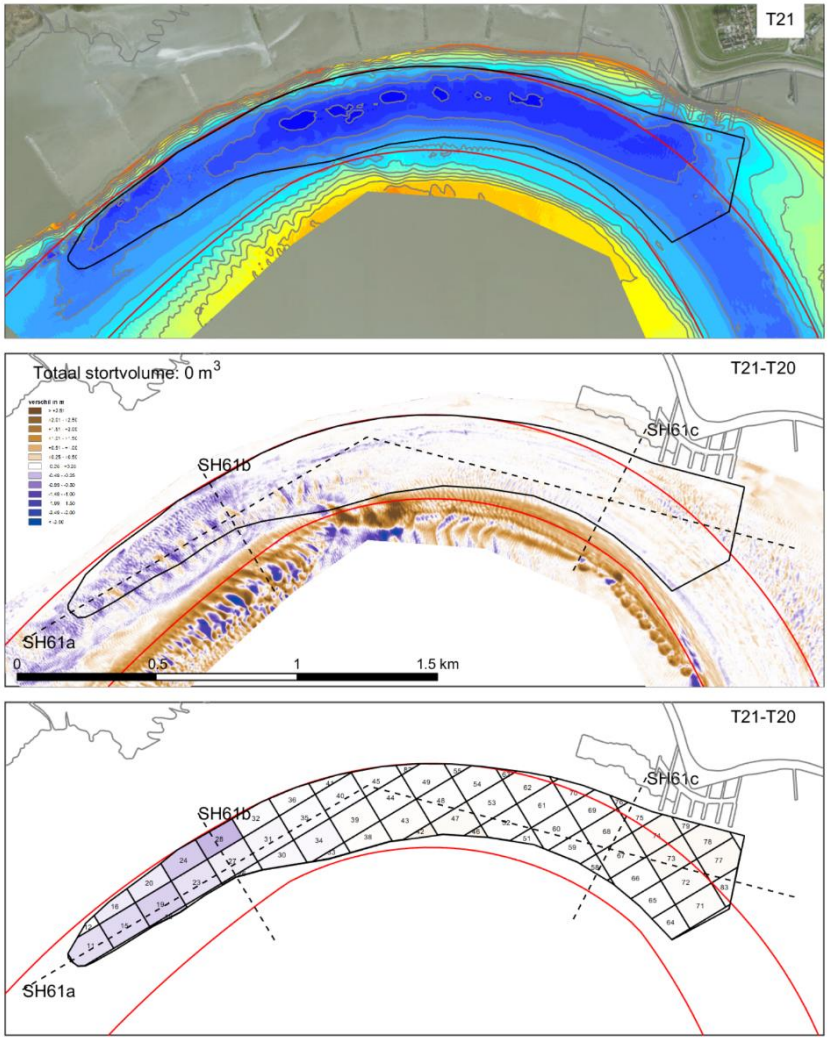

Figuur 7-4: Morfologische veranderingen bij SH61 tussen T21 en T20.

7.2.4 Analyse juni en juli


In Tabel 7-4 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 7-4: Feitelijke informatie voor SH61 in juni en juli 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Juni: geen stortingen Juli: geen stortingen	Figuur 7-1
Peilingen	T22 (02/06/2025)	Figuur 7-6, Bijlage A.4
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T22 (02/06/2025) – T0 (08/03/2021): -6%	Figuur 7-1
Profielen	Langs doorsnedes SH61a, SH61b en SH61c	Figuur 7-2, Figuur 7-5
Verschilkaarten	T22 – T0 (02/06/2025 – 08/03/2021) T22 – T21 (02/06/2025 – 08/04/2025):	Figuur 7-6, Bijlage A.4

Parameter	Commentaar	Figuur
	• Stortvolume: geen stortingen • Peilvolume: ca. 34 000 m³	


Voor deze periode worden de aangeleverde profielen getoond in Figuur 7-5. Om de bodemontwikkeling in een breder historisch kader te plaatsen wordt de nieuwe peiling vergeleken met de voorafgaande peiling, alsook met het referentiepeil T0.

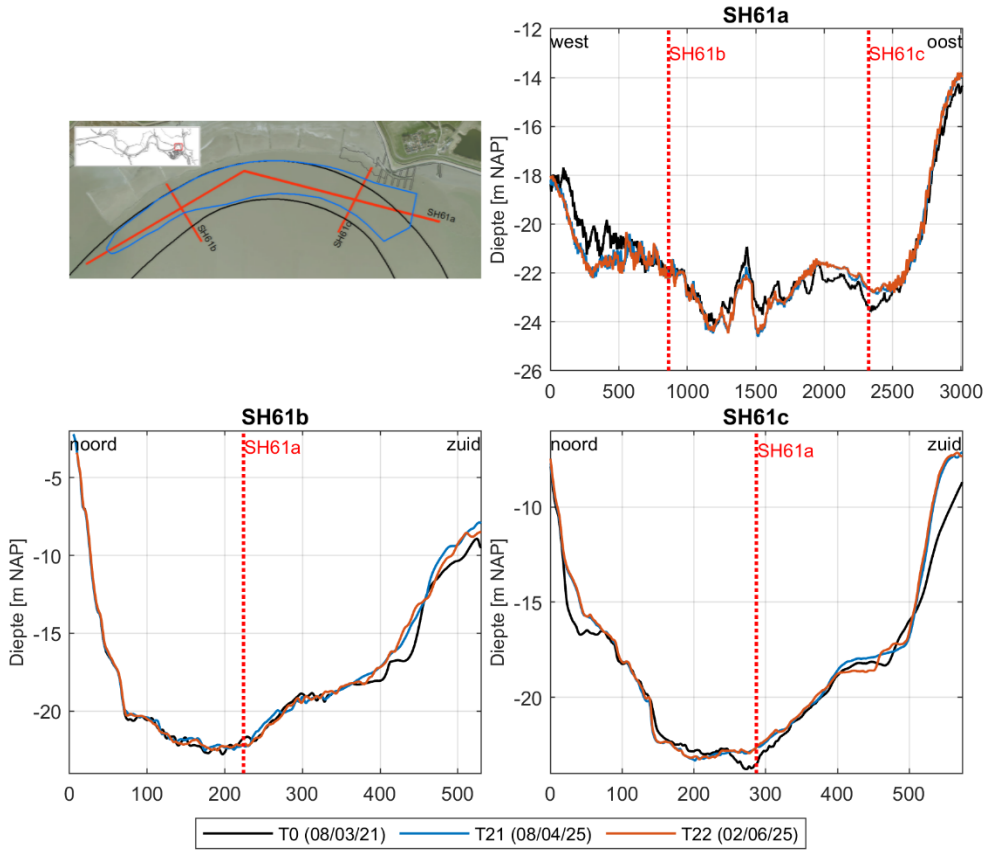

Figuur 7-5: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes SH61a, SH61b en SH61c bij stortzone SH61 sinds 2021.

In stortzone **SH61** wordt sinds mei 2024 niet meer gestort. Op de verschilkaart T22-T21 zijn met name in het westelijk deel van de stortzone bodemvormen zichtbaar (Figuur 7-6). Echter, de verschillen tussen T22 en T21 zijn minimaal. Eveneens is in Figuur 7-5 bij raai SH61b waar te nemen dat deze verschillen miniem zijn. Ten opzichte van T0 is de stortzone in het zuiden licht ondieper geworden. In het oostelijk deel van de stortzone zijn de morfologische veranderingen zeer beperkt. De relatieve volumeverandering tussen de laatste peiling (T22) en de referentiepeiling (T0) blijft negatief en bedraagt -6% (Figuur 7-1).

In het kader van het onderhouden van de vaargeul worden regelmatig baggerwerken uitgevoerd. Na de laatste baggerwerken is in de binnenbocht van de vaarweg duidelijke verdieping te zien (Figuur 7-6).

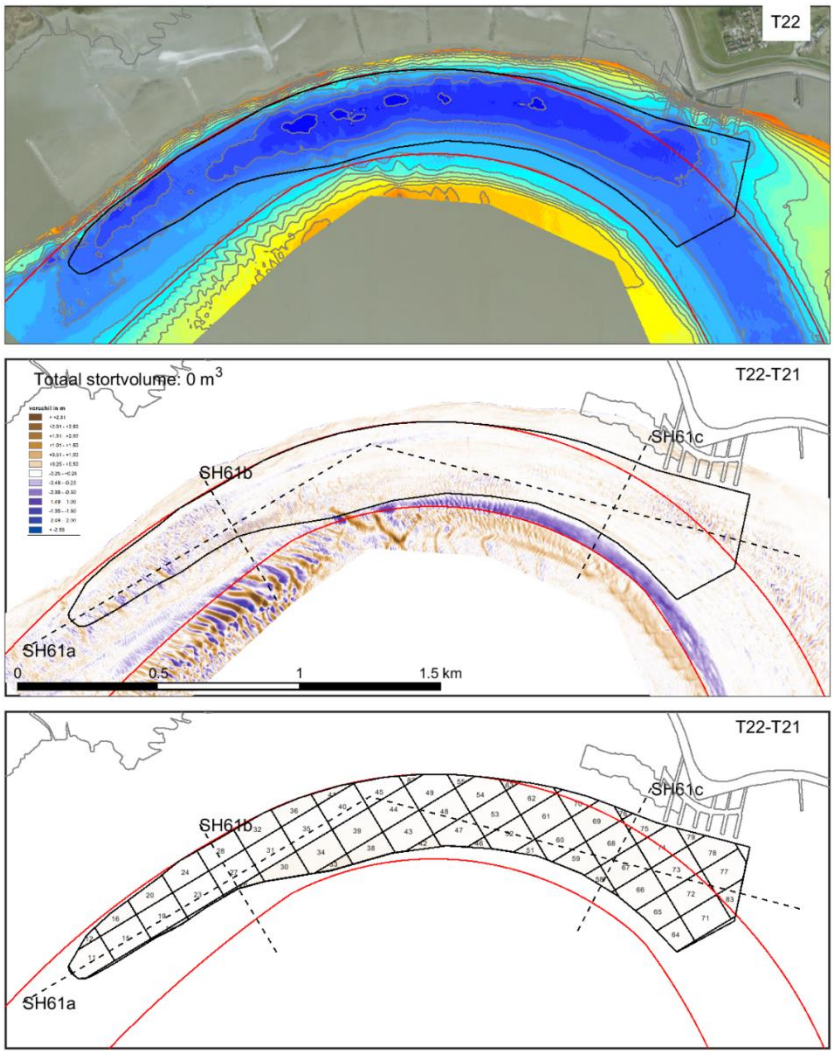

Figuur 7-6: Morfologische veranderingen bij SH61 tussen T22 en T21.

7.2.5 Analyse augustus en september

In Tabel 7-5 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 7-5: Feitelijke informatie voor SH61 in augustus en september 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Augustus: geen stortingen September: geen stortingen	Figuur 7-1
Peilingen	-	-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	-	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	-	-

Er werden in deze periode geen peilingen aangeleverd.


7.2.6 Analyse oktober en november

In Tabel 7-6 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 7-6: Feitelijke informatie voor SH61 in oktober en november 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Oktober: geen stortingen November: geen stortingen	Figuur 7-1
Peilingen	T23 (24/09/2025)	Figuur 7-8, Bijlage A.6
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T23 (24/09/2025) – T0 (08/03/2021): -7%	Figuur 7-1
Profielen	Langs doorsnedes SH61a, SH61b en SH61c	Figuur 7-2, Figuur 7-7
Verschilkaarten	T23 – T0 (24/09/2025– 08/03/2021) T23 – T22 (24/09/2025– 02/06/2025): • Stortvolume: geen stortingen • Peilvolume: ca. -8 000 m³	Figuur 7-8, Bijlage A.6


Voor deze periode worden de aangeleverde profielen getoond in Figuur 7-7. Om de bodemontwikkeling in een breder historisch kader te plaatsen wordt de nieuwe peiling vergeleken met de voorafgaande peiling, alsook met het referentiepeil T0.

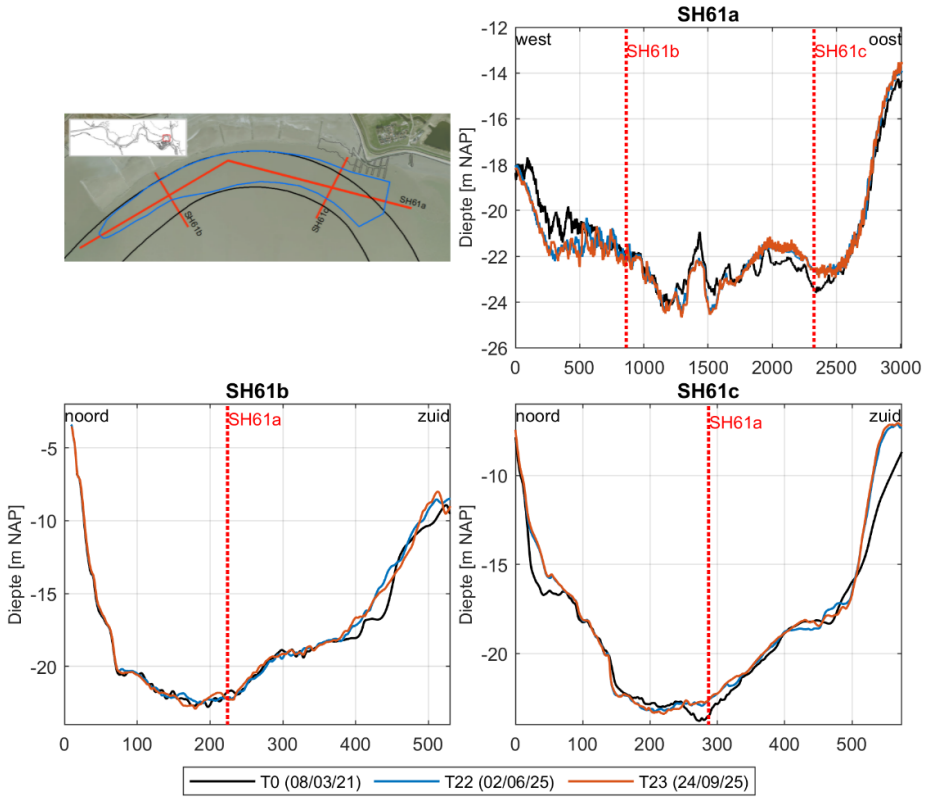

Figuur 7-7: Evolutie van de bathymetrie langs doorsnedes SH61a, SH61b en SH61c bij stortzone SH61 sinds 2021.

In stortzone **SH61** wordt sinds mei 2024 niet meer gestort. Op de verschilkaart T23-T22 zijn met name in het westelijk deel van de stortzone bodemvormen zichtbaar (Figuur 7-8). Echter, de verschillen tussen T23 en T22 zijn minimaal. Eveneens is in Figuur 7-7 bij raai SH61b waar te nemen dat deze verschillen miniem zijn. Ten opzichte van To is de stortzone in het zuiden licht ondieper geworden. In het oostelijk deel van de stortzone zijn de morfologische veranderingen zeer beperkt. De relatieve volumeverandering tussen de laatste peiling (T23) en de referentiepeiling (T0) blijft negatief en bedraagt -7% (Figuur 7-1).

In het kader van het onderhouden van de vaargeul worden regelmatig baggerwerken uitgevoerd. Na de laatste baggerwerken is in de binnenbocht van de vaarweg duidelijke verdieping te zien in de werkstrook (Figuur 7-8).

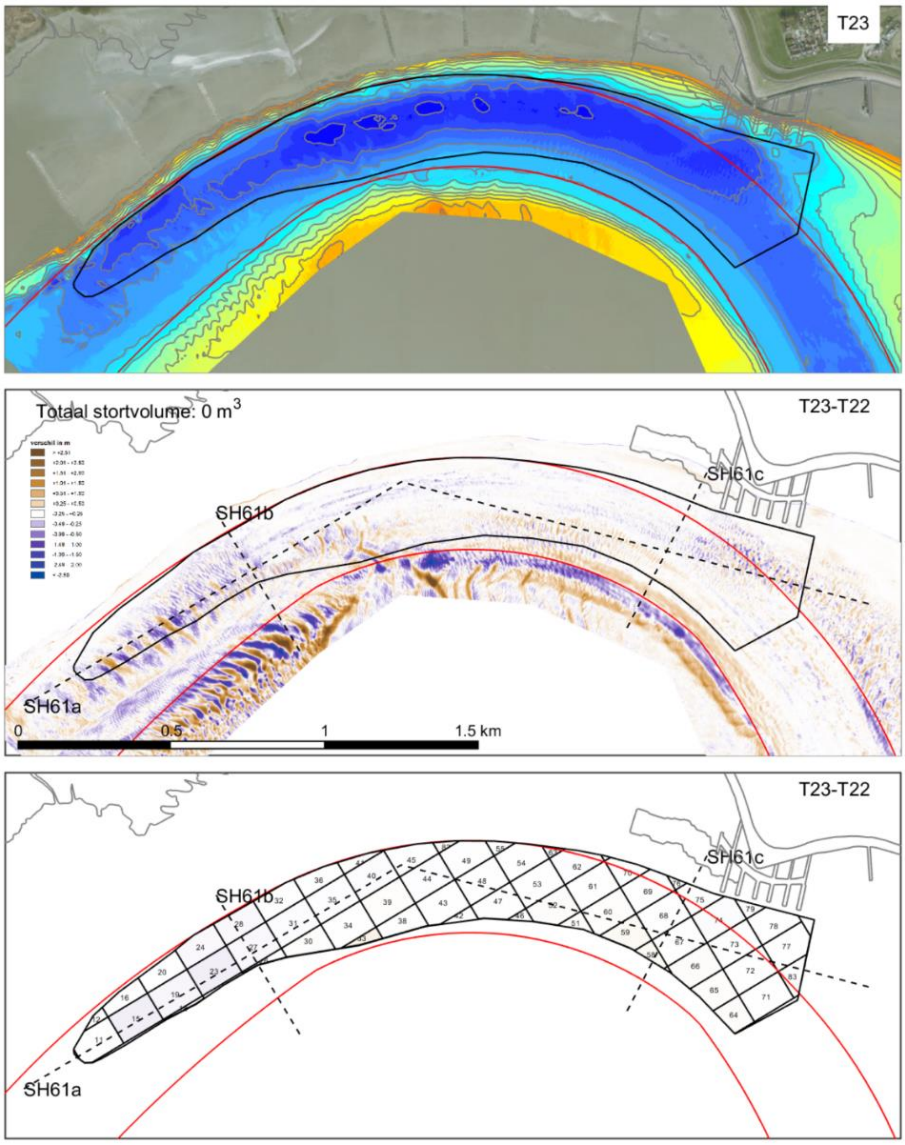

Figuur 7-8: Morfologische veranderingen bij SH61 tussen T23 en T22.

7.2.7 Analyse december

In Tabel 7-7 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 7-7: Feitelijke informatie voor SH61 in december 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	December: geen stortingen	Figuur 7-1
Peilingen	-	-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	-	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	-	-

Er werden in deze periode geen peilingen aangeleverd.


8 SH71

8.1 Resultaten lopend vergunningsjaar

De zone SH71 wordt mee opgenomen in de evaluatie van de stortactiviteiten in functie van het verder verfijnen van de in te zetten stortvakken in deze stortzone.


De relatieve volumeverandering van de stortzone (in %) wordt geëvalueerd door het (cumulatieve) stortvolume te vergelijken met het gepeilde volume op de bodem ten opzichte van een referentiepeiling.

De relatieve volumeverandering van de stortzone SH71 is weergegeven in Figuur 8-1. Als referentiepeiling is de eerste peiling T0 (07/01/2021) geselecteerd (uit het GOPS-project). De relatieve volumeverandering van de stortzone SH71 wordt berekend ten opzichte van dit referentiepeil.

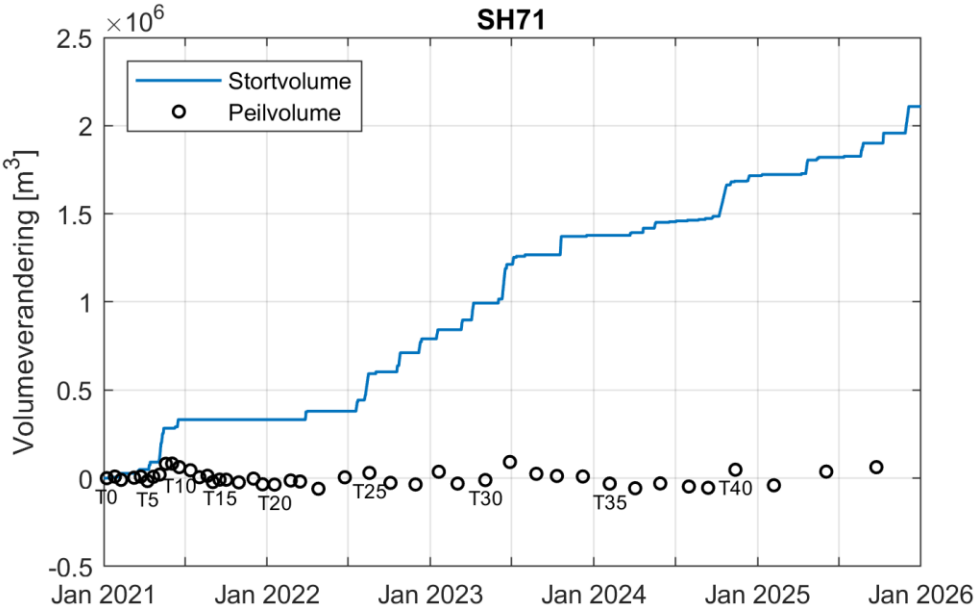

Figuur 8-1: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen voor de complete stortzone voor SH71.

Voor SH71 wordt de bodemontwikkeling op basis van profielen opgevolgd en voor het volledig vergunningsjaar 2025 weergegeven in Figuur 8-2. De referentiepeiling (T0, 07/01/2021) wordt eveneens opgenomen om de bodemontwikkeling op lange termijn op te volgen.

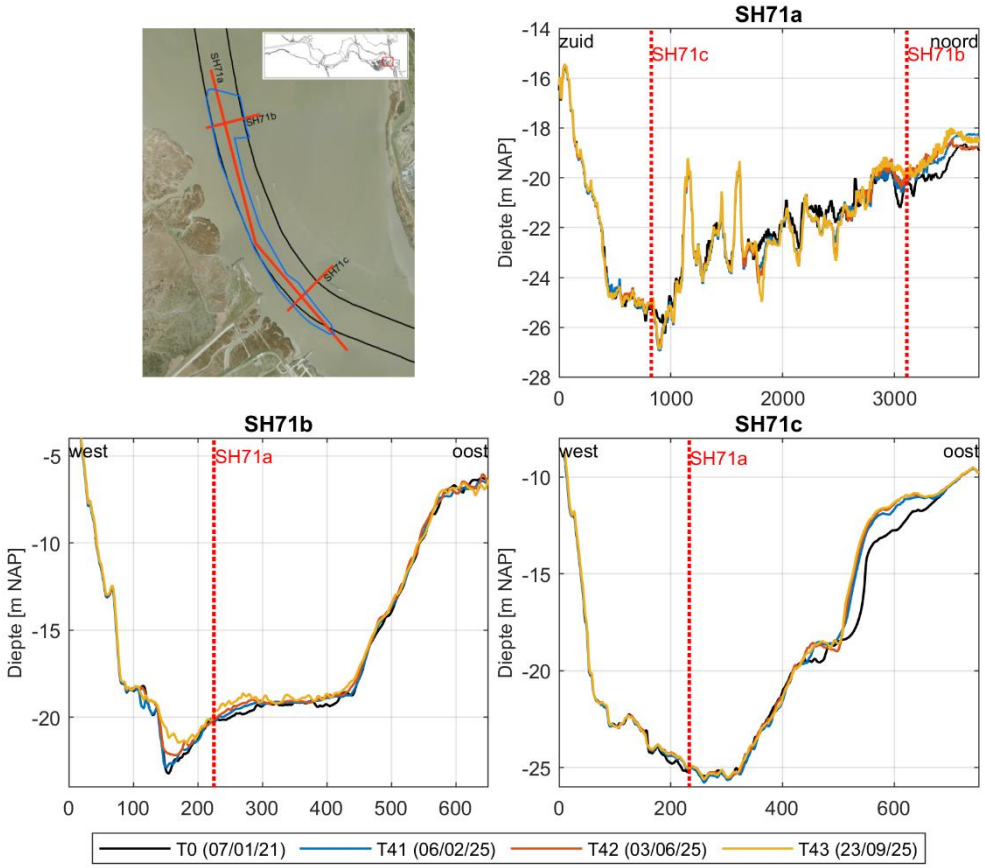

Figuur 8-2: Evolutie van de bathymetrie voor vergunningsjaar 2025 langs doorsnedes SH71a, SH71b en SH71c bij stortzone SH71.

8.2 Resultaten maandrapportages

8.2.1 Analyse januari

In Tabel 8-1 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 8-1: Feitelijke informatie voor SH71 in januari 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Januari: ca. 7 000 m³	Figuur 8-1
Peilingen	-	-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	-	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	-	-

Er werden in deze periode geen peilingen aangeleverd.


8.2.2 Analyse februari en maart

In Tabel 8-2 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 8-2: Feitelijke informatie voor SH71 in februari en maart 2025.


Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Februari: geen stortingen Maart: geen stortingen	Figuur 8-1
Peilingen	T41 (06/02/2025)	Figuur 8-4; Bijlage A.2
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T41 – T0 (06/02/2025 – 07/01/2021): -2%	Figuur 8-2
Profielen	Langs doorsnedes SH71a en SH71b	Figuur 8-3
Verschilkaarten	T41 – T0 (06/02/2025 – 07/01/2021) T41 – T40 (06/02/2025 – 12/11/2024): • Stortvolume: ca. 38 000 m³ • Peilvolume: ca. -88 000 m³	Figuur 8-4; Bijlage A.2

Voor deze periode worden de aangeleverde profielen getoond in Figuur 8-3. Om de bodemontwikkeling in een breder historisch kader te plaatsen wordt de nieuwe peiling vergeleken met de voorafgaande peiling, alsook met de referentiepeiling T0.

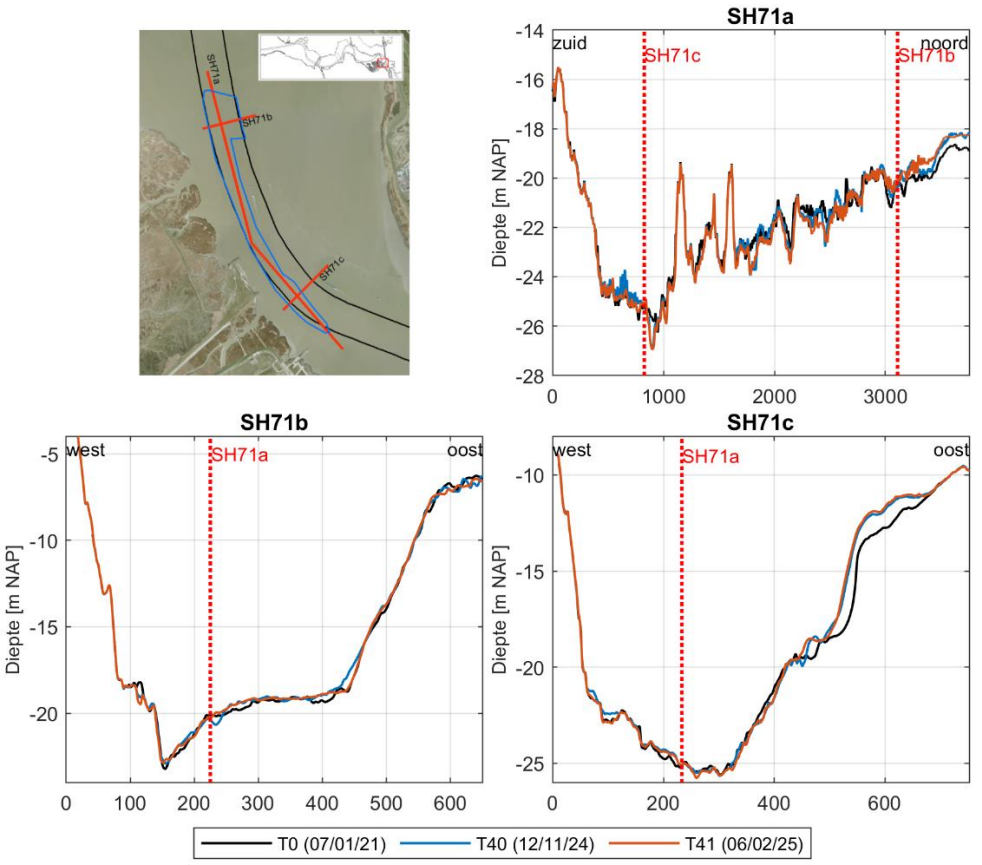

Figuur 8-3: Evolutie van de bathymetrie voor vergunningsjaar 2025 langs doorsnedes SH71a, SH71b en SH71c bij stortzone SH71 sinds 2021.

In **SH71** werd in de periode T40-T41 gestort in het midden en zuiden van de stortzone. Er vindt voornamelijk verdieping plaats ter hoogte van de gebruikte stortvakken (Figuur 8-4). Dit is waarschijnlijk het gevolg van de erosie van het eerder gestort materiaal.

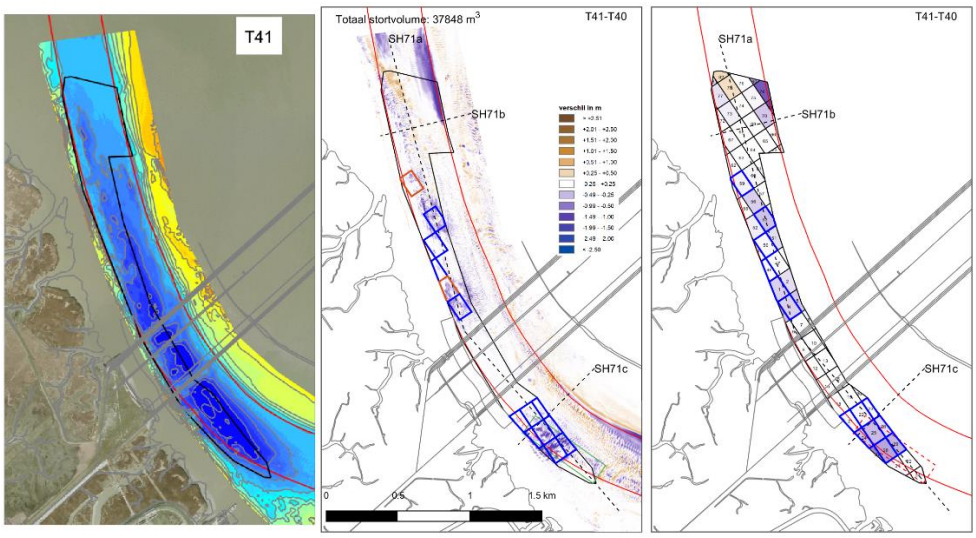

Figuur 8-4: Morfologische veranderingen bij SH71 tussen T40 en T41. In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

8.2.3 Analyse april en mei

In Tabel 8-3 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 8-3: Feitelijke informatie voor SH71 in april en mei 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	April: ca. 82 000 m³ Mei: ca. 16 000 m³	Figuur 8-1
Peilingen	-	-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	-	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	-	-

Er werden in deze periode geen peilingen aangeleverd.

8.2.4 Analyse juni en juli


In Tabel 8-4 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 8-4: Feitelijke informatie voor SH71 in juni en juli 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Juni: geen stortingen Juli: ca. 6 000 m³	Figuur 8-1


Parameter	Commentaar	Figuur
Peilingen	T42 (03/06/2025)	Figuur 8-6; Bijlage A.4
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T42 – T0 (03/06/2025 – 07/01/2021): 2%	Figuur 8-2
Profielen	Langs doorsnedes SH71a en SH71b	Figuur 8-5
Verschilkaarten	T42 – T0 (03/06/2025 – 07/01/2021) T42 – T41 (03/06/2025 – 06/02/2025): • Stortvolume: ca. 98 000 m³ • Peilvolume: ca. 78 000 m³	Figuur 8-6; Bijlage A.4

Voor deze periode worden de aangeleverde profielen getoond in Figuur 8-5. Om de bodemontwikkeling in een breder historisch kader te plaatsen wordt de nieuwe peiling vergeleken met de voorafgaande peiling, alsook met de referentiepeiling T0.

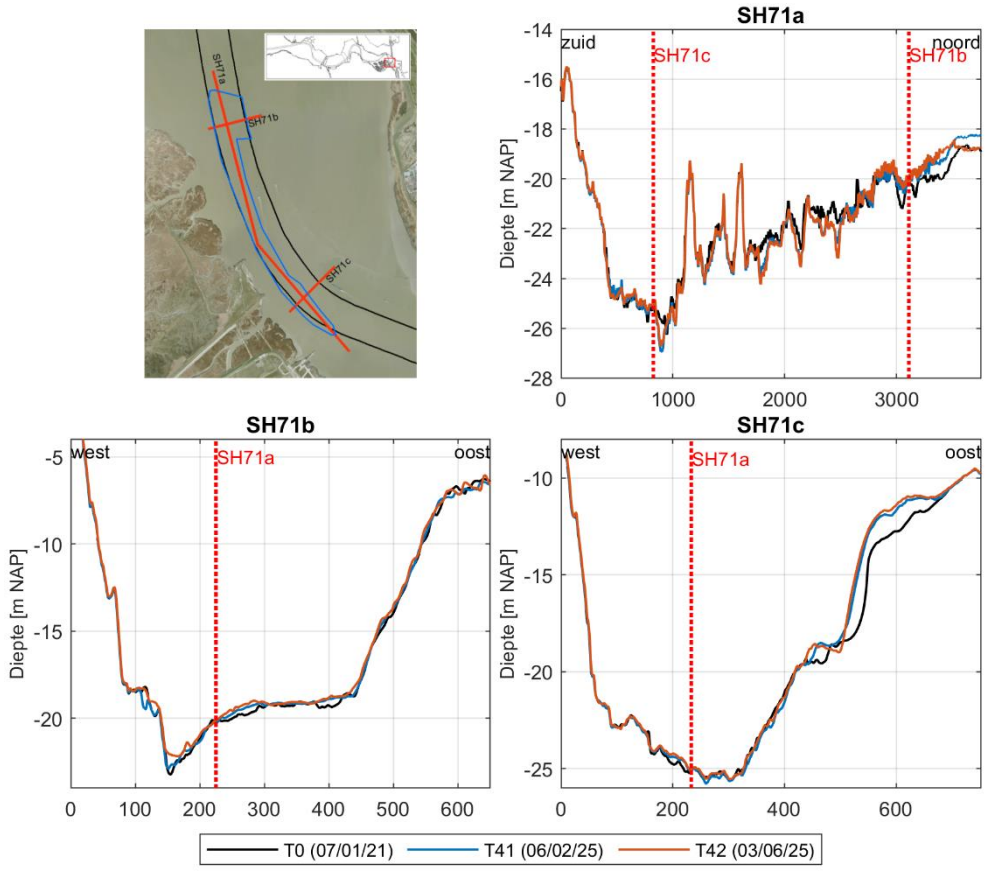

Figuur 8-5: Evolutie van de bathymetrie voor vergunningsjaar 2025 langs doorsnedes SH71a, SH71b en SH71c bij stortzone SH71 sinds 2021.

In **SH71** werd in de periode T41-T42 gestort in zowel het noorden als het zuiden van de stortzone. Er vindt voornamelijk verondieping plaats ter hoogte van de gebruikte stortvakken (Figuur 8-6). Dit is waarschijnlijk het gevolg van het gestort materiaal.

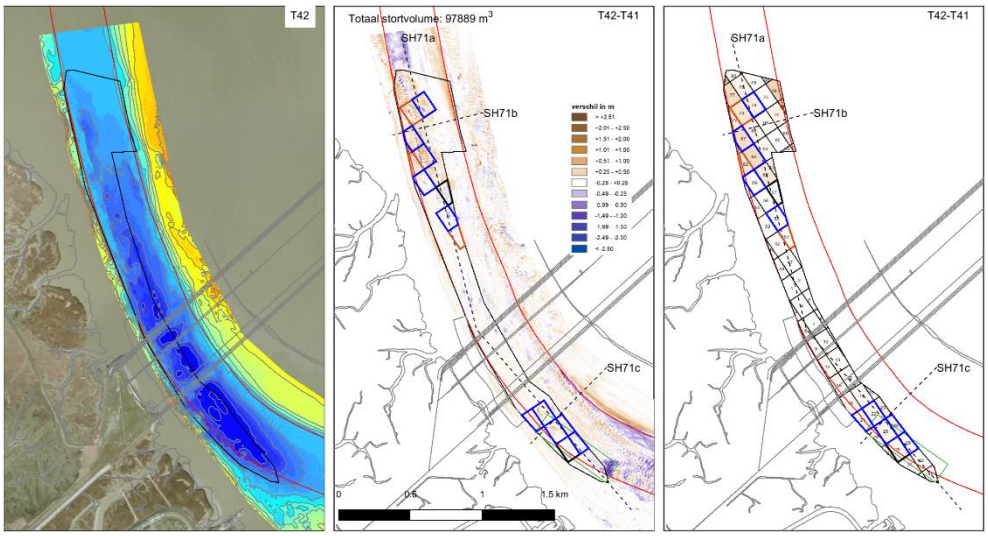

Figuur 8-6: Morfologische veranderingen bij SH71 tussen T41 en T42. In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.


8.2.5 Analyse augustus en september

In Tabel 8-5 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 8-5: Feitelijke informatie voor SH71 in augustus en september 2025.


Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Augustus: geen stortingen September: ca. 6 000 m³	Figuur 8-1
Peilingen	T43 (23/09/2025)	Figuur 8-8; Bijlage A.5
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T43 – T0 (23/09/2025 – 07/01/2021): 3%	Figuur 8-2
Profielen	Langs doorsnedes SH71a en SH71b	Figuur 8-7
Verschilkaarten	T43 – T0 (23/09/2025 – 07/01/2021) T43 – T42 (23/09/2025 – 03/06/2025): • Stortvolume: ca. 80 000 m³ • Peilvolume: ca. 25 000 m³	Figuur 8-8; Bijlage A.5

Voor deze periode worden de aangeleverde profielen getoond in Figuur 8-7. Om de bodemontwikkeling in een breder historisch kader te plaatsen wordt de nieuwe peiling vergeleken met de voorafgaande peiling, alsook met de referentiepeiling T0.

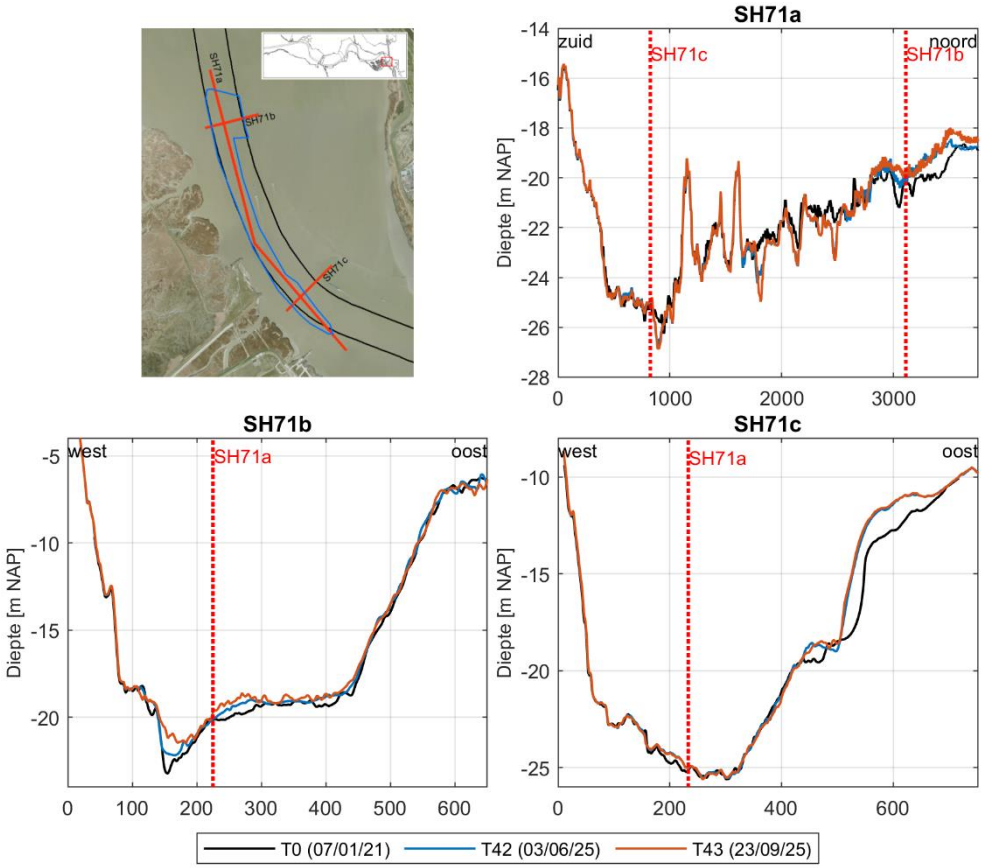

Figuur 8-7: Evolutie van de bathymetrie voor vergunningsjaar 2025 langs doorsnedes SH71a, SH71b en SH71c bij stortzone SH71 sinds 2021.

In **SH71** werd in de periode T42-T43 gestort in zowel het noorden als het zuiden van de stortzone. Er vindt voornamelijk verondieping plaats in het noordelijke deel van de zone, ter hoogte van de gebruikte stortvakken en ten noorden van de zone (Figuur 8-8). Dit is mogelijk het gevolg van de noordelijke migratie van het gestorte sediment.

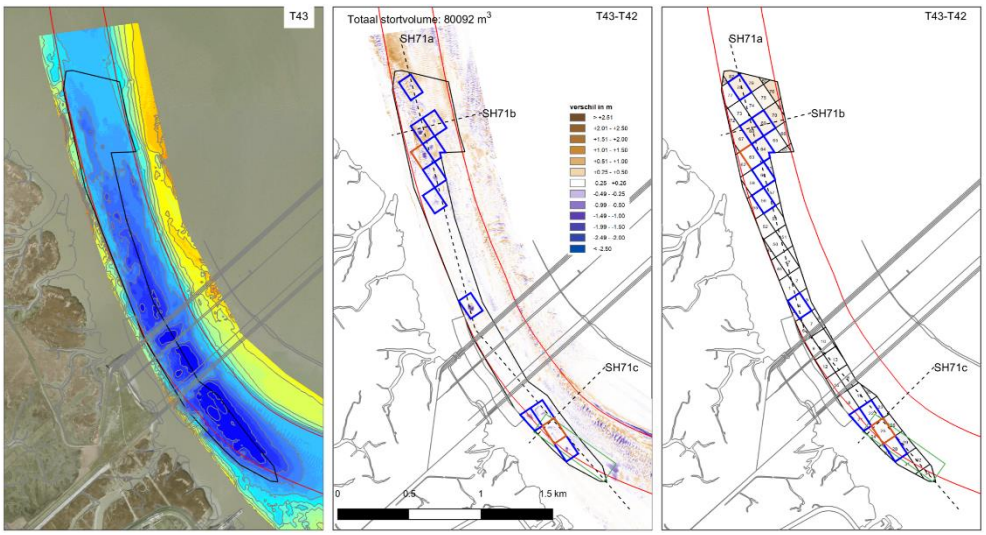

Figuur 8-8: Morfologische veranderingen bij SH71 tussen T42 en T43. In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

8.2.6 Analyse oktober en november

In Tabel 8-6 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 8-6: Feitelijke informatie voor SH71 in oktober en november 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Oktober: ca. 57 000 m³ November: ca. 61 000 m³	Figuur 8-1
Peilingen	-	-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	-	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	-	-

Er werden in deze periode geen peilingen aangeleverd.

8.2.7 Analyse december

In Tabel 8-7 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 8-7: Feitelijke informatie voor SH71 in december 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	December: ca. 79 000 m³	Figuur 8-1
Peilingen	-	-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	-	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	-	-

Er werden in deze periode geen peilingen aangeleverd.


9 Overige stortzones

9.1 SN11

9.1.1 Analyse juli 2024 – december 2025

Stortzone SN11 wordt jaarlijks gepeild als onderdeel van de grote peiling van het gebied rond de Hooge Platen. De meest recente peiling werd uitgevoerd op 14/10/2025 (T3), terwijl de voorgaande peiling werd gedaan op 17/06/2024 (T2). Het stortvolume in stortzone SN11 deze periode was ca. 1 923 000 m³, terwijl een volumeverschil van ca. 616 000 m³ werd opgemeten. Ten opzichte van referentiepeiling T0 (18/07/2022), is de relatieve volumeverandering in de zone ca. 31%.

In de periode T3-T2 (16 maanden) is er bij **SN11** verondieping waar te nemen ter hoogte van de gebruikte stortvakken in het oostelijk deel van de stortzone SN11 (Figuur 9-1). Ook migreert de vloedschaar van de Schaar van Spijkerplaat naar het noorden, wat leidt tot verondieping aan de zuidrand van de stortzone. Ook de migratie van sediment uit de stortingen in HPW, ten zuiden van SN11, dragen hier mogelijk voor een deel aan bij. Het centrale deel van SN11 is licht verdiept en ter hoogte van de gebruikte stortvakken in het westelijke deel is er weinig verandering in de bathymetrie waargenomen.

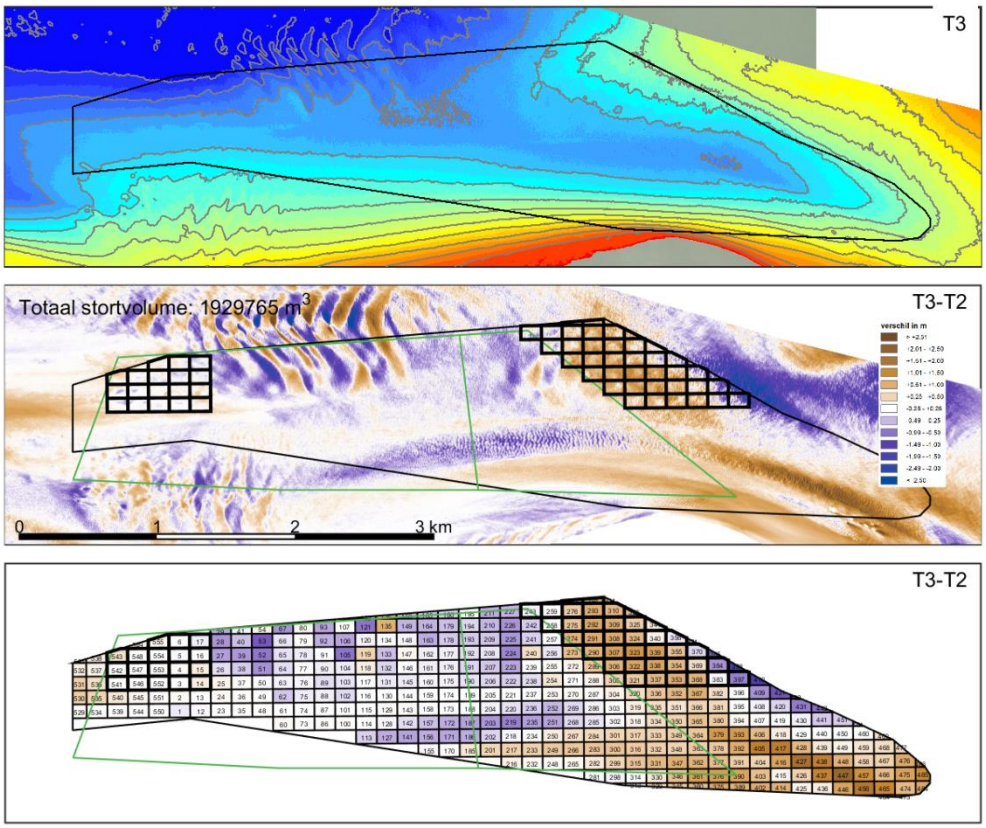


Figuur 9-1: Bathymetrie van T3 bij SN11 (boven), morfologische veranderingen bij SN11 tussen T3 en T2 (midden) en stortvakgemiddelde bodemhoogteverandering (onder) In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

9.2 SN31


De relatieve volumeverandering van de stortzone (in %) wordt geëvalueerd door het (cumulatieve) stortvolume te vergelijken met het gepeilde volume op de bodem ten opzichte van een referentiepeiling.

De relatieve volumeverandering van de stortzone SN31 is weergegeven in Figuur 9-2. De relatieve volumeverandering van de stortzone SN31 wordt berekend ten opzichte van referentiepeil T0 (05/07/2022). In Figuur 9-2 worden enkel de peilingen weergegeven die de volledige stortzone bedekken.

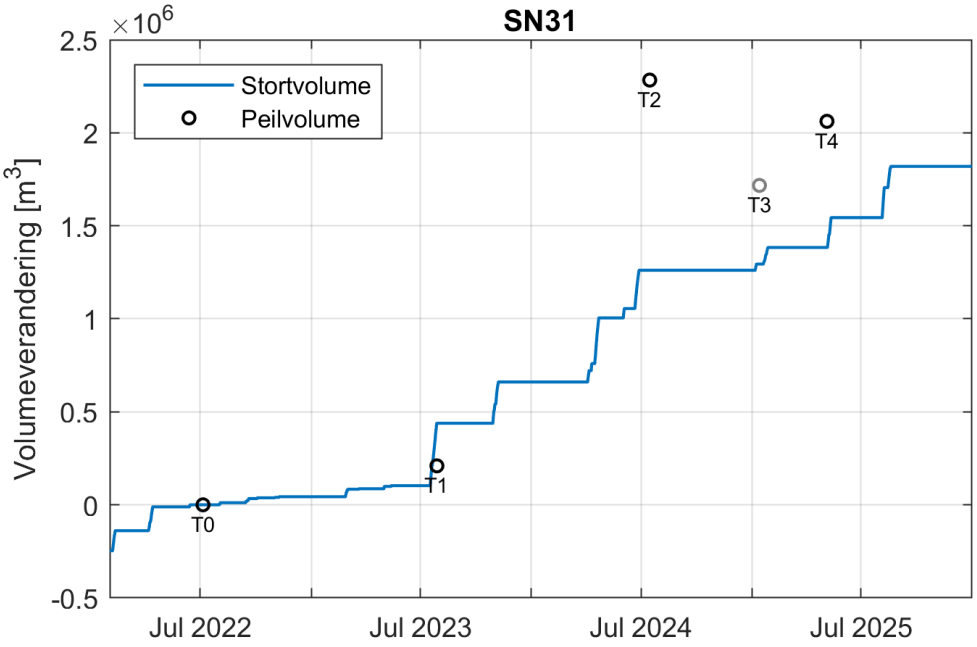


Figuur 9-2: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen in de complete stortzone SN31. De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking.

De stortingen in SN31 vinden voornamelijk plaats in het zuidwestelijke deel van de stortzone. Om de relatieve volumeverandering van de zone waar de stortingen plaats vinden beter te kunnen inschatten, is de stortzone gesplitst in 3 delen: een zuidwestelijk deel (SN31-WestZ), een noordwestelijk deel (SN31-WestN) en een oostelijk deel (SN31-Oost) (Figuur 9-3).

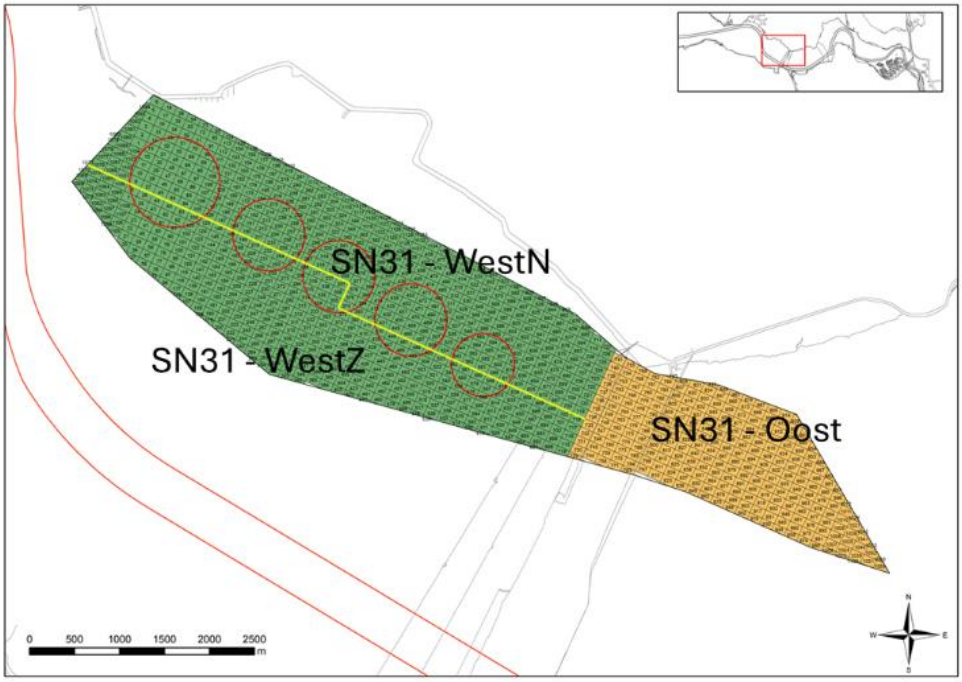

Figuur 9-3: Deelzones SN31-WestZ, SN31-WestN (groen) en SN31-Oost (oranje) van de stortzone SN31, ankergebieden zijn aangeduid in rood.

De relatieve volumeverandering van de deelzones van SN31 is weergegeven in Figuur 9-4, hierin zijn enkel de peilingen opgenomen die de volledige stortzone bedekken.

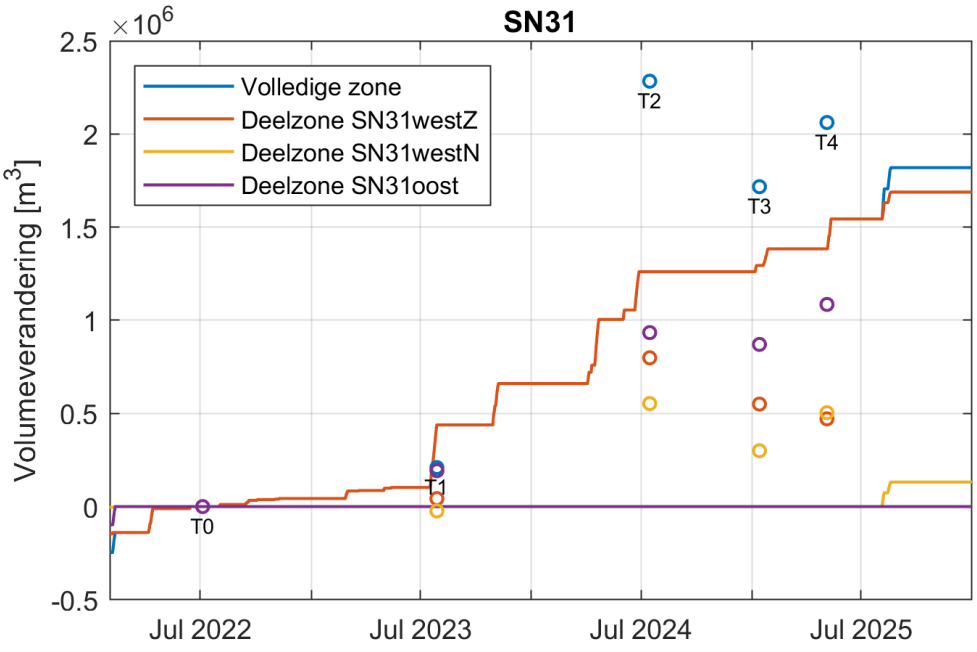

Figuur 9-4: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen voor de complete stortzone en deelzones van SN31.

9.2.1 Analyse juli 2024 – januari 2025


In Tabel 9-1 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 9-1: Feitelijke informatie voor SN31 tussen juli 2024 en januari 2025. De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Augustus tot december 2024: geen stortingen Januari 2025: ca. 123 000 m³	Figuur 9-4
Peilingen	T3 (13/01/2025)	Figuur 9-5; Bijlage A.1
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T3 – T0 (13/01/2025 – 05/07/2022): 133% Deelzone SN31-west: • T3-T0: 66%	Figuur 9-4
Profielen	-	-
Verschilkaarten	T3 – T0 (13/01/2025 – 05/07/2022) T3 – T2 (13/01/2025 – 15/07/2024): • Stortvolume: ca. 33 000 m³ • Peilvolume: ca. -566 000 m³	Figuur 9-5; Bijlage A.1

In de periode T3-T2 (6 maanden) is er bij **SN31** verdieping verspreid over de stortzone en ter hoogte van de gebruikte stortvakken waar te nemen (Figuur 9-5). In het centrale deel van de stortzone zijn er migrerende bodemvormen. Ter hoogte van de DOW-leidingen is voornamelijk verdieping te zien. De verdieping bevindt zich voornamelijk in de westelijke deelzone (Figuur 9-3), in het bijzonder ter hoogte van de stortvakken (Figuur 9-5). Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat deze verdieping waarschijnlijk een overschatting is o.w.v. de afwijkende peiling T3 (Figuur 9-2).

De zuidoostelijke punt van de stortzone richting het drempelgebied van de Everingen is sterk verondiept. Aangezien er, vanaf de door aMT gebruikte stortvakken, geen transportpaden (bodemvormen, aanzandingswaaier, etc.) richting het drempelgebied loopt, lijkt er ook geen verband te zijn tussen de stortingen en de verondieping in de zuidoostelijke punt van de stortzone. Deze verondieping is waarschijnlijk meer gerelateerd aan de morfodynamiek in het drempelgebied van de Everingen.

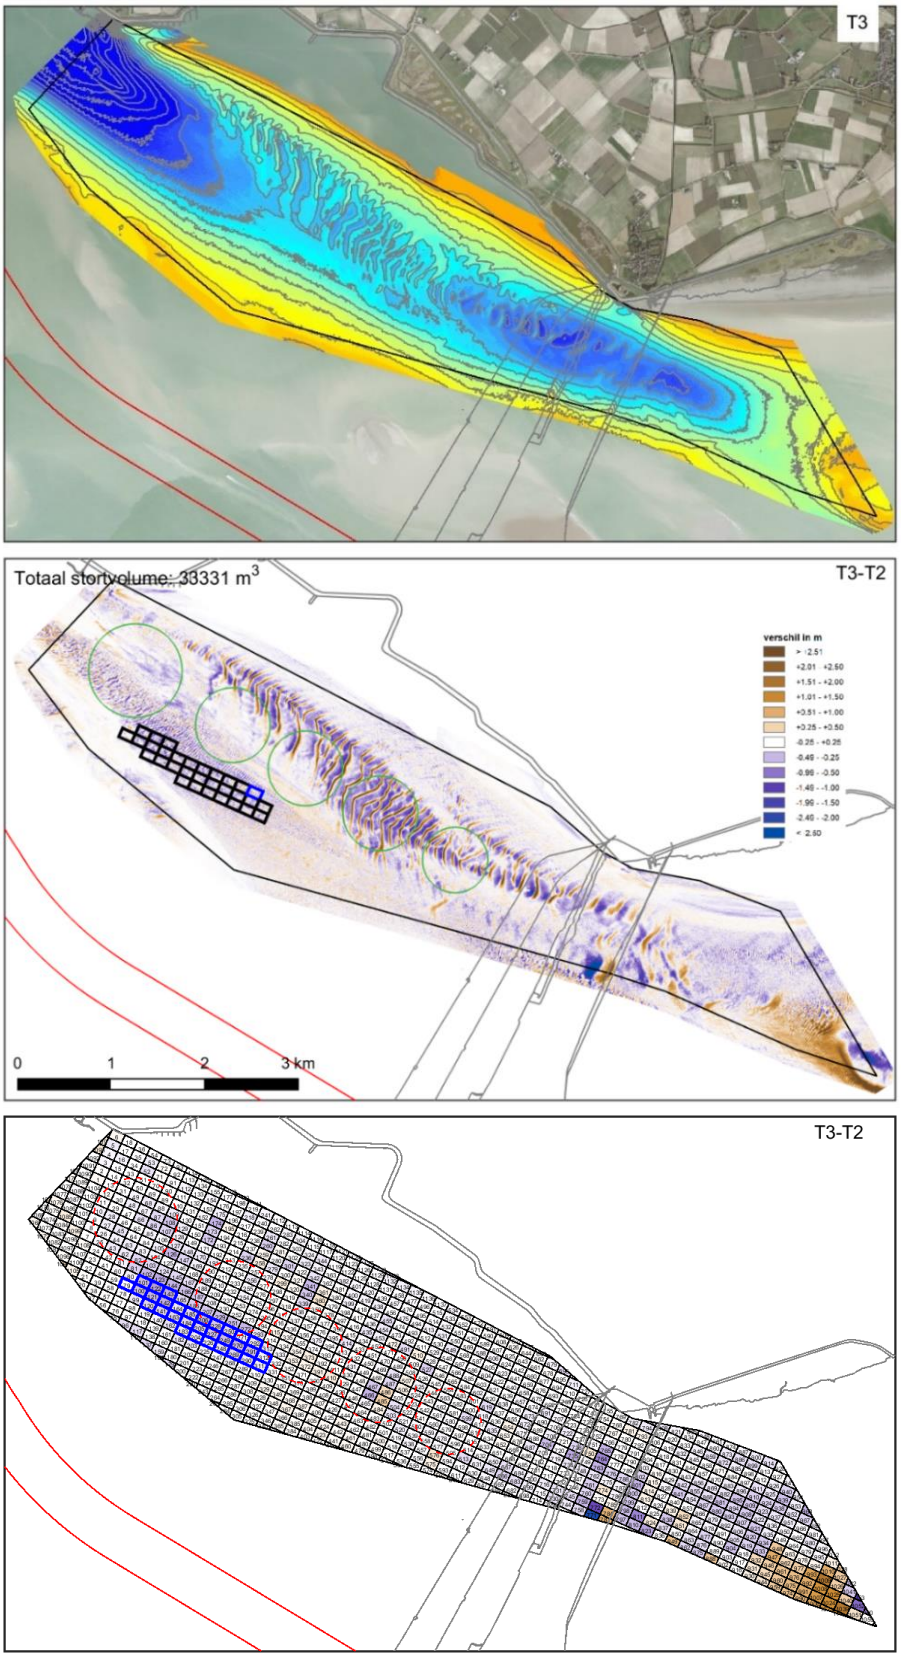

Figuur 9-5: Morfologische veranderingen bij SN31 tussen T3 en T1. In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

9.2.2 Analyse februari 2025 – mei 2025


In Tabel 9-2 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 9-2: Feitelijke informatie voor SN31 tussen februari 2025 – mei 2025. De peiling in het grijs werd opgenomen met andere meetapparatuur en vertoont een kleine afwijking.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Februari tot april 2025: geen stortingen Mei 2025: ca. 160 000 m³	Figuur 9-4
Peilingen	T4 (05/05/2025)	Figuur 9-6; Bijlage A.3
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T4 – T0 (05/05/2025– 05/07/2022): 149% Deelzone SN31-westZ: • T4-T0: 34%	Figuur 9-4
Profielen	-	-
Verschilkaarten	T4 – T0 (05/05/2025– 05/07/2022) T4 – T3 (05/05/2025 – 13/01/2025): • Stortvolume: ca. 89 000 m³ • Peilvolume: ca. 345 000 m³	Figuur 9-6; Bijlage A.3

In stortzone **SN31** is er in de periode T4-T3 (4 maanden) ca. 89 000 m³ gestort in het zuidwestelijke deel van de stortzone. Ter hoogte van de gebruikte stortvakken is er lichte verdieping zichtbaar (Figuur 9-6). Ten noordwesten van de gebruikte stortvakken komt er lichte verondieping voor, wat kan wijzen op een stroomafwaartse migratie van de gestorte sedimenten. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat deze verondieping waarschijnlijk een overschatting is o.w.v. de afwijkende peiling T3 (Figuur 9-2). Net als bij voorgaande peilingen zijn in het centrale deel van de stortzone migrerende bodemvormen zichtbaar en ter hoogte van de DOW-leidingen lokale verdieping (Figuur 9-6).

In de zuidoostelijke punt van de stortzone is net zoals tussen de voorgaande peilingen verondieping zichtbaar die wijst op veranderingen in het drempelgebied van de Everingen. Zoals eerder vermeld is deze verondieping waarschijnlijk meer gerelateerd aan de drempeldynamiek van de Everingen dan aan de stortingen.

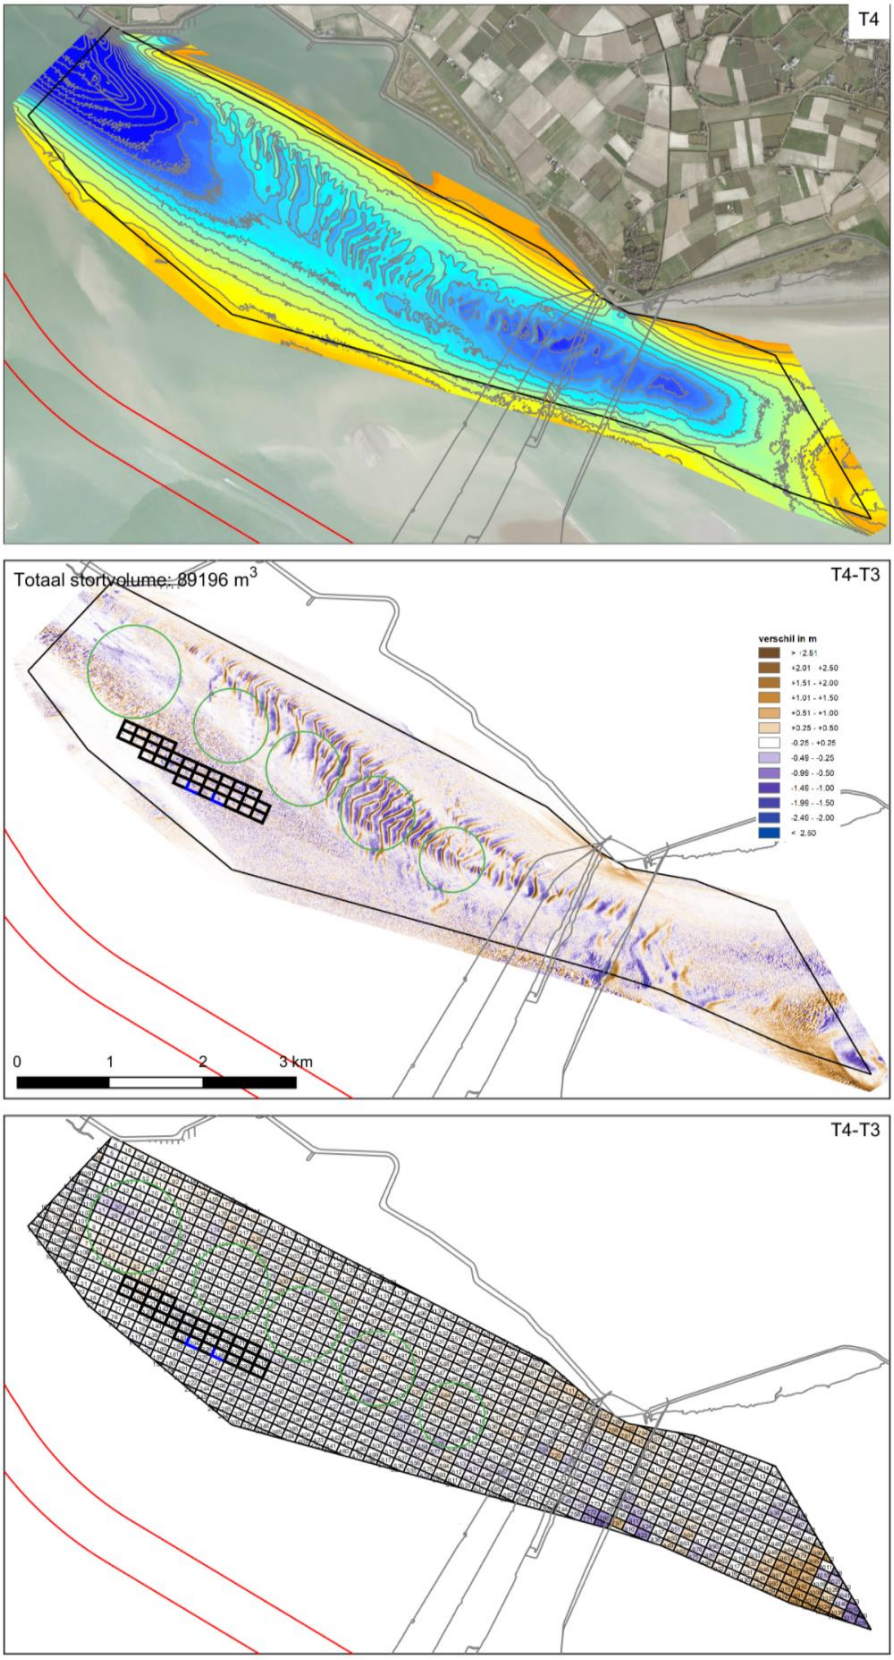

Figuur 9-6: Morfologische veranderingen bij SN31 tussen T4 en T3. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

9.2.3 Analyse juni – september 2025


In Tabel 9-3 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 9-3: Feitelijke informatie voor SN31 tussen juni 2025 – september 2025.


Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Juni-juli 2025: geen stortingen Augustus 2025: ca. 276 000 m³ September 2025: geen stortingen	Figuur 9-4
Peilingen	T5 (05/08/2025) T6 (04/09/2025)	Figuur 9-7; Figuur 9-8; Bijlage A.5
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	n.v.t.	-Figuur 9-4
Profielen	-	-
Verschilkaarten	T5 – T0 (05/08/2025 – 05/07/2022) T5 – T4 (05/08/2025 – 05/05/2025): • Stortvolume: ca. 180 000 m³ • Peilvolume: ca. -19 000 m³* T6 – T0 (04/09/2025 – 05/07/2022) T6 – T5 (04/09/2025 – 05/08/2025): • Stortvolume: ca. 256 000 m³ • Peilvolume: ca. 173 000 m³*	Figuur 9-7; Figuur 9-8; Bijlage A.5

*T5 en T6 beslaan slechts een zeer beperkt deel van stortzone SN31

In stortzone **SN31** is er in de periode T5-T4 (mei-augustus 2025) ca. 171 000 m³ gestort in het zuidwestelijke deel van de stortzone en ca. 9 000 m³ in het meest westelijke deel. In de verschilkaart, die enkel het meest westelijke deel van SN31 beslaat, is de beweging van kleine bodemvormen zichtbaar, zonder overheersende verdieping of verondieping (Figuur 9-7). In de periode T6-T5 (augustus-september 2025) werd ca. 126 000 m³ gestort in het zuidwestelijke deel van de stortzone en ca. 129 000 m³ in het meest westelijke deel van SN31. In de gebruikte stortvakken is verondieping zichtbaar (Figuur 9-8), die licht uitbreidt naar het ankergebied dat direct ten oosten gelegen is. In het overige deel van de gepeilde zone is enkel de beweging van bodemvormen zichtbaar.

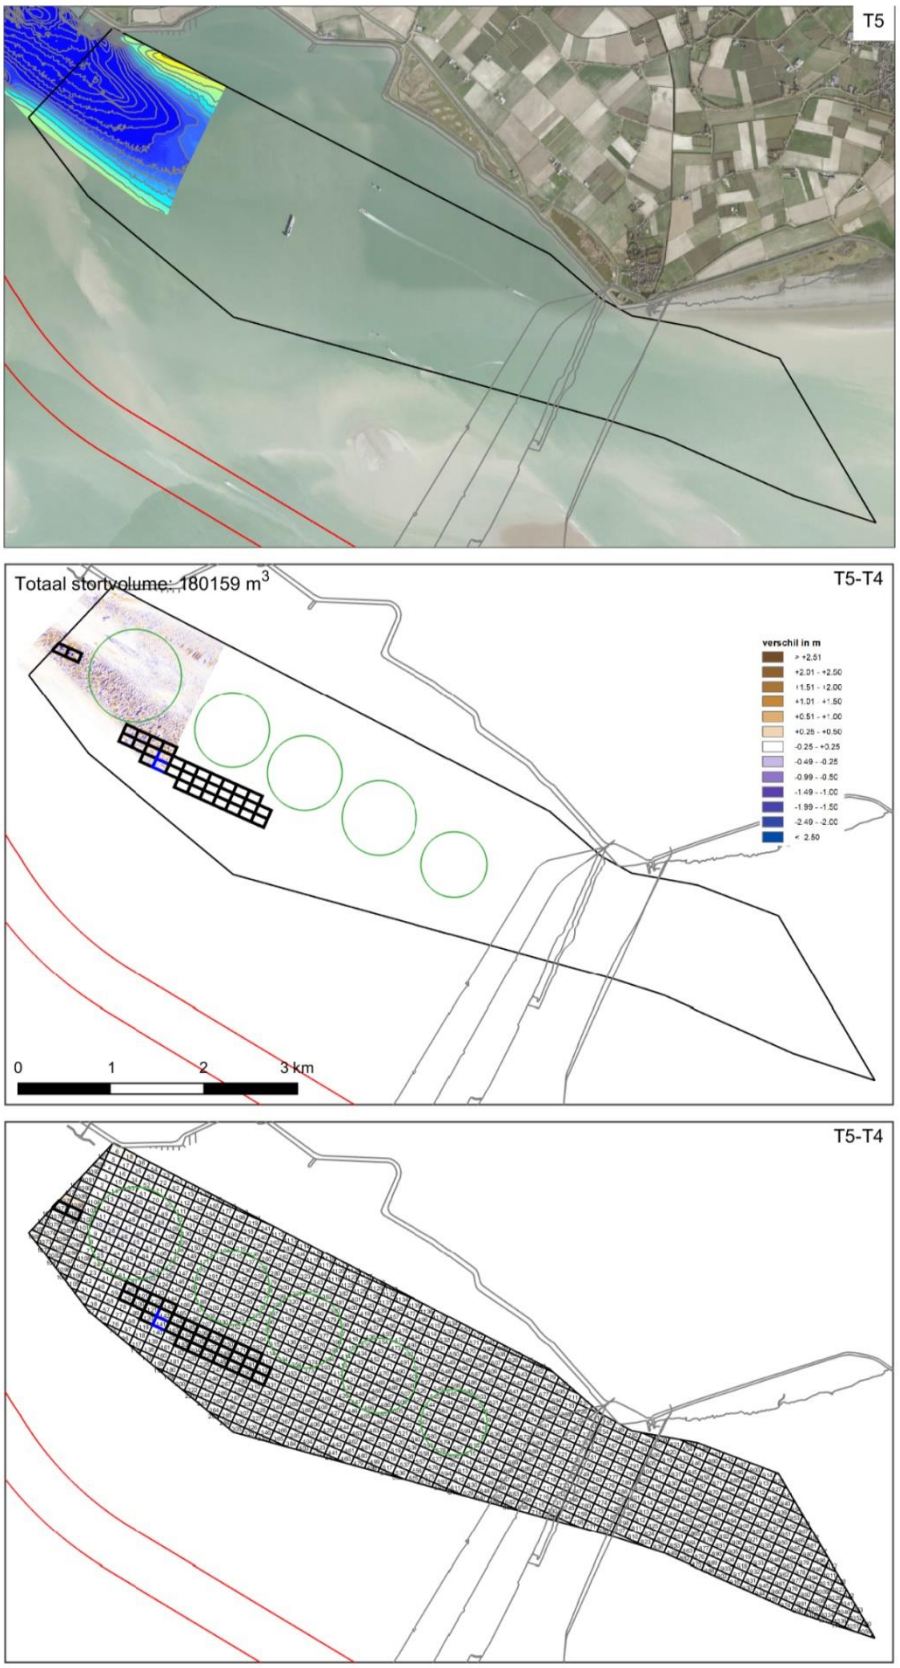

Figuur 9-7: Morfologische veranderingen bij SN31 tussen T5 en T4. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

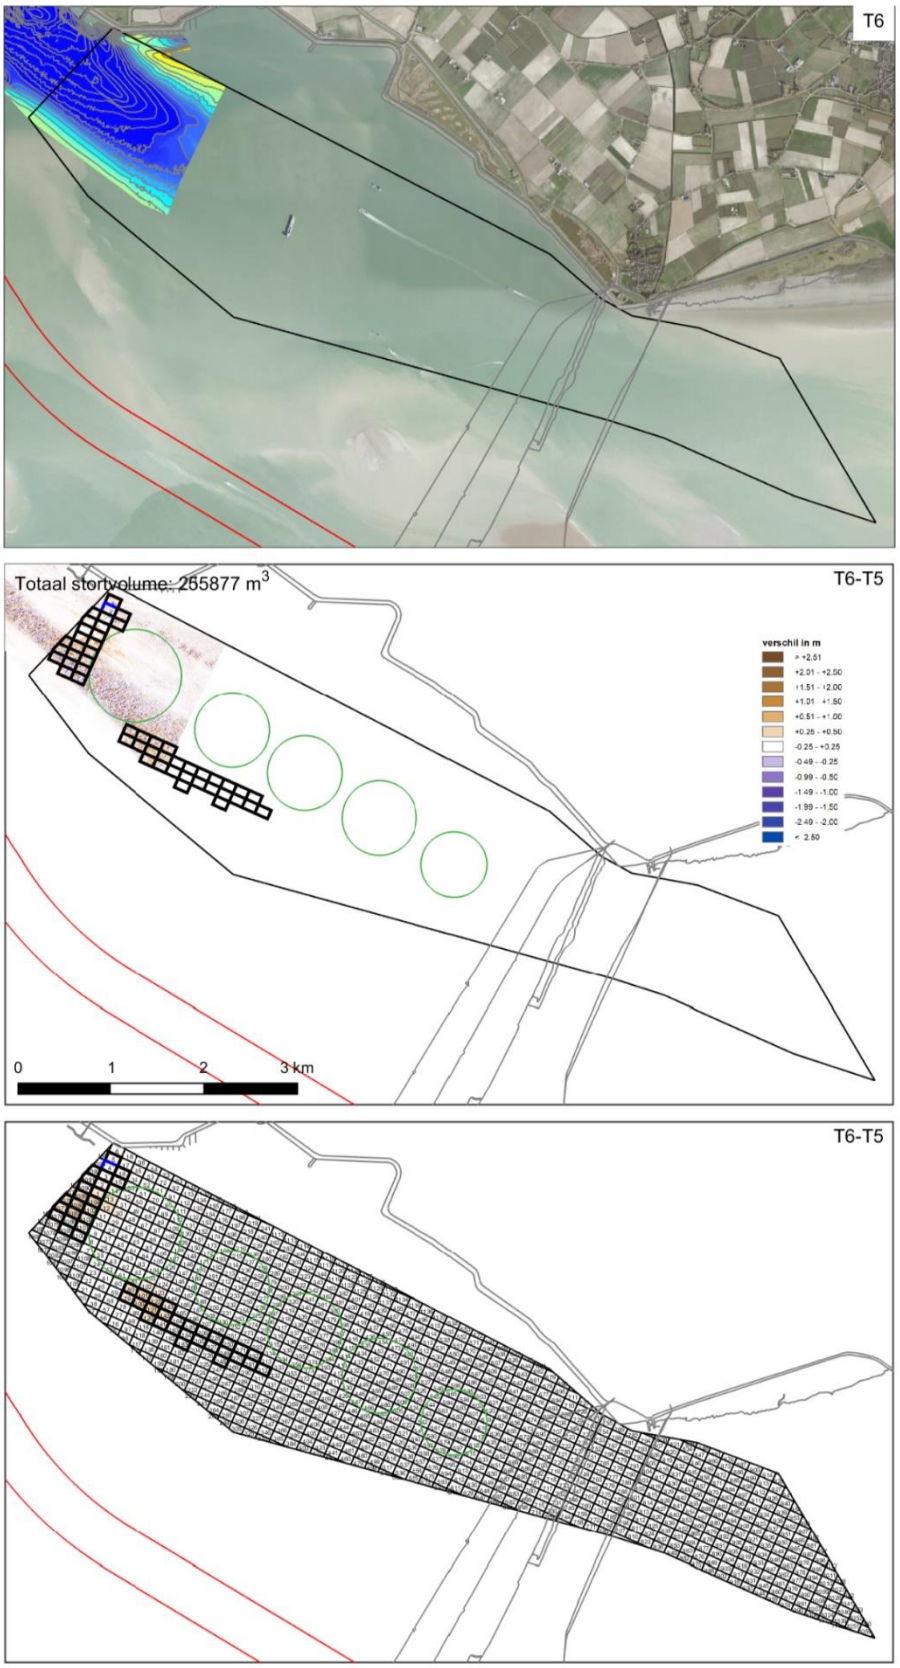

Figuur 9-8: Morfologische veranderingen bij SN31 tussen T6 en T5. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.


9.2.4 Analyse oktober – december 2025

In Tabel 9-4 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.


Tabel 9-4: Feitelijke informatie voor SN31 tussen oktober 2025 – december 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Oktober tot december 2025: geen stortingen	Figuur 9-13
Peilingen	T7 (deelpeiling, 07/10/2025) T8 (deelpeiling, 05/11/2025)	Figuur 9-9; Figuur 9-10
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	n.v.t.	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	T7-T6 (deelpeiling, 07/10/2025-04/09/2025) • Stortvolume: geen stortingen T8-T7 (deelpeiling, 05/11/2025-07/10/2025) • Stortvolume: geen stortingen	Figuur 9-9; Figuur 9-10

Er werden in deze periode twee deelpeilingen aangeleverd van het westelijke deel van SN31. In deze periodes werden er geen stortingen uitgevoerd en de morfologische veranderingen tussen de opeenvolgende deelpeilingen T6, T7 en T8 zijn klein. Opvallend is een strook met opwaarts migrerende bodemvormen door de zuidelijke helft van ankerplaats Everingen A. Ter hoogte van de eerder gebruikte stortvakken (Figuur 9-8) is een zeer beperkte verdieping zichtbaar.

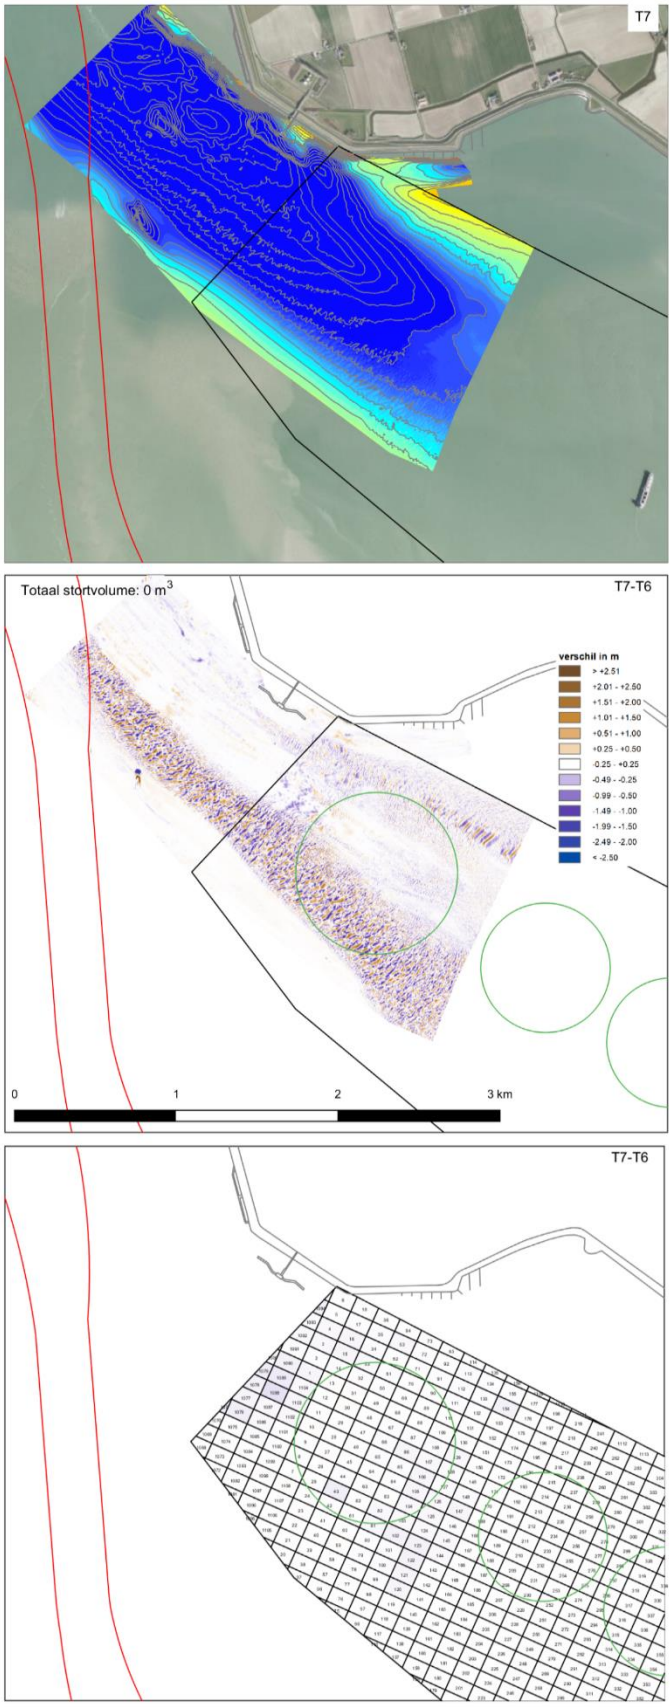

Figuur 9-9: Deelpeiling T7 en morfologische veranderingen in het westelijke deel van stortzone SN31 tussen deelpeilingen T6 en T7.

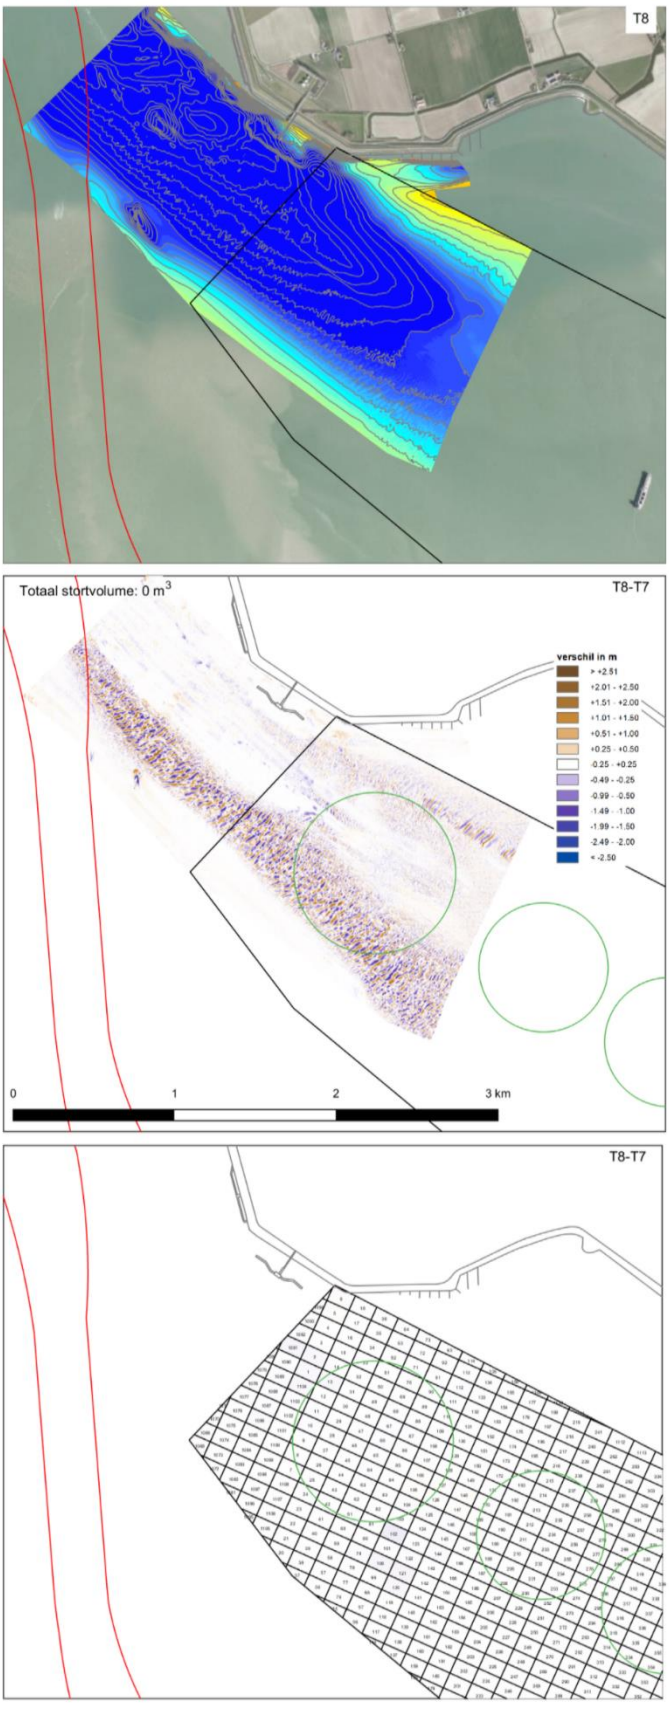


Figuur 9-10: Deelpeiling T8 en morfologische veranderingen in het westelijke deel van stortzone SN31 tussen deelpeilingen T7 en T8. Geen stortingen.

9.3 SH41

De relatieve volumeverandering van de stortzone (in %) wordt geëvalueerd door het (cumulatieve) stortvolume te vergelijken met het gepeilde volume op de bodem ten opzichte van een referentiepeiling.

De relatieve volumeverandering van de stortzone SH41 is weergegeven in Figuur 9-11. Als referentiepeiling is de eerste peiling T0 (18/07/2022) geselecteerd. De relatieve volumeverandering van de stortzone SH41 wordt berekend ten opzichte van dit referentiepeil. In Figuur 9-11 zijn enkel de peilingen opgenomen die de volledige stortzone bedekken.

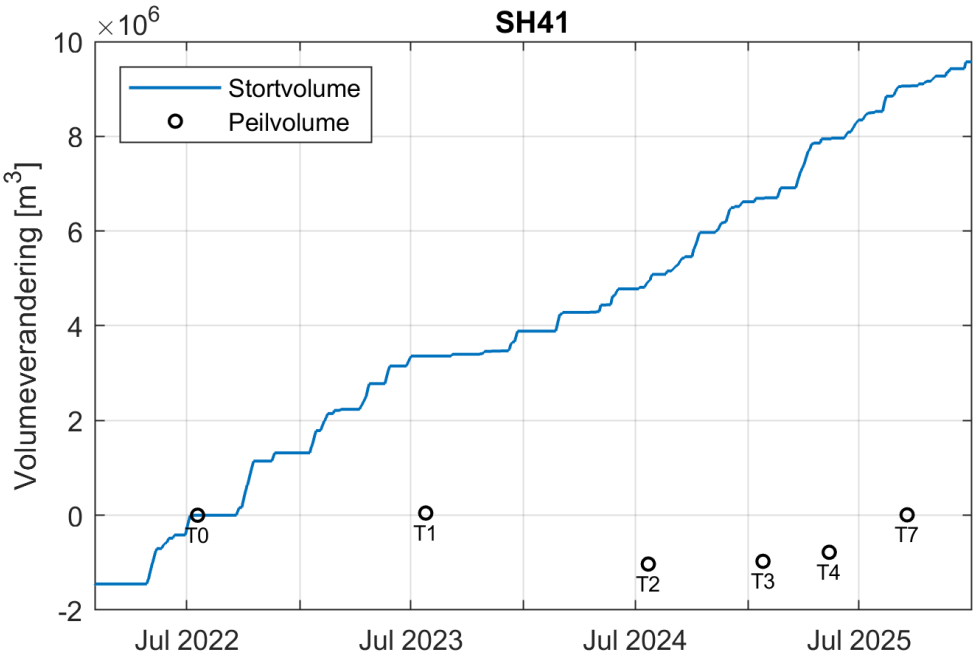


Figuur 9-11: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen in de complete stortzone SH41.

Om de relatieve volumeverandering van zone ter hoogte van de stortingen, die met name enkel in het zuidelijk deel hebben plaatsgevonden, beter te kunnen inschatten is de stortzone in een zuidelijk en noordelijk deel gesplitst (Figuur 9-12).



Figuur 9-12: Deelzones SH41-noord (groen) en SH41-zuid (oranje) van de stortzone SH41.

De relatieve volumeverandering voor de deelzones van SH41 is weergegeven in Figuur 9-13.

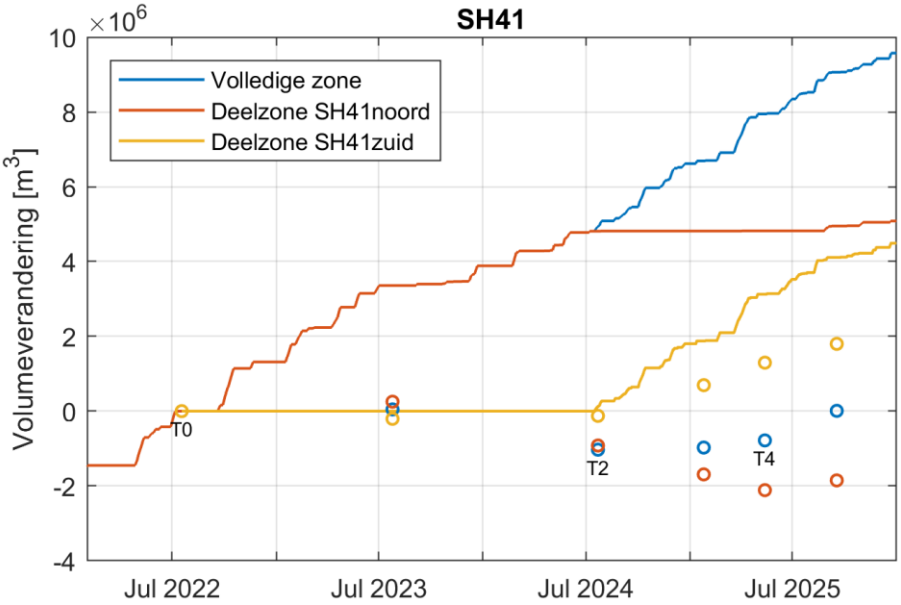

Figuur 9-13: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen voor de deelzones SH41noord en SH41zuid in stortzone SH41.


9.3.1 Analyse juli 2024 – januari 2025

In Tabel 9-5 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 9-5: Feitelijke informatie voor SH41 tussen juli 2024 en januari 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Juli 2024: ca. 308 000 m³ Augustus 2024: ca. 110 000 m³ September 2024: ca. 263 000 m³ Oktober 2024: ca. 511 000 m³ November 2024: ca. 436 000 m³ December 2024: ca. 212 000 m³ Januari 2025: ca. 83 000 m³	Figuur 9-13
Peilingen	T3 (25/01/2025)	Figuur 9-14; Bijlage A.2
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T3 – T0 (25/01/2025– 18/07/2022): -15% Deelzone SH41-noord: • T3 – T0: -35% Deelzone SH41-zuid: • T3 – T0: 37%	Figuur 9-13
Profielen	-	-
Verschilkaarten	T3 – T0 (25/01/2025 – 18/07/2022) T3 – T2 (25/01/2025 – 22/07/2024): • Stortvolume: ca. 1 754 000 m³ • Peilvolume: ca. 57 000 m³	Figuur 9-14; Bijlage A.2

In de periode T3-T2 (6 maanden) is er gekozen om enkel in het zuidelijke deel van stortzone **SH41** te storten. Binnen de stortzone is duidelijke verondieping zichtbaar ter hoogte van de gebruikte stortvakken. In het noorden van de stortzone is sterke verdieping zichtbaar ter hoogte van de erosiekuil waar tot juli 2024 nog baggerspecie gestort is. Deze uitgesproken verdieping verklaart het grote verschil tussen het stortvolume en het peilvolume in Figuur 9-13 (noordelijke deelzone). Ook in het meer centrale deel is er sprake van enige verdieping (Figuur 9-14). Mogelijk speelt hier de migratie (verondieping) van de Rug van Baarland in oostelijke richting een rol.

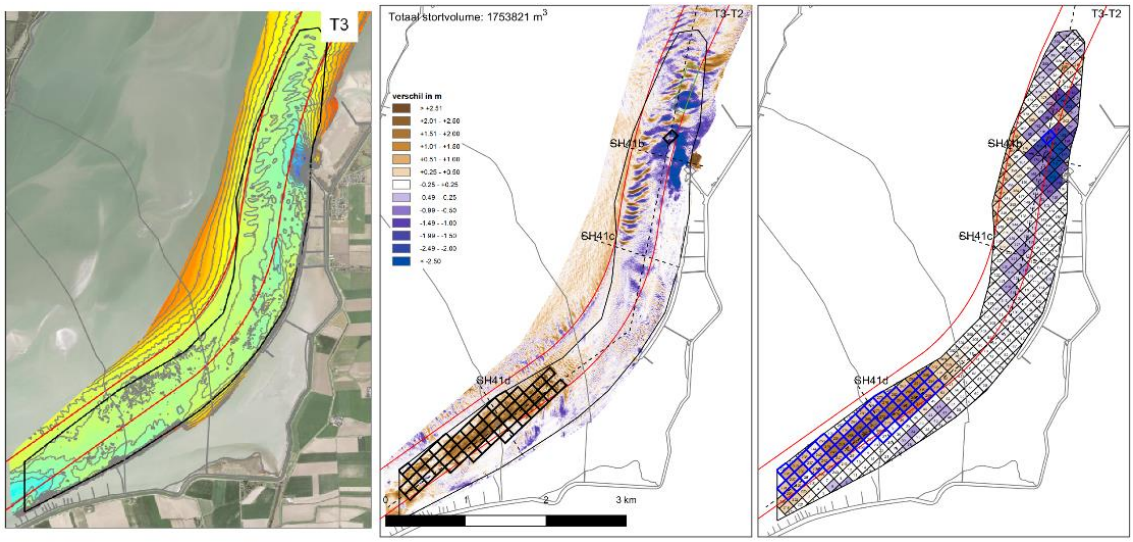

Figuur 9-14: Morfologische veranderingen in stortzone SH41 tussen T2 en T3. In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

9.3.2 Analyse februari 2025 – mei 2025


In Tabel 9-6 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 9-6: Feitelijke informatie voor SH41 tussen januari 2025 en mei 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Februari 2025: ca. 210 000 m³ Maart 2025: ca. 452 000 m³ April 2025: ca. 582 000 m³ Mei 2025: ca. 16 000 m³	Figuur 9-13
Peilingen	T4 (13/05/2025)	Figuur 9-15; Bijlage A.3
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T4 – T0 (13/05/2025– 18/07/2022): -10% Deelzone SH41-noord: • T4 – T0: -44% Deelzone SH41-zuid: • T4 – T0: 45%	Figuur 9-13
Profielen	-	-
Verschilkaarten	T4 – T0 (13/05/2025 – 18/07/2022) T4 – T3 (13/05/2025 – 25/01/2025): • Stortvolume: ca. 1 256 000 m³ • Peilvolume: ca. 192 000 m³	Figuur 9-15; Bijlage A.3

In **SH41** is er in de periode T4-T3 ca. 1 256 000 m³ aan sediment gestort in het zuidelijke deel van de stortzone. Ter hoogte van de meest zuidelijk gebruikte stortvakken is sterke verondieping zichtbaar (Figuur 9-15). Het sediment gestort in de meer noordelijk gebruikte stortvakken migreert mogelijks stroomopwaarts gezien centraal in de stortzone verondieping zichtbaar is. Anderzijds speelt hier de migratie van de Rug van Baarland in oostelijke richting mogelijk een rol.

In het noorden van de stortzone, waar tot juli 2024 gestort werd, blijft ter hoogte van de erosiekuil de verdieping toenemen (Figuur 9-15). Deze uitgesproken verdieping verklaart het toenemende verschil tussen het stortvolume en het peilvolume in de noordelijke deelzone (Figuur 9-13). Het is niet uit te sluiten dat dit materiaal naar de binnenbocht van de Put van Hansweert migreert.

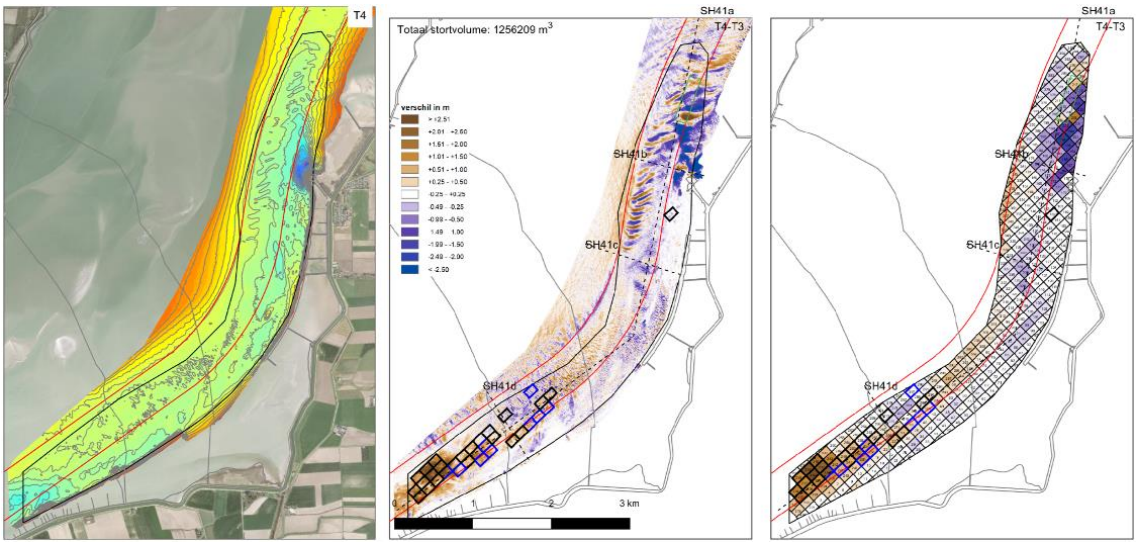

Figuur 9-15: Morfologische veranderingen in stortzone SH41 tussen T4 en T3. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

9.3.3 Analyse juni 2025 – juli 2025

In Tabel 9-7 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.


Tabel 9-7: Feitelijke informatie voor SH41 tussen juni 2025 en juli 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Juni 2025: ca. 383 000 m³ Juli 2025: ca. 180 000 m³	Figuur 9-13
Peilingen	T5 (drempelpeiling, 23/07/2025)	Figuur 9-16; Bijlage A.4
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T5 – T0 (23/07/2025 – 18/07/2022): 9% Deelzone SH41-noord: • T5 – T0: -22% Deelzone SH41-zuid: • T5 – T0: 51%	Figuur 9-13
Profielen	-	-
Verschilkaarten	T5 – T0 (23/07/2025 – 18/07/2022) T5 – T4 (23/07/2025 – 13/05/2025): • Stortvolume: ca. 557 000 m³ • Peilvolume: ca. 163 000 m³	Figuur 9-16; Bijlage A.4

In **SH41** is er in de periode T5-T4 ca. 557 000 m³ aan sediment gestort in het zuidelijke deel van de stortzone. Ter hoogte van de gebruikte stortvakken is lichte verondieping

zichtbaar (Figuur 9-16). In het overige zuidelijke deel van de stortzone zijn veelal kleinere bodemvormen waarneembaar, en kan de verspreiding van het sediment waargenomen worden rondom de gebruikte stortzones.

In het noorden van de stortzone, waar tot juli 2024 gestort werd, is de uitgesproken verdieping die tussen T4-T3 waargenomen werd niet langer zichtbaar. Tussen T5-T4 zijn met name bodemvormen aanwezig die lokaal leiden tot ver(on)diepingen (Figuur 9-16). Het toenemende verschil tussen het stortvolume en het peilvolume in de noordelijke deelzone dat werd waargenomen tot de voorgaande peiling (T4), heeft zich omgedraaid tussen T4 en T5 (Figuur 9-13). Echter, hierbij moet worden vermeld dat de laatste peiling (T5) enkel een deel van de gehele stortzone SH41 bestrijkt, waardoor deze relatieve volumeverandering van de stortzone moeilijk interpreteerbaar is.

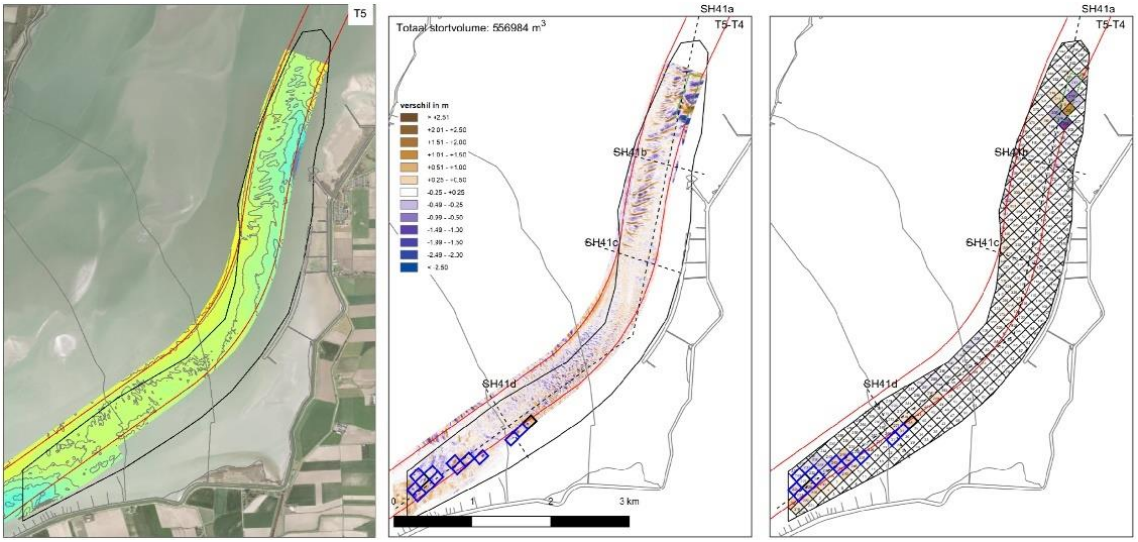

Figuur 9-16: Morfologische veranderingen in stortzone SH41 tussen T5 en T4. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

9.3.4 Analyse augustus – september 2025

In Tabel 9-8 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.


Tabel 9-8: Feitelijke informatie voor SH41 in augustus en september 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Augustus 2025: ca. 481 000 m³ September 2025: ca. 61 000 m³	Figuur 9-13
Peilingen	T6 (drempelpeiling, 18/08/2025) T7 (17/09/2025)	Figuur 9-17; Figuur 9-18; Bijlage A.5
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T6 – T0 (18/08/2025 – 18/07/2022): 12% T7 – T0 (17/09/2025 – 18/07/2022): 0% Deelzone SH41-noord: -37% Deelzone SH41-zuid: 47%	Figuur 9-13
Profielen	-	-


Parameter	Commentaar	Figuur
Verschilkaarten	T6 – T0 (18/08/2025 – 18/07/2022) T6 – T5 (18/08/2025 – 23/07/2025): • Stortvolume: ca. 343 000 m³ • Peilvolume: ca. 300 000 m³ T7 – T0 (17/09/2025 – 18/07/2022) T7 – T6 (17/09/2025 – 18/08/2025): • Stortvolume: ca. 215 000 m³ • Peilvolume: ca. 267 000 m³	Figuur 9-17; Figuur 9-18; Bijlage A.5

In **SH41** is er in de periode T6-T5 ca. 343 000 m³ aan sediment gestort in het zuidelijke deel van de stortzone. Ter hoogte van de gebruikte stortvakken is duidelijke verondieping zichtbaar (Figuur 9-17). In het overige deel van de stortzone zijn veelal kleinere bodemvormen waarneembaar, met beperkte verondieping in de zuidelijke helft van de zone, wat duidt op de verspreiding van het gestorte sediment. In het noorden van de stortzone is sprake van beperkte verdieping. Er wordt opgemerkt dat peiling T6 niet de volledige stortzone SH41 bestrijkt.

Tussen peiling T7 en T6 werd ca. 215 000 m³ aan sediment gestort, grotendeels in het noordelijke deel van de stortzone. In het zuidelijk deel is beperkte verdieping zichtbaar in de zone waar eerder werd gestort (Figuur 9-18). In het centrale deel van de zone overheerst lichte verondieping. Ten opzichte van T0, is bij de meest recente sterke verdieping zichtbaar in de noordelijke zone waar de stortingen voorheen werden uitgevoerd (Bijlage A.5).

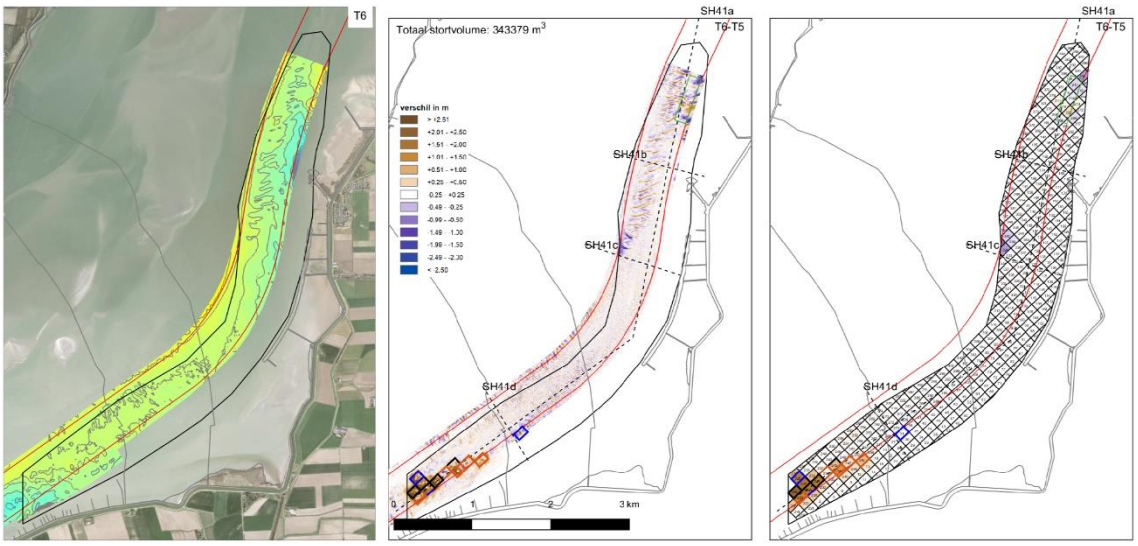

Figuur 9-17: Morfologische veranderingen in stortzone SH41 tussen T6 en T5. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

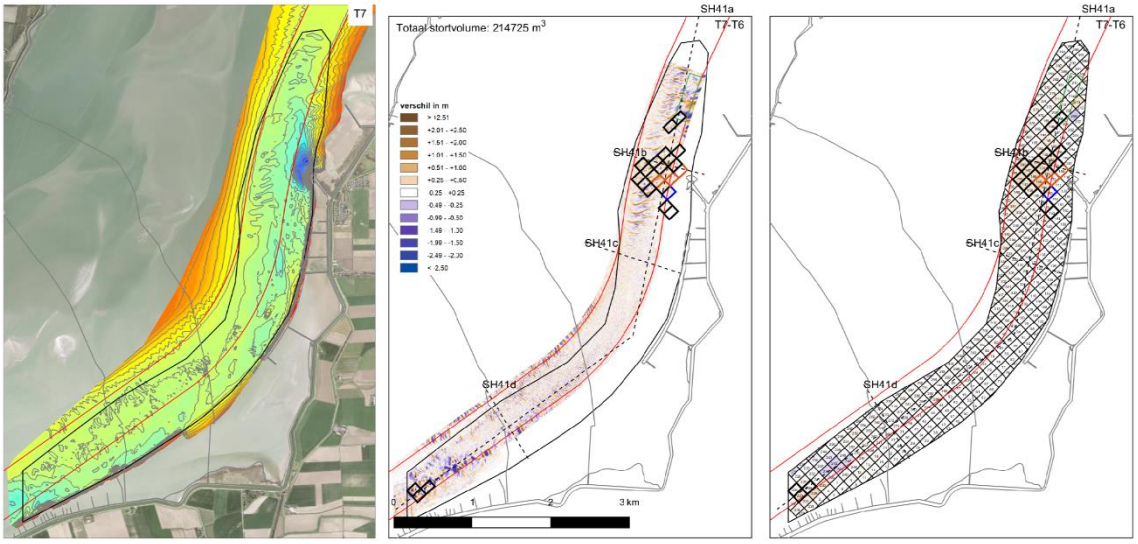

Figuur 9-18: Morfologische veranderingen in stortzone SH41 tussen T7 en T6. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

9.3.5 Analyse oktober – november 2025


In Tabel 9-9 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 9-9: Feitelijke informatie voor SH41 tussen oktober en november 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Oktober 2025: ca. 178 000 m³ November 2025: ca. 184 000 m³	Figuur 9-13
Peilingen	T8 (drempelpeiling, 13/11/2025)	Figuur 9-19-
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	n.v.t.	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	T8 – T0 (13/11/2025 – 18/07/2022) T8 – T7 (13/11/2025 – 17/09/2025) • Stortvolume: ca. 211 000 m³	Figuur 9-19

Er werd in deze periode een deelpeiling aangeleverd die de vaargeul ter hoogte van SH41 bedekt.

In **SH41** is er in de periode T8-T7 ca. 211 000 m³ aan sediment gestort, zowel in het zuidelijke- als in het noordelijke deel van de stortzone. Ter hoogte van deze stortvakken is echter eerder verdieping zichtbaar (Figuur 9-19). Dit kan het gevolg zijn van erosie van eerder gestort materiaal tussen T5 en T7. In het noordelijk deel van de stortzone is het merendeel van de stortingen uitgevoerd. Deze zijn in de verschilkaart echter niet zichtbaar, wat duidt op hoge mobiliteit.

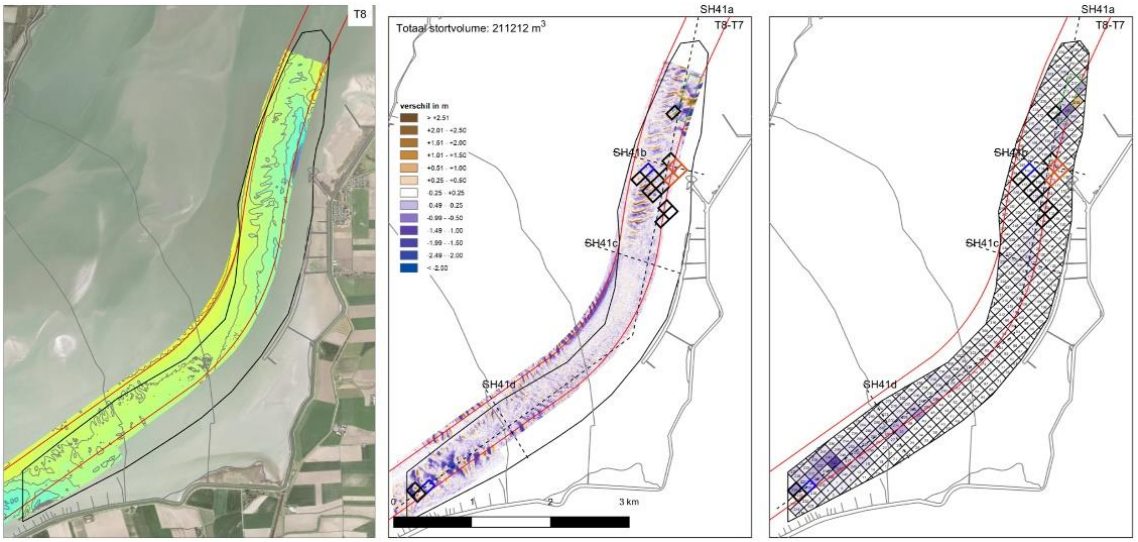

Figuur 9-19: Morfologische veranderingen in stortzone SH41 tussen T8 en T7. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

9.3.6 Analyse december 2025


In Tabel 9-10 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.

Tabel 9-10: Feitelijke informatie voor SH41 in december 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	December 2025: ca. 144 000 m³	Figuur 9-13
Peilingen	T9 (drempelpeiling, 08/12/2025)	Figuur 9-20
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	n.v.t.	-
Profielen	-	-
Verschilkaarten	T9 – T0 (08/12/2025 – 18/07/2022) T9 – T8 (08/12/2025 – 13/11/2025) • Stortvolume: ca. 156 000 m³	Figuur 9-20

Er werd in deze periode een deelpeiling aangeleverd die de vaargeul ter hoogte van SH41 bedekt.

In **SH41** is er in de periode T9-T8 ca. 156 000 m³ aan sediment gestort in het zuidelijke deel van de stortzone. Ter hoogte van deze stortvakken is met name lichte verondieping zichtbaar (Figuur 9-20). In het noordelijk deel van de stortzone hebben geen stortingen plaatsgevonden. Hier is met name migratie van bodemvormen te observeren.

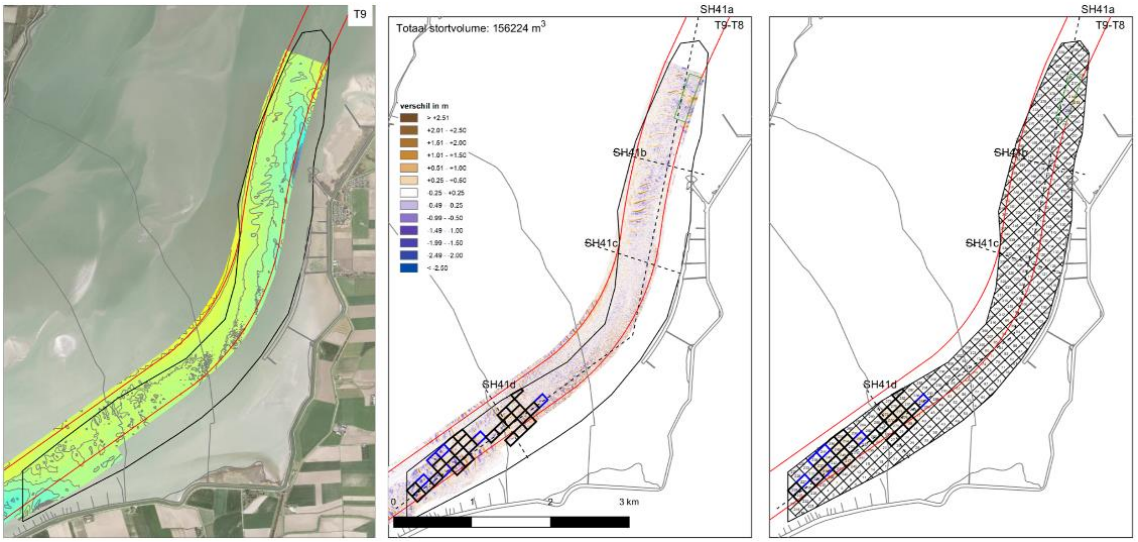


Figuur 9-20: Morfologische veranderingen in stortzone SH41 tussen T9 en T8. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

9.4 SN51

9.4.1 Analyse juli 2024 – december 2025

Stortzone SN51 wordt jaarlijks gepeild als onderdeel van de grote peiling van het gebied rond de Plaat van Walsoorden. De meest recente peiling werd uitgevoerd op 30/09/2025 (T3), terwijl de voorgaande peiling werd gedaan op 03/06/2024 (T2). In deze stortzone worden geen stortingen uitgevoerd, en het opgemeten volumeverschil in deze periode was ca. 299 000 m³. In de periode T3-T2 (16 maanden) is er bij **SN51** verondieping waar te nemen in het zuidelijk deel van de stortzone (Figuur 9-21). Ook breidt de Plaat van Walsoorden daar uit richting de Schaar van Valkenisse. Dit kan worden teruggevoerd op een trage opwaarts gerichte netto-migratie van sediment langs de plaatrand. Het noordelijk deel van de stortzone verdiept licht.

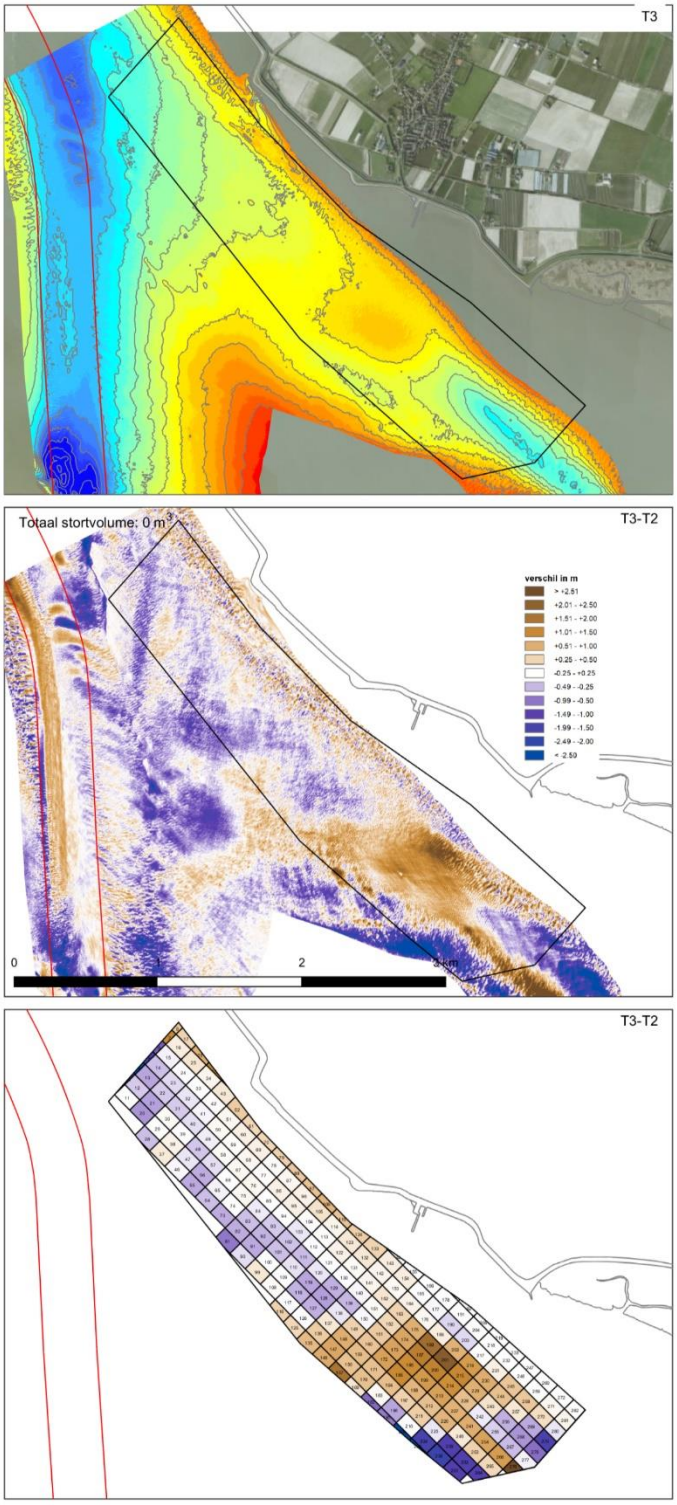


Figuur 9-21: Bathymetrie van T3 bij SN51 (boven), morfologische veranderingen bij SN51 tussen T3 en T2 (midden) en stortvakgemiddelde bodemhoogteverandering (onder).

9.5 SH51

De relatieve volumeverandering van de stortzone (in %) wordt geëvalueerd door het (cumulatieve) stortvolume te vergelijken met het gepeilde volume op de bodem ten opzichte van een referentiepeiling.

De relatieve volumeverandering van de stortzone SH51 is weergegeven in Figuur 9-22. Als referentiepeiling is de eerste peiling To (22/07/2022) geselecteerd. De relatieve volumeverandering van de stortzone SH51 wordt berekend ten opzichte van dit referentiepeil.

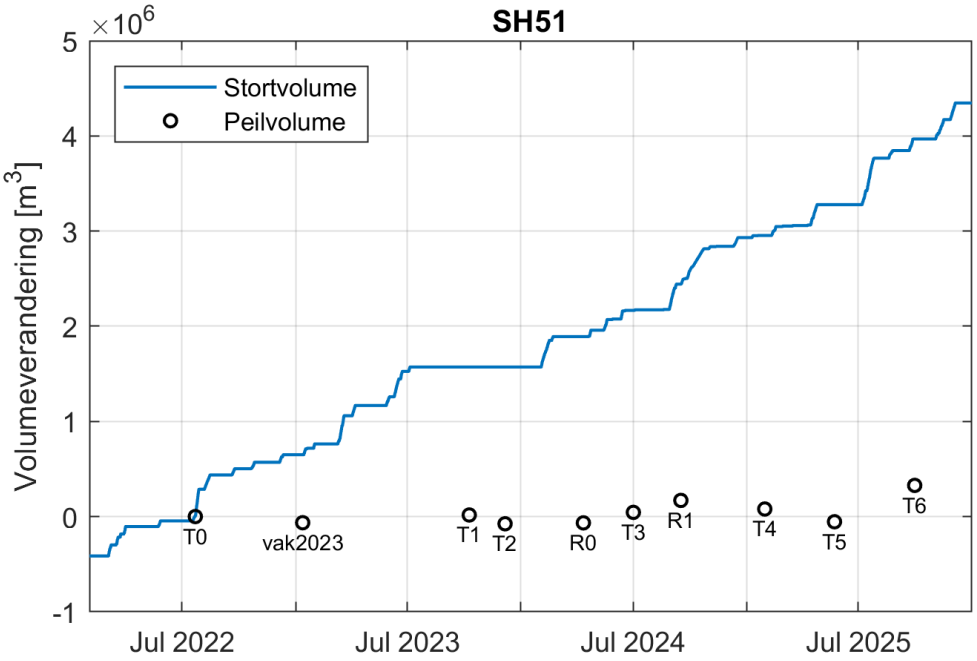

Figuur 9-22: Tijdsverloop van het cumulatief volume gestort materiaal en het cumulatieve verschilvolume uit de peilingen in de complete stortzone SH51.

9.5.1 Analyse juli 2024 – januari 2025

In Tabel 9-11 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.


Tabel 9-11: Feitelijke informatie voor SH51 tussen juli 2024 en januari 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Juli 2024: ca. 6 000 m³ Augustus 2024: ca. 100 000 m³ September 2024: ca. 314 000 m³ Oktober 2024: ca. 231 000 m³ November 2024: ca. 23 000 m³ December 2024: ca. 92 000 m³ Januari 2025: ca. 22 000 m³	Figuur 9-22
Peilingen	T4 (30/01/2025)	Figuur 9-23; Bijlage A.2
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T4 (30/01/2025) – To (22/07/2022): 3%	Figuur 9-22

Parameter	Commentaar	Figuur
Profielen	-	-
Verschilkaarten	T4 – T0 (30/01/2025 – 22/07/2022) T4 – T3 (30/01/2025 – 01/07/2024): • Stortvolume: ca. 787 000 m³ • Peilvolume: ca. 35 000 m³	Figuur 9-23; Bijlage A.2

Recent zijn door het Baggeroverleg in stortzone **SH51** nieuwe stortvakken aangeduid. Hierdoor is in de periode T4-T3 (ca. 7 maanden) zowel eerst in het noorden als later in het zuiden van de stortzone gestort. In het zuiden van de stortzone heeft dit geleid tot verondieping ter hoogte van de gebruikte stortvakken. Ter hoogte van de gebruikte stortvakken in het noorden is er juist verdieping geconstateerd (Figuur 9-23).

De gebruikte stortvakken in het noorden van SH51 liggen nabij de gebruikte stortvakken in plaatrandstortzone Plaat van Walsoorden. De strook tussen de beide stortzones wordt gekenmerkt door migrerende bodemvormen (Figuur 9-23). Ook is in de vaargeul sedimentatie ter hoogte van de zandrug zichtbaar.

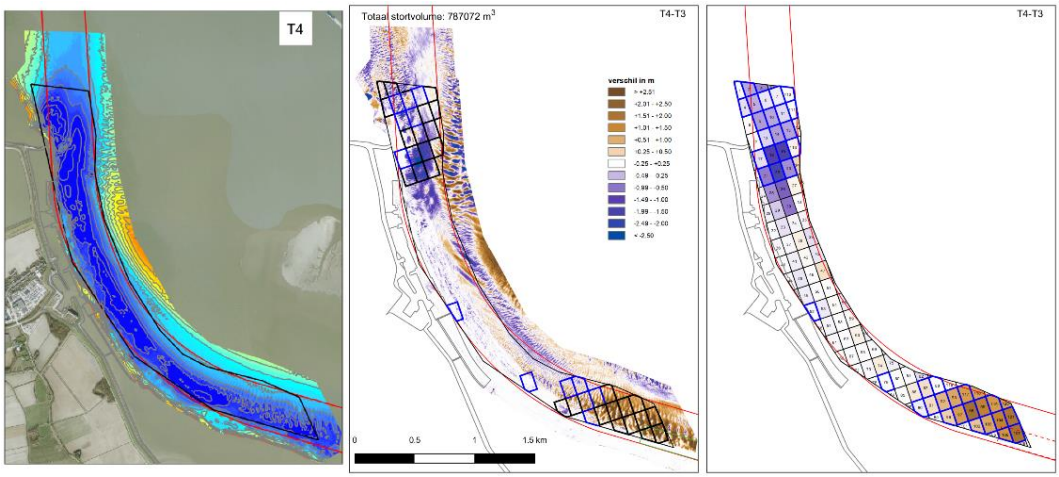

Figuur 9-23: Morfologische veranderingen bij SH51 tussen T3 en T4. In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

9.5.2 Analyse februari 2025 – juli 2025

In Tabel 9-12 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.


Tabel 9-12: Feitelijke informatie voor SH51 tussen februari 2025 en juli 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Februari 2025: ca. 99 000 m³ Maart 2025: ca. 6 000 m³ April 2025: ca. 219 000 m³ Mei 2025: geen stortingen Juni 2025: geen stortingen Juli 2025: ca. 489 000 m³	Figuur 9-22
Peilingen	T5 (23/05/2025)	Figuur 9-24; Bijlage A.4
Relatieve volumeverandering	T5 (23/05/2025) – T0 (22/07/2022): -2%	Figuur 9-22

Parameter	Commentaar	Figuur
van de stortzone (in %)		
Profielen	-	-
Verschilkaarten	T5 – T0 (23/05/2025 – 22/07/2022) T5 – T4 (23/05/2025 – 30/01/2025): • Stortvolume: ca. 324 000 m³ • Peilvolume: ca. -134 000 m³	Figuur 9-24; Bijlage A.4

Recent zijn door het Baggeroverleg in stortzone **SH51** nieuwe stortvakken aangeduid. Hierdoor is in de periode T5-T4 (ca. 6 maanden) zowel in het noorden als in het zuiden van de stortzone gestort. In het zuiden van de stortzone heeft dit geleid tot verondieping ter hoogte van de gebruikte stortvakken. Ter hoogte van de gebruikte stortvakken in het noorden wordt er juist verdieping waar genomen (Figuur 9-23).

De gebruikte stortvakken in het noorden van SH51 liggen nabij de gebruikte stortvakken in plaatrandstortzone Plaat van Walsoorden. De strook tussen de beide stortzones wordt gekenmerkt door migrerende bodemvormen (Figuur 9-24). In de vaargeul is er ook sedimentatie ter hoogte van de zandrug zichtbaar.

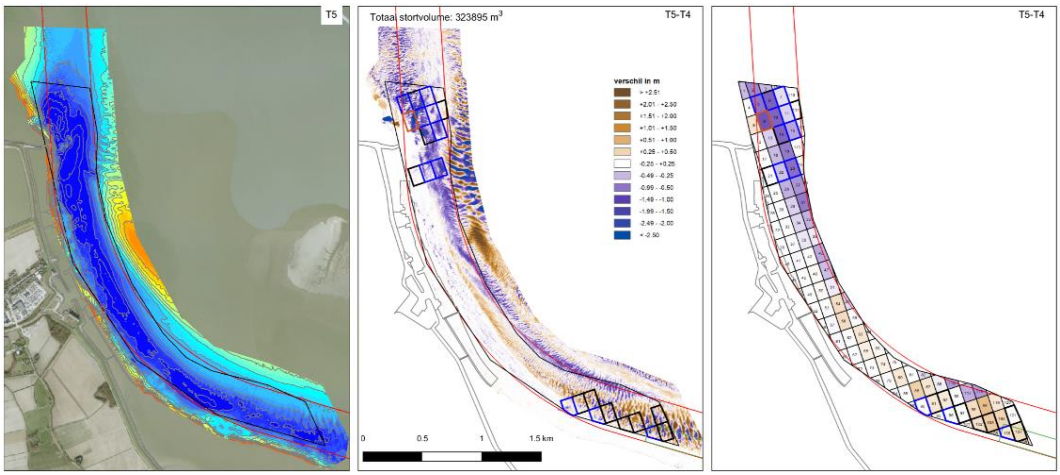

Figuur 9-24: Morfologische veranderingen bij SH51 tussen T4 en T5. In de middelste figuur zijn de gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

9.5.3 Analyse augustus – december 2025

In Tabel 9-13 wordt informatie gegeven met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten in bovengenoemde onderhoudsperiode.


Tabel 9-13: Feitelijke informatie voor SH51 tussen augustus 2025 en december 2025.

Parameter	Commentaar	Figuur
Stortingen	Augustus 2025: ca. 80 000 m³ September 2025: ca. 122 000 m³ Oktober 2025: geen stortingen November 2025: ca. 265 000 m³ December 2025: ca. 90 000 m³	Figuur 9-25
Peilingen	T6 (30/09/2025)	Figuur 9-25; Bijlage A.6

Parameter	Commentaar	Figuur
Relatieve volumeverandering van de stortzone (in %)	T6 (30/09/2025) – T0 (22/07/2022): 8%	Figuur 9-22
Profielen	-	-
Verschilkaarten	T6 – T0 (30/09/2025 – 22/07/2022) T6 – T5 (30/09/2025– 23/05/2025): • Stortvolume: ca. 690 000 m³ • Peilvolume: ca. 382 000 m³	Figuur 9-25; Bijlage A.6

In de periode T6-T5 (ca. 4 maanden) is zowel in het noorden als in het zuiden van de stortzone gestort. In het zuiden van de stortzone heeft dit geleid tot verondieping ter hoogte van de gebruikte stortvakken. In de verschilkaart tussen de grote peilingen waartussen een periode van 16 maanden zit (zie Figuur 4-9), is extra goed zichtbaar. Ter hoogte van de gebruikte stortvakken in het noorden wordt er zowel verdieping (met name in het noorden) als verondieping (zuiden) waar genomen (Figuur 9-25).

De gebruikte stortvakken in het noorden van SH51 liggen nabij de gebruikte stortvakken in plaatrandstortzone Plaat van Walsoorden. De strook tussen de beide stortzones wordt gekenmerkt door migrerende bodemvormen (Figuur 9-25). In de vaargeul is er ook sedimentatie ter hoogte van de zandrug zichtbaar.

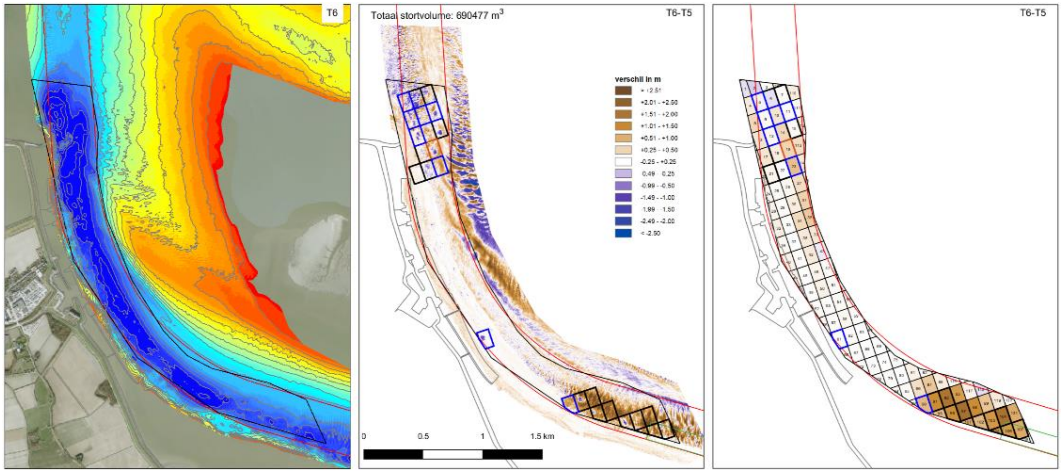

Figuur 9-25: Morfologische veranderingen bij SH51 tussen T5 en T6. De gebruikte stortvakken met <5% van het in de periode gestorte volume zijn in zwart aangeduid, 5-10% in blauw en >10% in oranje.

10 Conclusie

In dit rapport wordt de data geanalyseerd en beschreven die werd ontvangen tussen 1 januari en 31 december 2025. Het betreft hier de plaatrandstortzones Hooge Platen West (HPW) en de Plaat van Walsoorden (PWA), en de Hoofdgeulzones SH31, Put van Hansweert (PVH), SH61 en SH71. Dit in het kader van de opvolging van de bagger- en stortwerkzaamheden binnen de stortstrategie Flexibel Storten voor het vergunningsjaar 2025. Aanvullend zijn nog gegevens verwerkt van de stortzones SN11, SN31, SH41, SN51 en SH51.

Het totaal gebaggerd *in-situ* volume tijdens vergunningsjaar 2025 bedraagt ca. **10 567 231 m³** en is gestort in de vergunde stortzones in de Westerschelde ter hoogte van de hoofdgeul, de nevengeul en de plaatranden.

Op basis van de aangeleverde peilingen kan het volgende besloten worden betreffende de relatieve volumeverandering van de stortzone (in %) en morfologische veranderingen:

- In **HPW** blijven de morfologische veranderingen erg beperkt. In het noordoosten van de stortzone komt lichte verondieping voor. In het centrale deel zet de migratie van bodemvormen zich voort.
- In **PWA** neemt het peilvolume over de gehele stortzone terug af sinds juni 2024. De zandtong in het zuiden van de stortzone verondiept aan de zuidzijde en erodeert aan de noordzijde. Daarnaast migreert de zandtong eveneens richting de vaargeul en wordt het ondieper ter hoogte van het fietspad.
- In **SH31** is verondieping zichtbaar langsheen de volledige noordrand van de stort- en peilzone. Het gestorte sediment lijkt zich aan deze zijde van de vaargeul zowel opwaarts als afwaarts te verplaatsen. Daarnaast kan een invloed van de stortingen in het zuidelijke deel van SH41, en het drempelgebied met de nevengeul ten noorden, niet worden uitgesloten.
- In **PVH** is in de opeenvolgende peilingen eerst verondieping zichtbaar ter hoogte van de gebruikte stortingen, en vervolgens lichte verdieping in deze zelfde zone. De centraal-noordelijke zone van de Plaat van Ossenisse, waar in januari 2025 een plaatval werd geconstateerd, herstelt zich in november 2025 (T93) nog altijd. Verder naar het oosten langs de plaatrand heeft zich een kleine plaatval voorgedaan tussen juli en september 2025. In het oostelijke deel van de stortzone migreren onderwaterduinen in opwaartse richting.
- In **SH61** worden sinds juni 2024 geen stortingen uitgevoerd. In het kader van het onderhouden van de vaargeul worden regelmatig baggerwerken uitgevoerd. De relatieve volumeverandering is licht toegenomen tot -7%.
- In **SH71** wordt het gestorte sediment over het algemeen zeer snel verspreid. Tussen de peilingen van juni en september 2025 is wel duidelijke verondieping zichtbaar, zowel in het noorden van de stortzone als ten noorden buiten de zone.
- In **SN31** wordt aanzanding waargenomen in het zuidoostelijke deel van de zone, gerelateerd aan de drempeldynamiek van de Everingen. In het overige deel van de stortzone vindt voornamelijk migratie van bodemvormen plaats. Recent werd enkel het meest westelijke deel van de zone gepeild. Tussen de peiling van augustus en september 2025 was hier verondieping zichtbaar bij de gebruikte stortvakken, met lichte uitbreiding naar het ankergebied ten oosten van deze vakken. In de overige periodes waren de morfologische veranderingen klein en was beweging van kleine bodemvormen zichtbaar in de westelijke zone.
- In **SH41** is sterke verdieping zichtbaar in het noordoosten van de stortzone, waar in voorgaande jaren intensief werd gestort. Van juli 2024 tot augustus 2025 werd in het

zuidelijke deel van SH41 gestort en was in die zone duidelijke verondieping zichtbaar. Vanaf augustus 2025 werd zowel in het noordelijke als zuidelijke deel van de stortzone gestort, en zijn de morfologische veranderingen gemiddeld meer beperkt met afwisselende verdieping en verondieping en beweging van bodemvormen in de zone.

- In **SH51** wordt er zowel in de noordelijke put als het zuidelijke deel van de stortzone gestort. Hierdoor zijn de morfologische veranderingen eveneens geconcentreerd in twee zones. Het algemene beeld is verdieping van de zone in het noorden, en verondieping in het zuiden. Tussen mei en september 2025 (T5-T6), treedt er in het zuiden van de stortzone opnieuw verondieping op ter hoogte van de gebruikte stortvakken, maar ook in het noorden is in deze periode sprake van lichte verondieping.

11 Referenties

Consortium Arcadis-Technum (2007). Milieueffectenrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. Basisrapport Overige Aspecten. Consortium Arcadis – Technum.

IMDC (2010). Monitoringprogramma flexibel storten. Methodologie maandelijkse rapportage. I/RA/11353/10.030/RDS.


IMDC (2017). Methodologie Maandrapportages 2017. I/NO/11498/17.055/DDP/DDP.

IMDC (2025a). Flexibel Storten Vergunningsjaar 2024 - Analyse monitoring stortactiviteiten onderhoudsbaggerwerken vaargeul Westerschelde: periode januari-december 2024. I/RA/11640/25.012/CPA/KIV.

IMDC (2025b). Morfologische ontwikkeling Zuidergat en Plaat van Walsoorden. I/NO/11640/25.173/BRO/.

Bijlage A Kaartmateriaal

A.1 Kaartmateriaal januari 2025

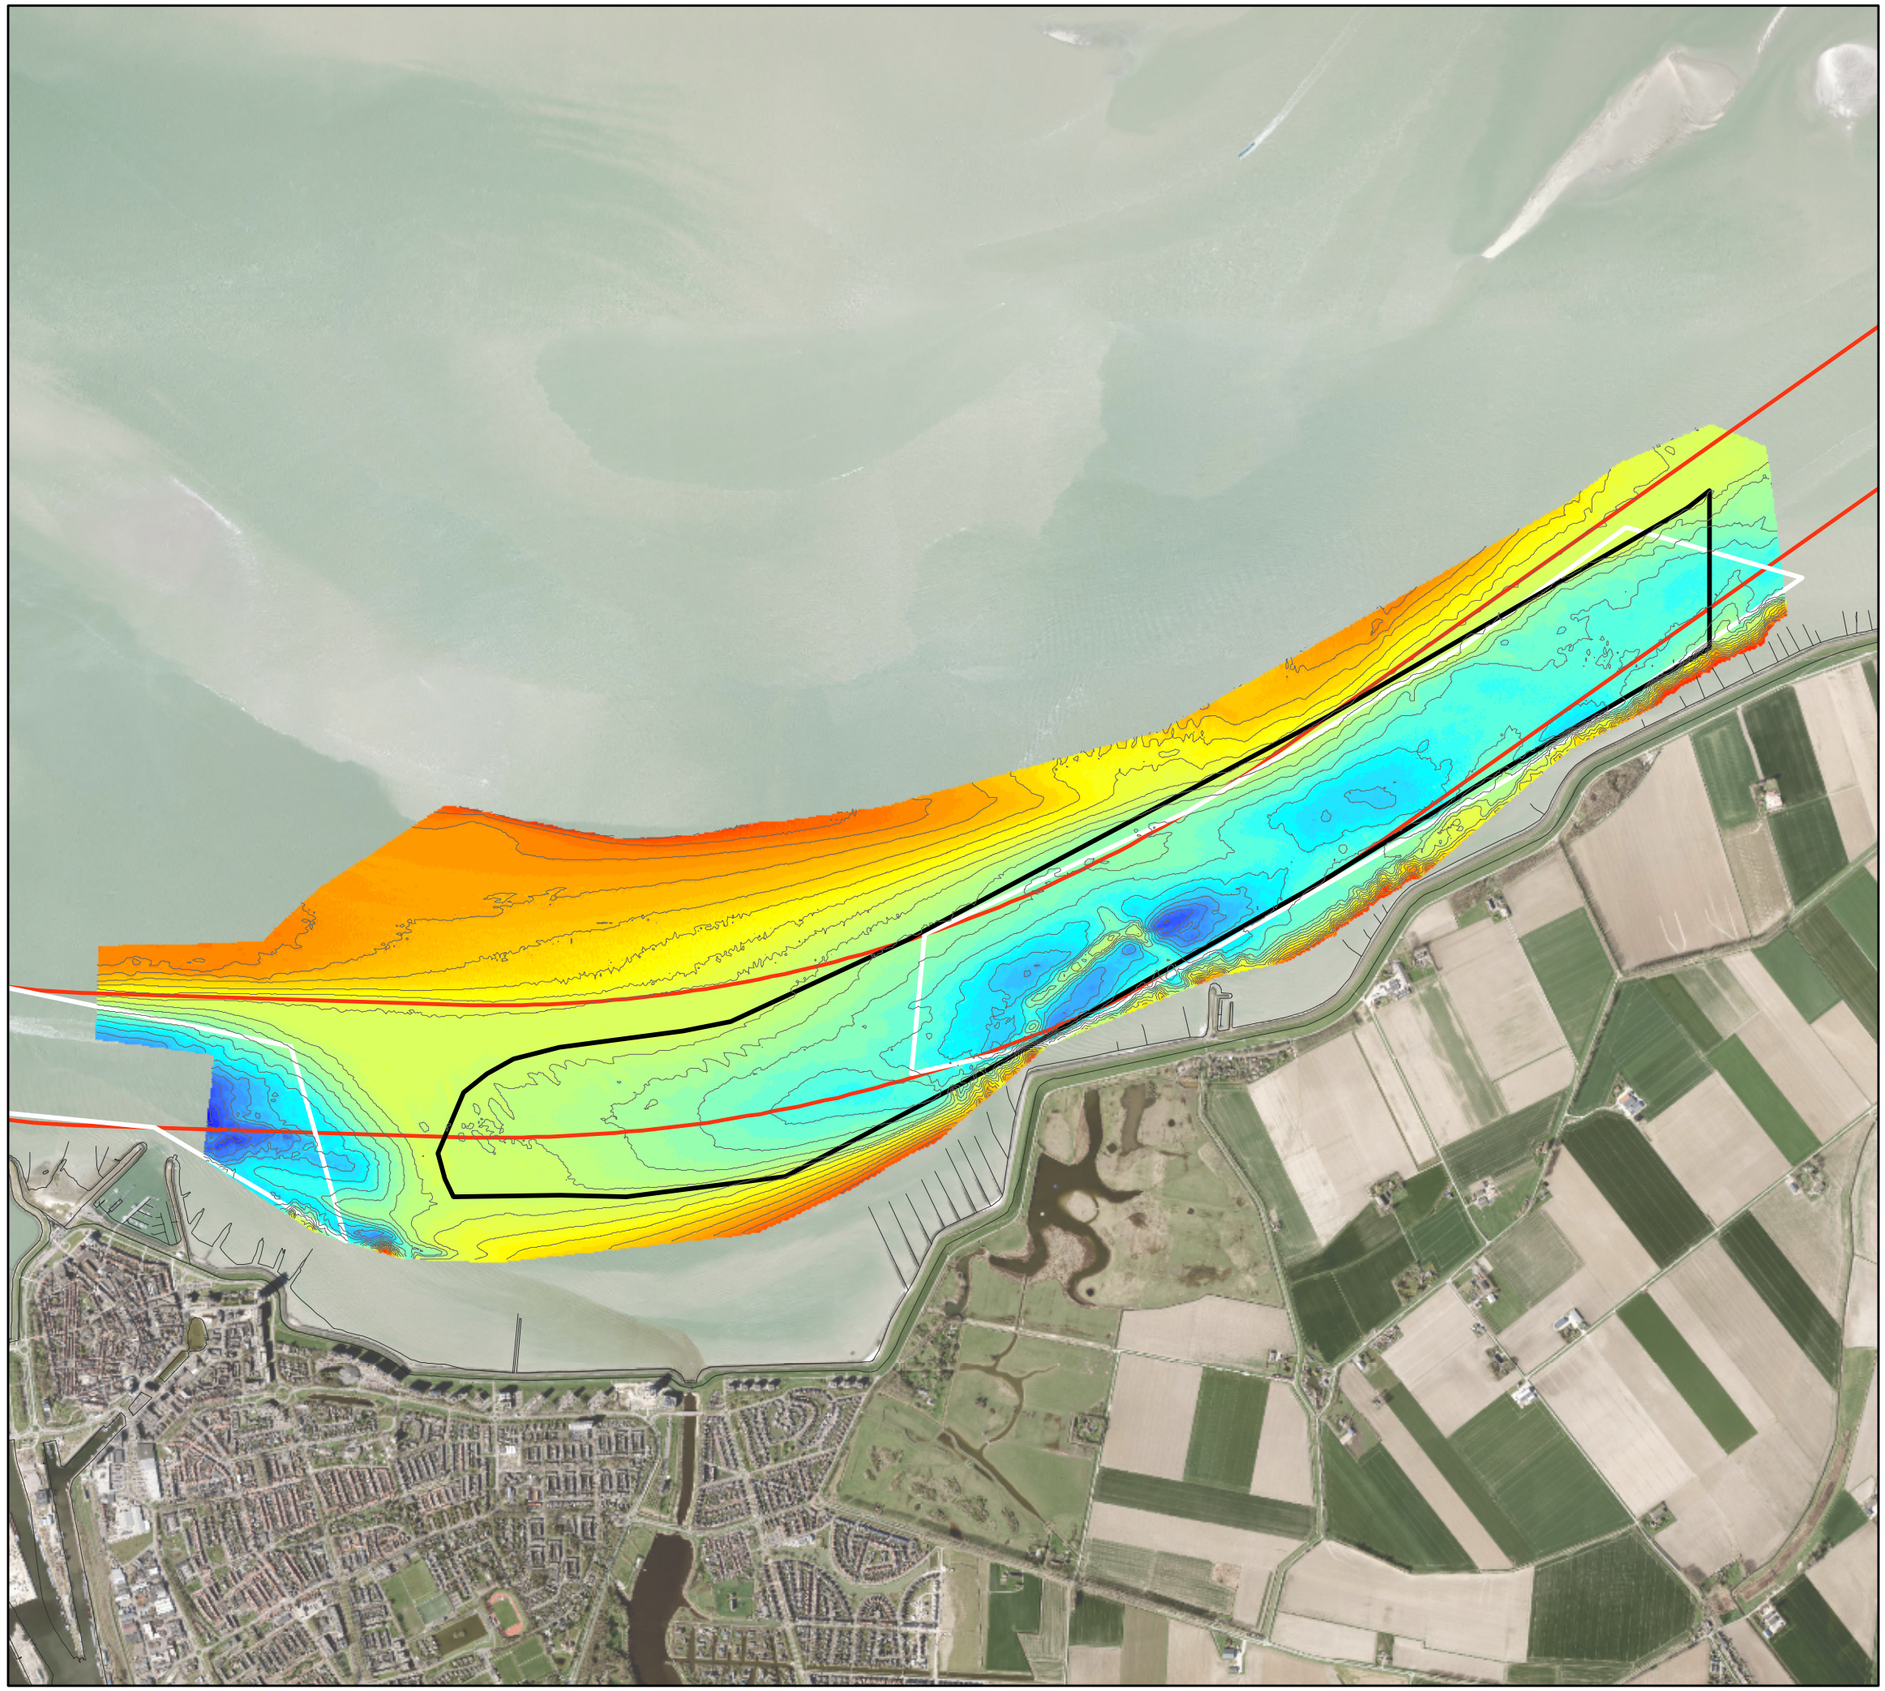

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SH31

22/01/2025 (T83)

11640_SH31_BT83
Rapport nr. 25.031



IMDC
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

Diepte in m [NAP]

1.88 - 2.00	22.01 - 23.00
2.01 - 3.00	23.01 - 24.00
3.01 - 4.00	24.01 - 25.00
4.01 - 5.00	25.01 - 26.00
5.01 - 6.00	26.01 - 27.00
6.01 - 7.00	27.01 - 28.00
7.01 - 8.00	28.01 - 29.00
8.01 - 9.00	29.01 - 30.00
9.01 - 10.00	30.01 - 31.00
10.01 - 11.00	31.01 - 32.00
11.01 - 12.00	32.01 - 33.00
12.01 - 13.00	33.01 - 34.00
13.01 - 14.00	34.01 - 35.00
14.01 - 15.00	35.01 - 36.00
15.01 - 16.00	36.01 - 37.00
16.01 - 17.00	37.01 - 38.00
17.01 - 18.00	38.01 - 39.00
18.01 - 19.00	39.01 - 40.00
19.01 - 20.00	40.01 - 41.00
20.01 - 21.00	41.01 - 42.00
21.01 - 22.00	

N
W E
S

0 250 500 750 1000 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)


Stortvak	Stortvolume
85	2 032
86	21 375
87	18 944
88	19 411
89	17 244
90	8 179
91	20 561
92	17 453
93	18 672
94	18 899
95	19 225
96	16 118
97	6 034
98	18 994
99	20 876
100	18 785
101	18 516
102	21 329
103	16 840
104	17 513
105	13 837
106	11 824
107	17 262
108	16 708
109	16 920
110	5 960
111	17 261
112	13 785
113	11 484
114	17 226
115	19 212
116	4 169
117	1 860
118	11 586
119	13 494
120	7 462
121	17 145
122	1 803
123	11 596
124	11 402
125	11 600
126	11 408
127	17 289
128	19 193
129	21 137
130	14 048
131	17 213
132	9 624
169	12 864
170	20 852
171	20 938
172	17 310
173	1 728
175	125 599
176	153 753
177	145 318
178	147 693
179	1 725
181	159 629
182	148 192
183	143 711
184	128 500
185	1 565
187	125 171
188	136 908
189	107 030
190	112 170
193	120 892
194	130 855
195	149 194
196	128 354
197	12 891
199	118 750
200	163 273
201	138 178
202	138 986
203	14 318
205	7 395
206	11 135
207	16 225
208	14 525
209	11 207
212	11 157
213	7 560
214	14 375
215	9 154
217	11 339
218	11 220
219	14 574

Totaal: 5 529 496 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 2 693 144 m³

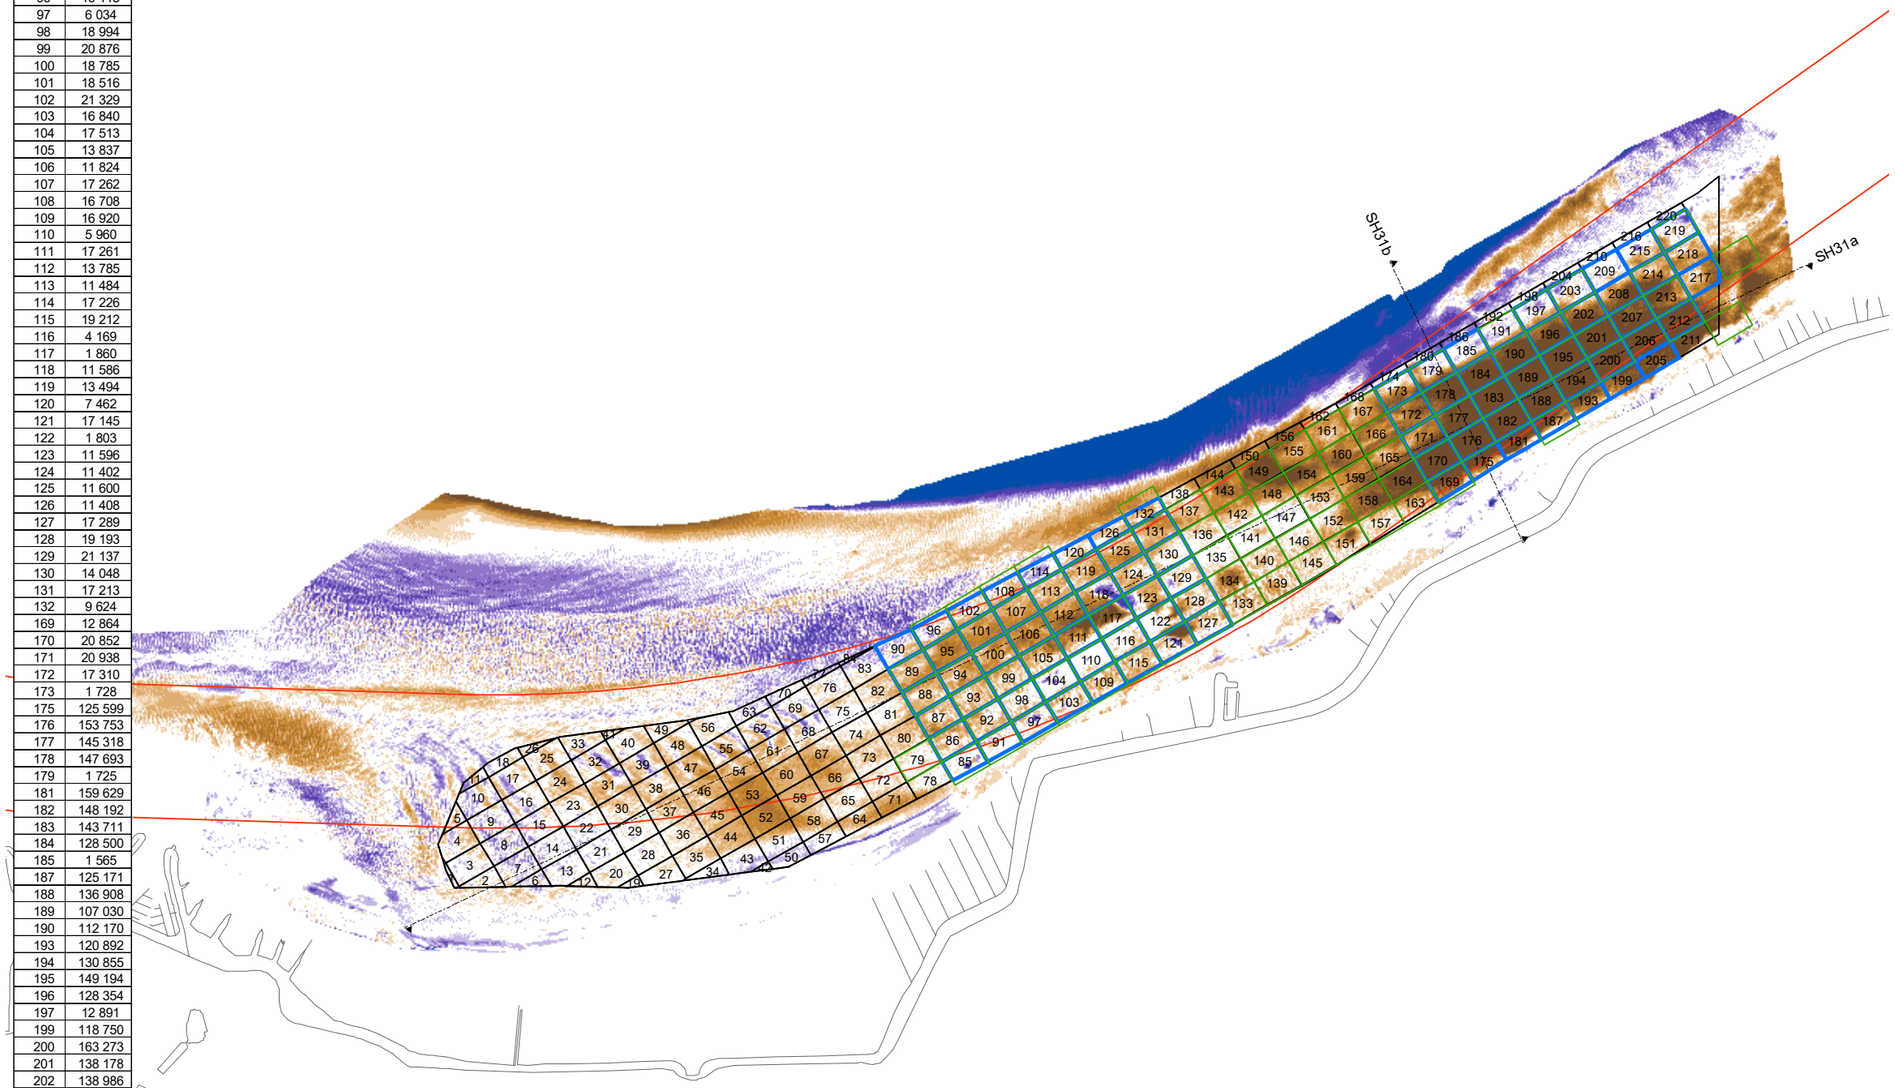

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH31

26/04/2022 (T62) - 22/01/2025 (T83)

11640_SH31_VT83-62
Rapport nr. 25.031



IMDC
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	verdieping
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N W E S

0 200 400 600 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)


Stortvak	Stortvolume
85	2 032
86	2 175
87	2 209
88	2 192
90	2 181
93	2 055
94	2 089
95	2 152
96	2 163
99	1 964
100	1 946
101	1 769
102	1 924
105	1 992
112	1 998
170	3 382
171	3 371
176	3 460
177	3 403
178	3 361
183	3 345
195	3 356
196	3 537
201	3 324
202	3 371
207	3 397
208	3 397
214	3 350
215	3 377
219	3 439

Totaal: 81 710 m^3

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 152 664 m^3

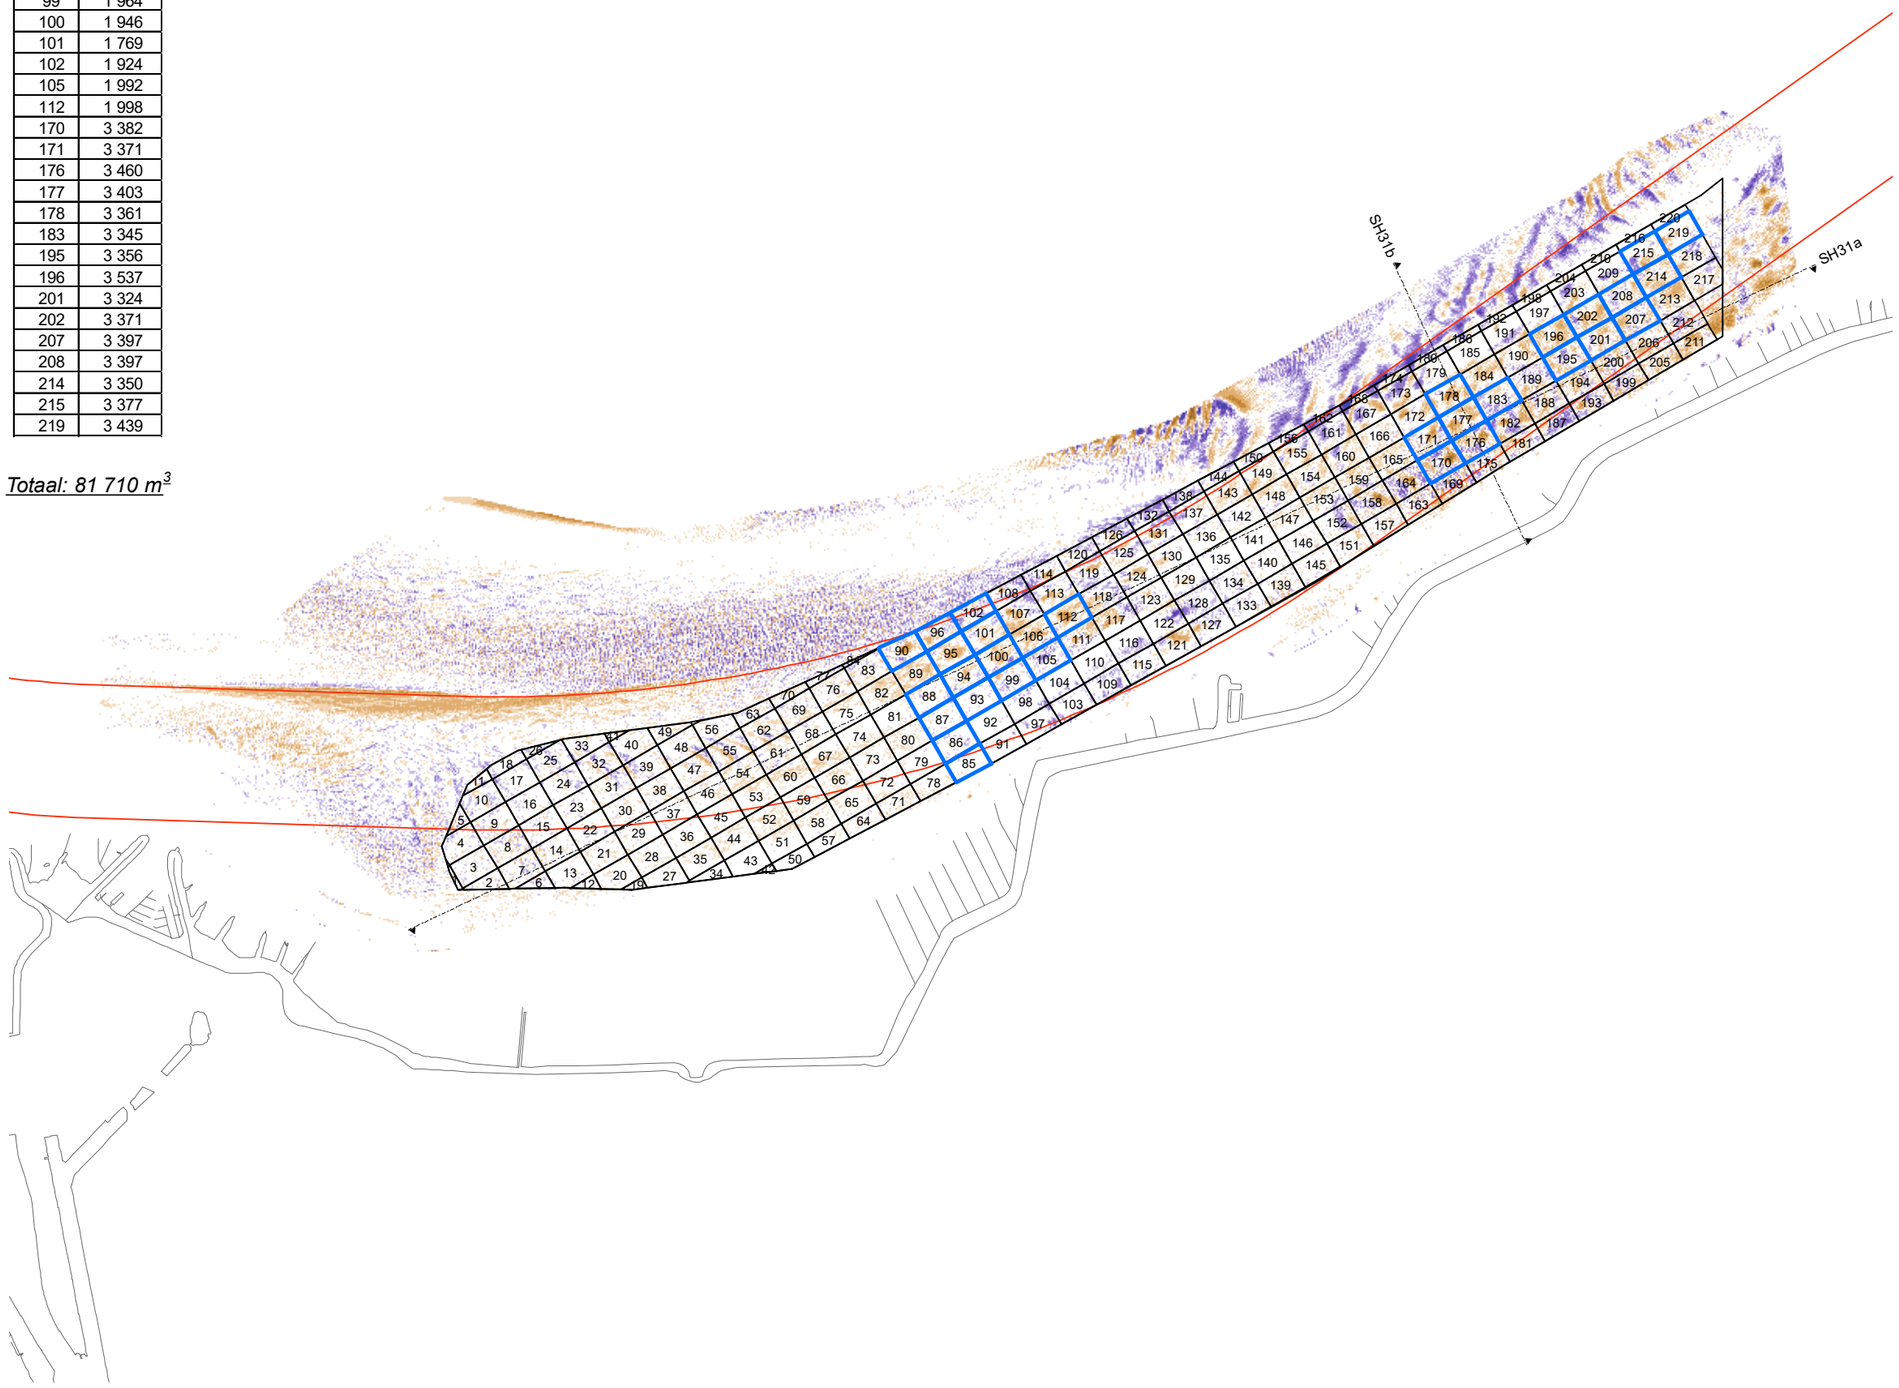

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH31

02/12/2024 (T82) - 22/01/2025 (T83)

11640_SH31_VT83-82
Rapport nr. 25.031



IMDC
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m


verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50

-0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N
W E
S

0 200 400 600 m

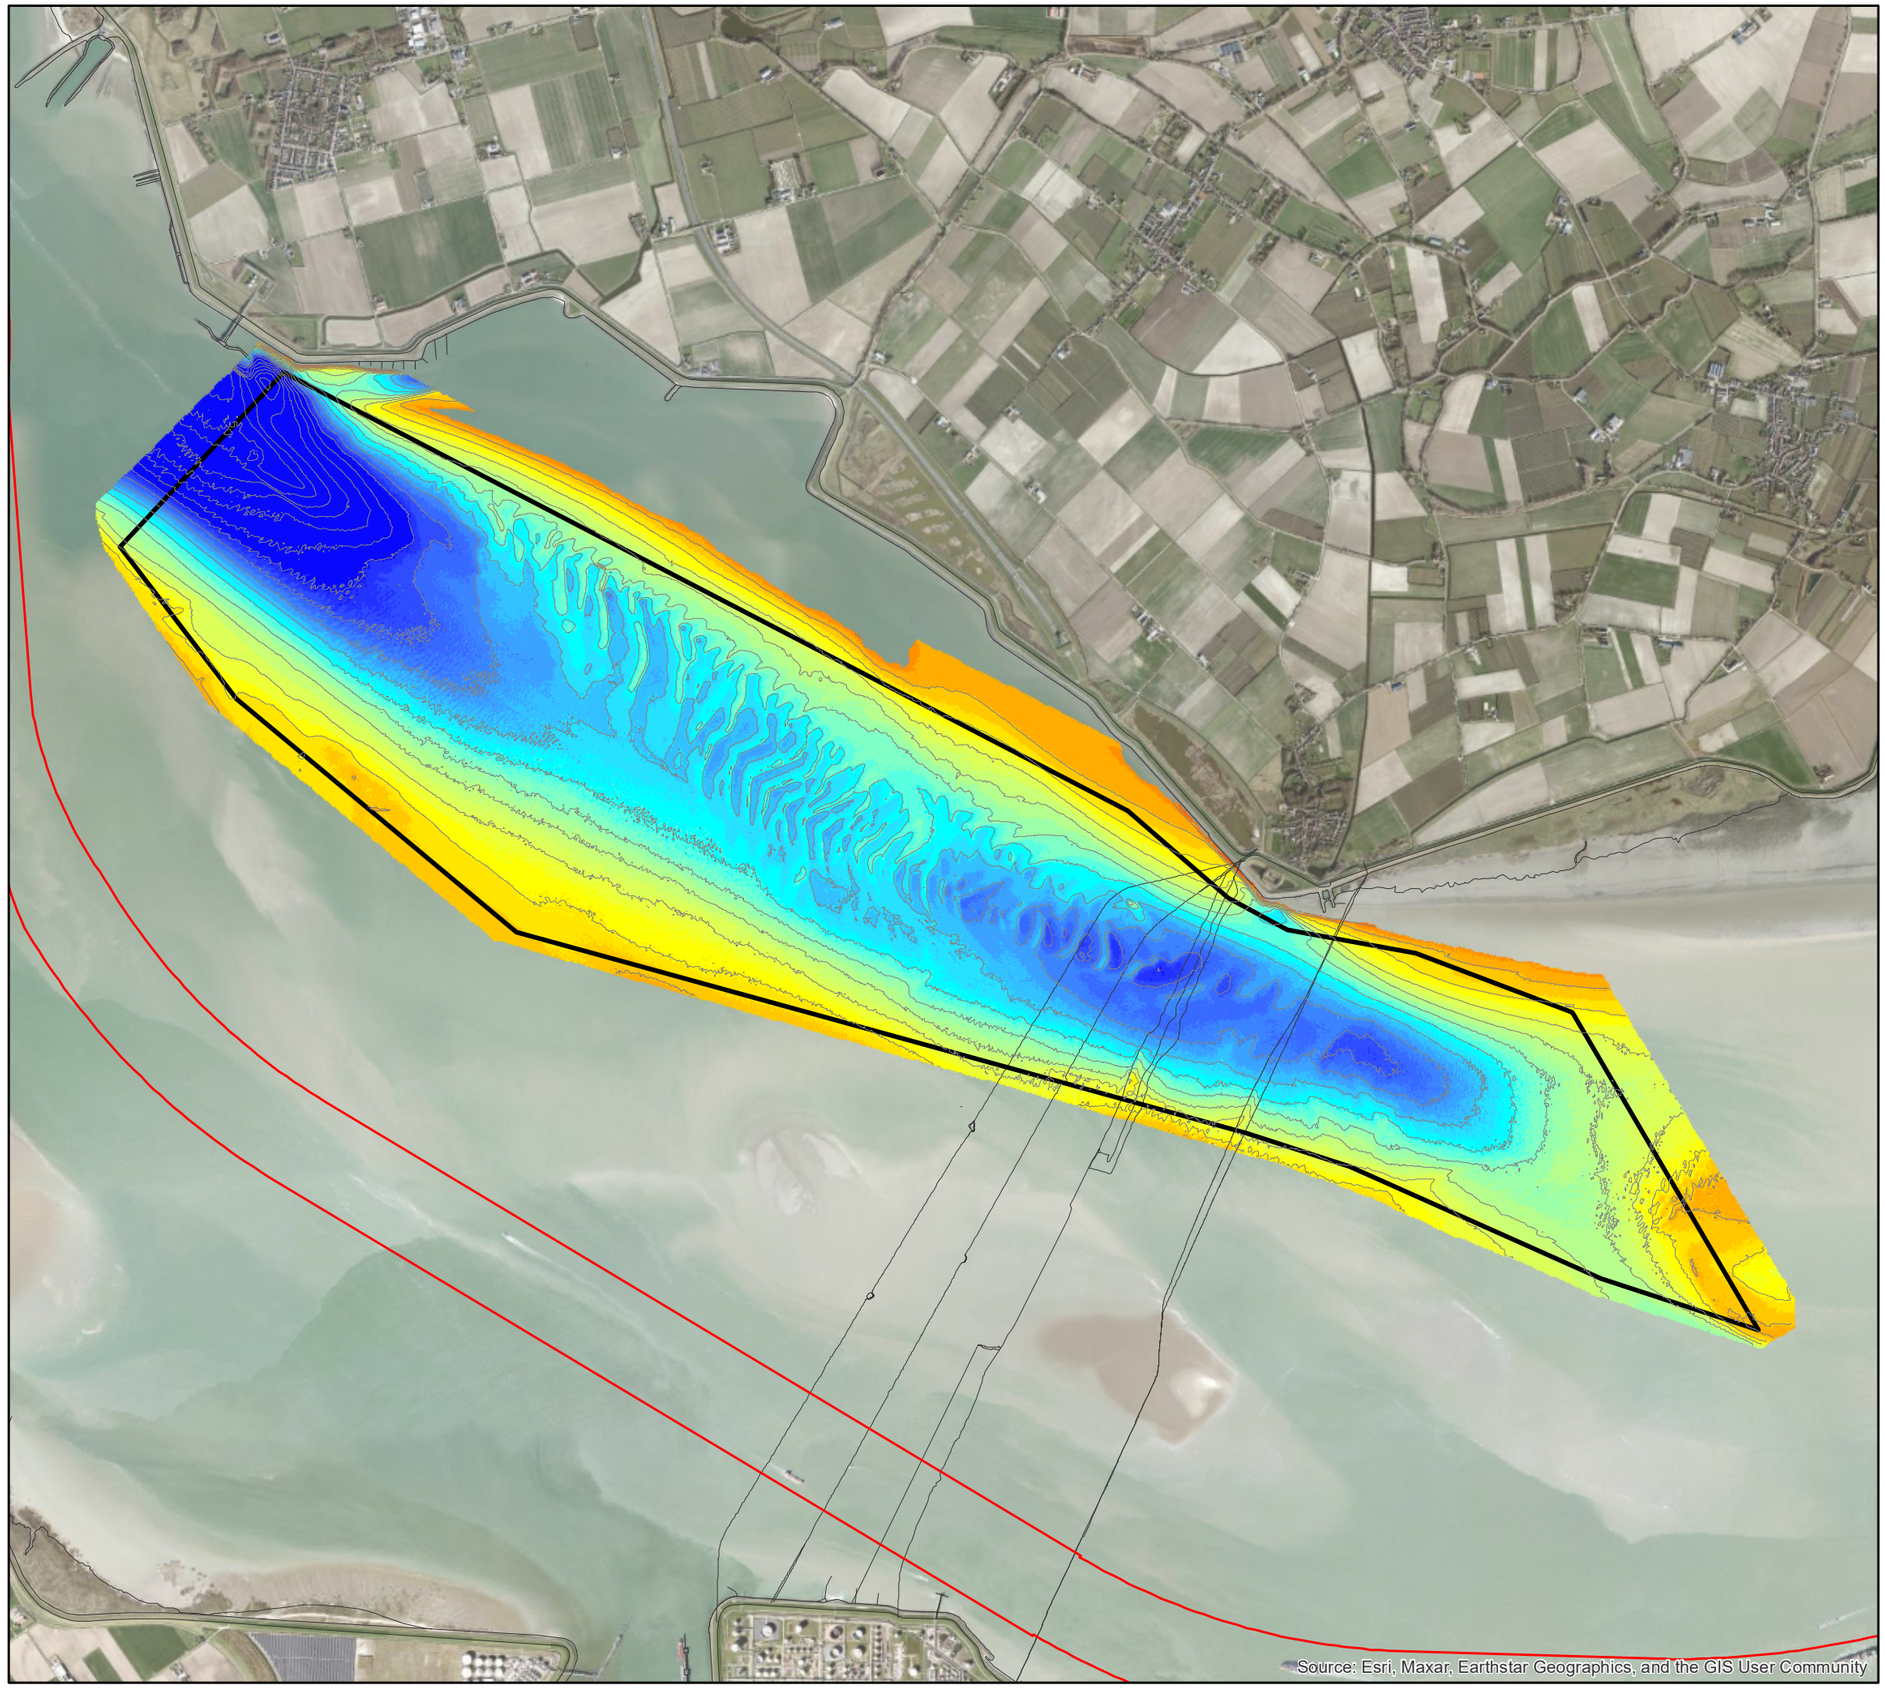

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025
Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SN31

13/01/2025 (T3)

11640_SN31_BT3
Rapport nr. 25.031



IMDC
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

Diepte in m [NAP]

- 0.09 - 1.00
- 1.01 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00

N
W E
S

0 200 400 600 800 1000 m

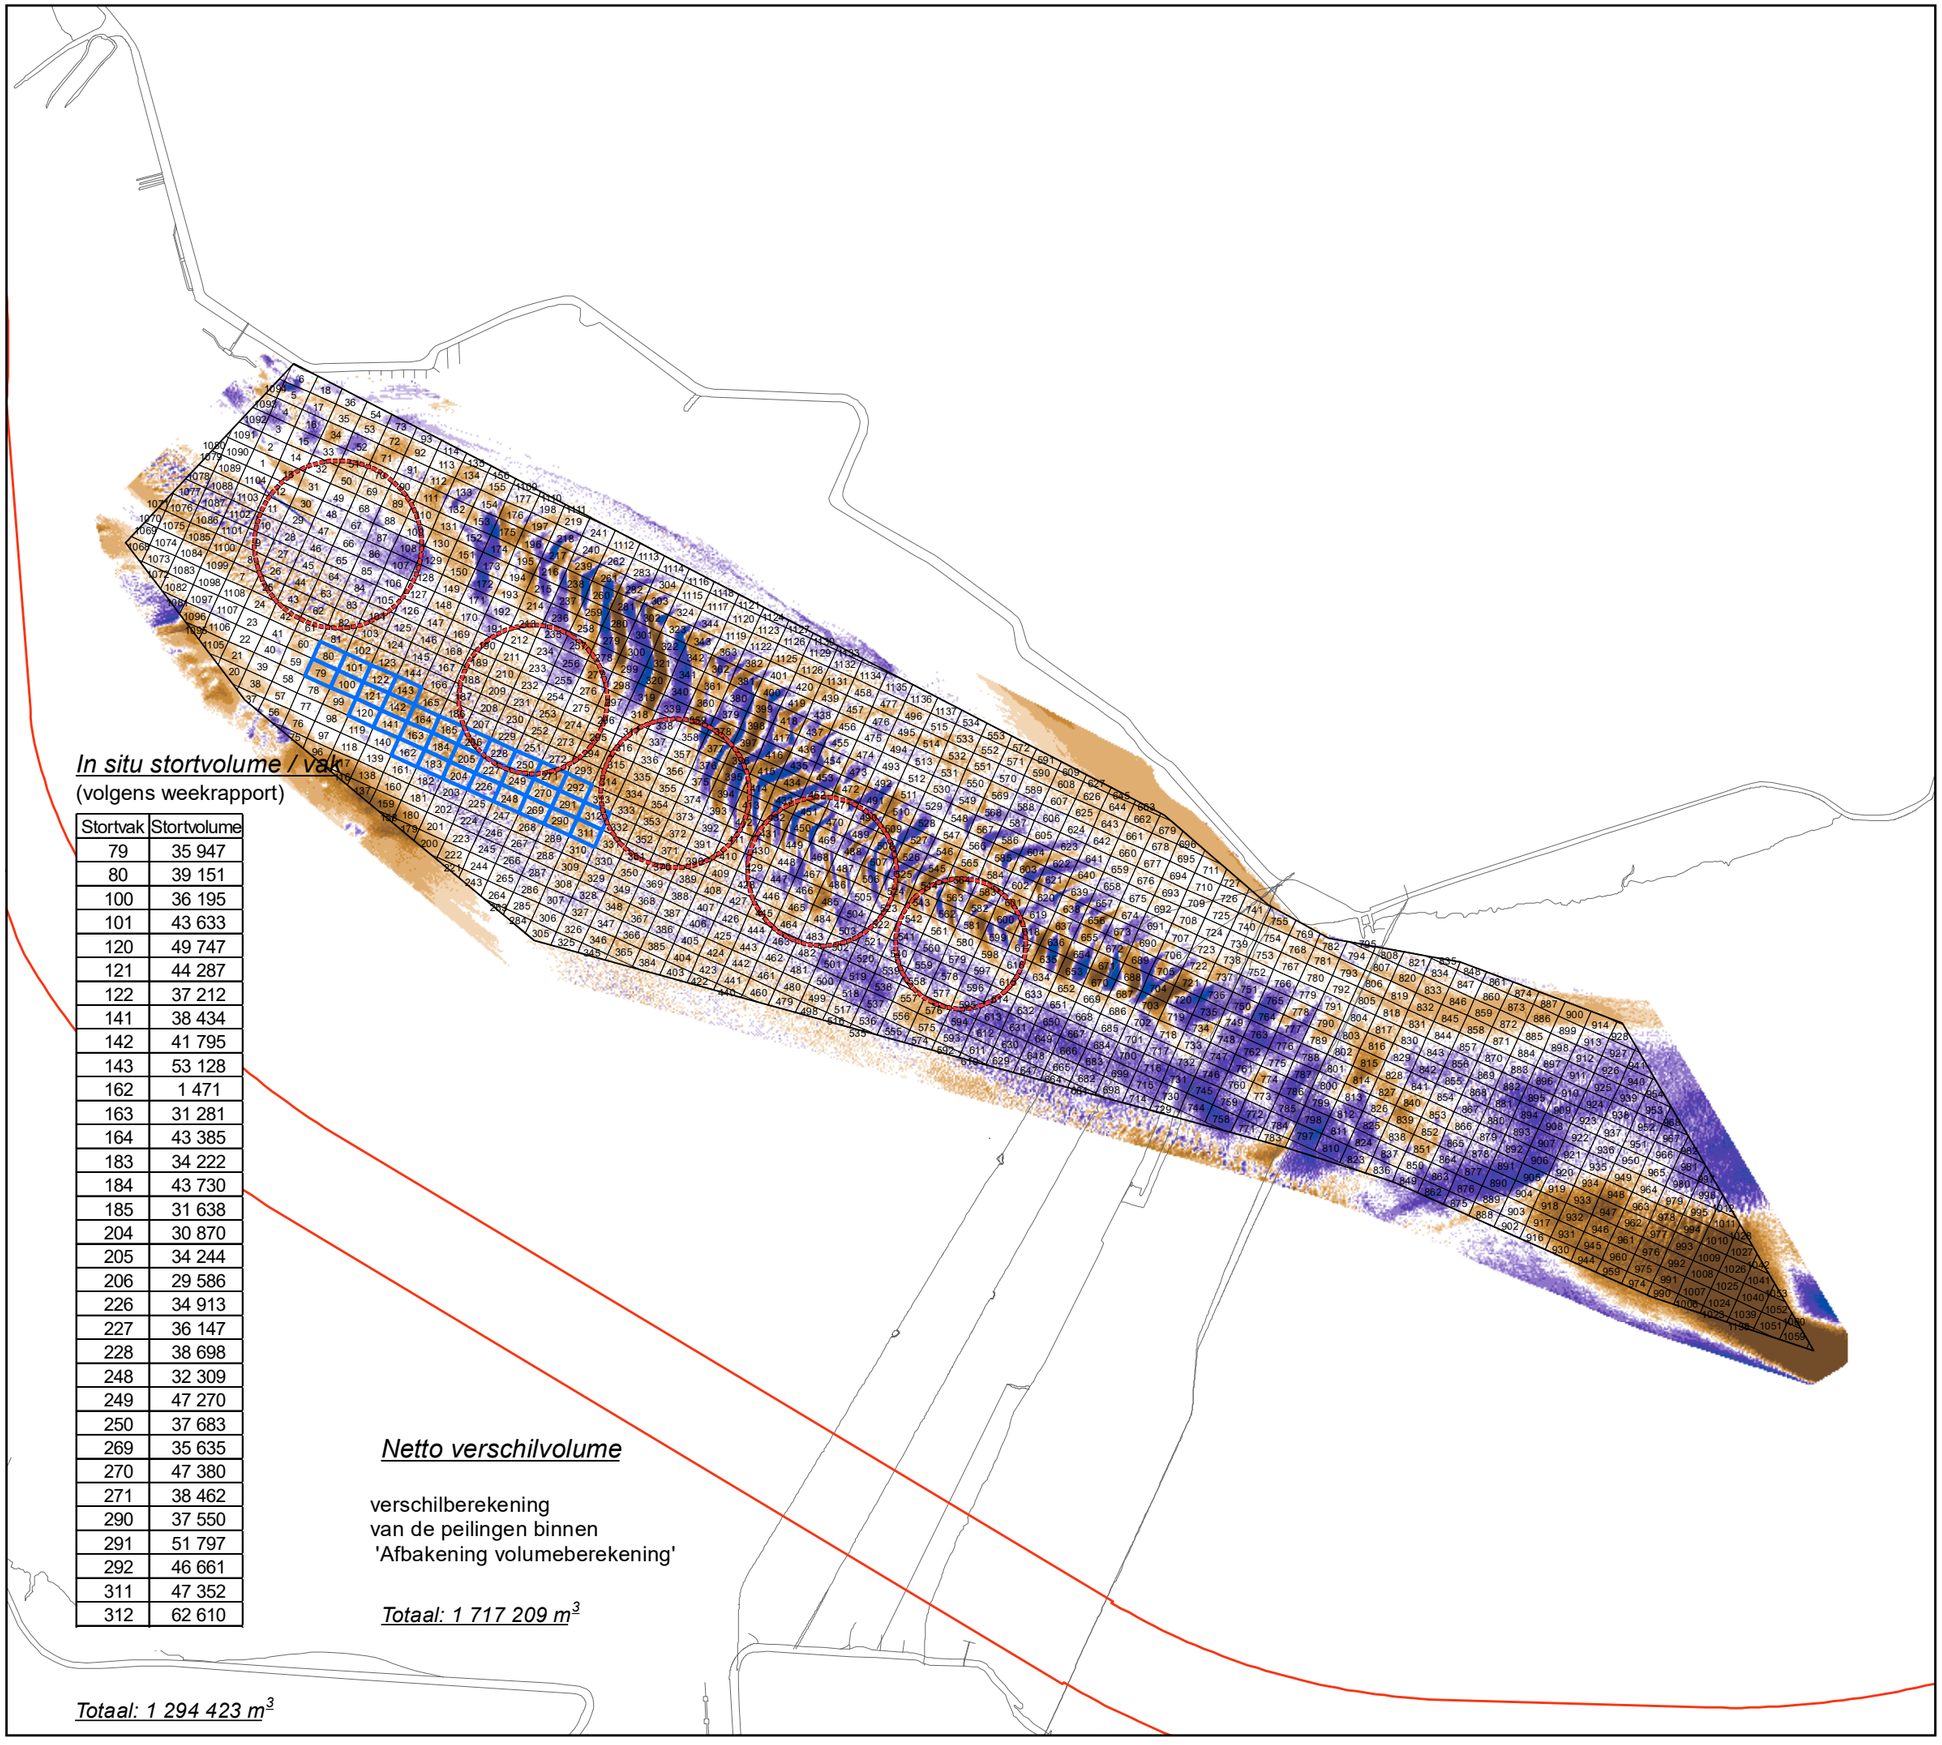

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SN31

05/07/2022 (T0) - 13/01/2025 (T3)

11640_SN31_VT3-0
Rapport nr. 25.031



IMDC
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50


verondieping

- -0.25 - +0.25
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

verdieping

N
W
E
S

0 500 1000 1500 2000 2500 m

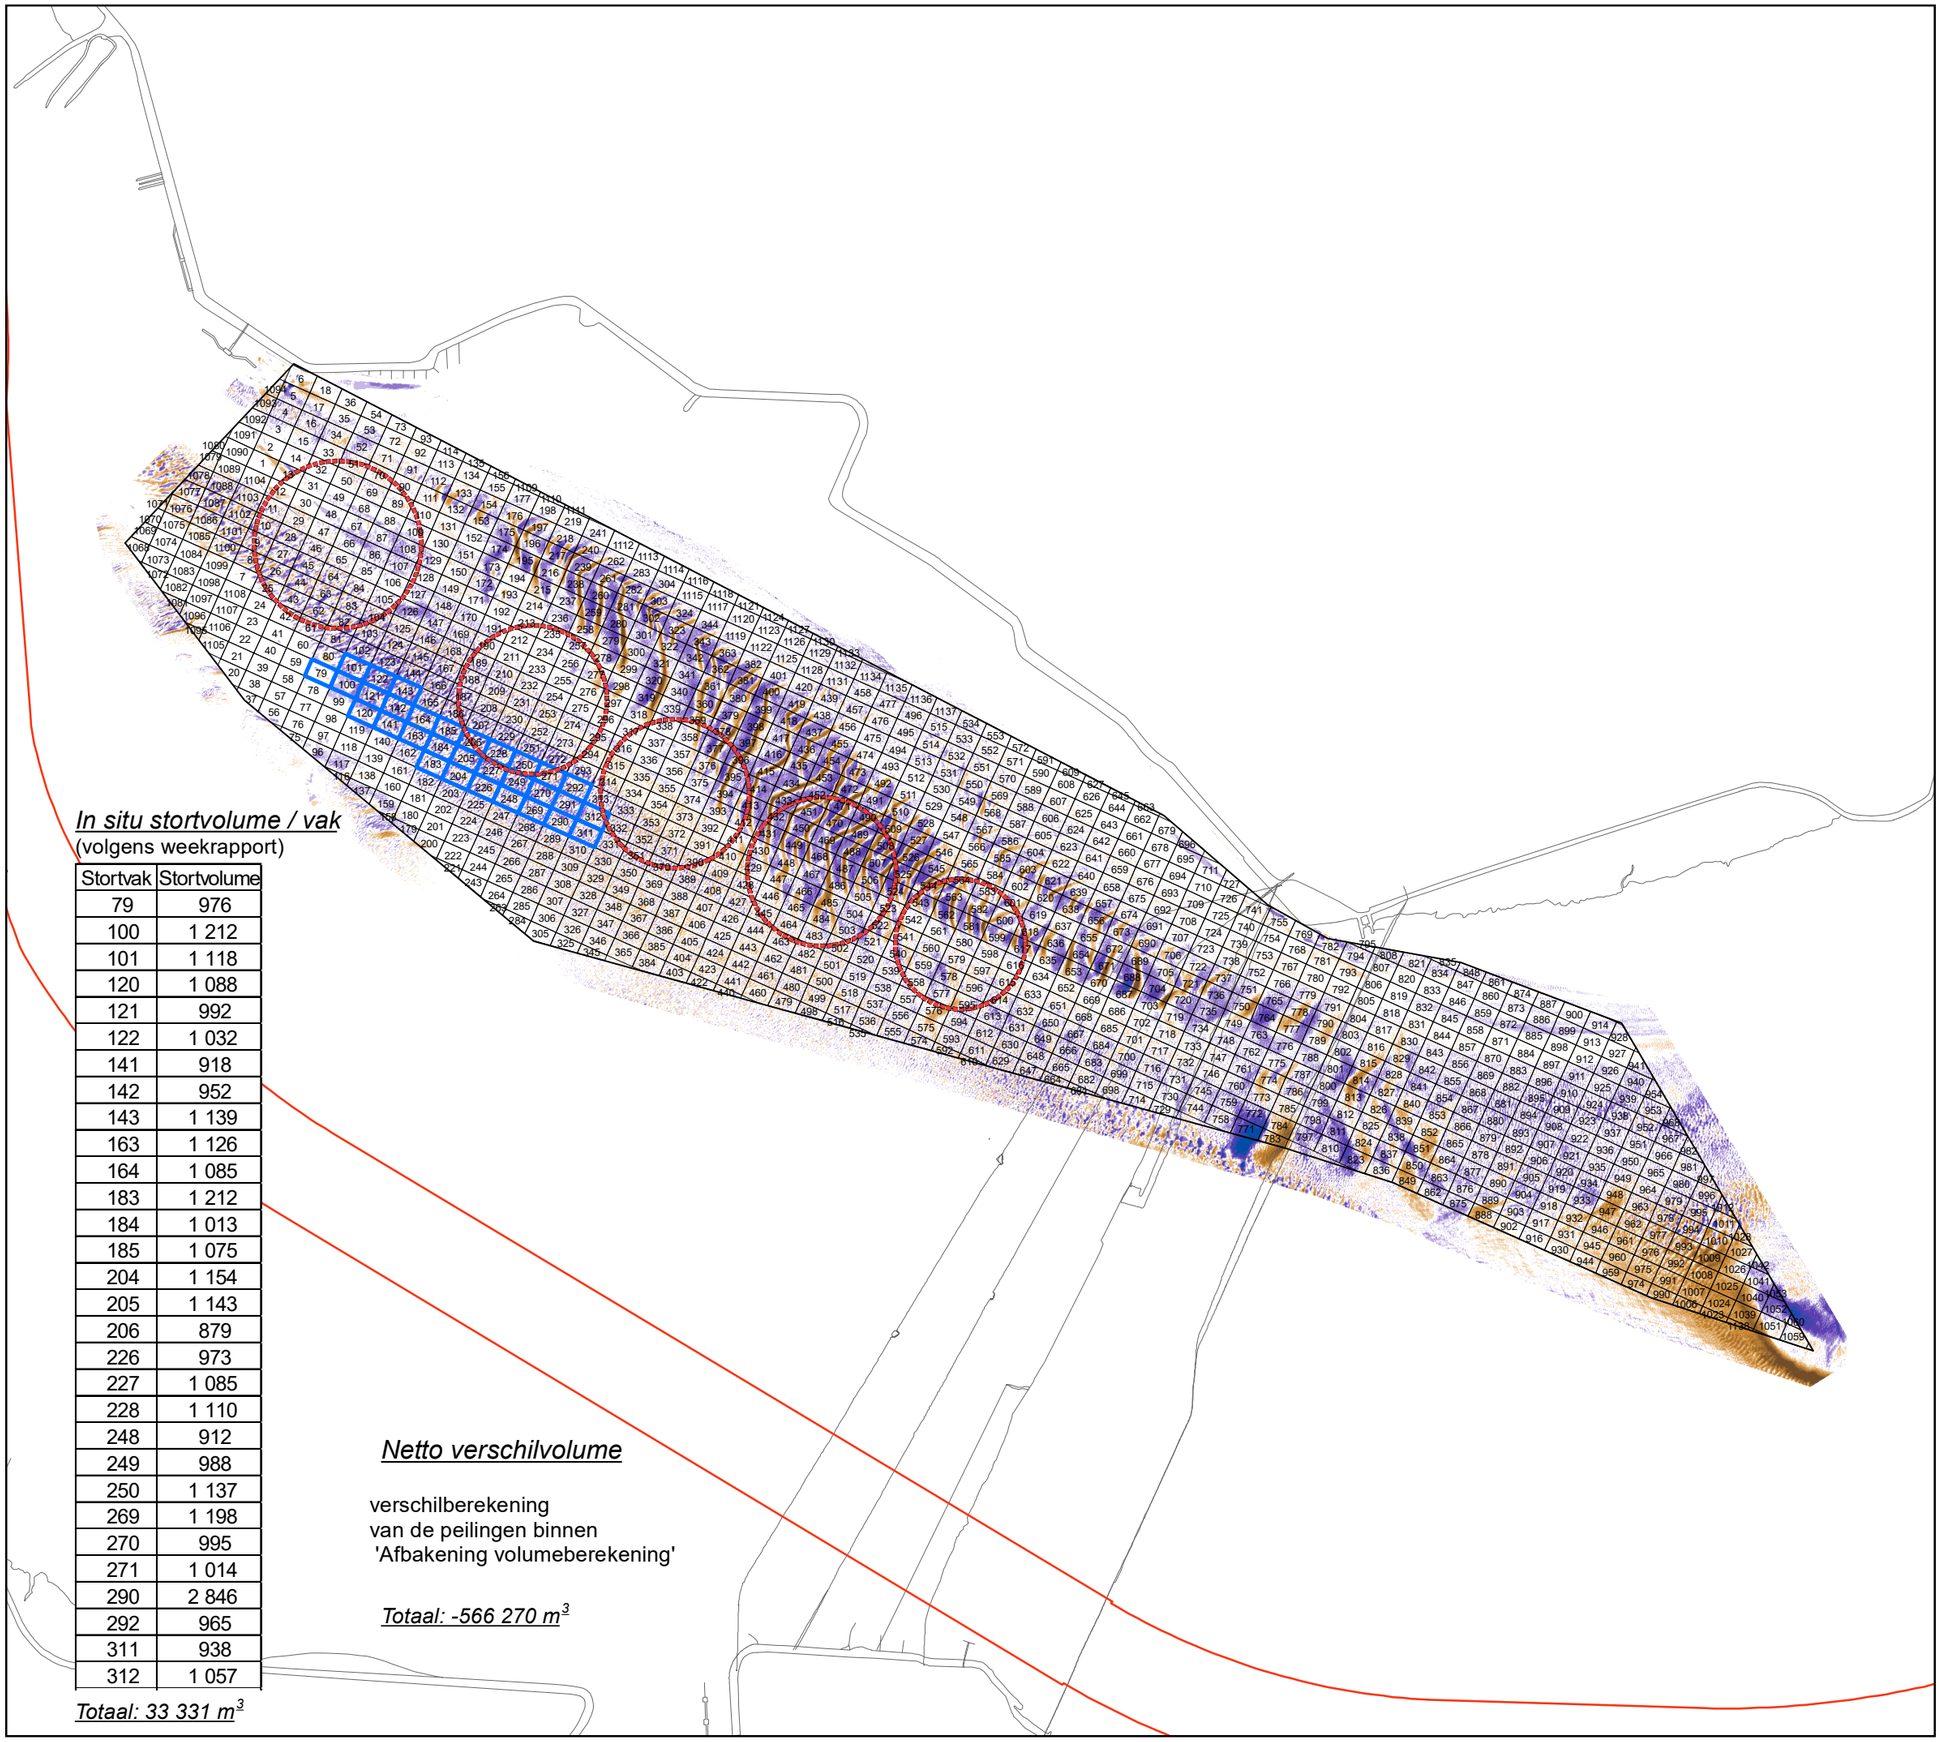

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SN31

15/07/2024 (T2) - 13/01/2025 (T3)

11640_SN31_VT3-2
Rapport nr. 25.031



IMDC
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50


- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N W E S

0 500 1000 1500 2000 2500 m

A.2 Kaartmateriaal februari en maart 2025

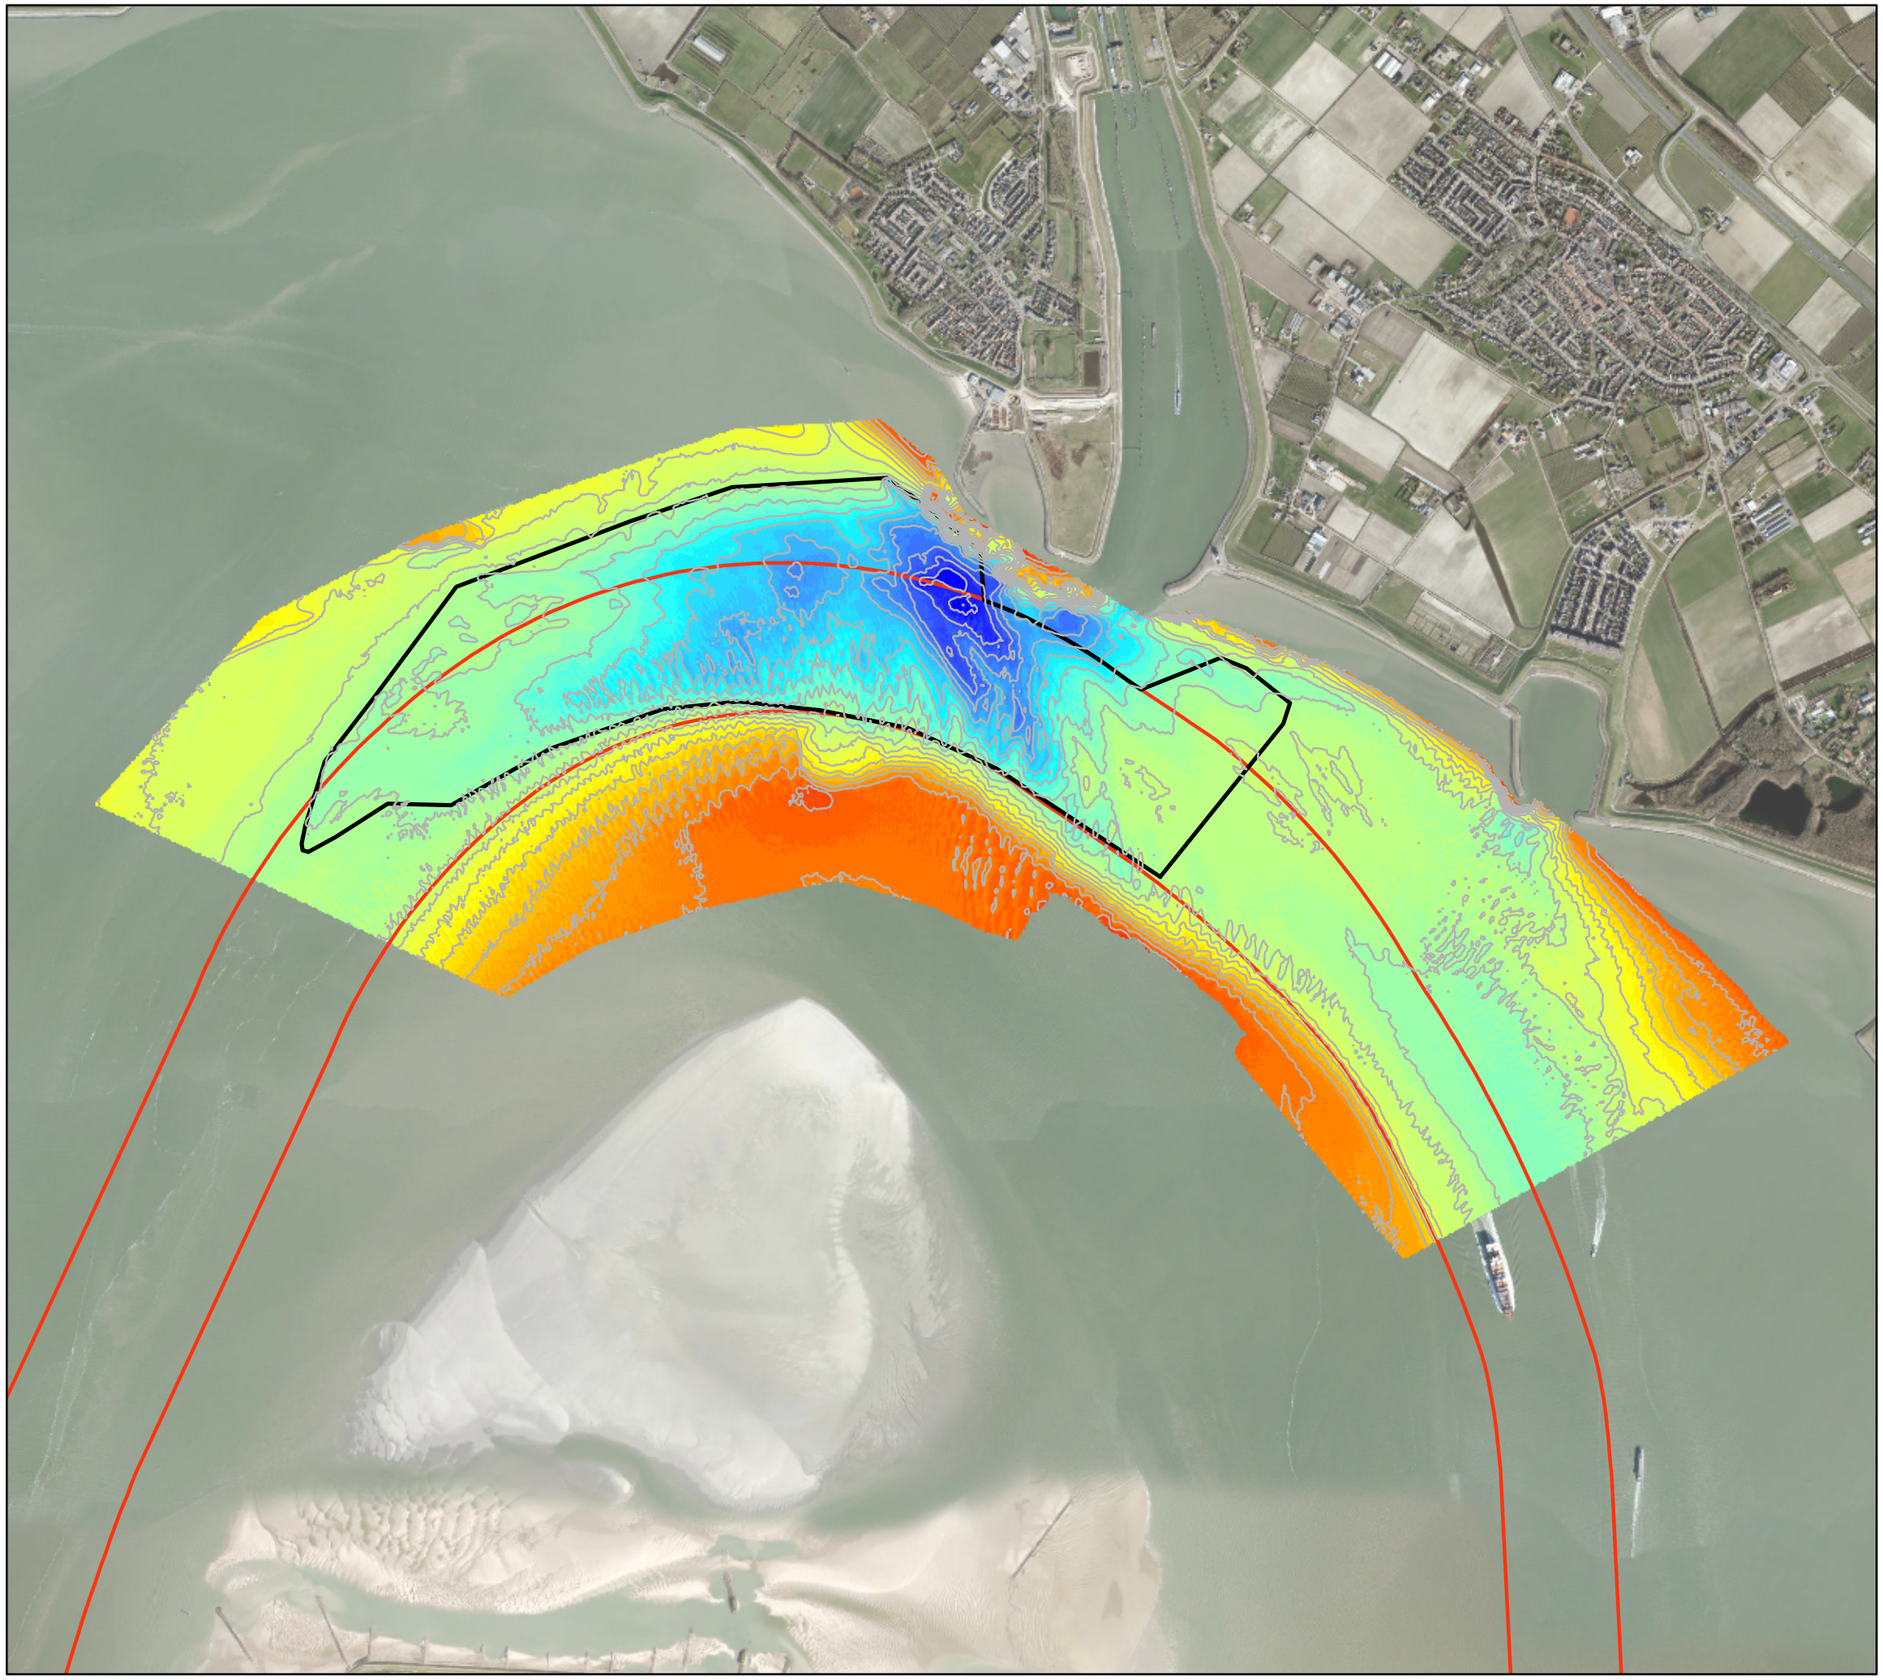

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025
Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart Put van Hansweert

27/01/2025 (T88)

11640_PVH_BT88
Rapport nr. 25.068



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

Diepte in m [NAP]

1.61 - 2.00	19.01 - 20.00
2.01 - 3.00	20.01 - 21.00
3.01 - 4.00	21.01 - 22.00
4.01 - 5.00	22.01 - 23.00
5.01 - 6.00	23.01 - 24.00
6.01 - 7.00	24.01 - 25.00
7.01 - 8.00	25.01 - 26.00
8.01 - 9.00	26.01 - 27.00
9.01 - 10.00	27.01 - 28.00
10.01 - 11.00	28.01 - 29.00
11.01 - 12.00	29.01 - 30.00
12.01 - 13.00	30.01 - 31.00
13.01 - 14.00	31.01 - 32.00
14.01 - 15.00	32.01 - 33.00
15.01 - 16.00	33.01 - 34.00
16.01 - 17.00	34.01 - 35.00
17.01 - 18.00	35.01 - 36.00
18.01 - 19.00	36.01 - 37.00

N
W E
S

0 200 400 600 800 1000 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)


Stortvak	Stortvolume
93	44 653
94	22 677
125	13 844
126	13 924
127	19 784
128	30 857
129	21 798
159	14 072
160	17 416
161	19 708
162	102 835
163	105 910
193	13 741
194	14 038
195	13 889
196	105 649
197	105 301
221	16 768
229	18 074
230	106 851
231	102 216
232	103 602
254	33 594
255	169 606
287	5 742
288	188 220
289	152 000
321	67 578
322	158 707
323	157 089
356	134 935
464	5 613
475	85 281
476	89 116
483	91 315
484	86 557
485	5 689
486	5 639
490	97 857
491	70 260
492	104 487
493	15 086
494	14 943
498	106 217
499	18 399
500	19 675
513	39 713
514	56 533
516	44 859
517	44 770
518	45 051
519	54 454
520	68 154
523	49 461
524	56 043
525	11 331

Totaal: 3381580 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 2391581 m³

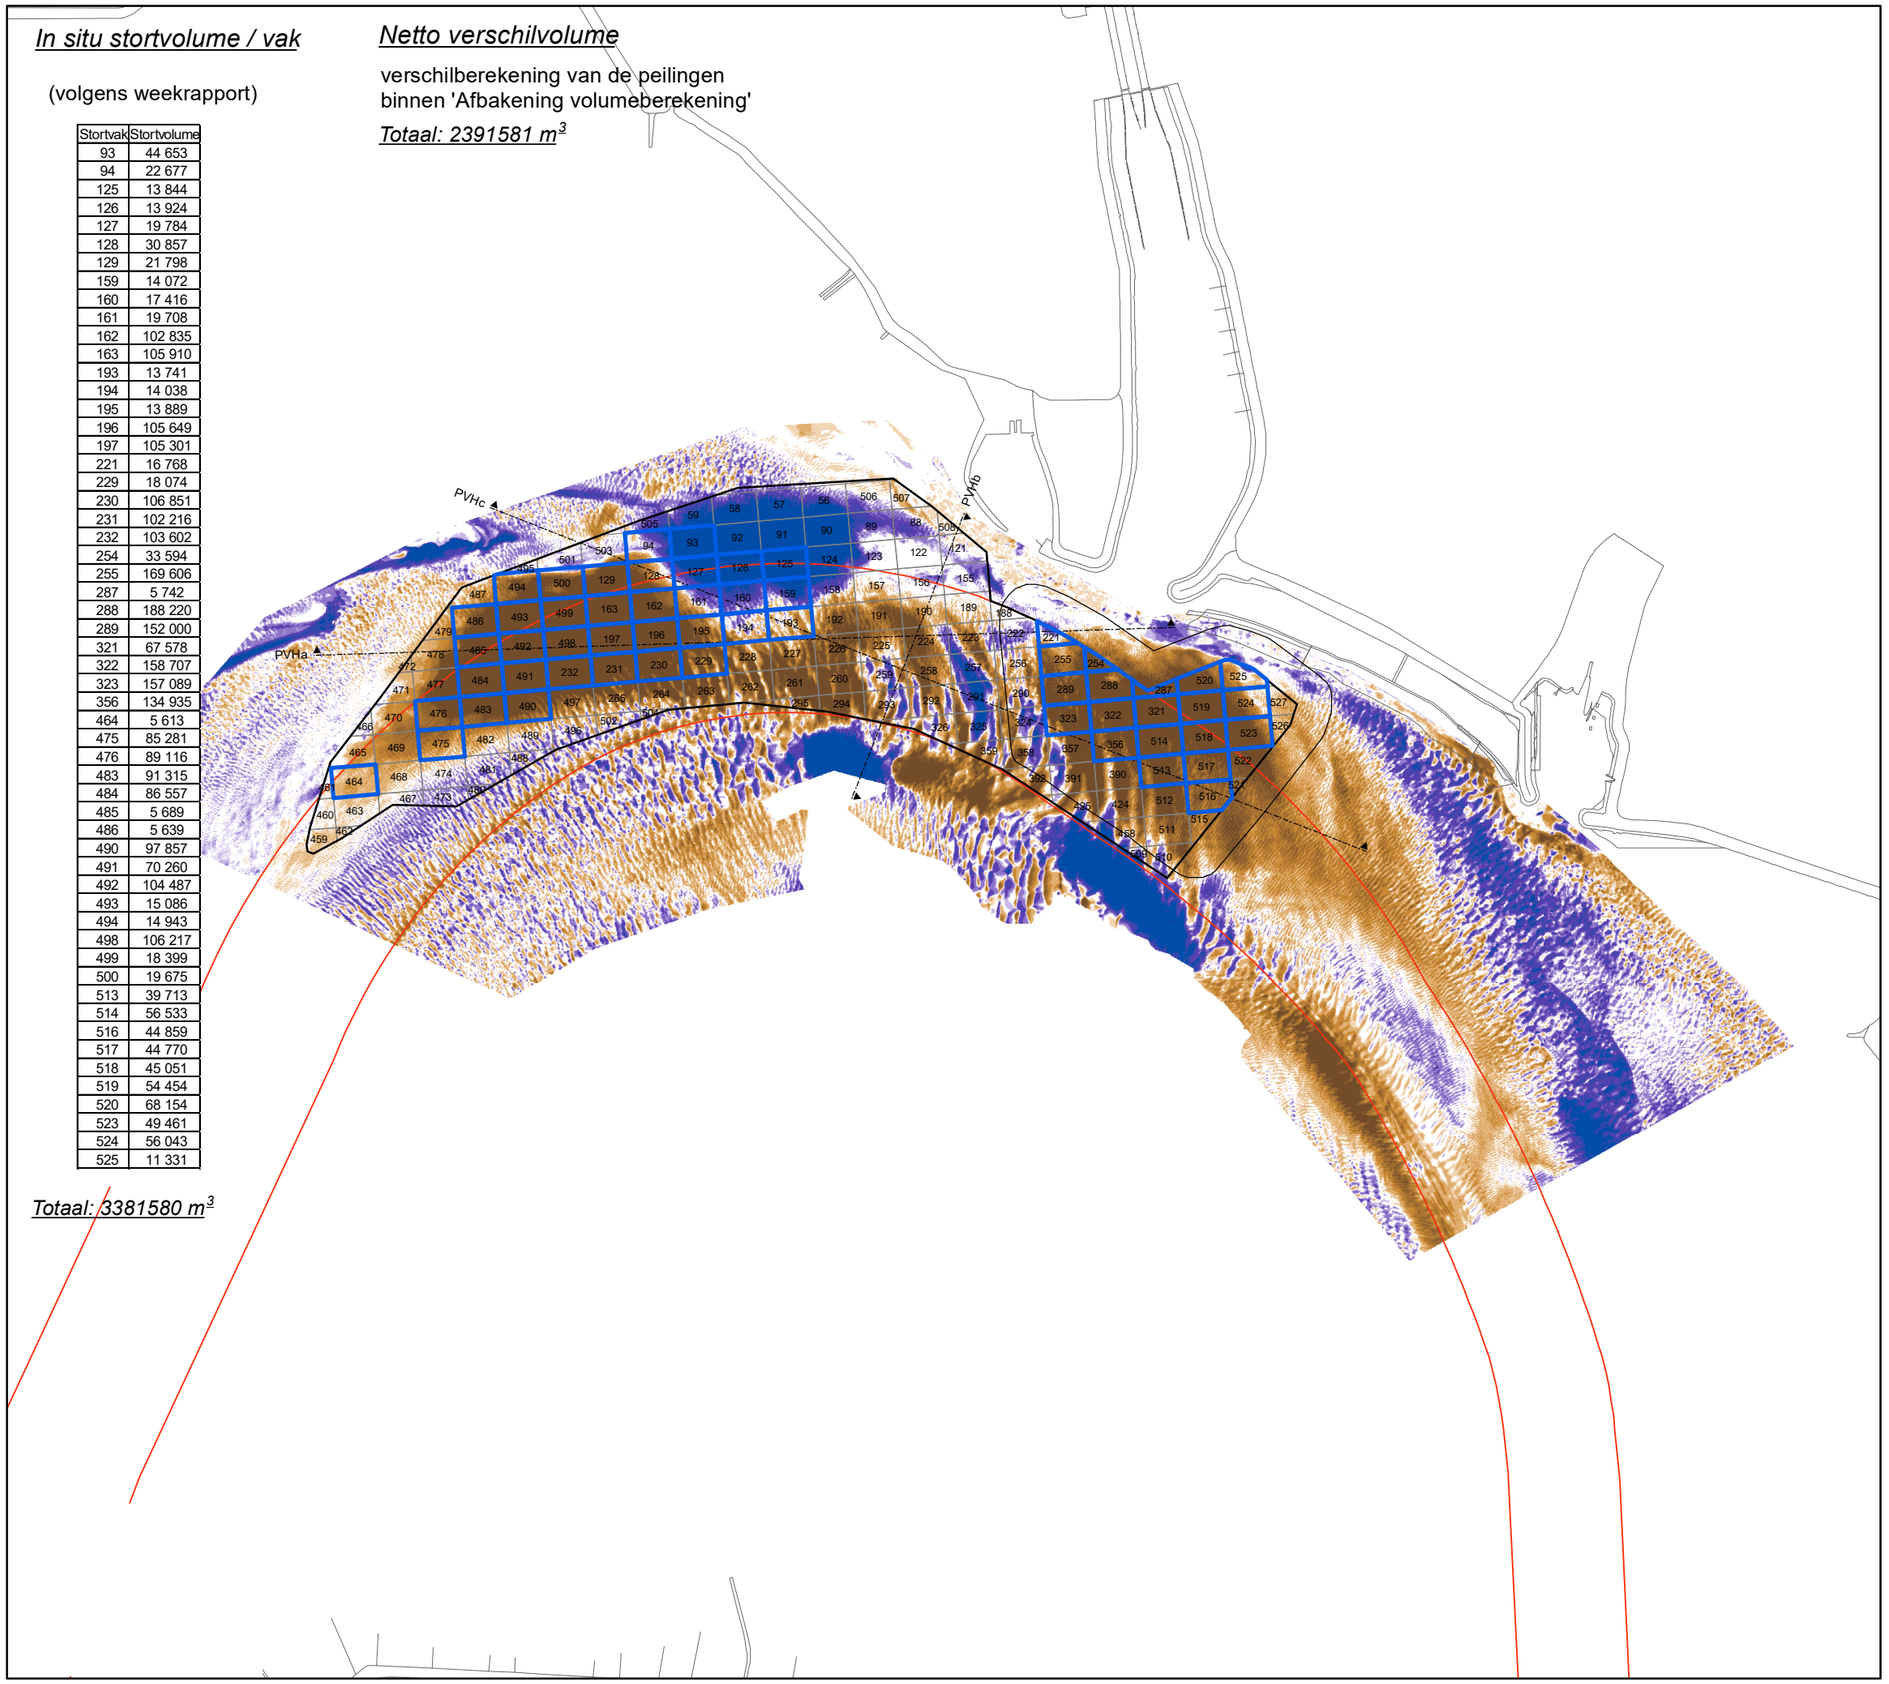

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nrMT/02323_C1_04

Verschilkaart Put van Hansweert

02/05/2022 (T65) - 27/01/2025 (T88)

11640_PVH_VT88-T65

Rapport nr. 25.068



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	
-0.99 - -0.50	verdieping
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

0 200 400 600 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)


Stortvak	Stortvolume
93	44 653
94	22 677
125	13 844
126	13 924
127	19 784
128	30 857
129	21 798
159	14 072
160	17 416
161	19 708
162	102 835
163	105 910
193	13 741
194	14 038
195	13 889
196	105 649
197	105 301
221	16 768
229	18 074
230	106 851
231	102 216
232	103 602
254	33 594
255	169 606
287	5 742
288	188 220
289	152 000
321	67 578
322	158 707
323	157 089
356	134 935
464	5 613
475	85 281
476	89 116
483	91 315
484	86 557
485	5 689
486	5 639
490	97 857
491	70 260
492	104 487
493	15 086
494	14 943
498	106 217
499	18 399
500	19 675
513	39 713
514	56 533
516	44 859
517	44 770
518	45 051
519	54 454
520	68 154
523	49 461
524	56 043
525	11 331

Totaal: 3381580 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 2855948 m³

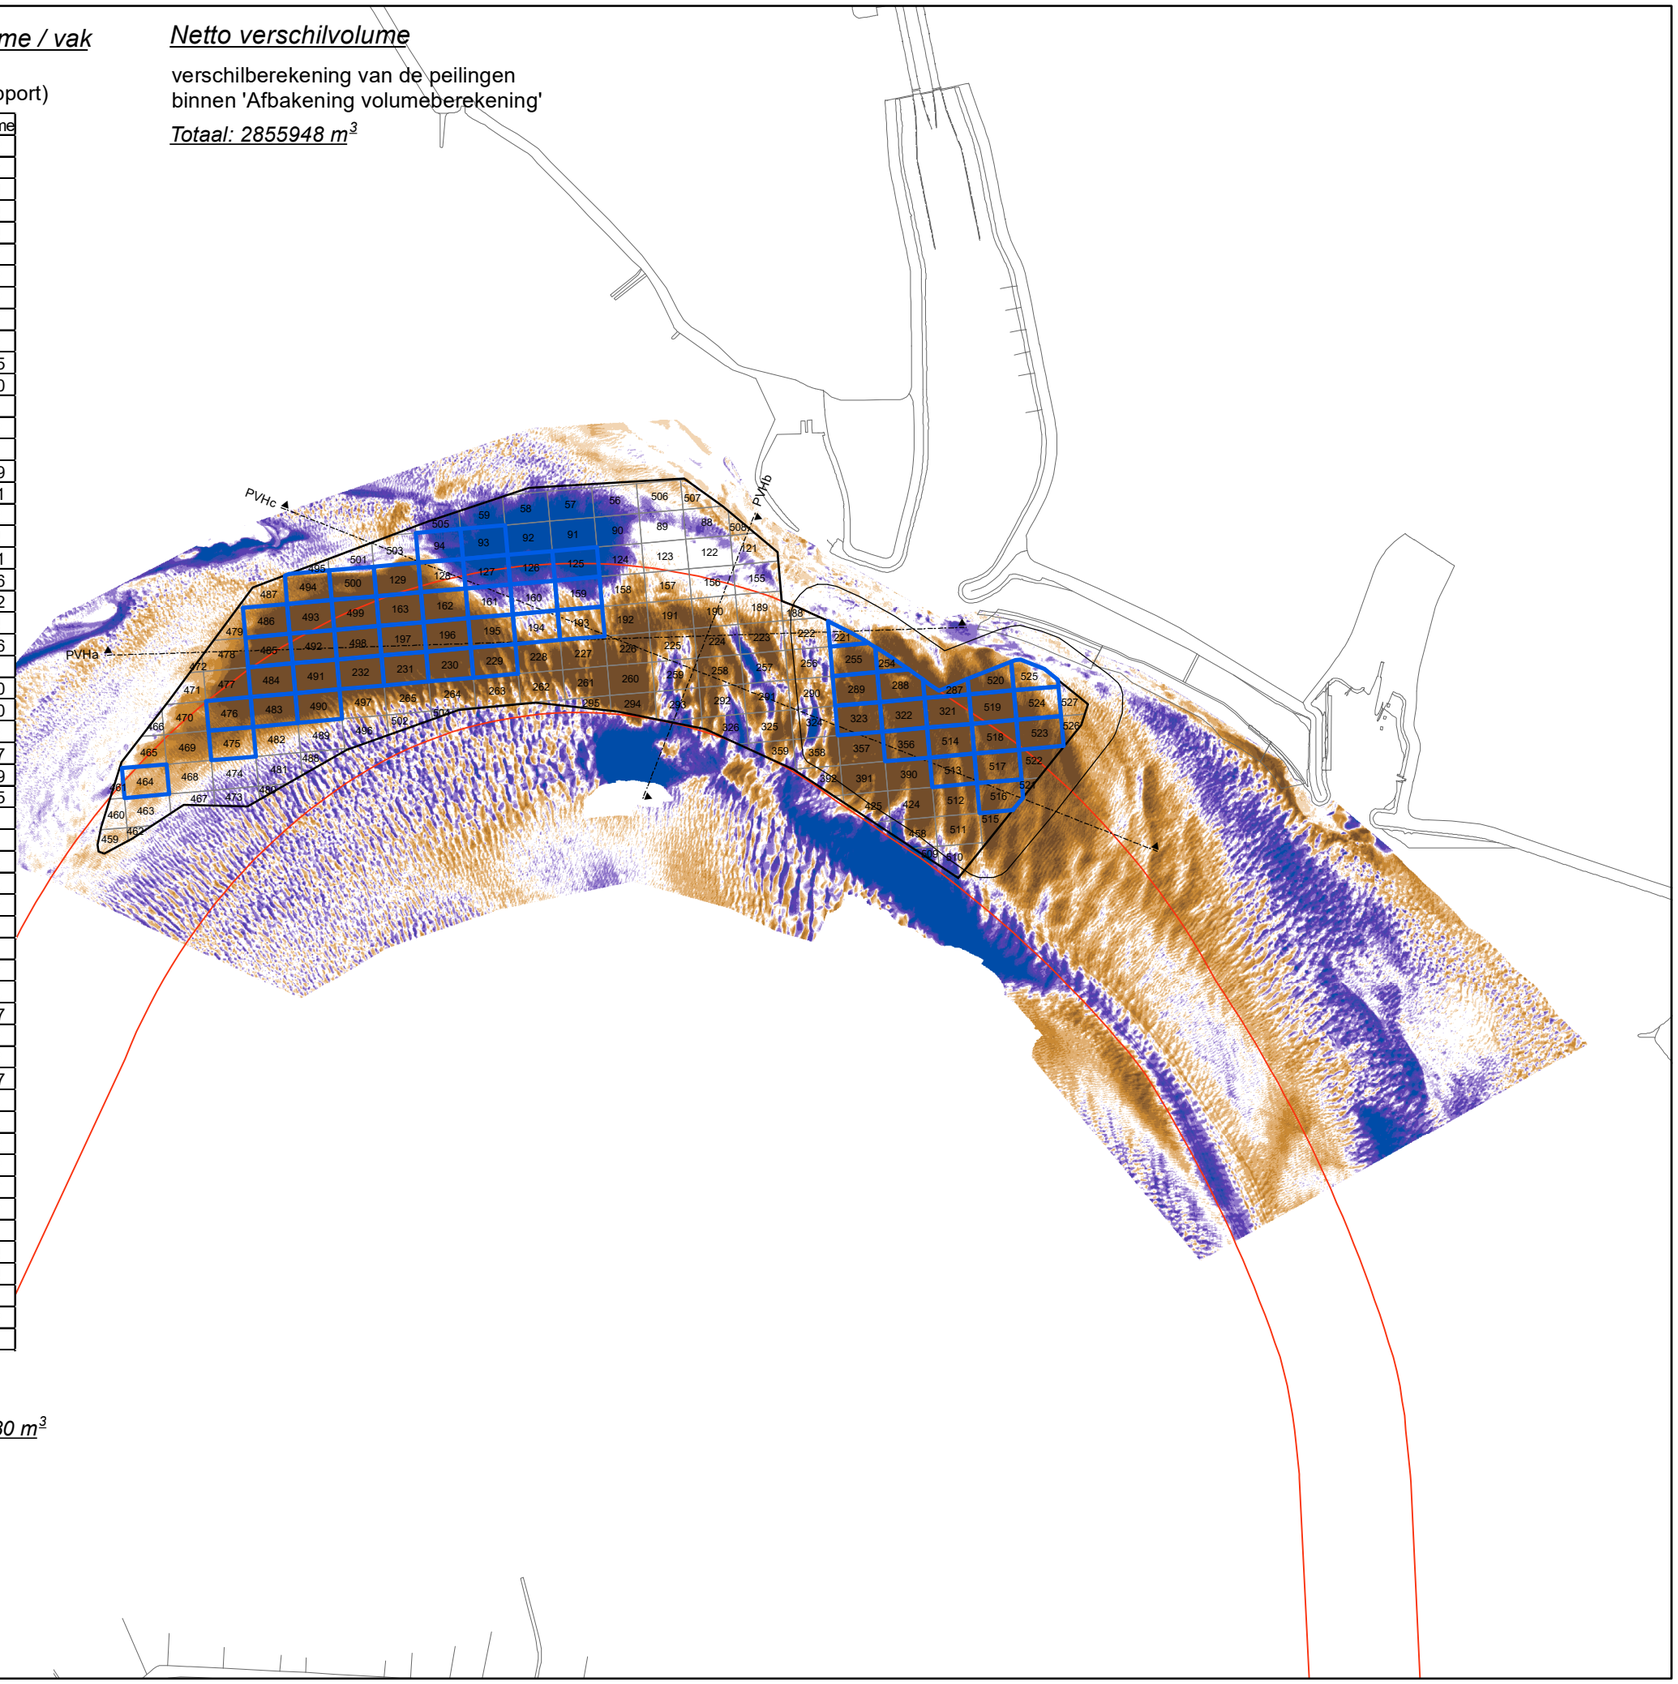

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nrMT/02323_C1_04

Verschilkaart Put van Hansweert

20/09/2022 (T68) - 27/01/2025 (T88)

11640_PVH_VT88-T68

Rapport nr. 25.068



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	verdieping
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

0 200 400 600 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
125	11 652
126	11 732
127	11 880
128	11 629
129	17 419
159	11 640
160	12 981
161	17 430
162	11 732
163	15 193
193	11 737
194	11 772
195	11 623
196	17 318
197	13 901
229	11 657
230	11 509
231	11 675
232	14 101
464	5 613
485	5 689
486	5 639
490	9 334
492	2 403
493	15 086
494	14 943
498	14 061
499	14 060
500	17 443

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 683105 m³

Totaal: 352852 m³

PVHa
PVHb
PVHc

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nrMT/02323_C1_04

Verschilkaart Put van Hansweert

17/11/2024 (T87) - 27/01/2025 (T88)

11640_PVH_VT88-T87

Rapport nr. 25.068



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m


verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50

- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N
W
E
S

0 200 400 600 m

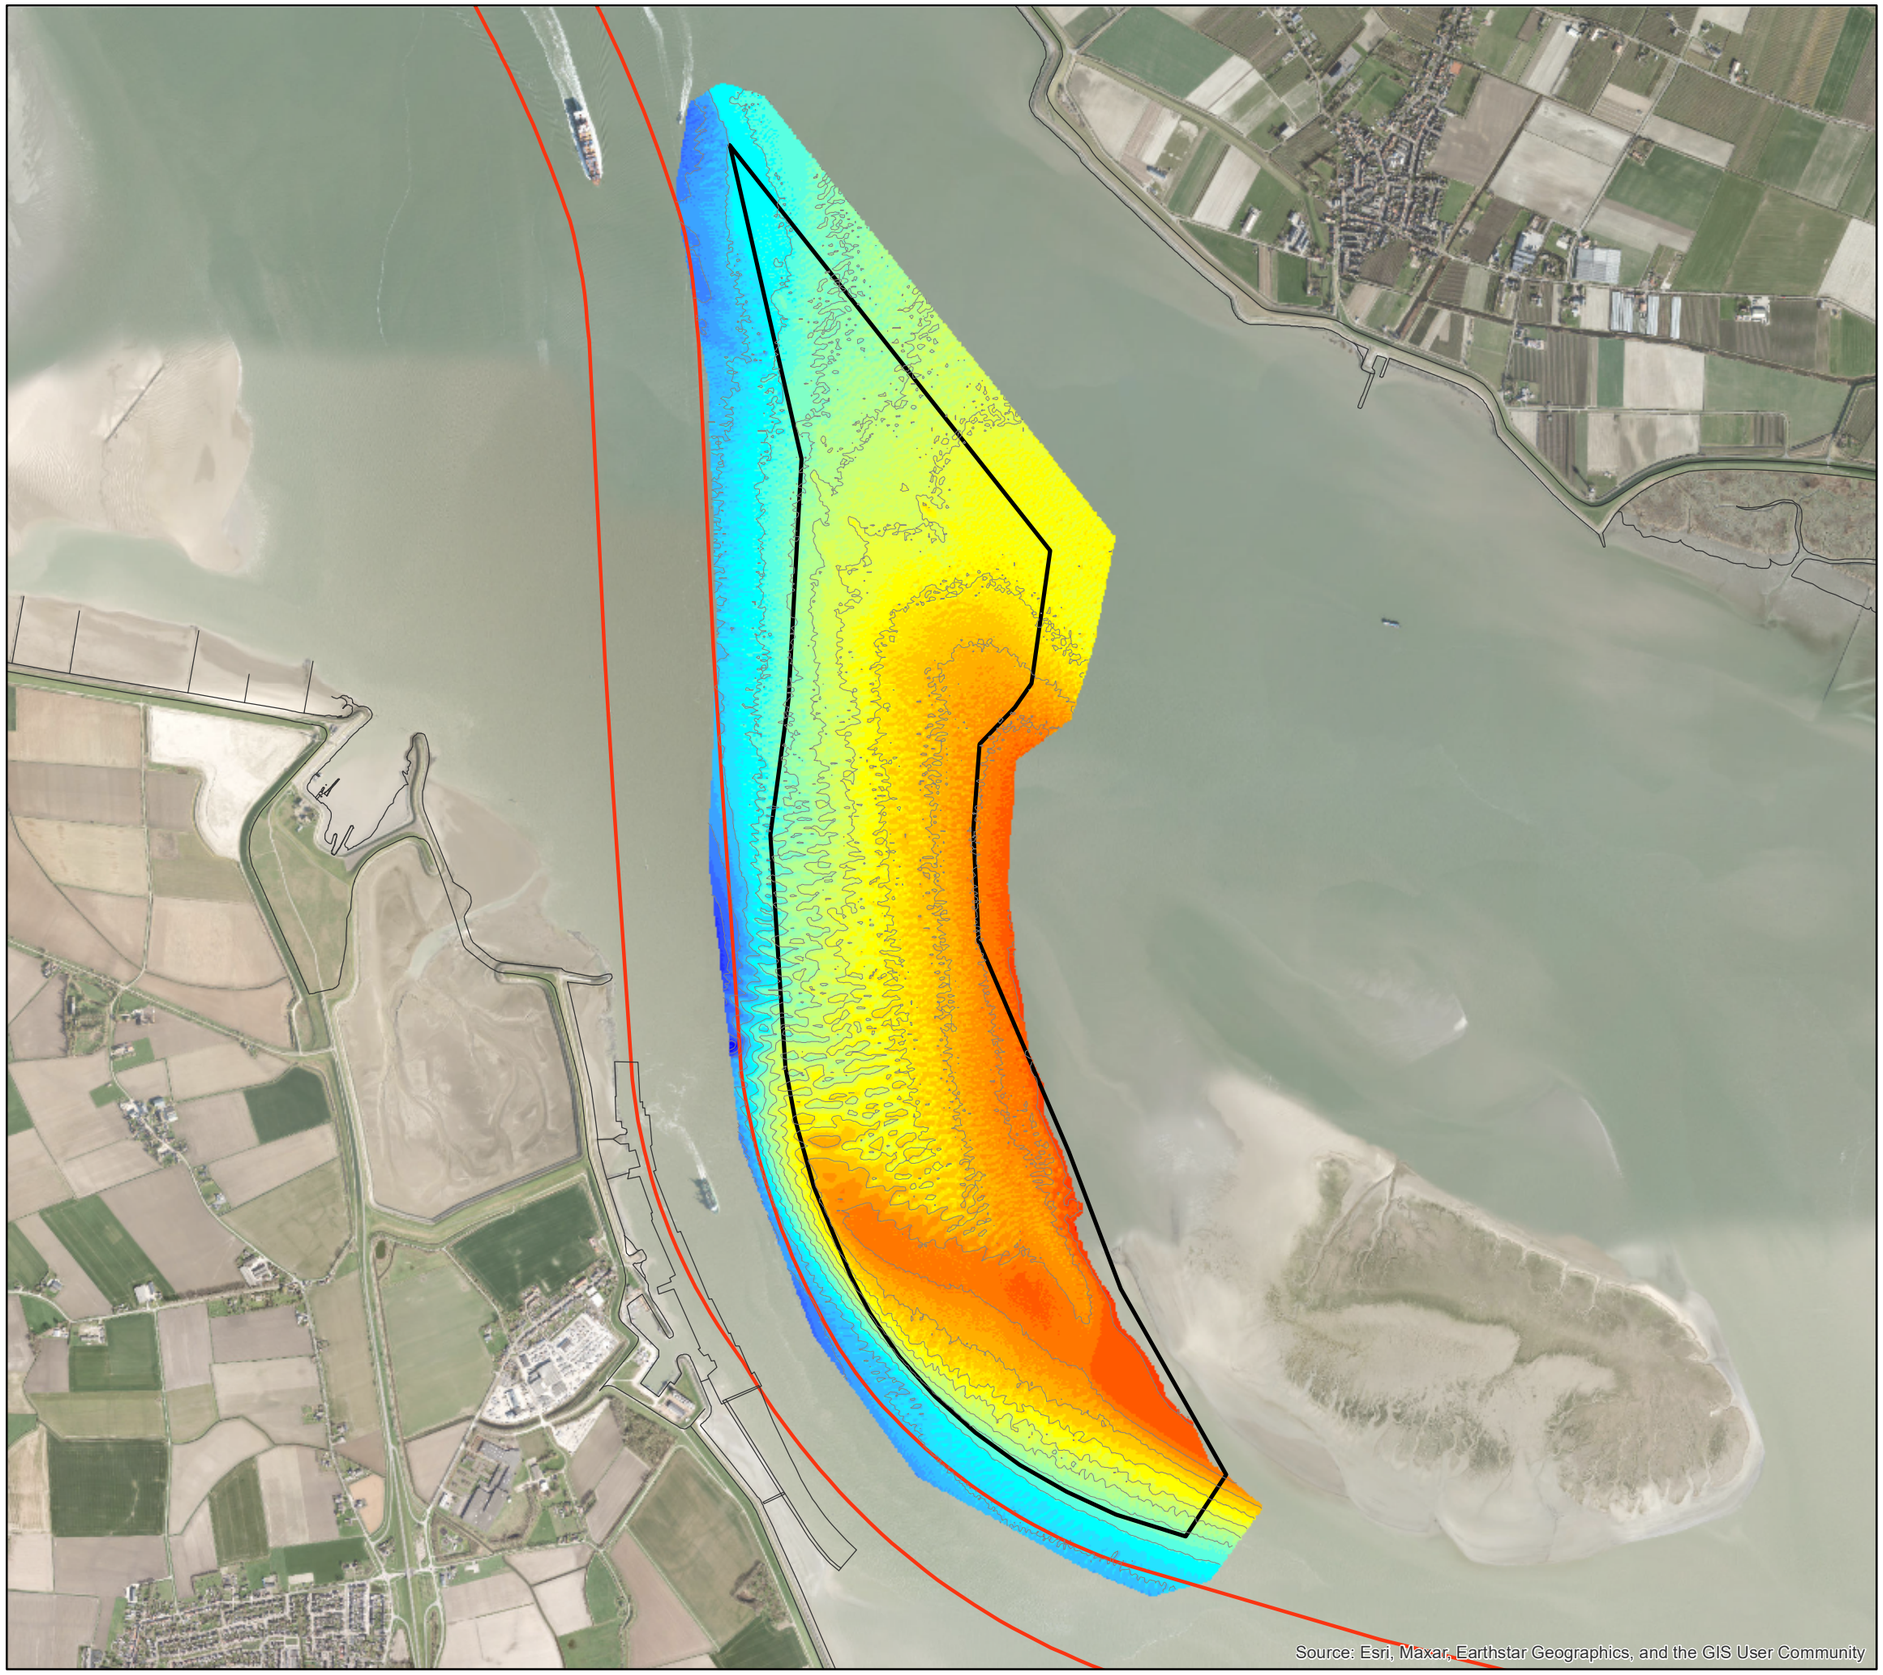

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart Plaat van Walsoorden

10/02/2025 (T171)

11640_PWA_BT171
Rapport nr. 25.068



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

Diepte in m [NAP]

- 0.09 - 1.00
- 1.01 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00

N
W E
S

0 300 600 900 1200 1500 m

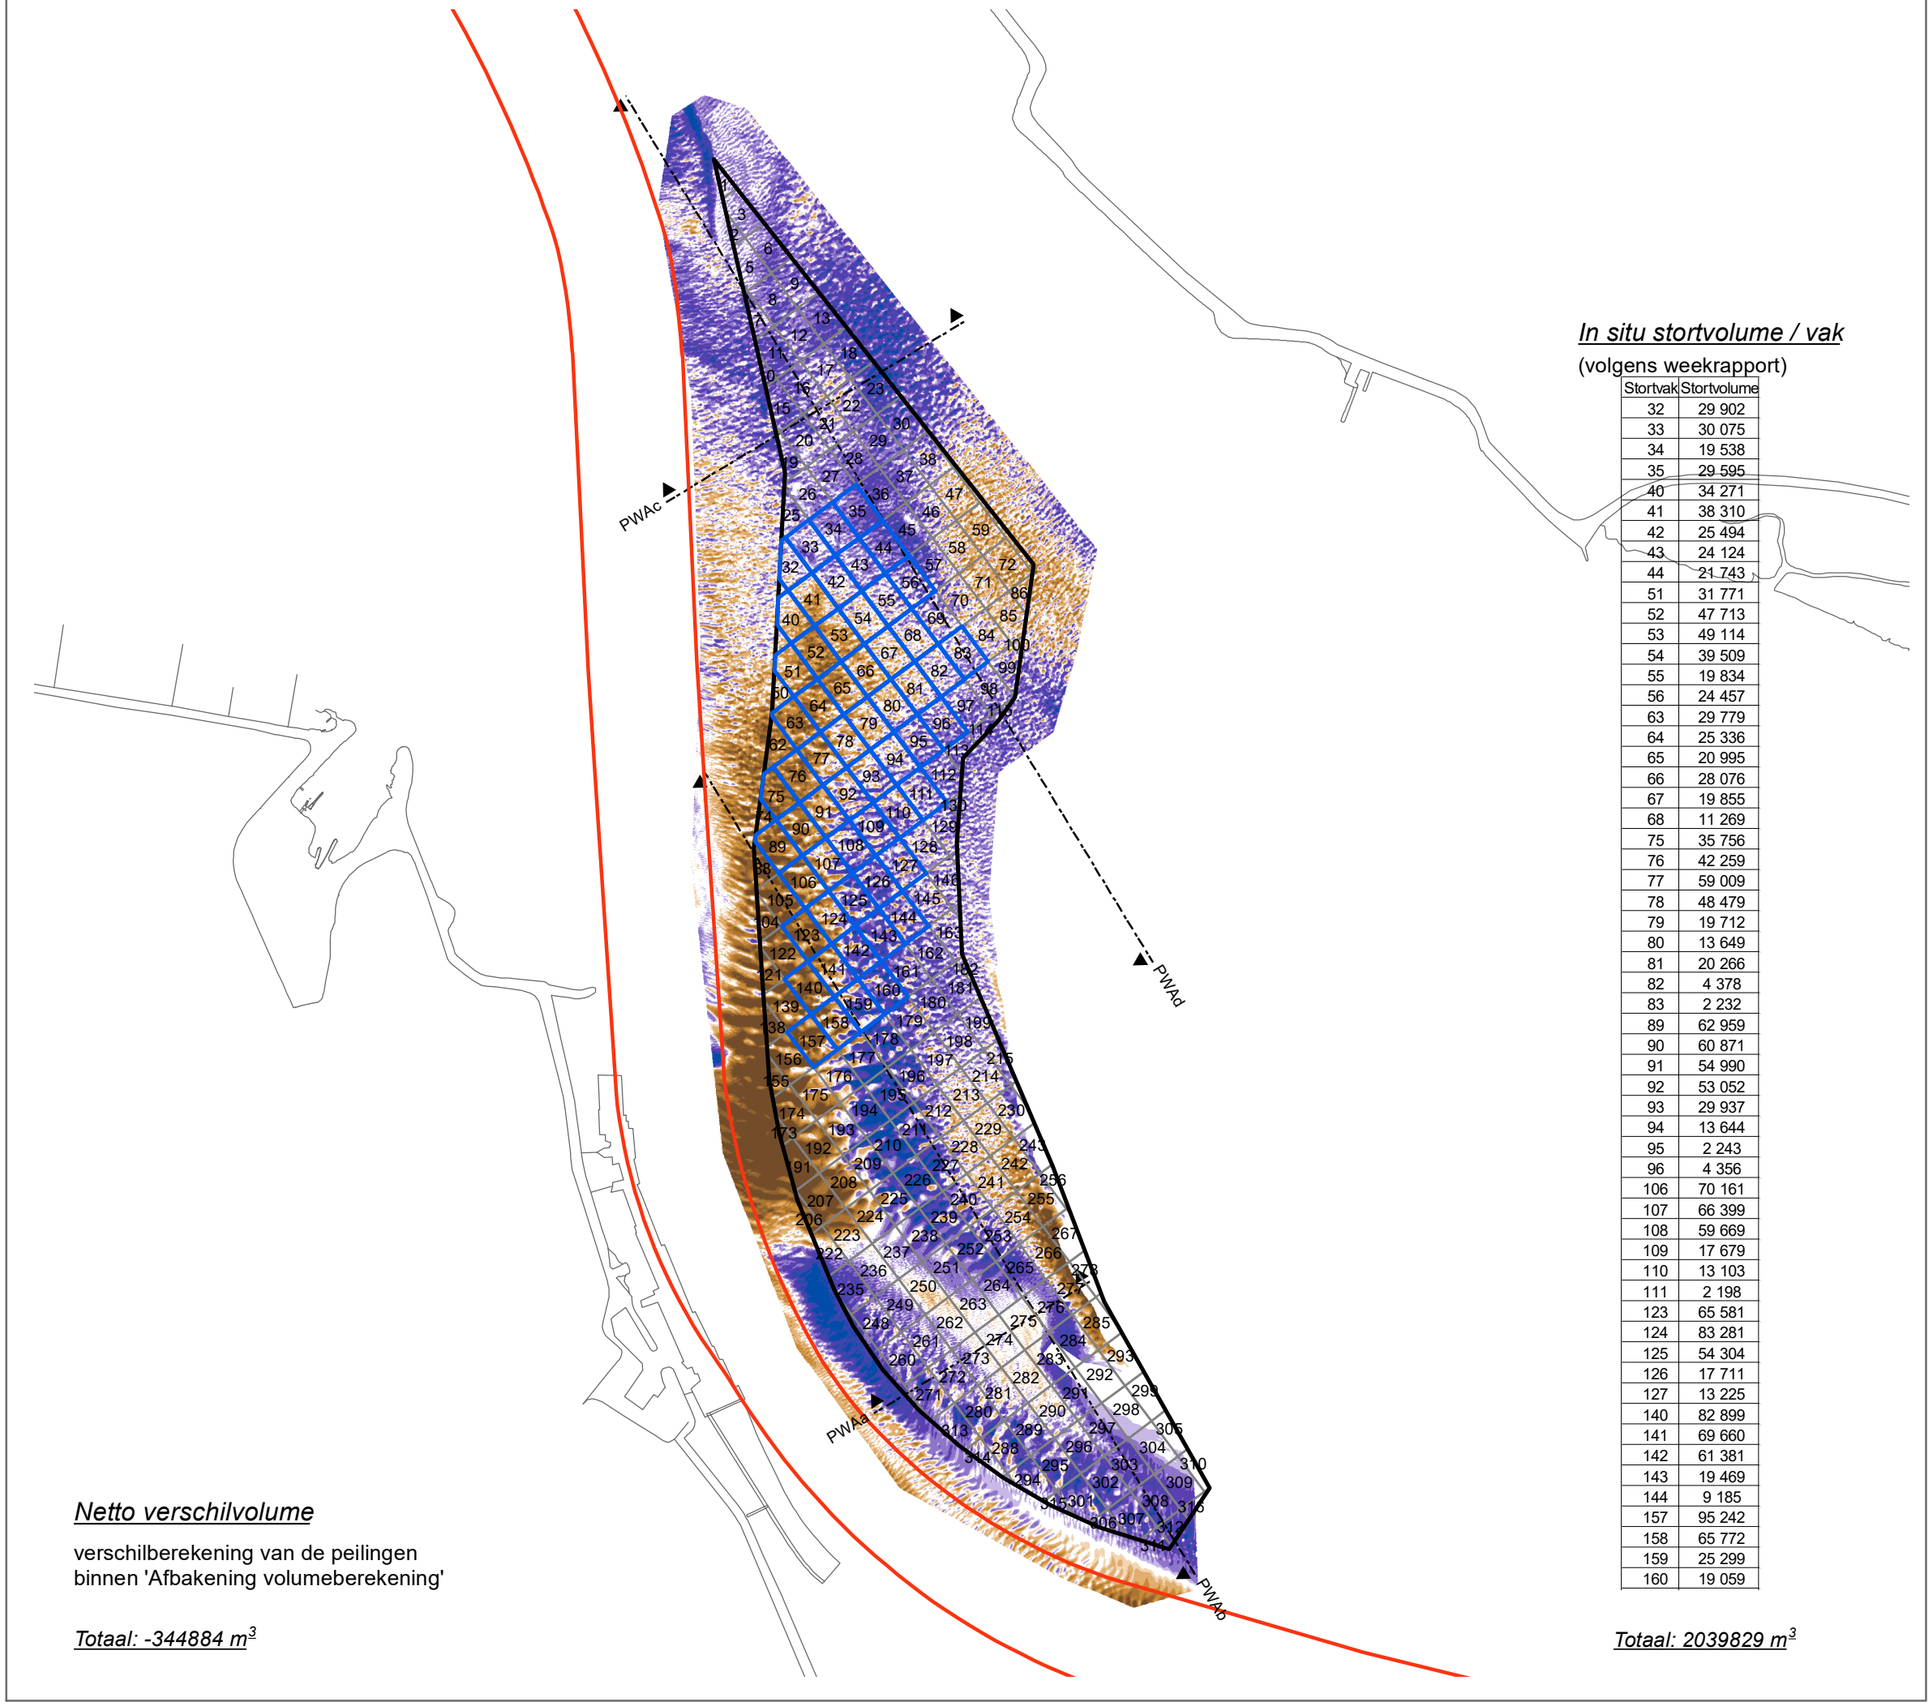

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
32	29 902
33	30 075
34	19 538
35	29 595
40	34 271
41	38 310
42	25 494
43	24 124
44	21 743
51	31 771
52	47 713
53	49 114
54	39 509
55	19 834
56	24 457
63	29 779
64	25 336
65	20 995
66	28 076
67	19 855
68	11 269
75	35 756
76	42 259
77	59 009
78	48 479
79	19 712
80	13 649
81	20 266
82	4 378
83	2 232
89	62 959
90	60 871
91	54 990
92	53 052
93	29 937
94	13 644
95	2 243
96	4 356
106	70 161
107	66 399
108	59 669
109	17 679
110	13 103
111	2 198
123	65 581
124	83 281
125	54 304
126	17 711
127	13 225
140	82 899
141	69 660
142	61 381
143	19 469
144	9 185
157	95 242
158	65 772
159	25 299
160	19 059

Totaal: 2039829 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -344884 m³

VLAAMSE OVERHEID

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart Plaat van Walsoorden

12/04/2022 (T155) - 10/02/2025 (T171)

11640_PWA_VT171-T155
Rapport nr. 25.068



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende


- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	verdieping
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

0 300 600 900 1200 1500 m

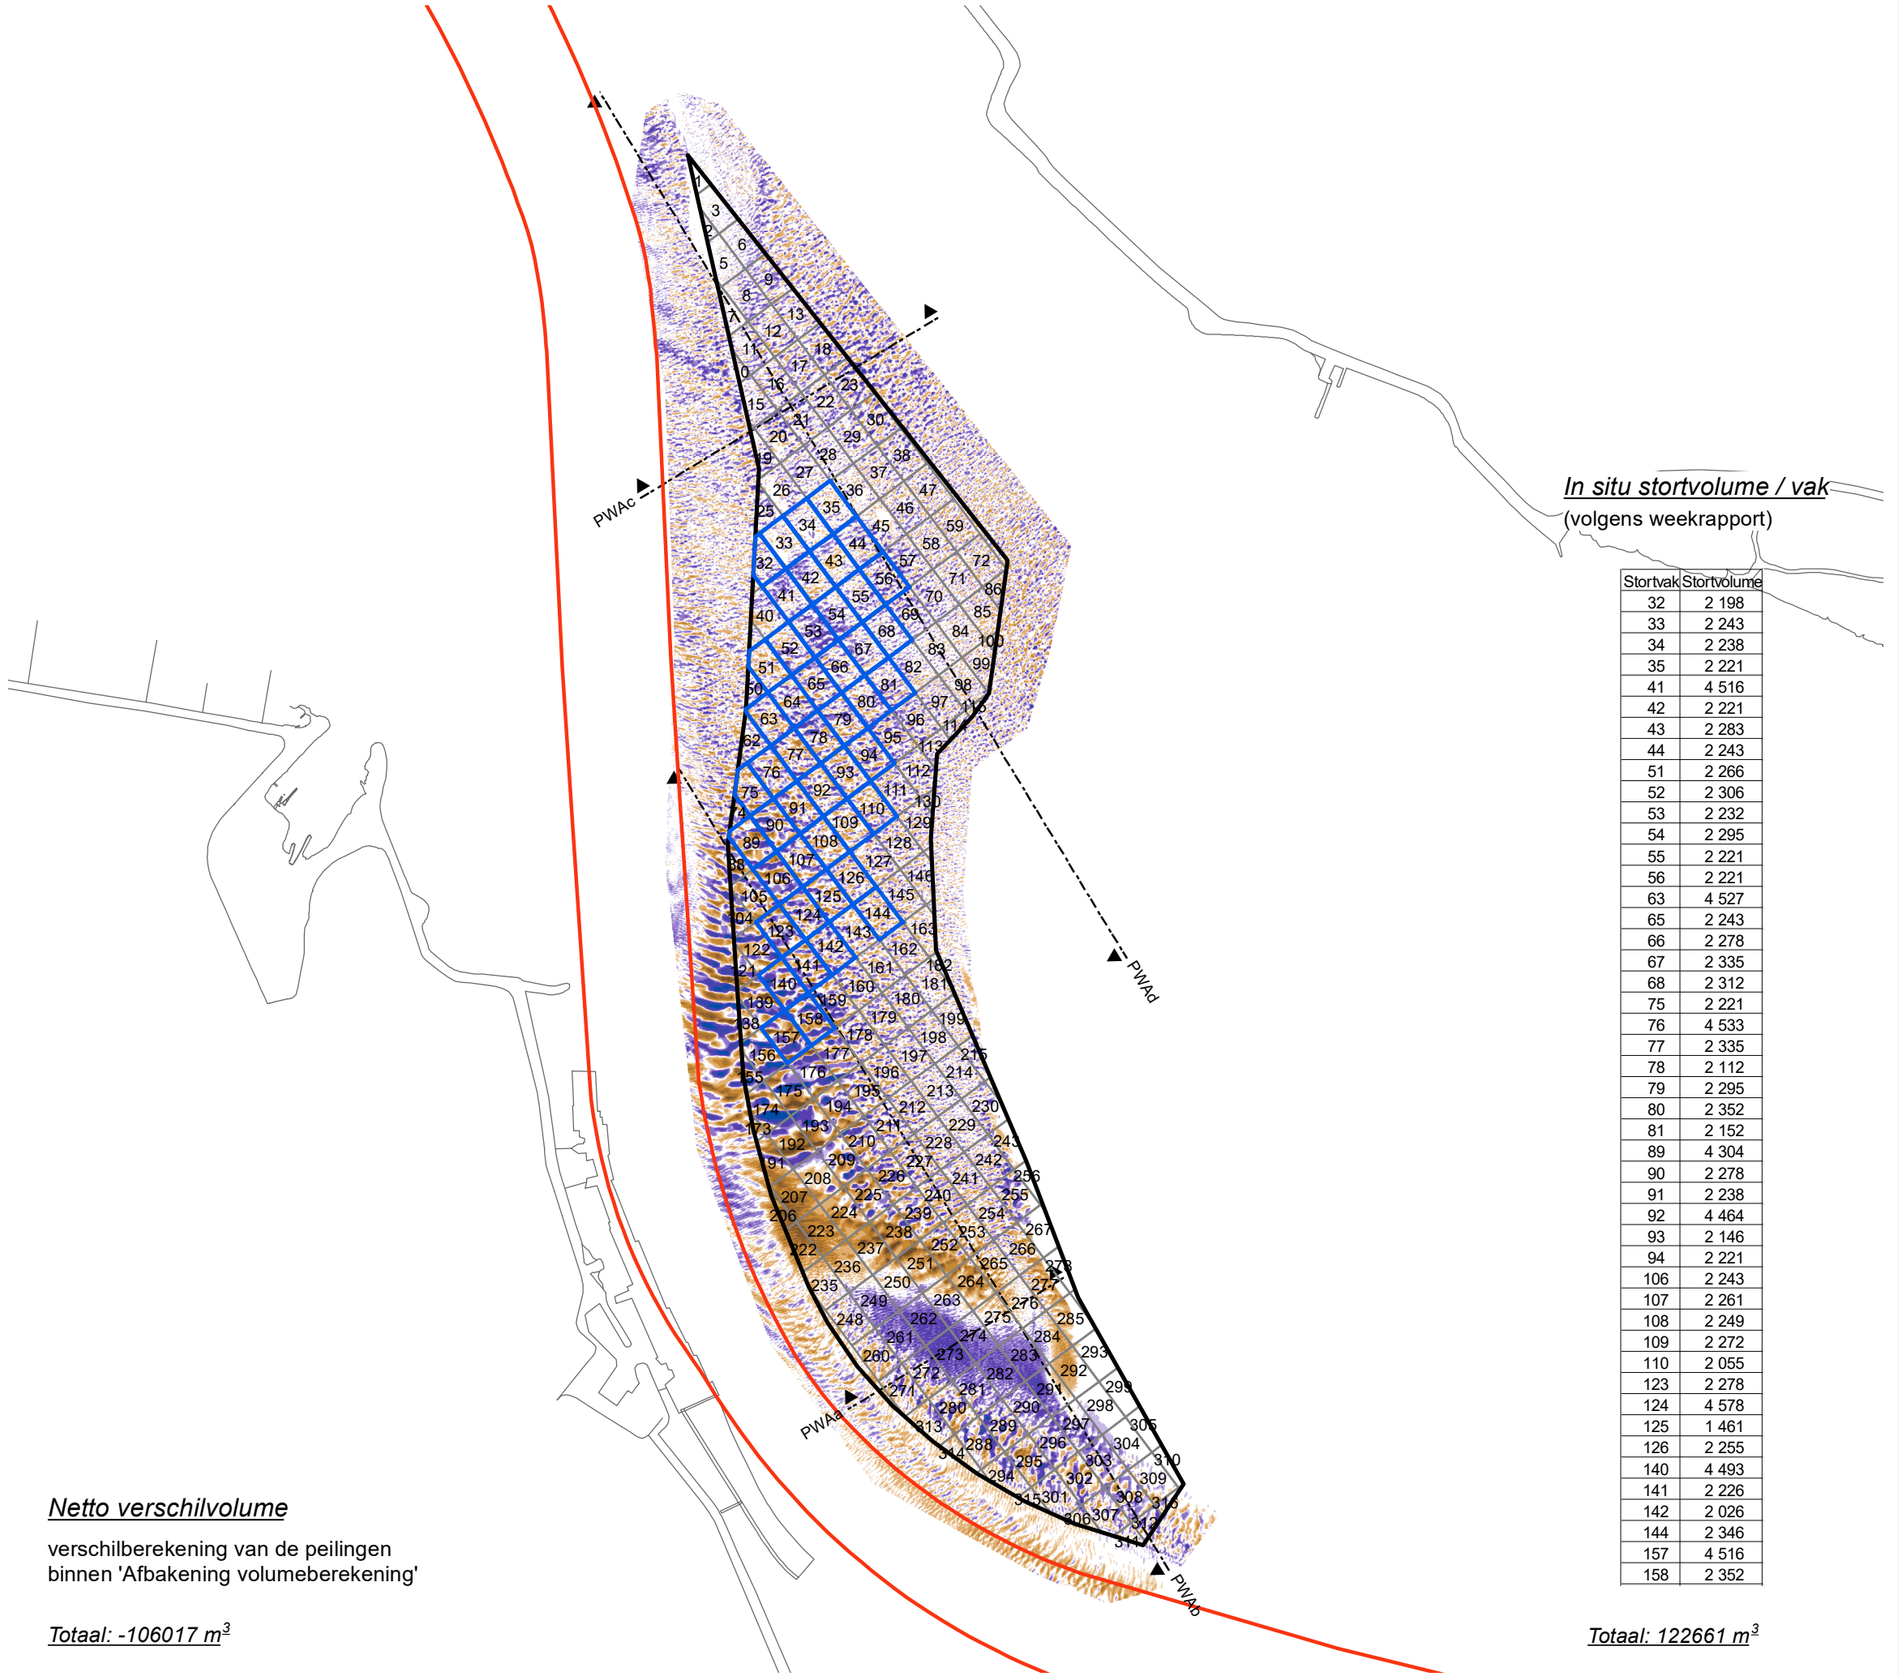

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
32	2 198
33	2 243
34	2 238
35	2 221
41	4 516
42	2 221
43	2 283
44	2 243
51	2 266
52	2 306
53	2 232
54	2 295
55	2 221
56	2 221
63	4 527
65	2 243
66	2 278
67	2 335
68	2 312
75	2 221
76	4 533
77	2 335
78	2 112
79	2 295
80	2 352
81	2 152
89	4 304
90	2 278
91	2 238
92	4 464
93	2 146
94	2 221
106	2 243
107	2 261
108	2 249
109	2 272
110	2 055
123	2 278
124	4 578
125	1 461
126	2 255
140	4 493
141	2 226
142	2 026
144	2 346
157	4 516
158	2 352

Totaal: 122661 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -106017 m³

VLAAMSE OVERHEID

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart Plaat van Walsoorden

16/11/2024 (T170) - 10/02/2025 (T171)

11640_PWA_VT171-T170
Rapport nr. 25.068



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken


verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N W E S

0 300 600 900 1200 1500 m

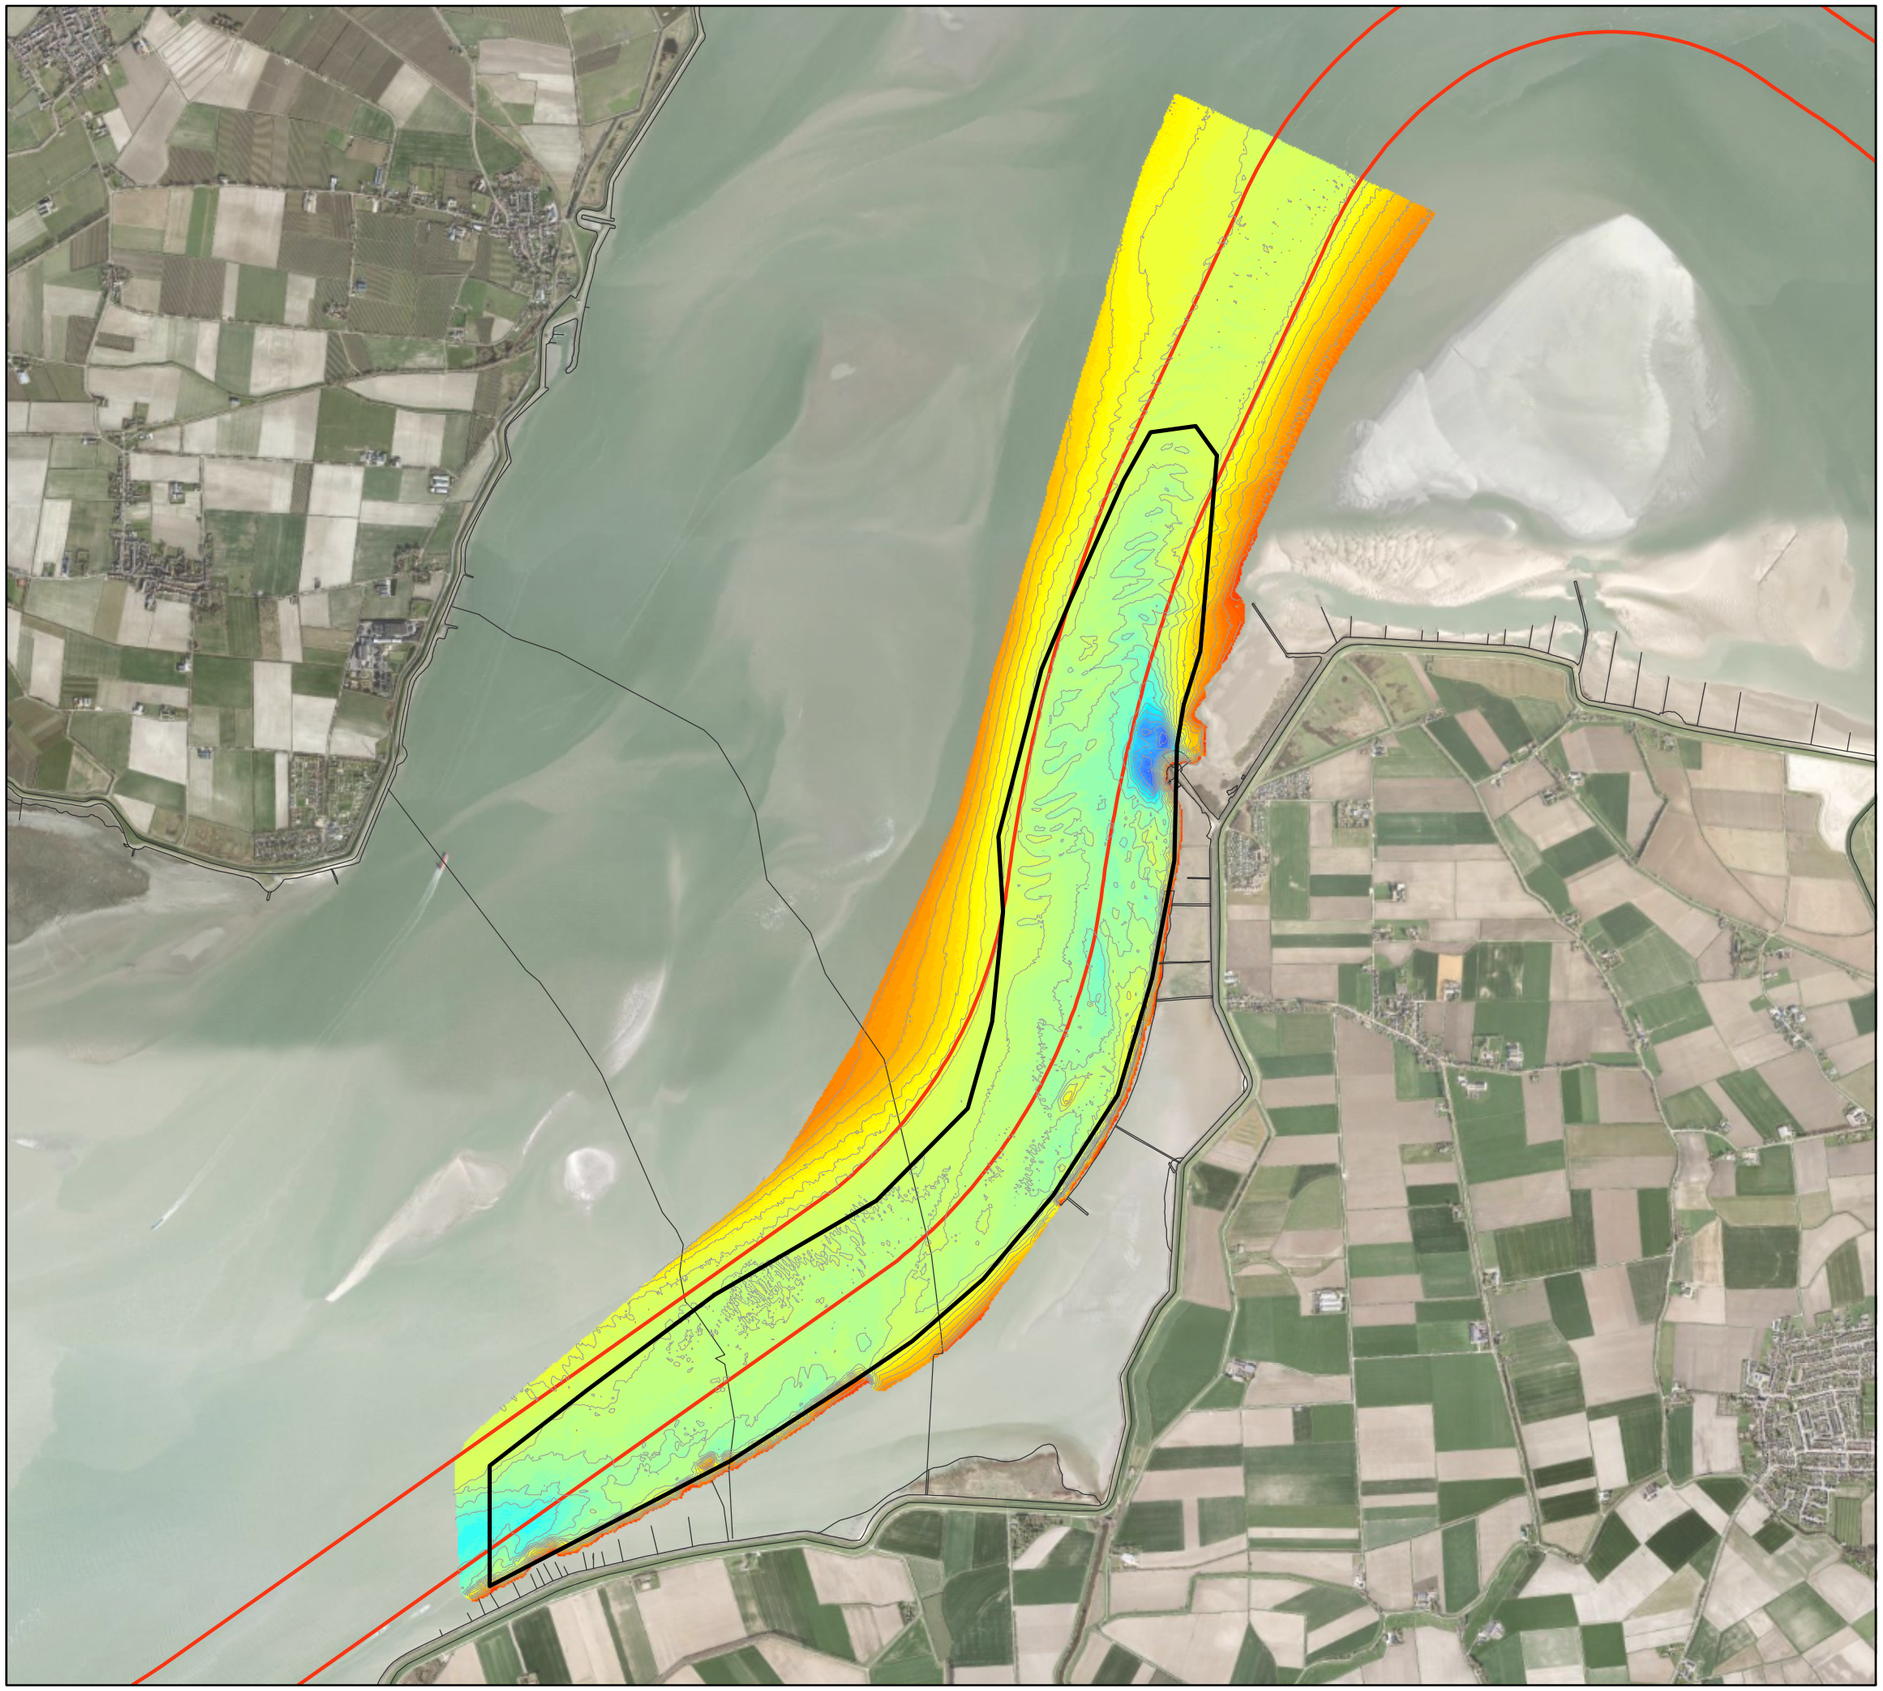

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SH41

25/01/2025 (T3)

11640_SH41_BT3
Rapport nr. 25.068



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

Diepte in m [NAP]

- 1.88 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00
- 25.01 - 26.00
- 26.01 - 27.00
- 27.01 - 28.00
- 28.01 - 29.00
- 29.01 - 30.00
- 30.01 - 31.00
- 31.01 - 32.00
- 32.01 - 33.00
- 33.01 - 34.00
- 34.01 - 35.00
- 35.01 - 36.00
- 36.01 - 37.00
- 37.01 - 38.00
- 38.01 - 39.00
- 39.01 - 40.00
- 40.01 - 41.00
- 41.01 - 42.00


N
W E
S

0 250 500 750 1000 m

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -973892 m³

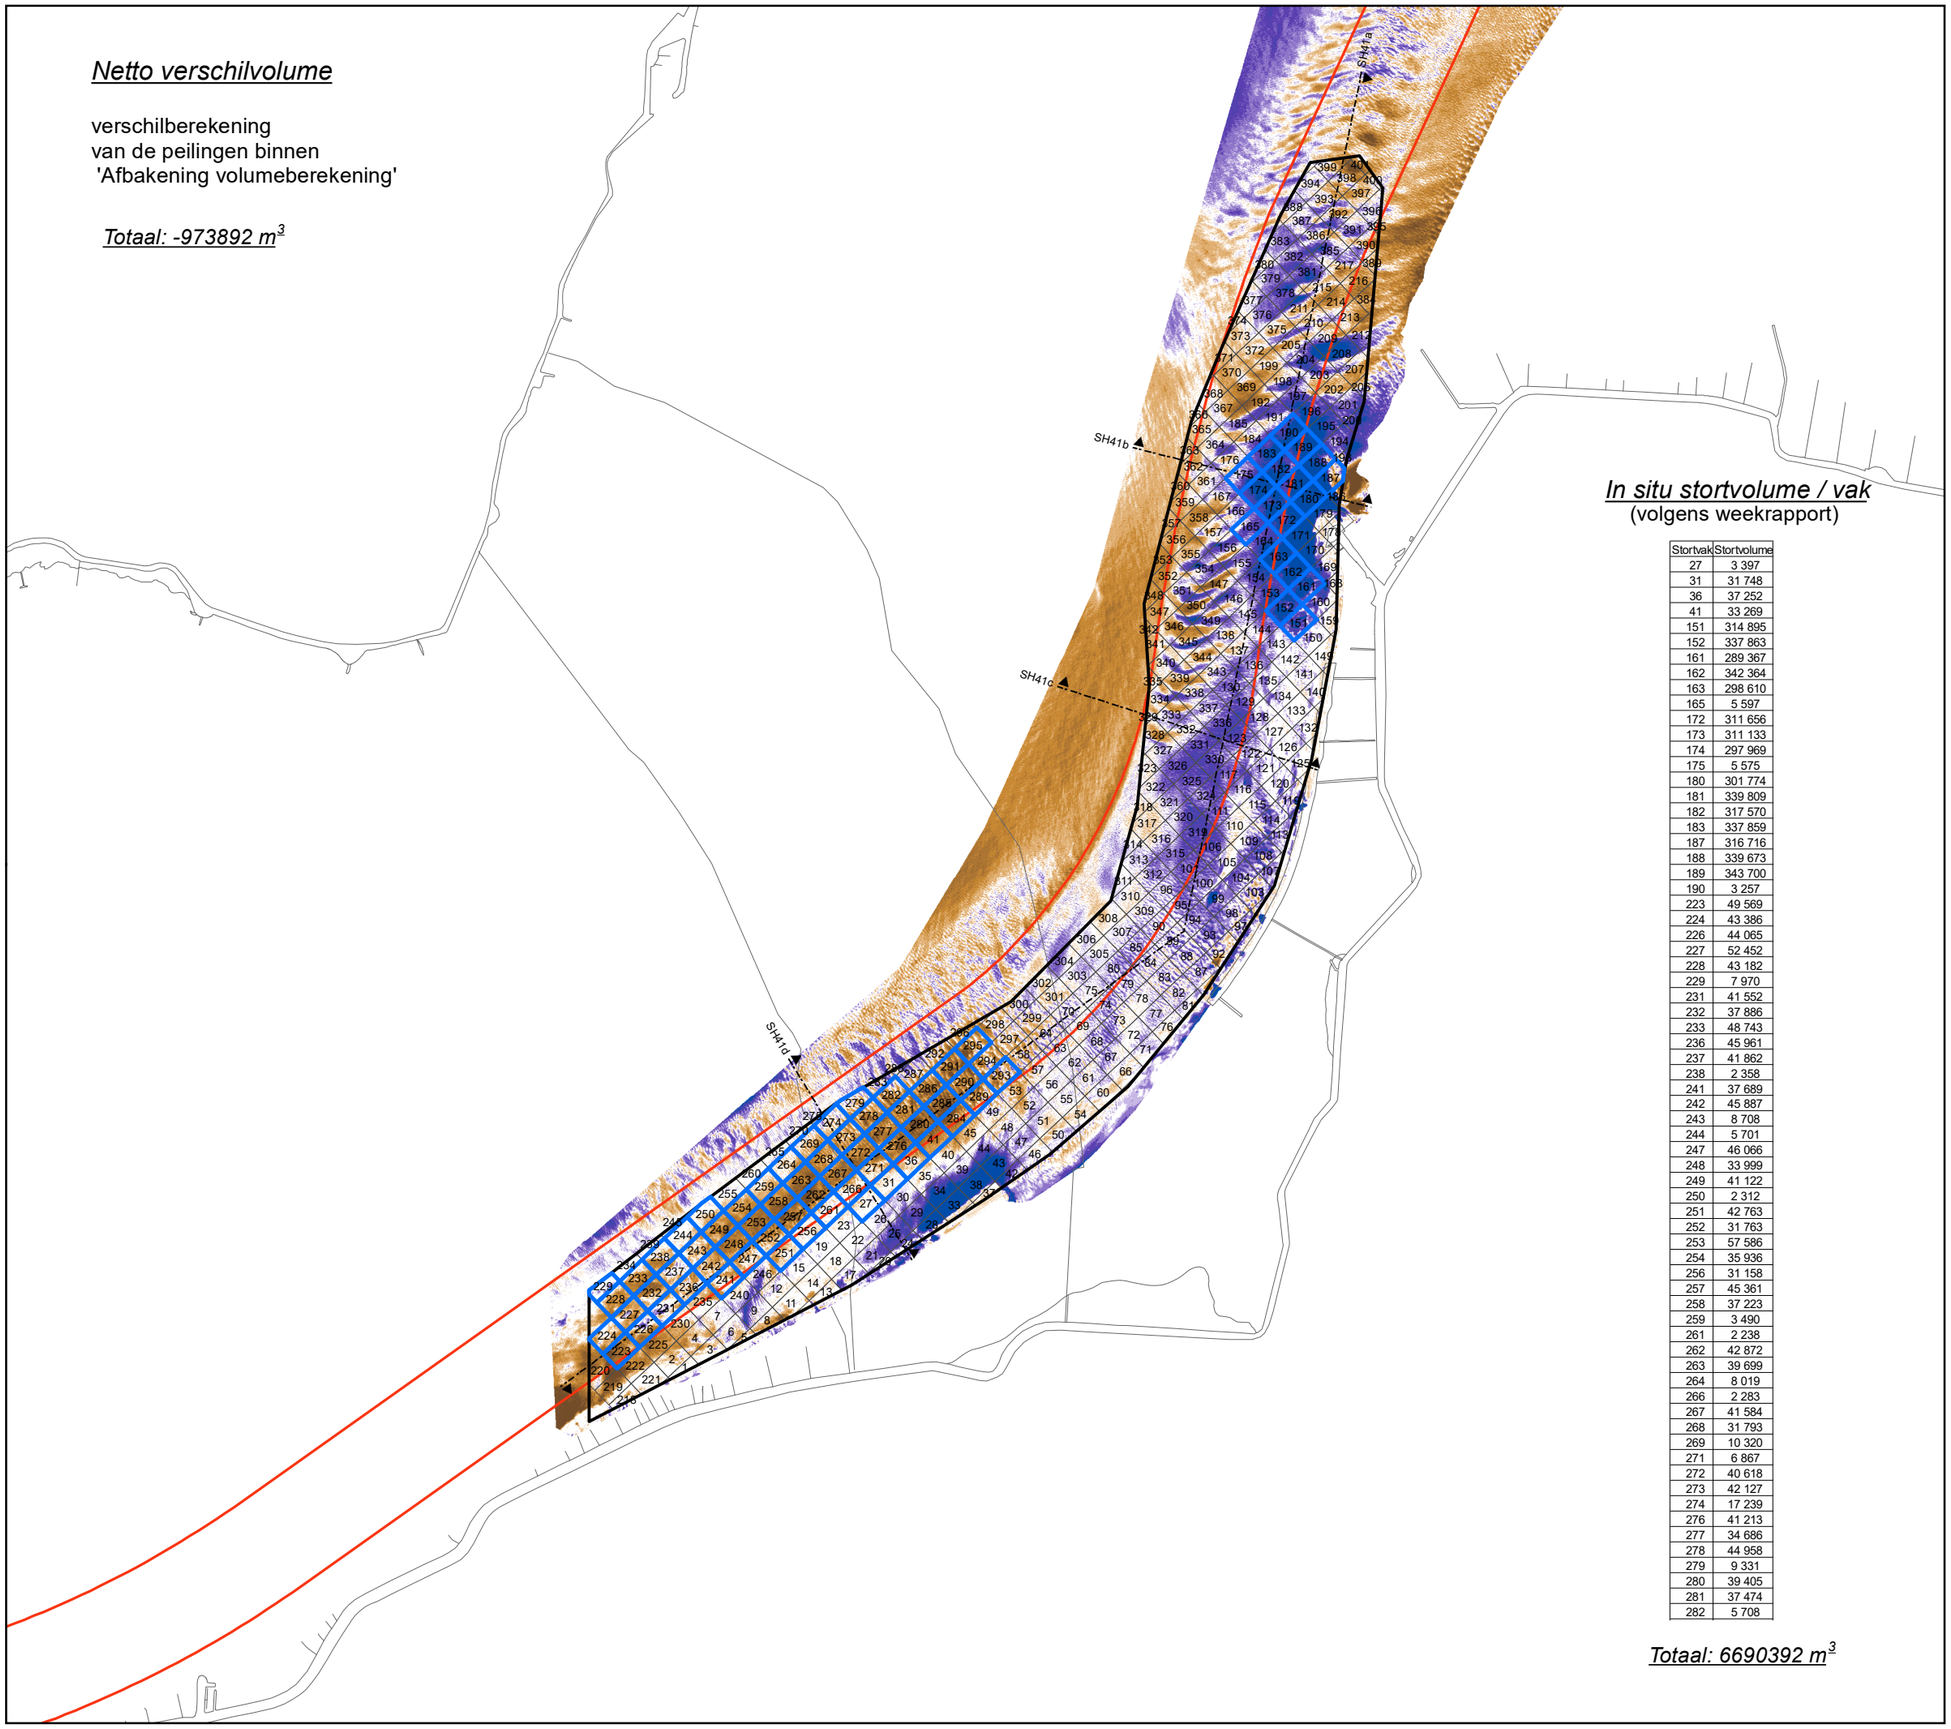

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
27	3 397
31	31 748
36	37 252
41	33 269
151	314 895
152	337 863
161	289 367
162	342 364
163	298 610
165	5 597
172	311 656
173	311 133
174	297 969
175	5 575
180	301 774
181	339 809
182	317 570
183	337 859
187	316 716
188	339 673
189	343 700
190	3 257
223	49 569
224	43 386
226	44 065
227	52 452
228	43 182
229	7 970
231	41 552
232	37 886
233	48 743
236	45 961
237	41 862
238	2 358
241	37 689
242	45 887
243	8 708
244	5 701
247	46 066
248	33 999
249	41 122
250	2 312
251	42 763
252	31 763
253	57 586
254	35 936
256	31 158
257	45 361
258	37 223
259	3 490
261	2 238
262	42 872
263	39 699
264	8 019
266	2 283
267	41 584
268	31 793
269	10 320
271	6 867
272	40 618
273	42 127
274	17 239
276	41 213
277	34 686
278	44 958
279	9 331
280	39 405
281	37 474
282	5 708

Totaal: 6690392 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH41

18/07/2022 (T0) - 25/01/2025 (T3)

11640_SH41_VT3-T0
Rapport nr. 25.068



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50


N
W E
S

0 500 1000 1500 2000 m

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 57293 m³

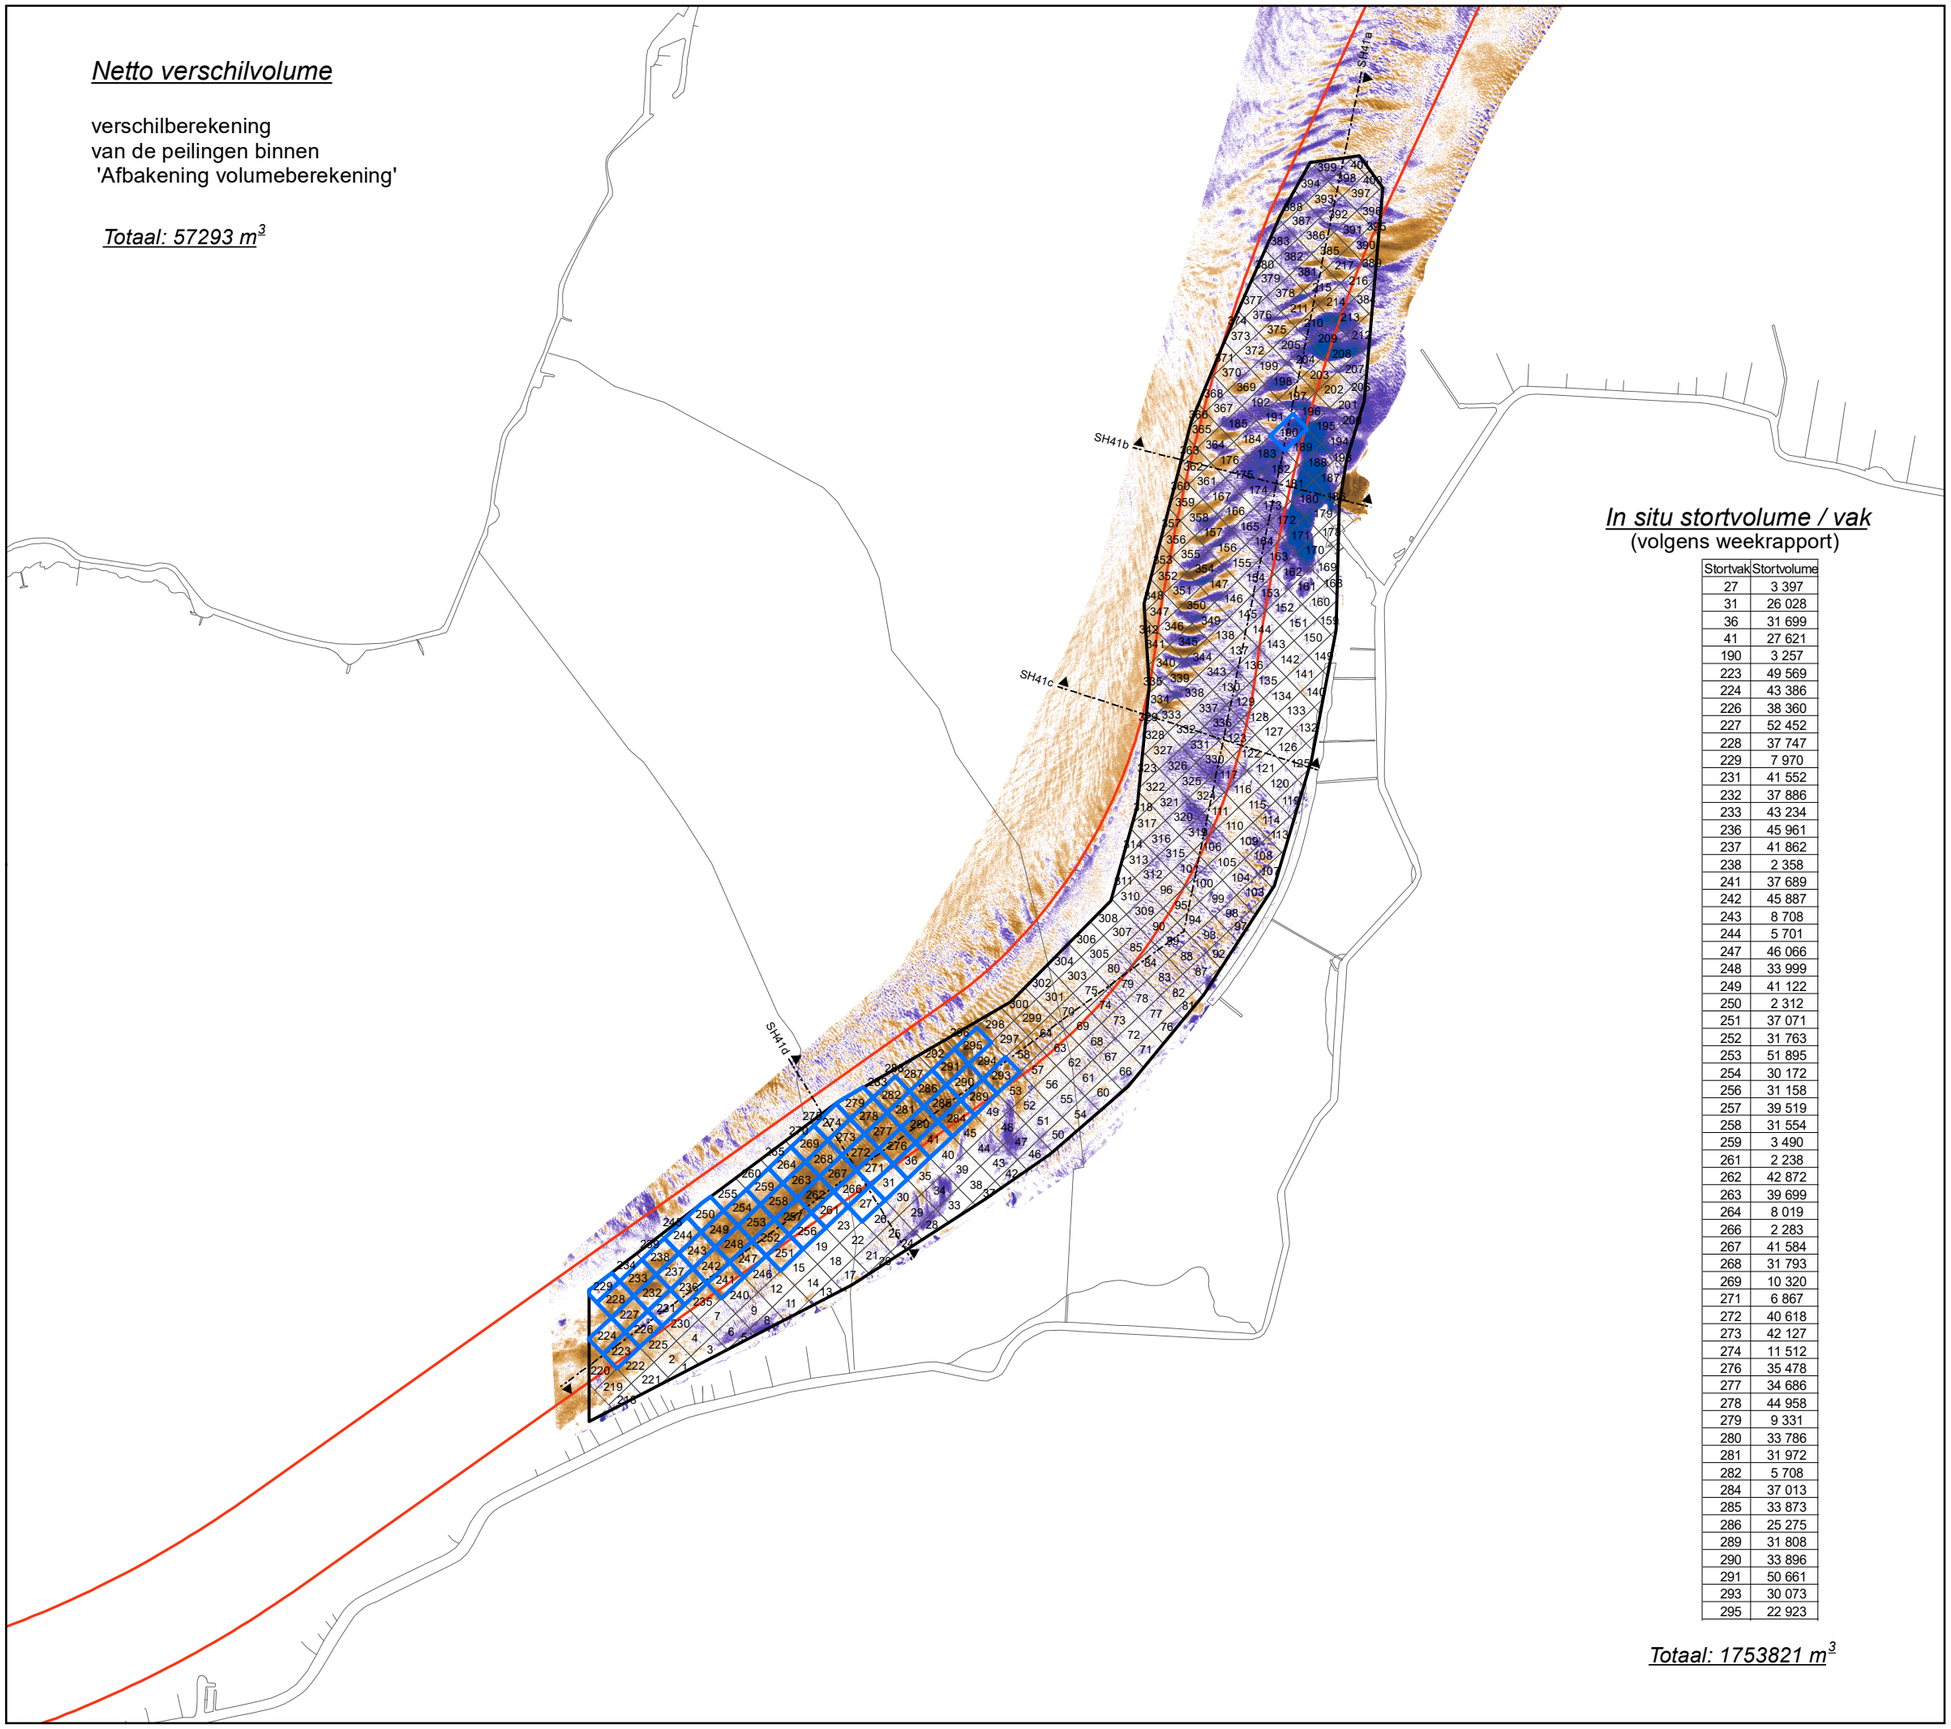

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
27	3 397
31	26 028
36	31 699
41	27 621
190	3 257
223	49 569
224	43 386
226	38 360
227	52 452
228	37 747
229	7 970
231	41 552
232	37 886
233	43 234
236	45 961
237	41 862
238	2 358
241	37 689
242	45 887
243	8 708
244	5 701
247	46 066
248	33 999
249	41 122
250	2 312
251	37 071
252	31 763
253	51 895
254	30 172
256	31 158
257	39 519
258	31 554
259	3 490
261	2 238
262	42 872
263	39 699
264	8 019
266	2 283
267	41 584
268	31 793
269	10 320
271	6 867
272	40 618
273	42 127
274	11 512
276	35 478
277	34 686
278	44 958
279	9 331
280	33 786
281	31 972
282	5 708
284	37 013
285	33 873
286	25 275
289	31 808
290	33 896
291	50 661
293	30 073
295	22 923

Totaal: 1753821 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH41

22/07/2024 (T2) - 25/01/2025 (T3)

11640_SH41_VT3-T2
Rapport nr. 25.068



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m


verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50

- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N
W E
S

0 500 1000 1500 2000 m

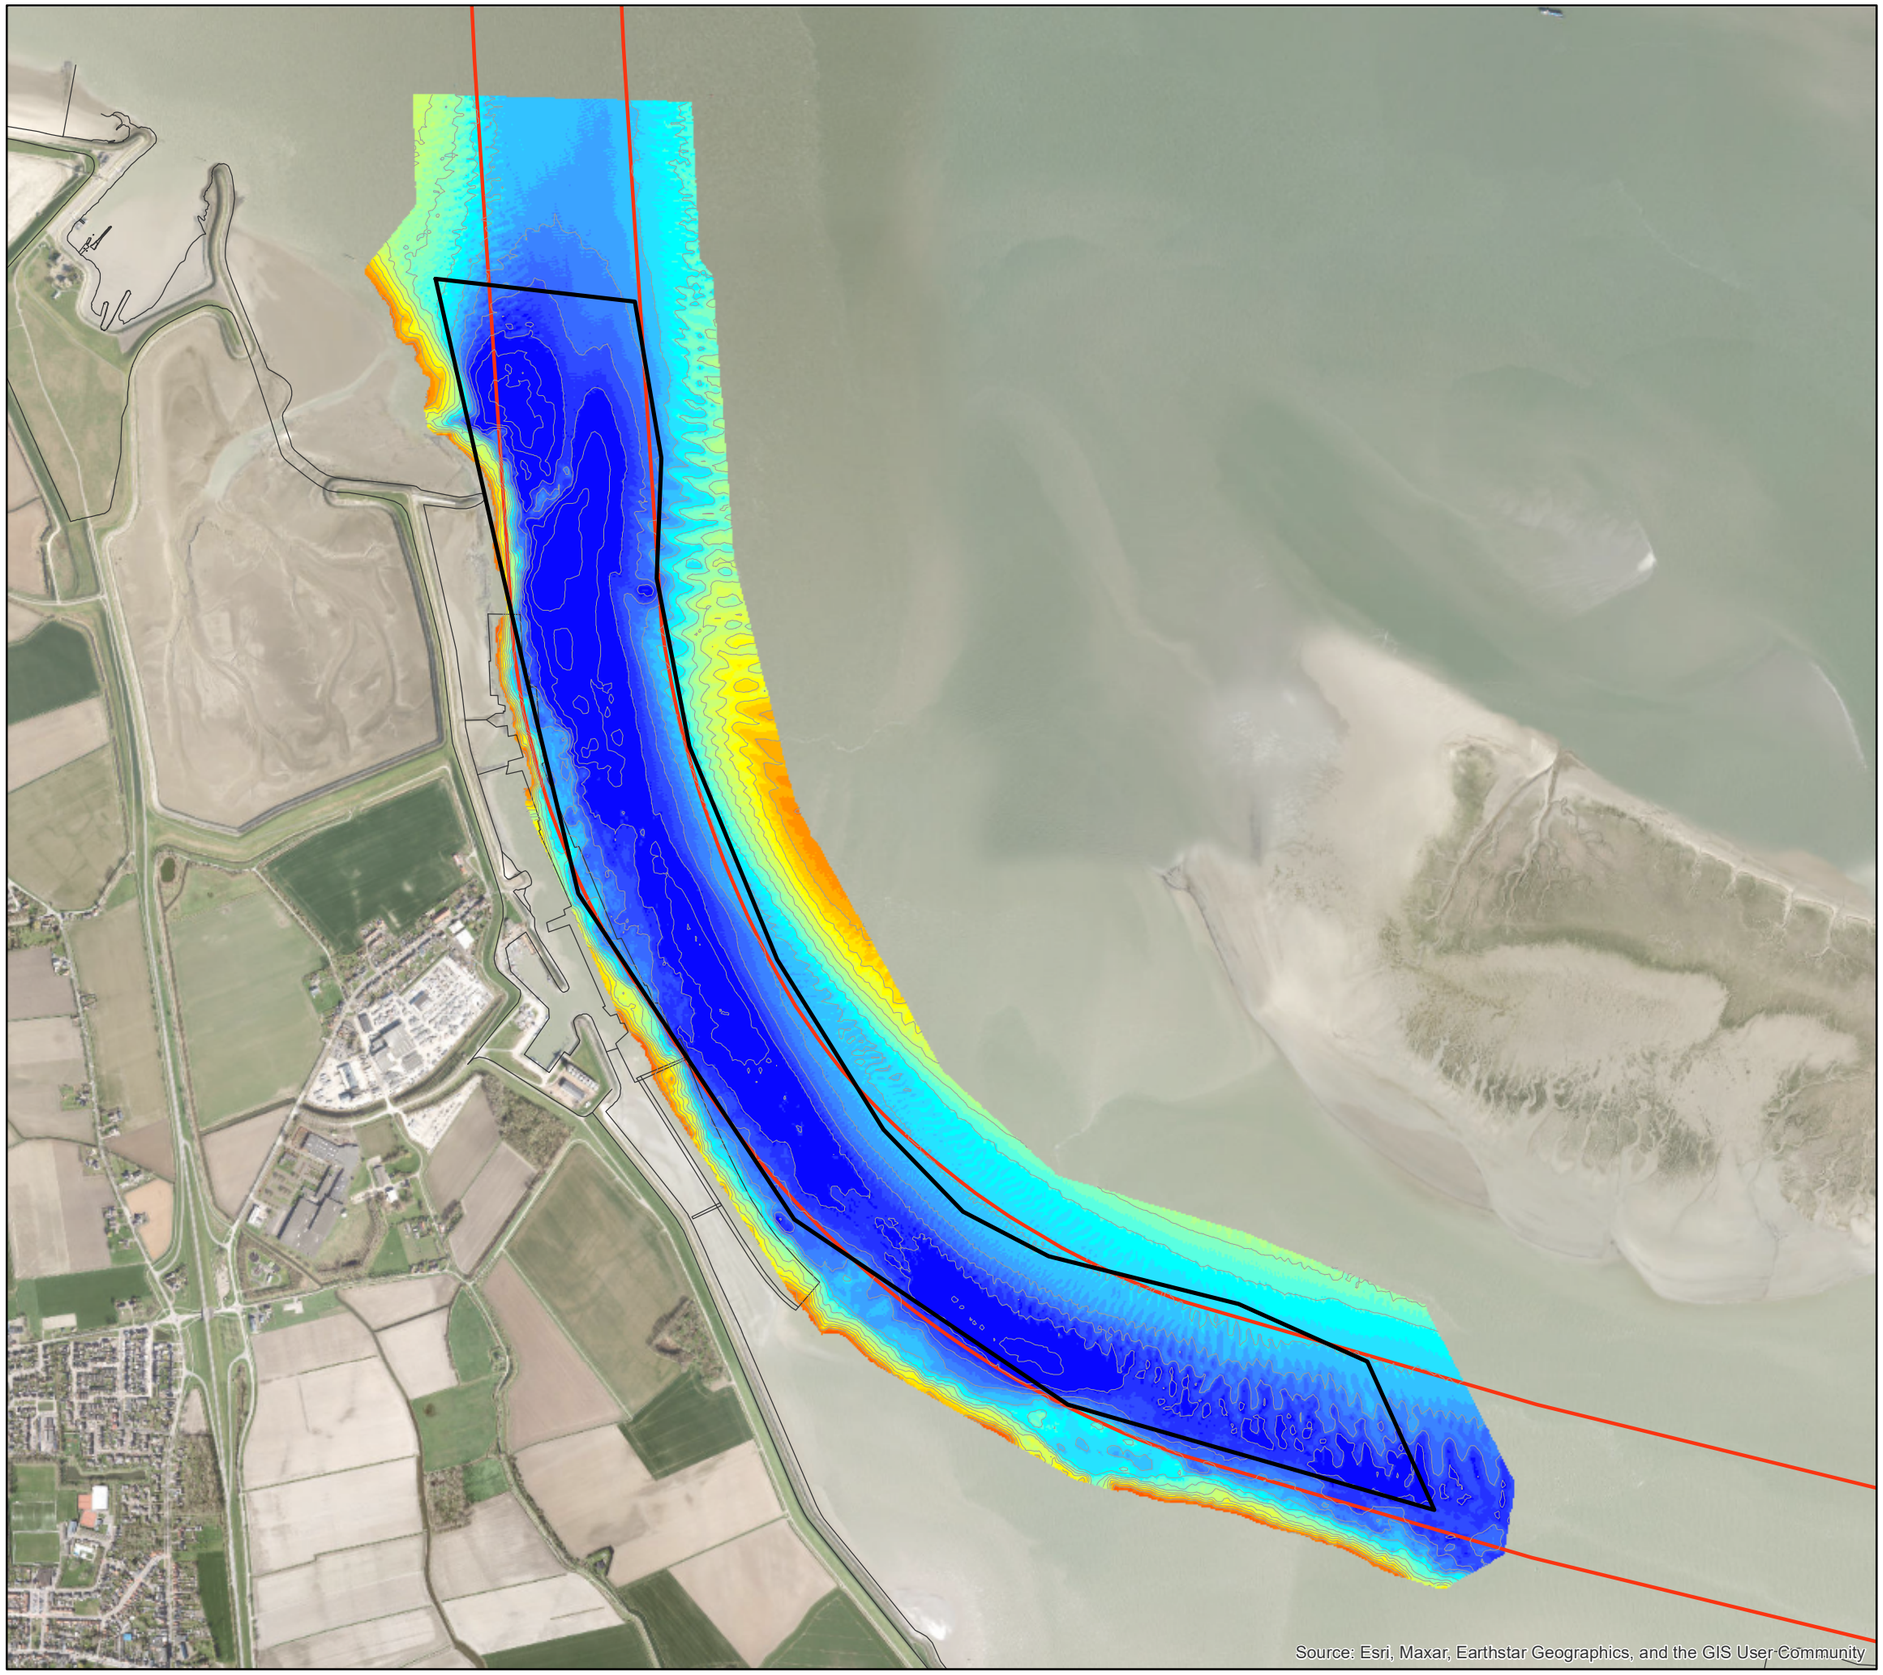

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SH51

30/01/2025 (T4)

11640_SH51_BT4
Rapport nr. 25.068



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

Diepte in m [NAP]

- 0.09 - 1.00
- 1.01 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00

N
W E
S

0 200 400 600 800 1000 m

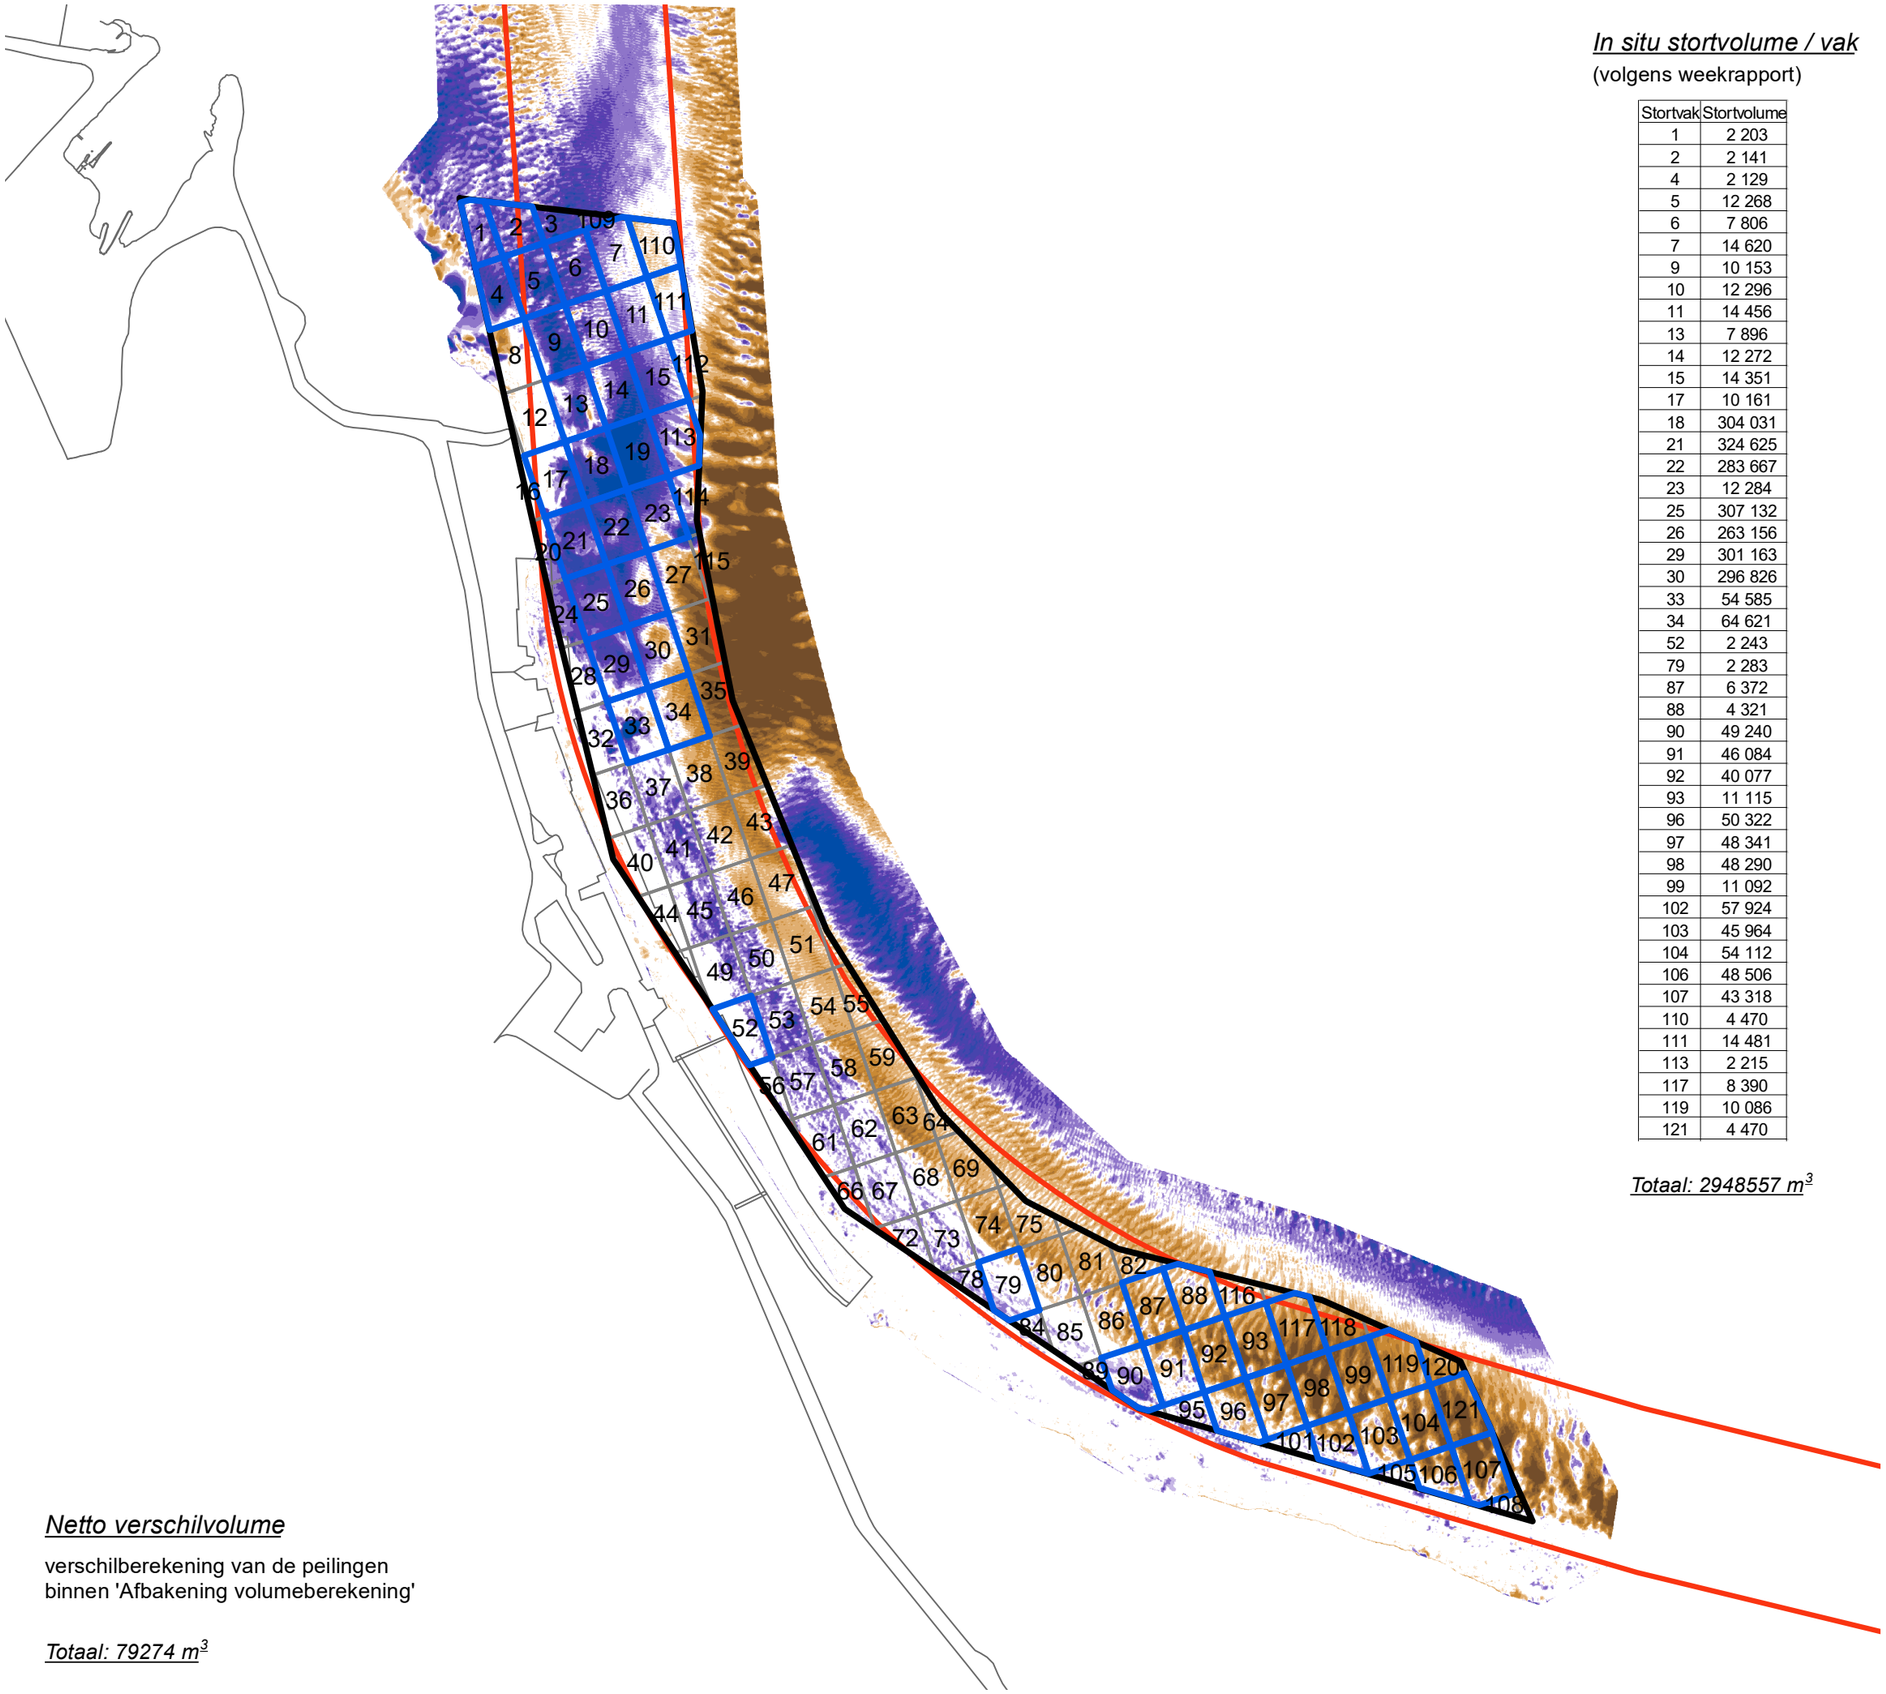

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
1	2 203
2	2 141
4	2 129
5	12 268
6	7 806
7	14 620
9	10 153
10	12 296
11	14 456
13	7 896
14	12 272
15	14 351
17	10 161
18	304 031
21	324 625
22	283 667
23	12 284
25	307 132
26	263 156
29	301 163
30	296 826
33	54 585
34	64 621
52	2 243
79	2 283
87	6 372
88	4 321
90	49 240
91	46 084
92	40 077
93	11 115
96	50 322
97	48 341
98	48 290
99	11 092
102	57 924
103	45 964
104	54 112
106	48 506
107	43 318
110	4 470
111	14 481
113	2 215
117	8 390
119	10 086
121	4 470

Totaal: 2948557 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 79274 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH51

22/07/2022 (T0) - 30/01/2025 (T4)

11640_SH51_VT4-T0
Rapport nr. 25.068



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende


- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	verdieping
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N W E S

0 300 600 900 1200

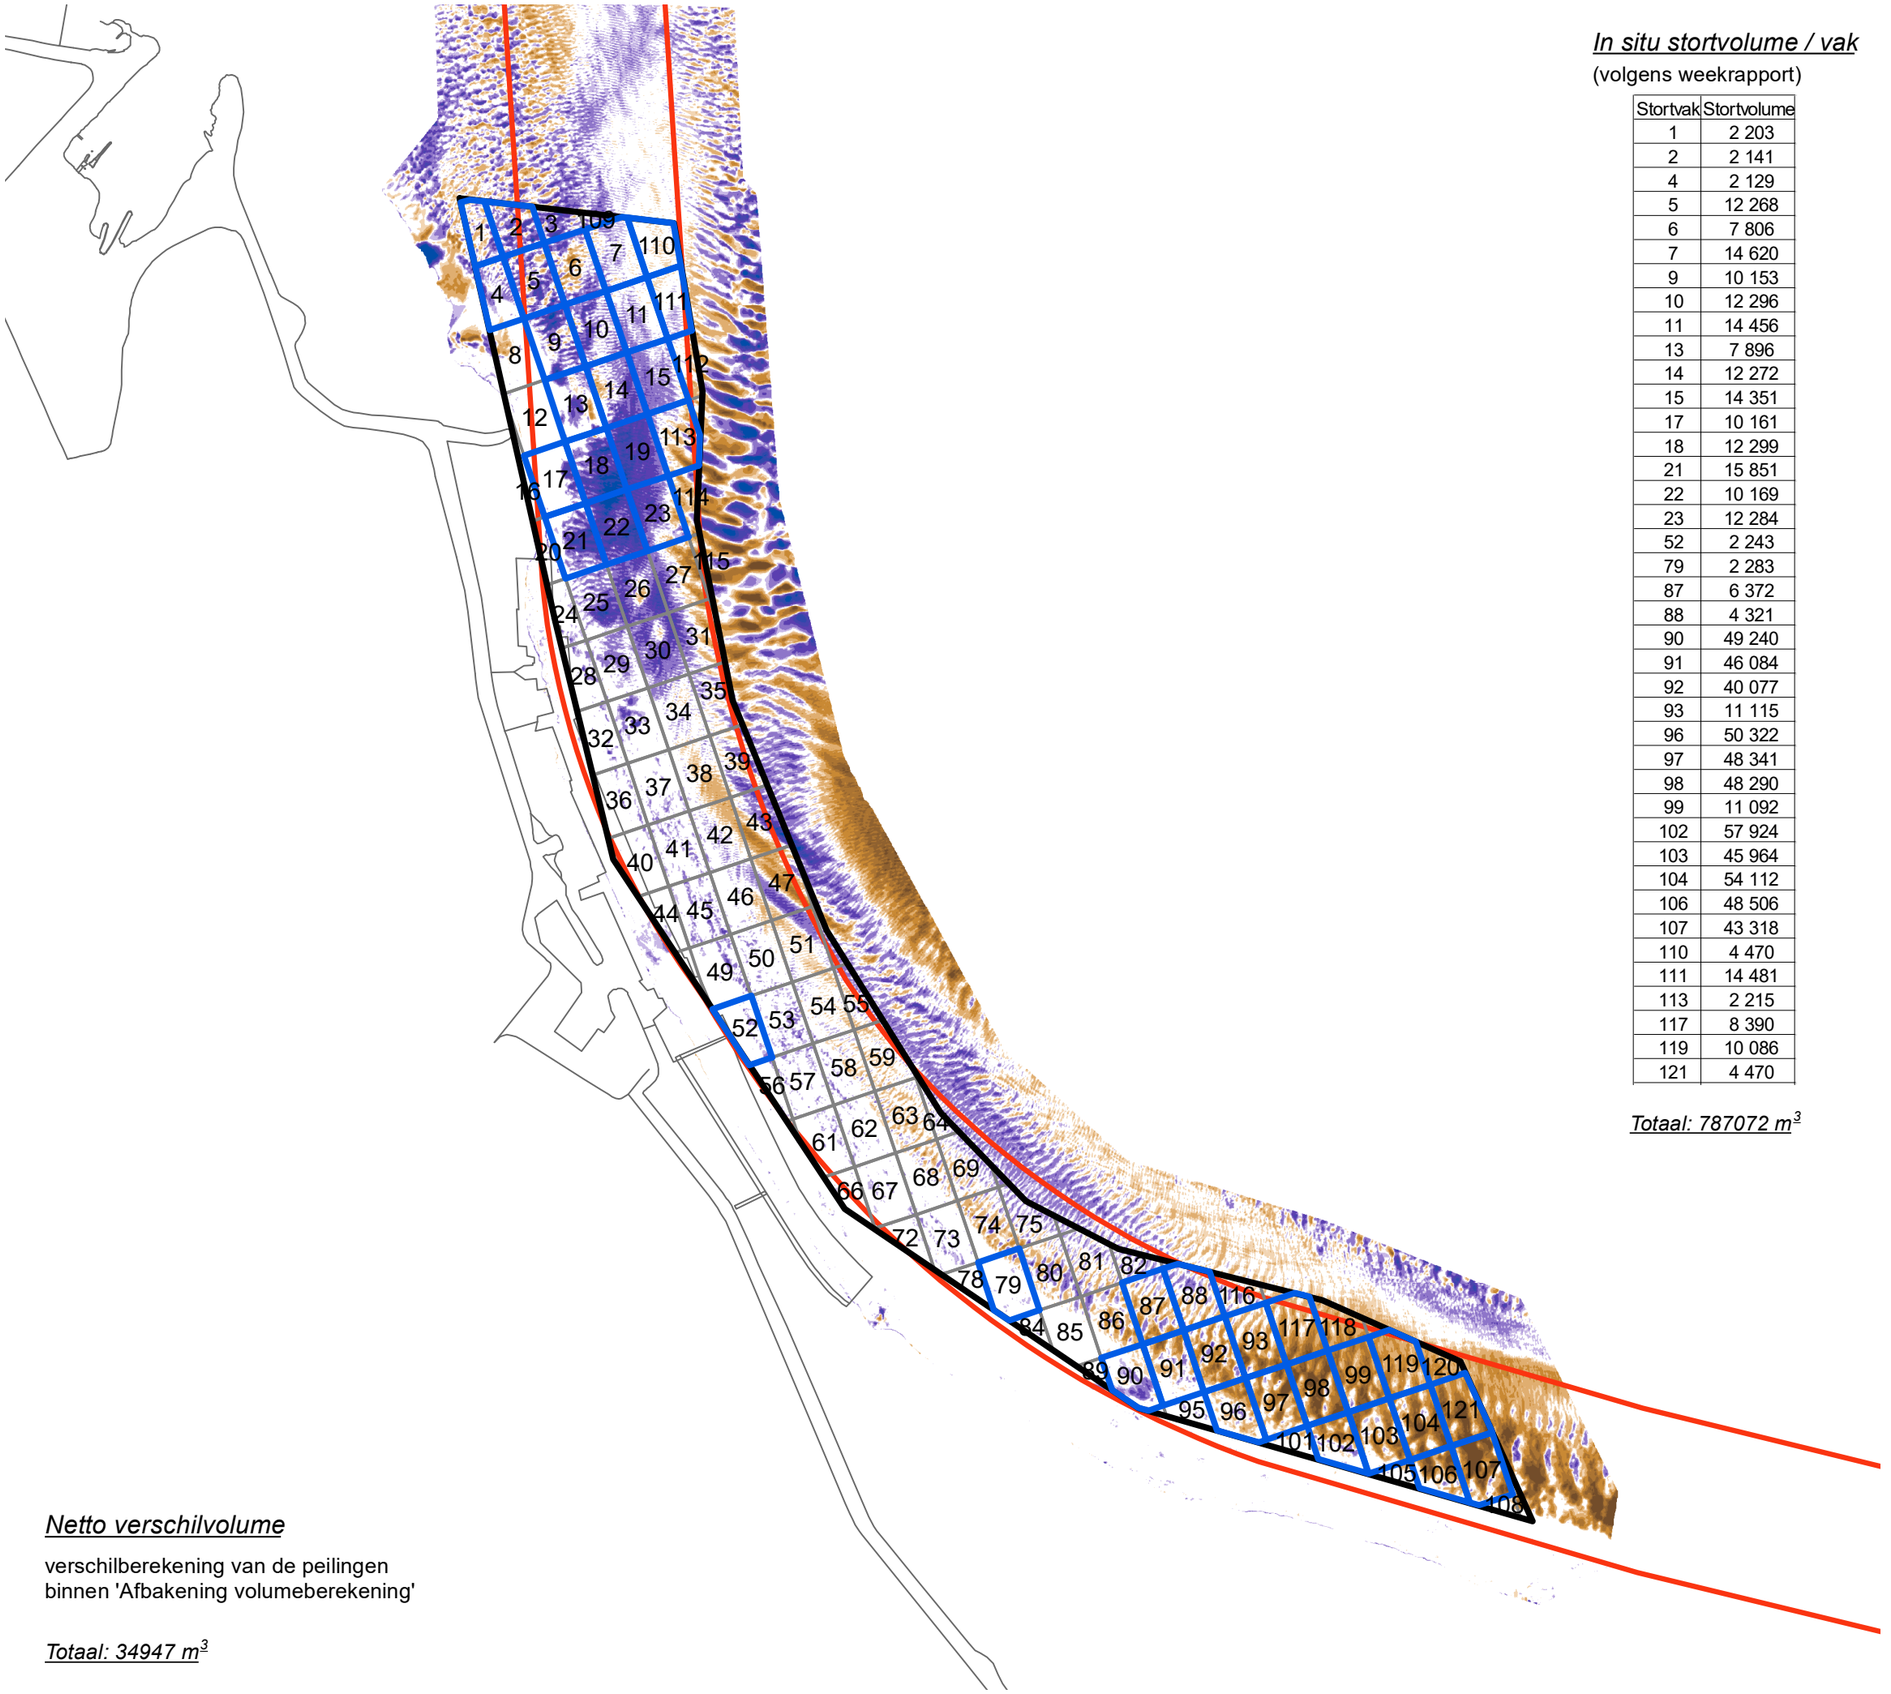

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
1	2 203
2	2 141
4	2 129
5	12 268
6	7 806
7	14 620
9	10 153
10	12 296
11	14 456
13	7 896
14	12 272
15	14 351
17	10 161
18	12 299
21	15 851
22	10 169
23	12 284
52	2 243
79	2 283
87	6 372
88	4 321
90	49 240
91	46 084
92	40 077
93	11 115
96	50 322
97	48 341
98	48 290
99	11 092
102	57 924
103	45 964
104	54 112
106	48 506
107	43 318
110	4 470
111	14 481
113	2 215
117	8 390
119	10 086
121	4 470

Totaal: 787072 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 34947 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH51

01/07/2024 (T3) - 30/01/2025 (T4)

11640_SH51_VT4-T3
Rapport nr. 25.068



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende


- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	verdieping
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N W E S

0 300 600 900 1200

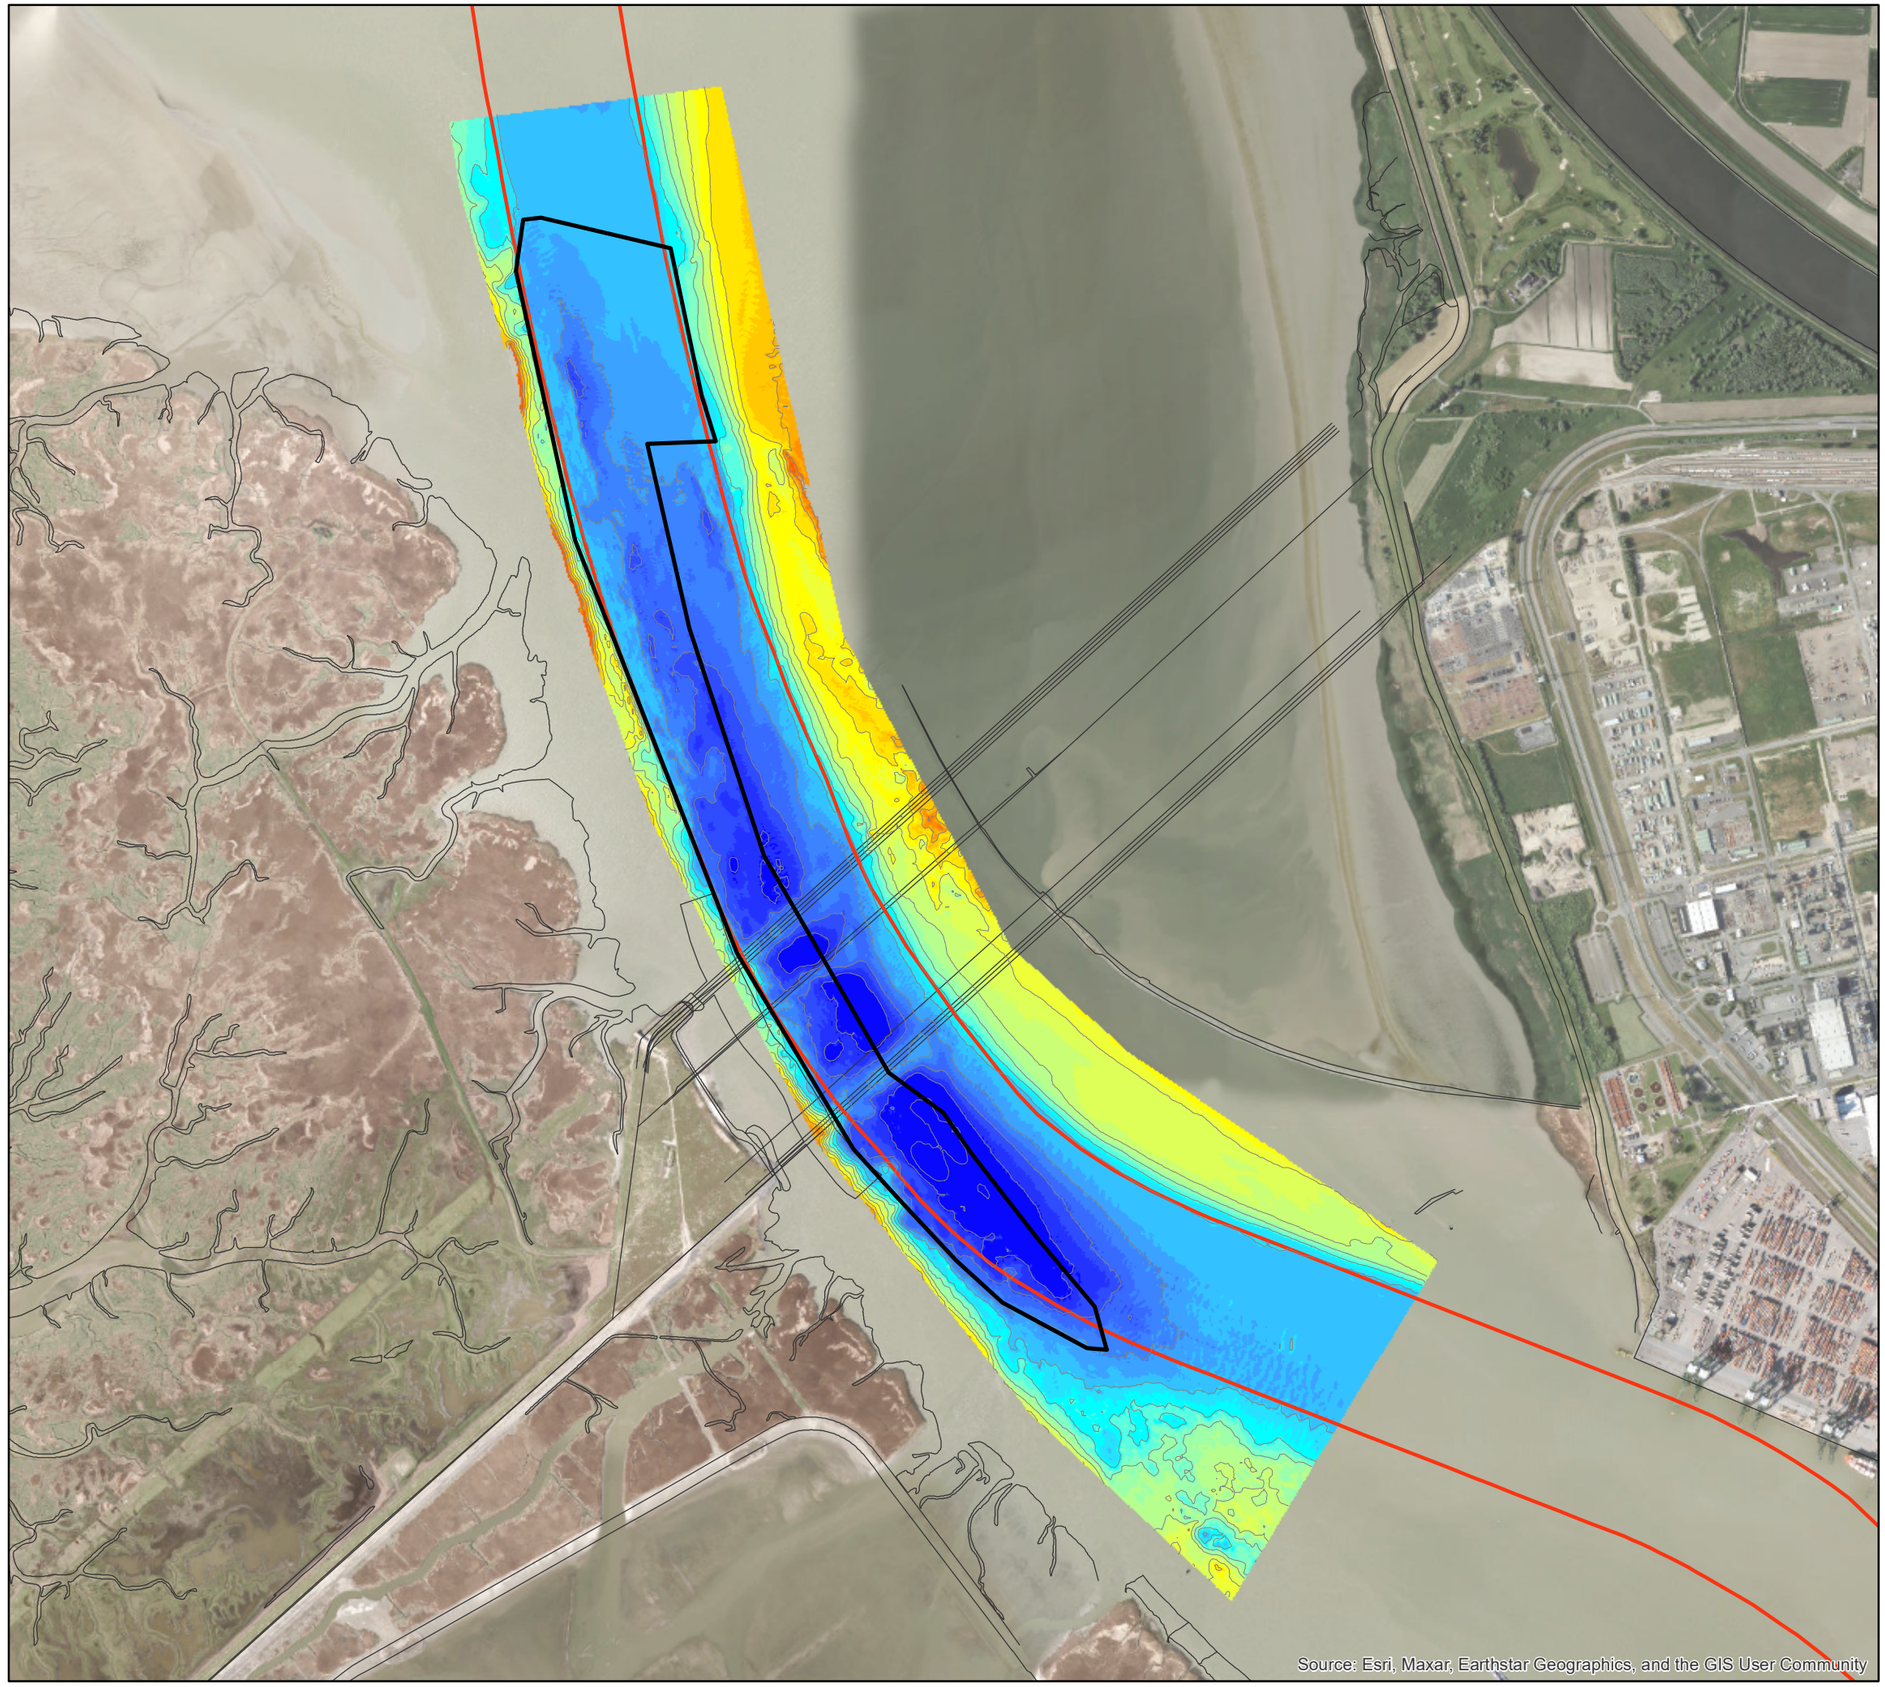

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SH71


06/02/2025 (T41)

11640_SH71_BT41
Rapport nr. 25.068



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

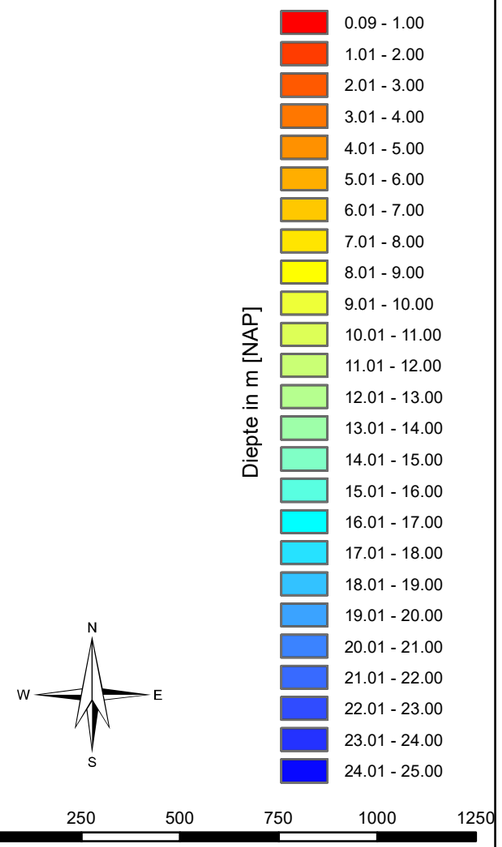

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
1	55 933
2	35 561
4	71 246
5	6 833
21	11 189
22	287 806
23	49 433
24	20 003
25	294 079
26	50 926
28	330 430
29	254 526
32	49 111
46	2 192
47	45 762
50	4 384
51	37 485
52	2 255
53	60 990
56	11 195
57	2 186
59	4 333
60	2 198
63	2 186
64	2 152
65	2 266
67	4 498
68	2 186
69	2 192
73	4 418
74	6 247
77	2 238
78	2 158
79	2 181

Totaal: 1722778 m³

SH71a

SH71b

SH71c

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -40506 m³

VLAAMSE OVERHEID

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH71

07/01/2021 (T0) - 06/02/2025 (T41)

11640_SH71_VT41-T0
Rapport nr. 25.068



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N W E S

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
1	2 209
4	2 215
21	2 278
22	2 272
23	2 301
24	2 232
25	6 639
26	2 249
28	4 424
29	2 226
46	2 192
50	2 215
53	2 255
59	2 141

Totaal: 37848 m³

SH71a

SH71b

SH71c

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -88306 m³

VLAAMSE OVERHEID

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH71

12/11/2024 (T40) - 06/02/2025 (T41)

11640_SH71_VT41-T40
Rapport nr. 25.068



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50


-0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N W E S

0 200 400 600 800 1000

A.3 Kaartmateriaal april en mei 2025

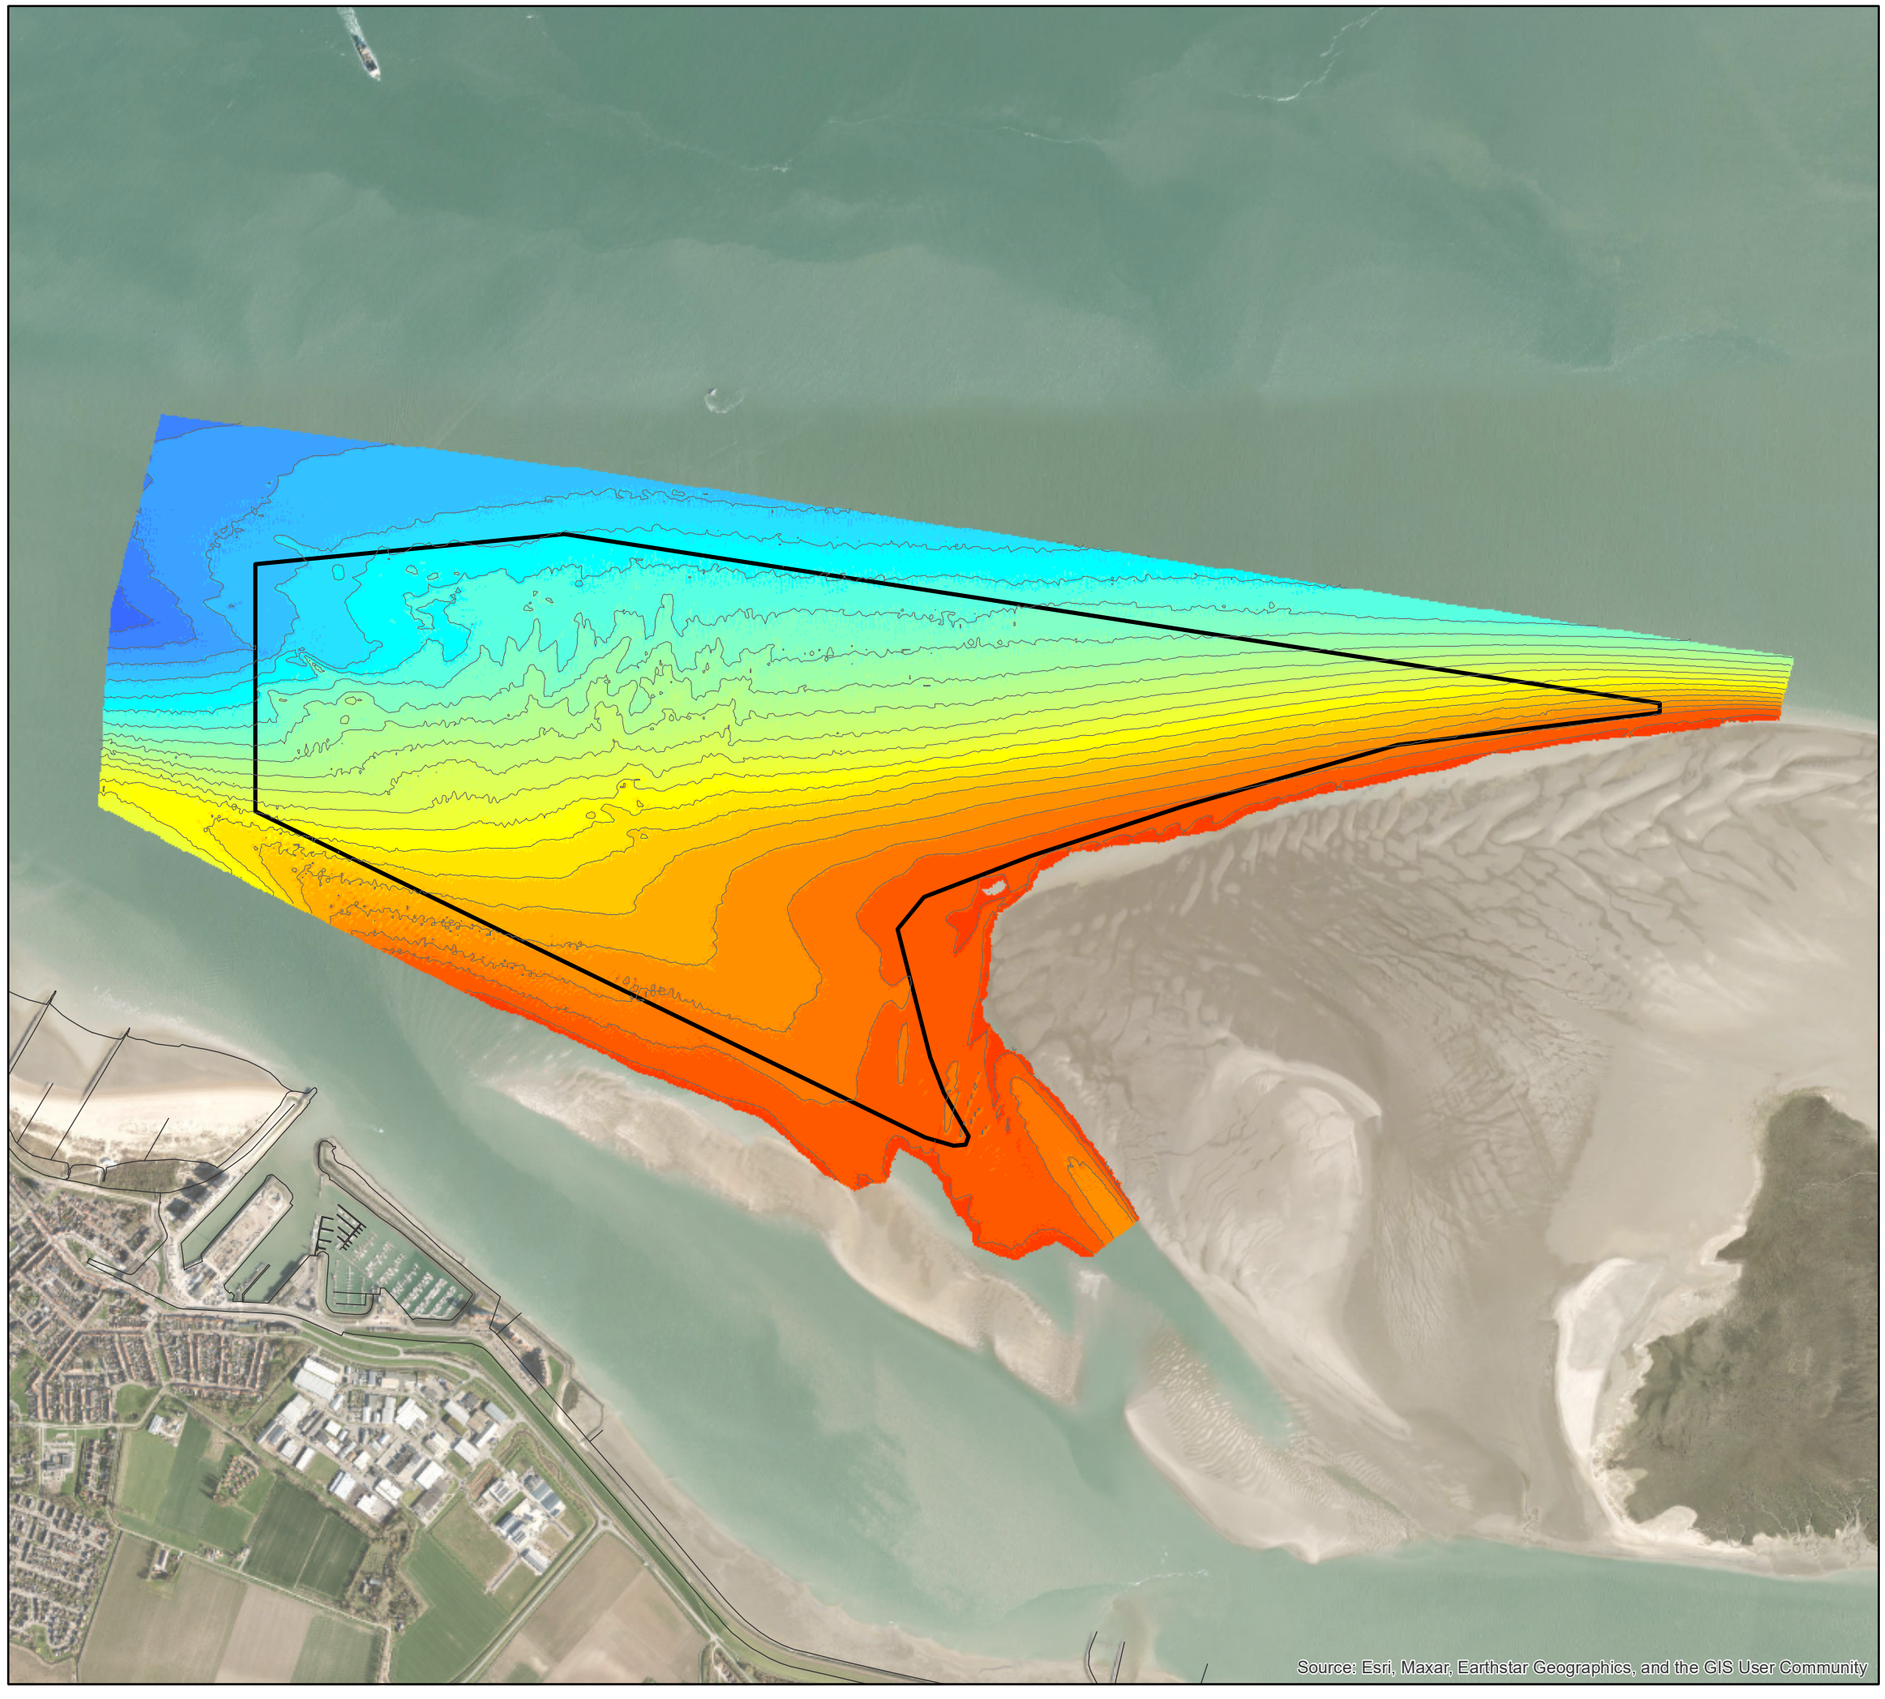

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart Hooge Platen West

24/02/2025 (T164)

11640_HPW_BT164
Rapport nr. 25.110



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

Diepte in m [NAP]

- 0.09 - 1.00
- 1.01 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00

N
W E
S

0 200 400 600 800 1000 m

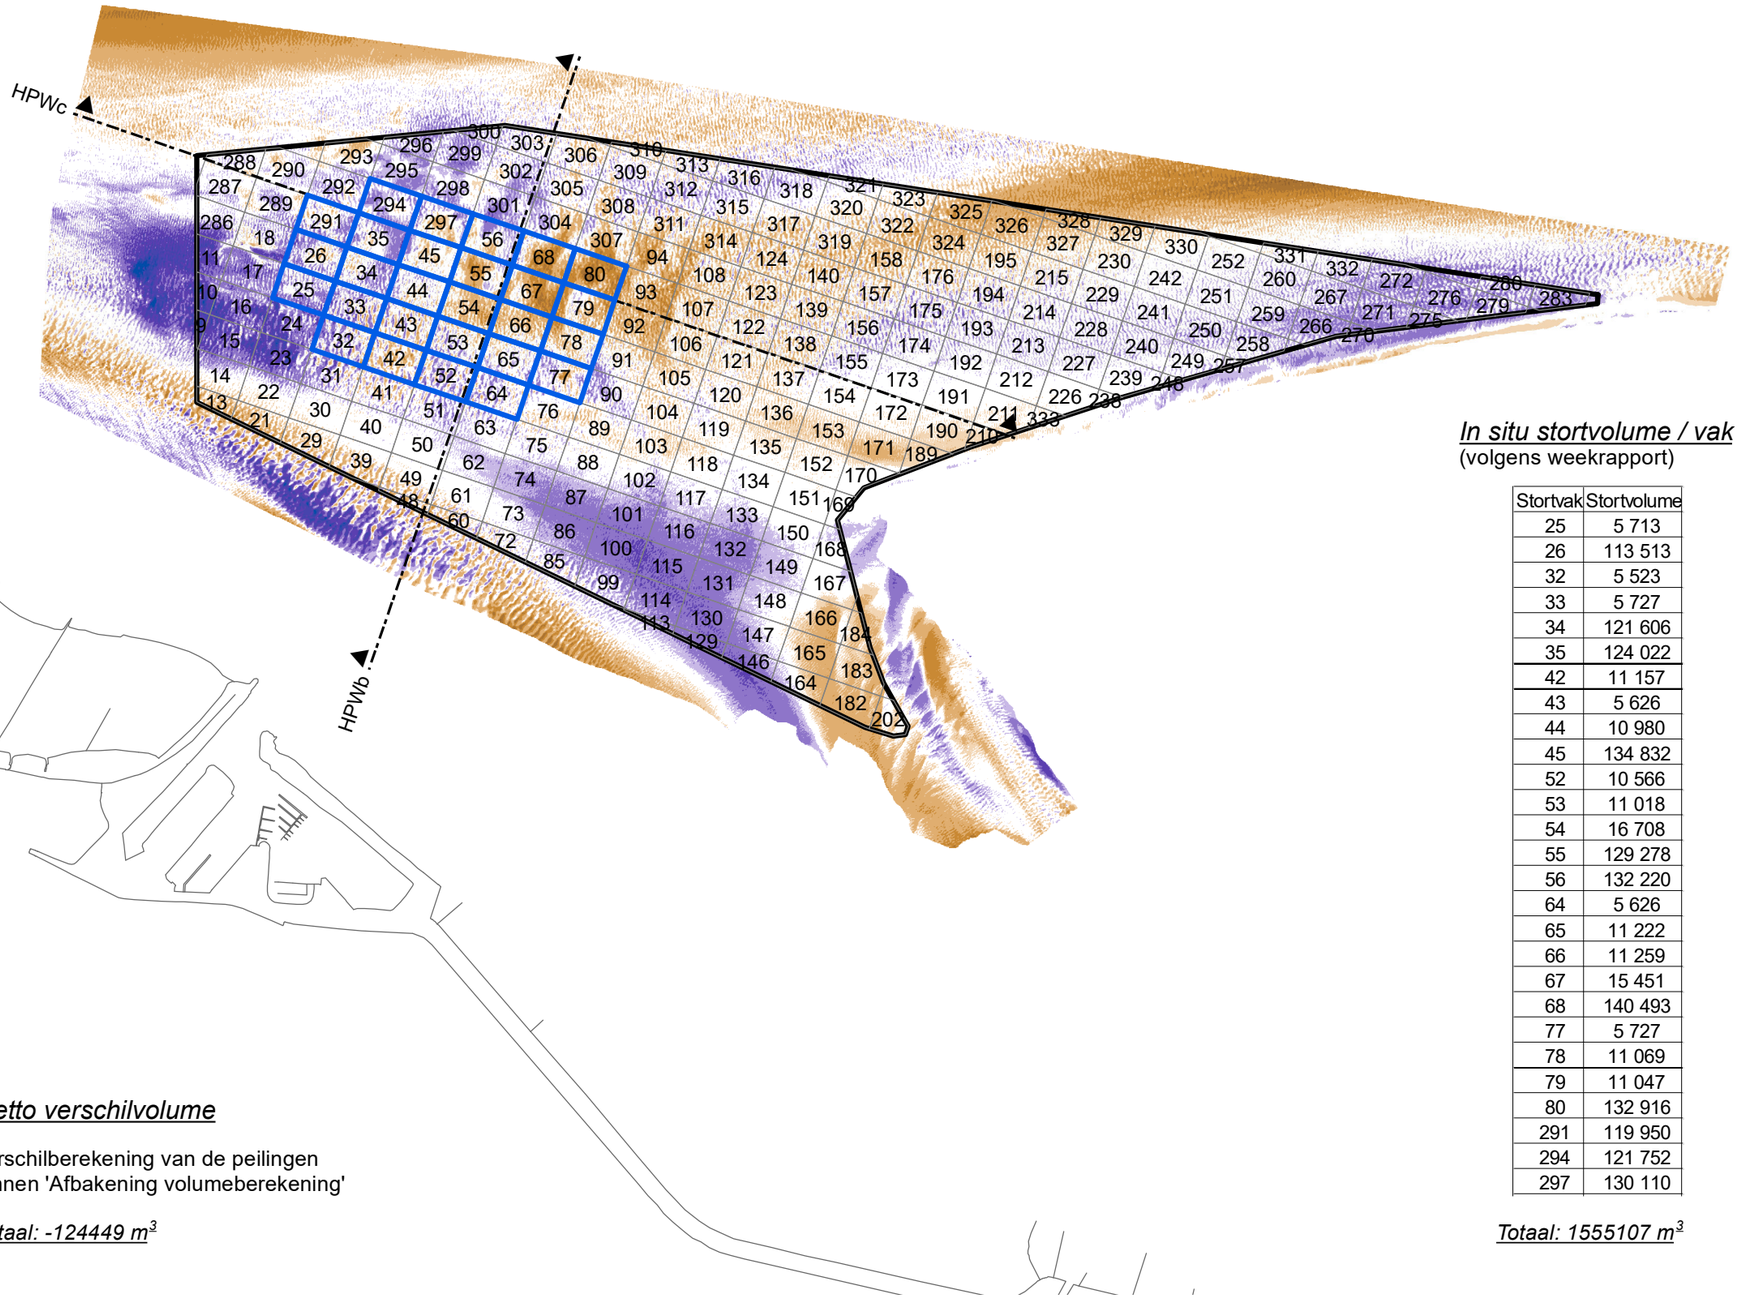

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
25	5 713
26	113 513
32	5 523
33	5 727
34	121 606
35	124 022
42	11 157
43	5 626
44	10 980
45	134 832
52	10 566
53	11 018
54	16 708
55	129 278
56	132 220
64	5 626
65	11 222
66	11 259
67	15 451
68	140 493
77	5 727
78	11 069
79	11 047
80	132 916
291	119 950
294	121 752
297	130 110

Totaal: 1555107 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -124449 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart Hooge Platen West

17/04/2022 (T146) - 24/02/2025 (T164)

11640_HPW_VT164-T146
Rapport nr. 25.110



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m


verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50

-0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N
W E
S

0 200 400 600 800 1000 m

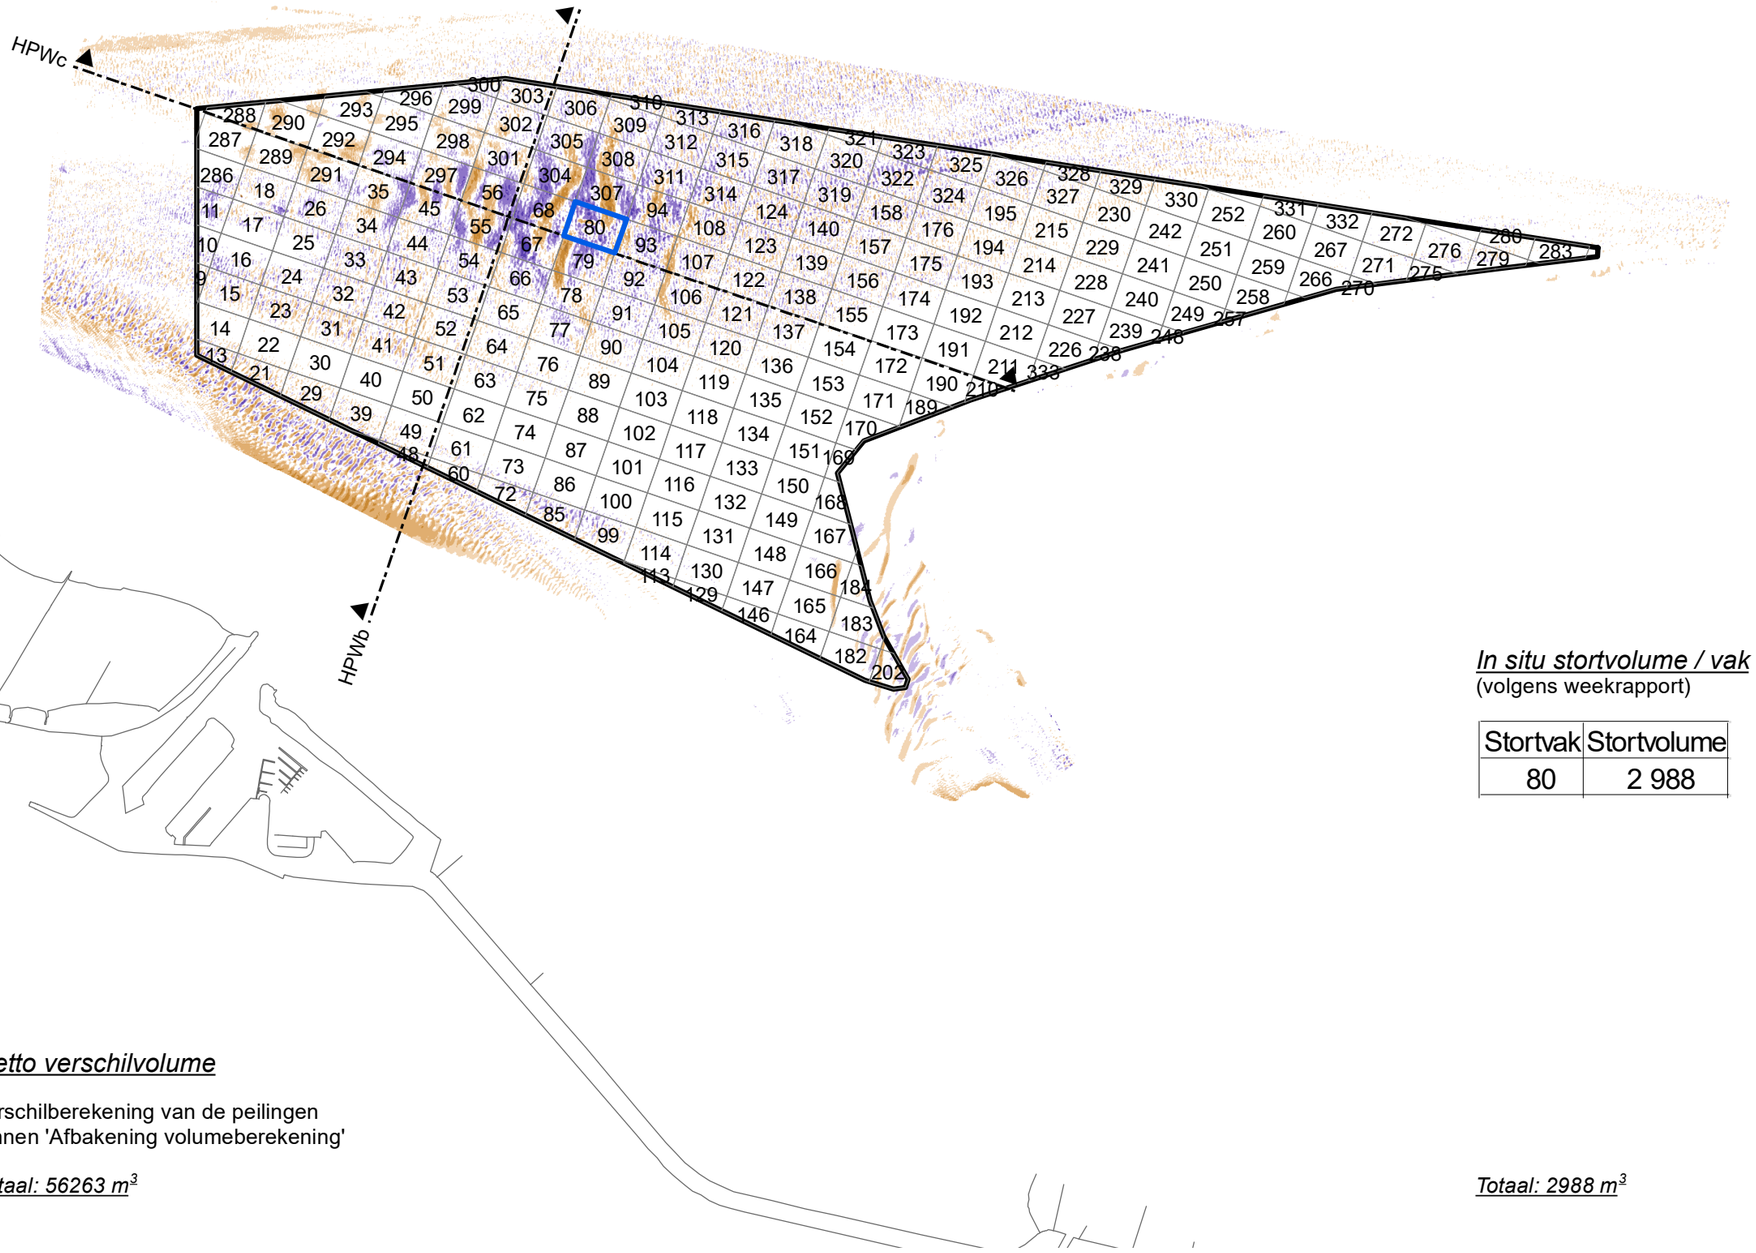

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 56263 m³

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
80	2 988

Totaal: 2988 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart Hooge Platen West

26/11/2024 (T163) - 24/02/2025 (T164)

11640_HPW_VT164-T163
Rapport nr. 25.110



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m


verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50

- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N W E S

0 200 400 600 800 1000 m

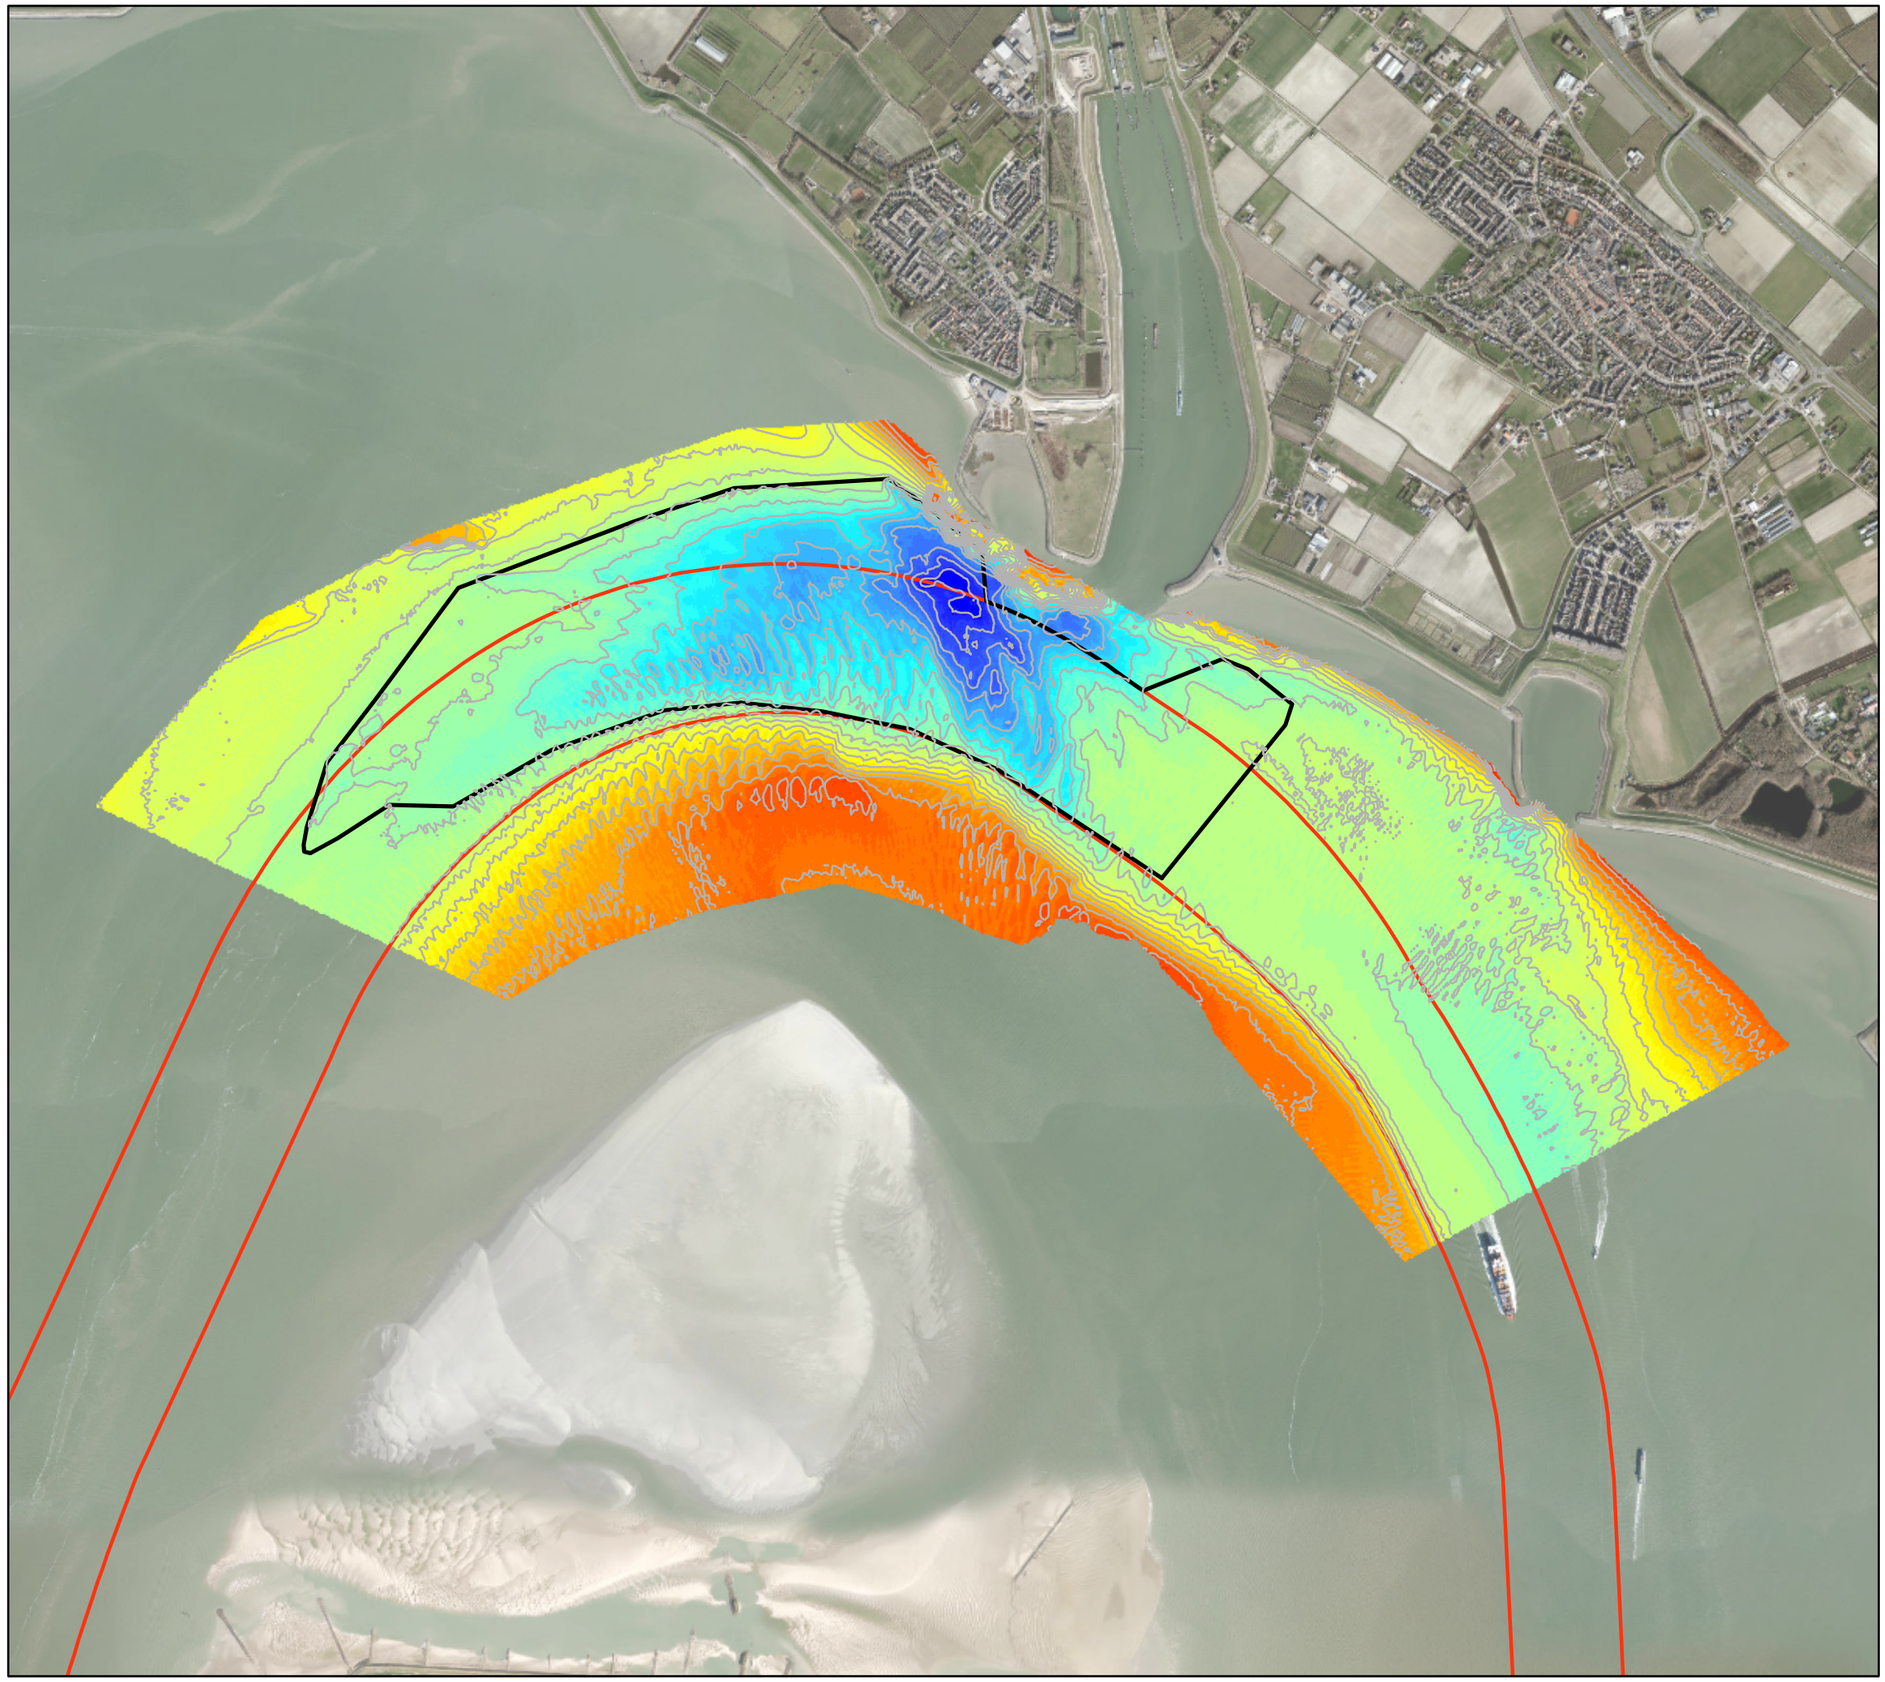

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang


Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025
Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart Put van Hansweert

09/04/2025 (T89)

11640_PVH_BT89
Rapport nr. 25.110



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

Diepte in m [NAP]

1.61 - 2.00	19.01 - 20.00
2.01 - 3.00	20.01 - 21.00
3.01 - 4.00	21.01 - 22.00
4.01 - 5.00	22.01 - 23.00
5.01 - 6.00	23.01 - 24.00
6.01 - 7.00	24.01 - 25.00
7.01 - 8.00	25.01 - 26.00
8.01 - 9.00	26.01 - 27.00
9.01 - 10.00	27.01 - 28.00
10.01 - 11.00	28.01 - 29.00
11.01 - 12.00	29.01 - 30.00
12.01 - 13.00	30.01 - 31.00
13.01 - 14.00	31.01 - 32.00
14.01 - 15.00	32.01 - 33.00
15.01 - 16.00	33.01 - 34.00
16.01 - 17.00	34.01 - 35.00
17.01 - 18.00	35.01 - 36.00
18.01 - 19.00	36.01 - 37.00

N
W E
S

0 200 400 600 800 1000 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)


Stortvak	Stortvolume
93	44 653
94	22 677
125	30 435
126	35 943
127	41 855
128	58 479
129	44 291
159	38 895
160	34 155
161	41 428
162	126 911
163	125 047
193	30 215
194	30 776
195	32 747
196	122 402
197	121 686
221	16 768
229	42 256
230	129 074
231	112 862
232	120 120
254	33 594
255	169 606
287	5 742
288	188 220
289	152 000
321	67 578
322	158 707
323	157 089
356	134 935
464	11 195
468	5 713
469	5 560
475	85 281
476	89 116
478	9 304
483	96 137
484	94 536
485	5 689
486	10 948
490	119 796
491	70 260
492	104 487
493	15 086
494	14 943
498	106 217
499	18 399
500	23 140
513	39 713
514	56 533
516	44 859
517	44 770
518	45 051
519	54 454
520	68 154
523	49 461
524	56 043
525	11 331

Totaal: 3827322 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 2541641 m³

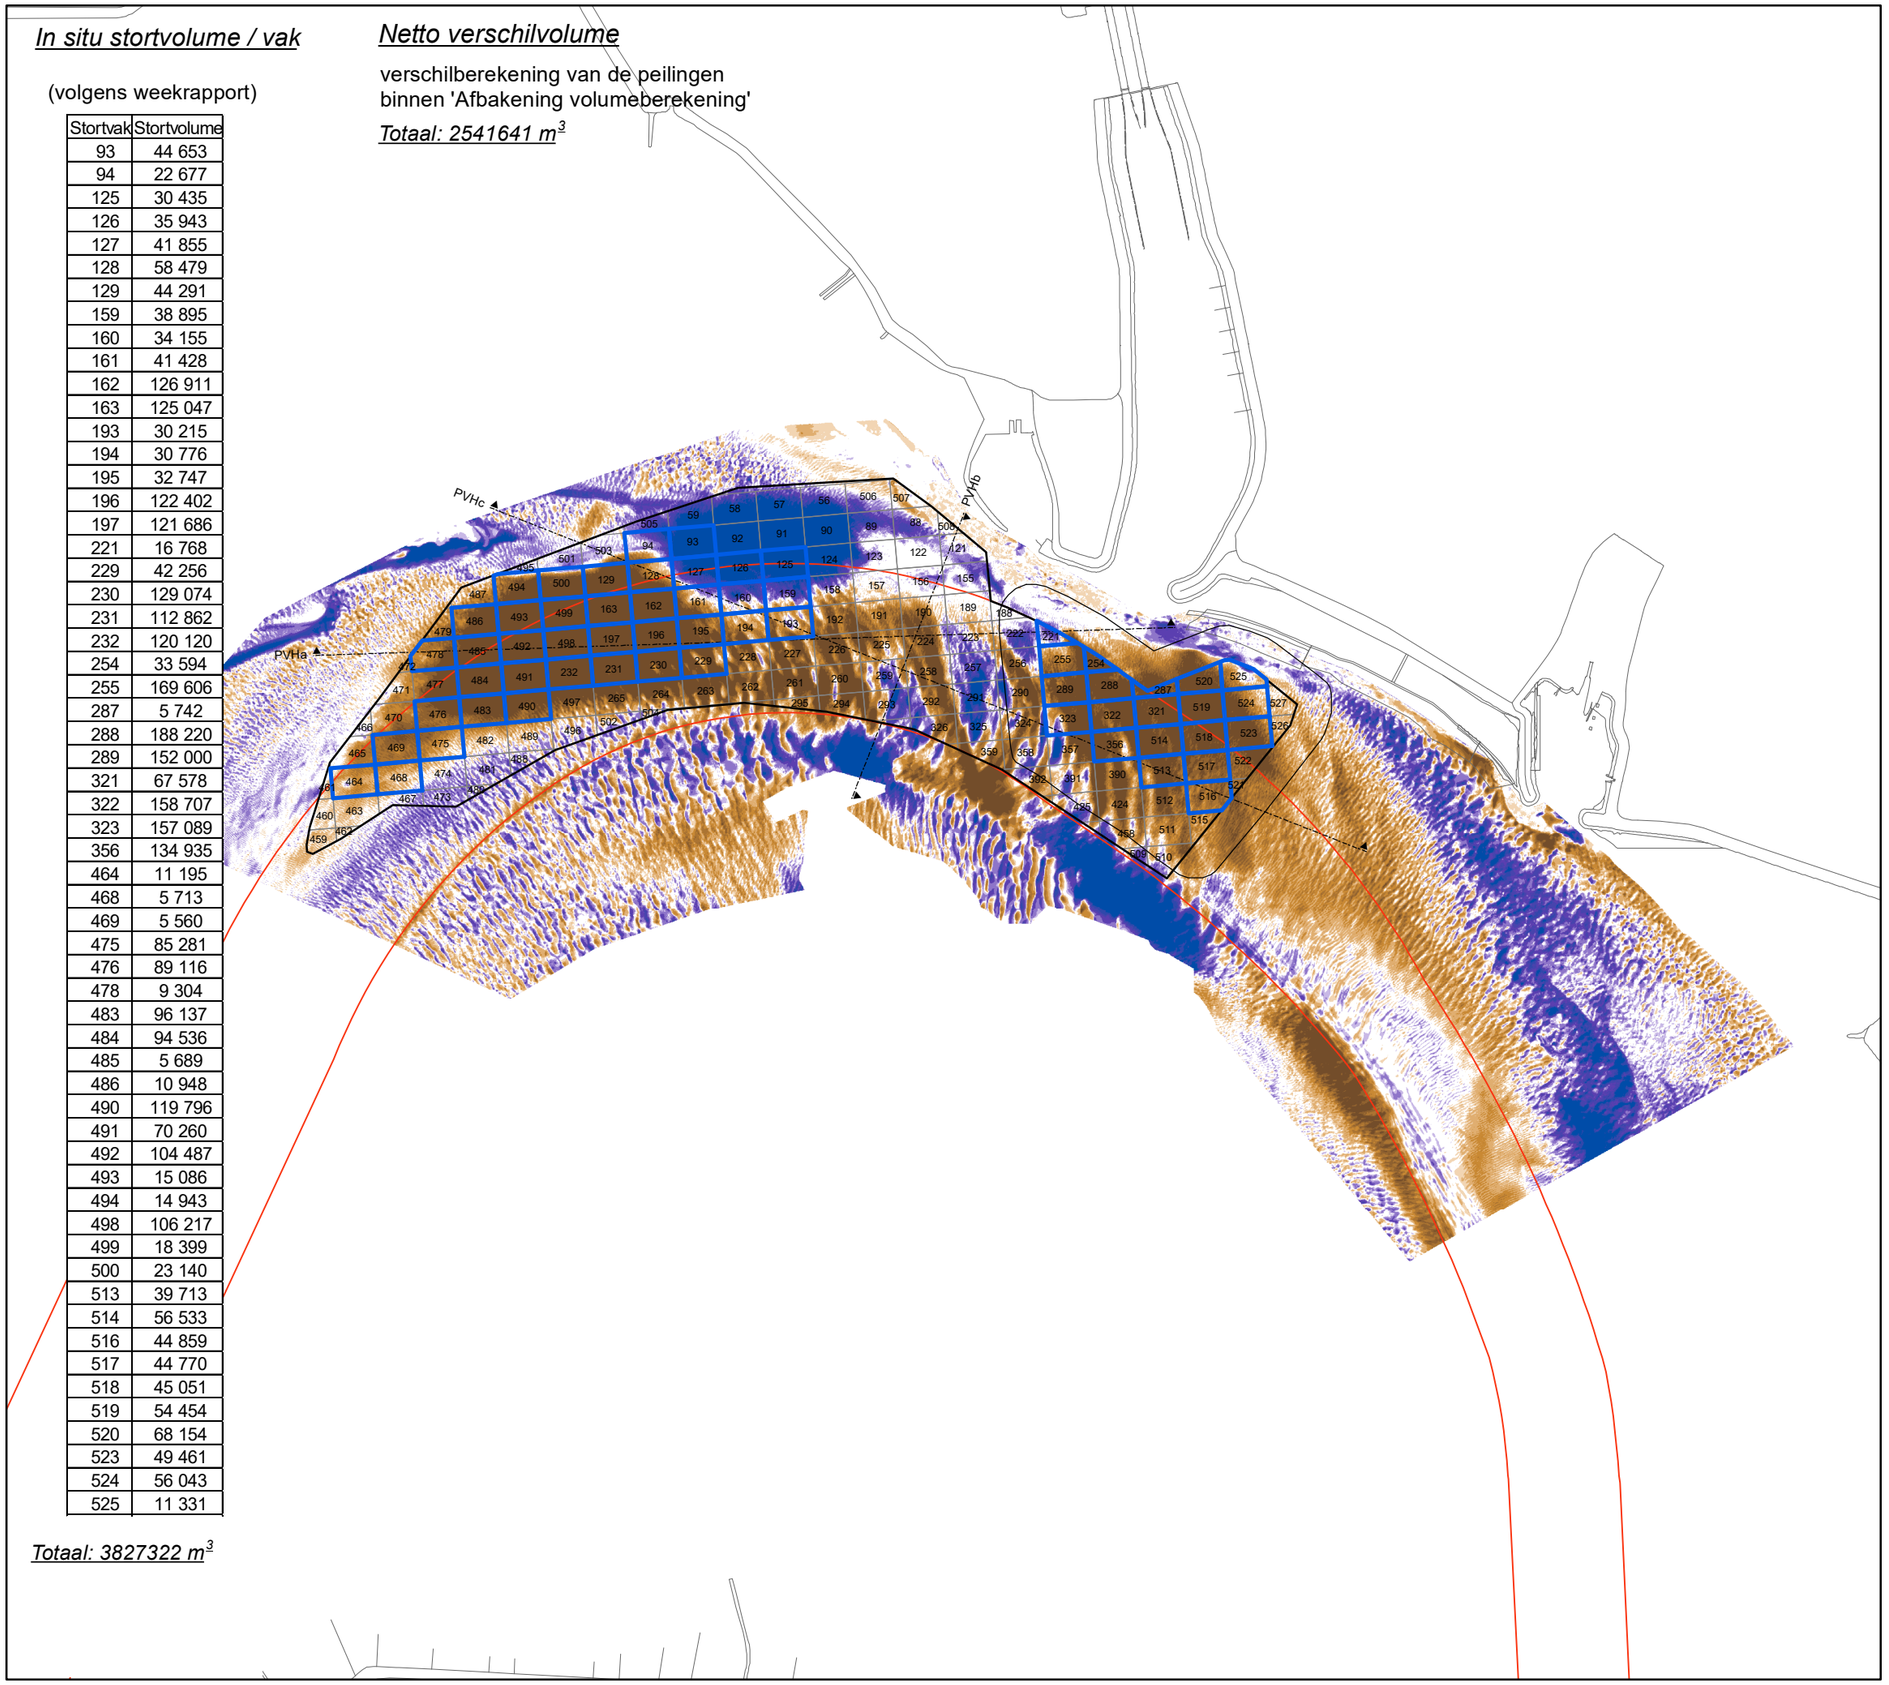

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nrMT/02323_C1_04

Verschilkaart Put van Hansweert

02/05/2022 (T65) - 09/04/2025 (T89)

11640_PVH_VT89-T65

Rapport nr. 25.110



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N W E S

0 200 400 600 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)


Stortvak	Stortvolume
93	44 653
94	22 677
125	30 435
126	35 943
127	41 855
128	58 479
129	44 291
159	38 895
160	34 155
161	41 428
162	126 911
163	125 047
193	30 215
194	30 776
195	32 747
196	122 402
197	121 686
221	16 768
229	42 256
230	129 074
231	112 862
232	120 120
254	33 594
255	169 606
287	5 742
288	188 220
289	152 000
321	67 578
322	158 707
323	157 089
356	134 935
464	11 195
468	5 713
469	5 560
475	85 281
476	89 116
478	9 304
483	96 137
484	94 536
485	5 689
486	10 948
490	119 796
491	70 260
492	104 487
493	15 086
494	14 943
498	106 217
499	18 399
500	23 140
513	39 713
514	56 533
516	44 859
517	44 770
518	45 051
519	54 454
520	68 154
523	49 461
524	56 043
525	11 331

Totaal: 3827322 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 3006007 m³

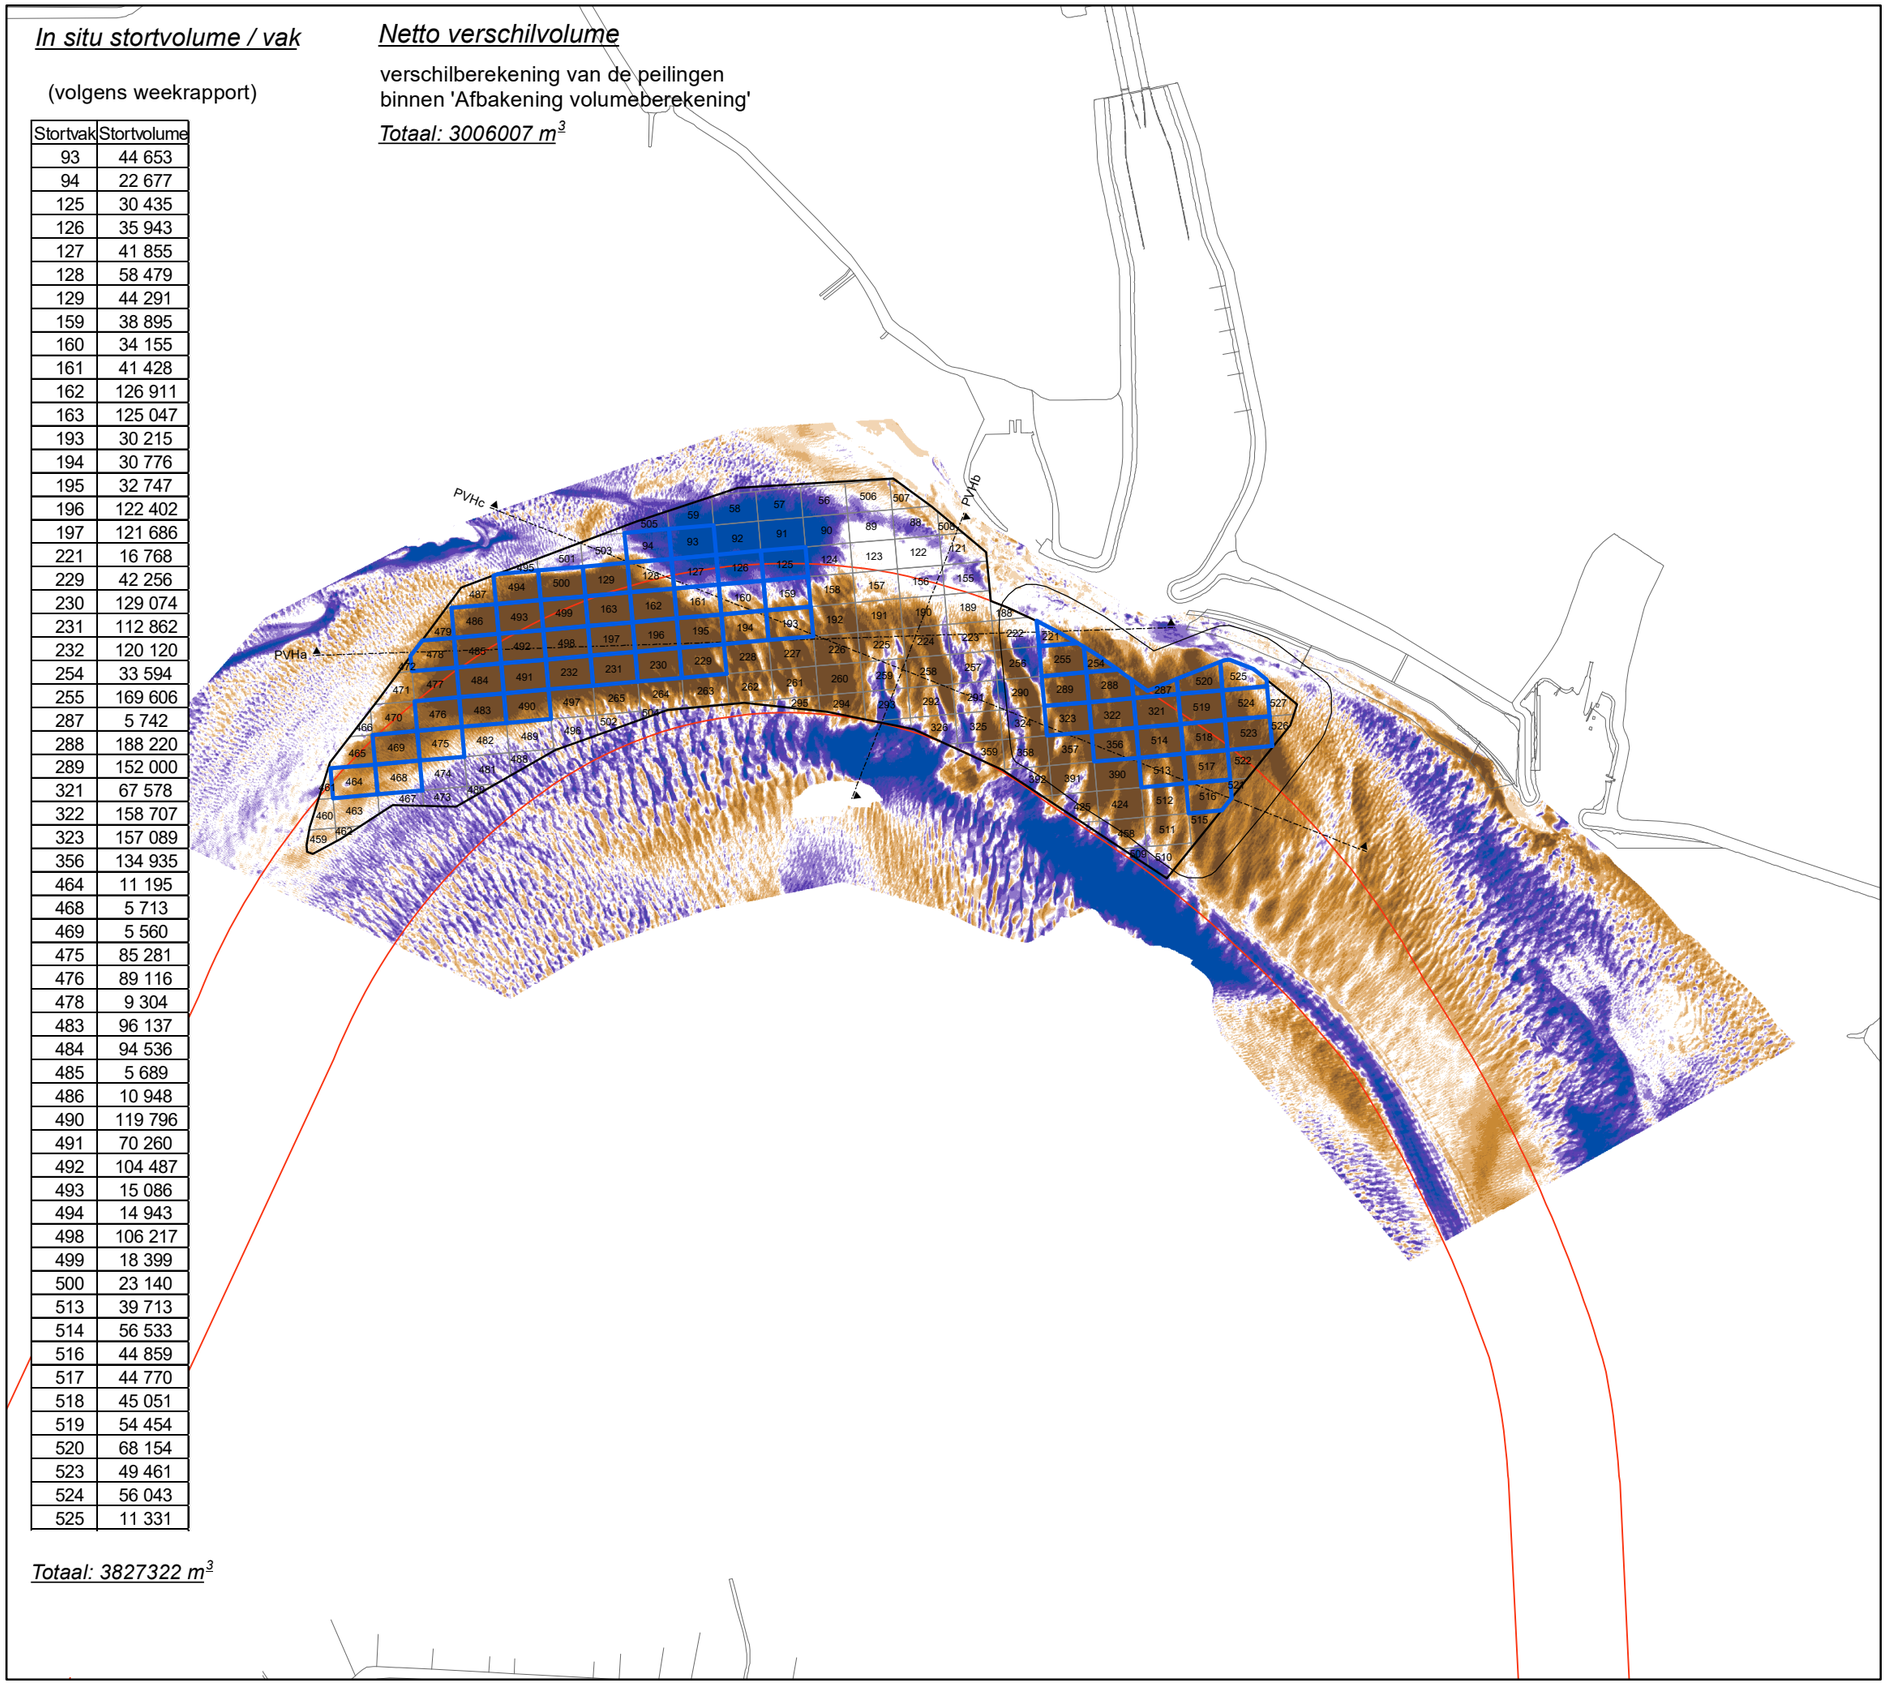

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nrMT/02323_C1_04

Verschilkaart Put van Hansweert

20/09/2022 (T68) - 09/04/2025 (T89)

11640_PVH_VT89-T68

Rapport nr. 25.110



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

verondieping

- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping

- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N W E S

0 200 400 600 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)


Stortvak	Stortvolume
125	16 592
126	22 019
127	22 071
128	27 622
129	22 493
159	24 823
160	16 739
161	21 720
162	24 075
163	19 137
193	16 474
194	16 738
195	18 858
196	16 753
197	16 385
229	24 182
230	22 223
231	10 647
232	16 518
464	5 582
468	5 713
469	5 560
478	9 304
483	4 823
484	7 980
486	5 309
490	21 939
500	3 464

Totaal: 445742 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 150059 m³

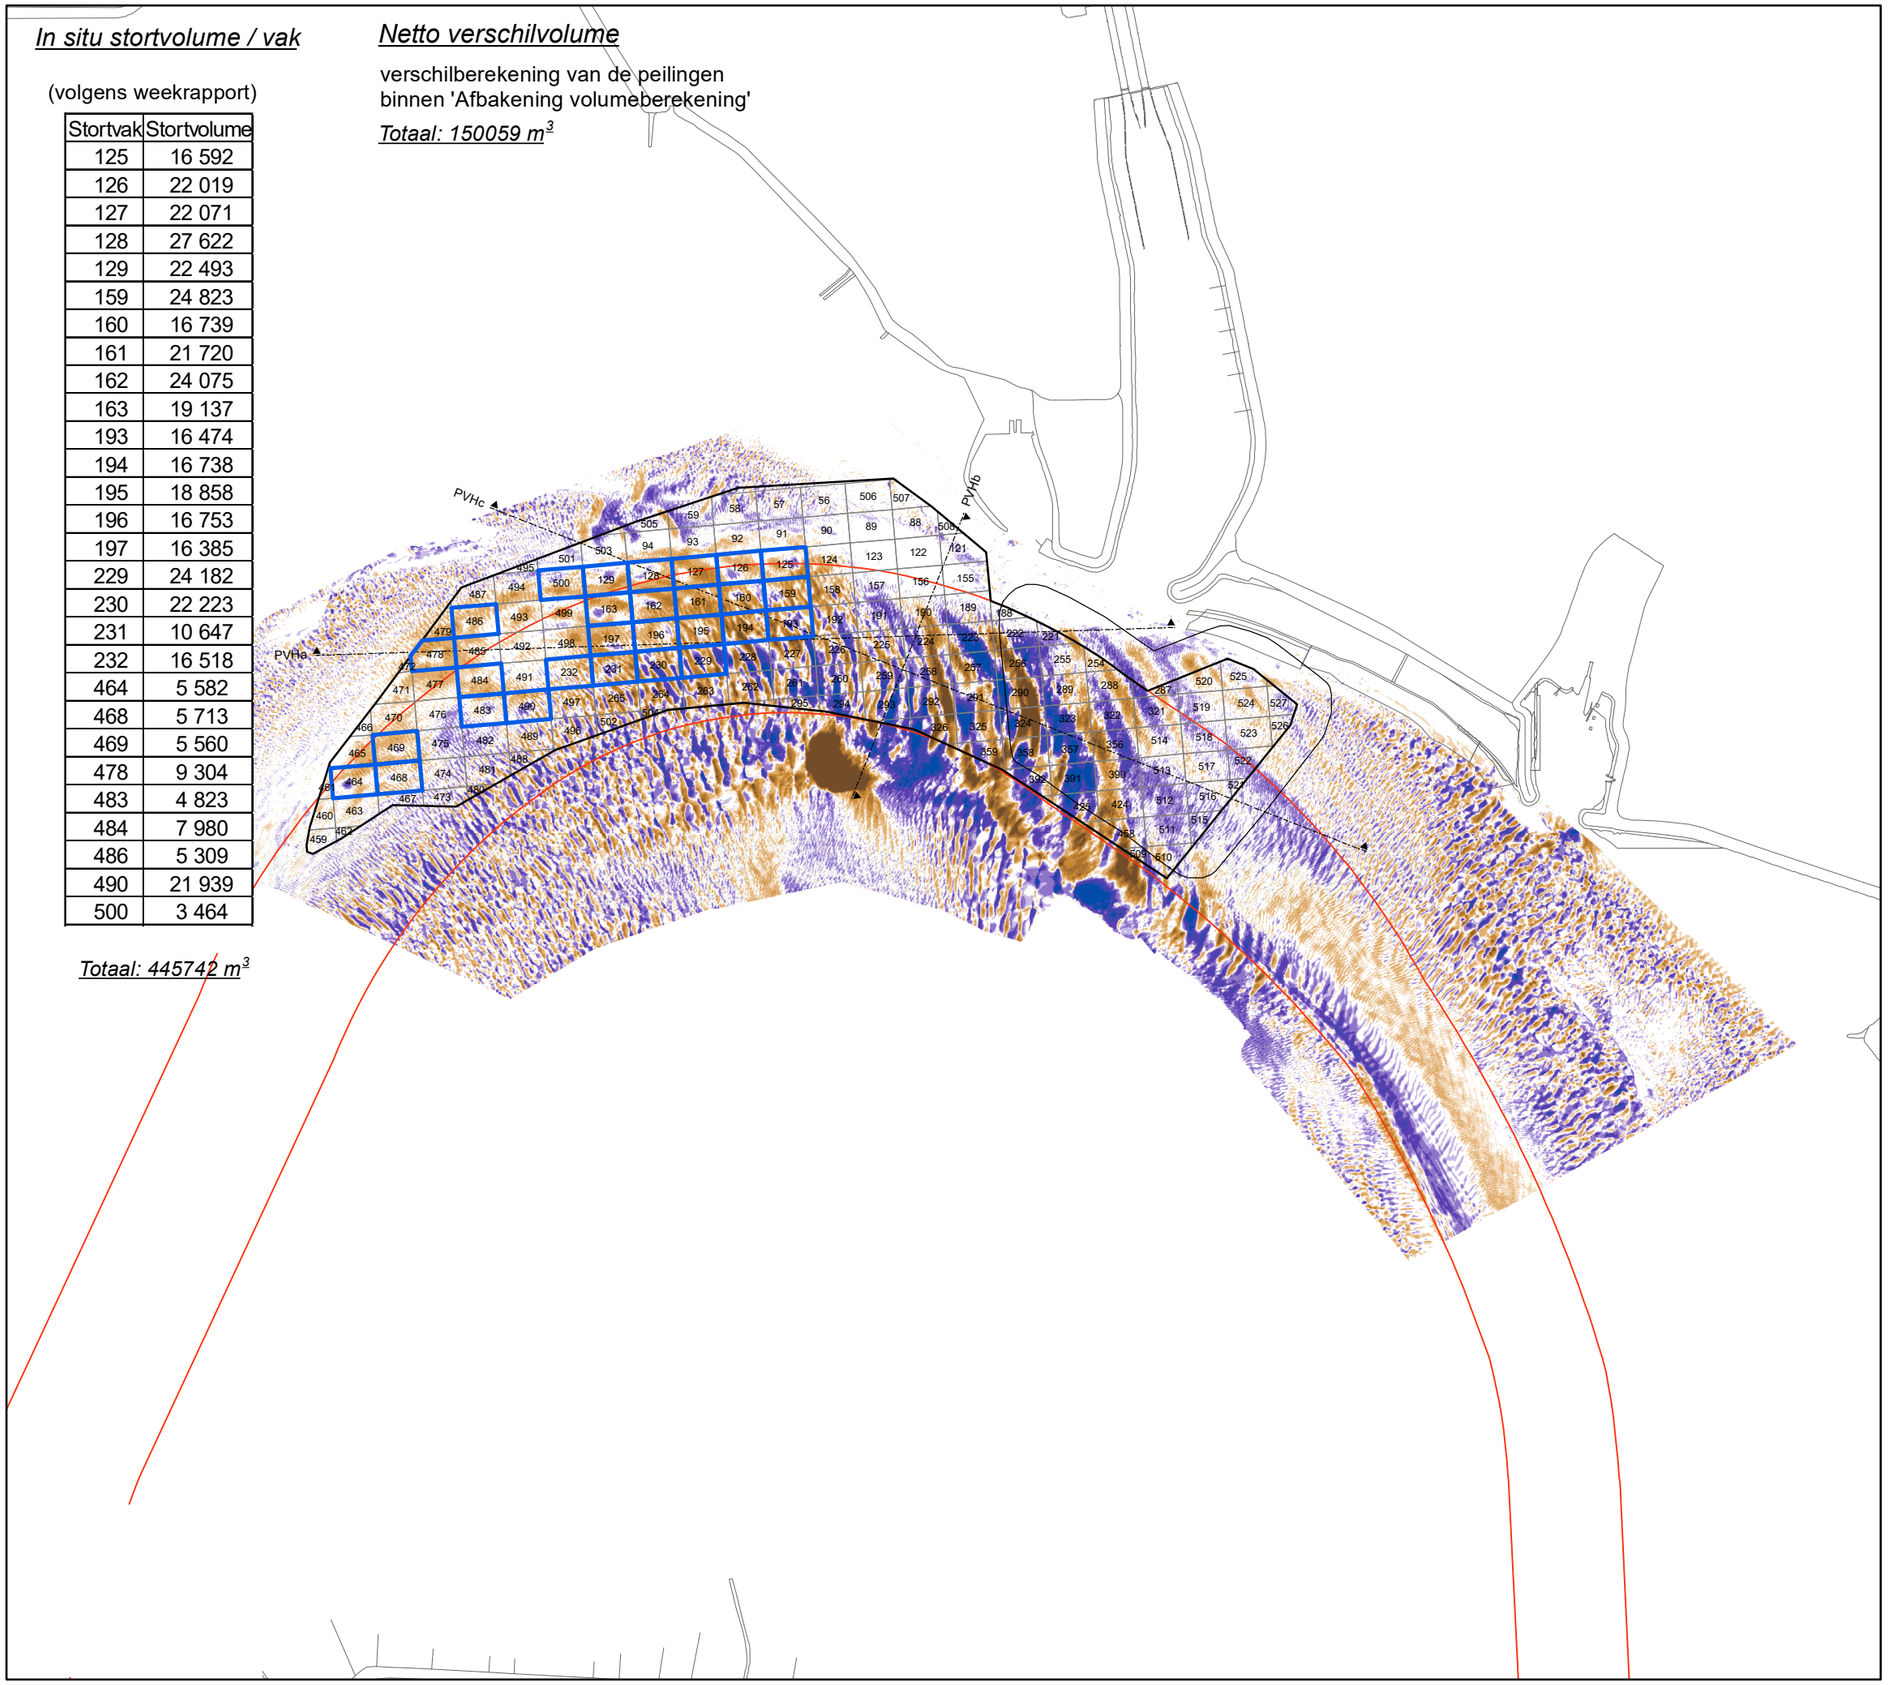

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nrMT/02323_C1_04

Verschilkaart Put van Hansweert

27/01/2025 (T88) - 09/04/2025 (T89)

11640_PVH_VT89-T88

Rapport nr. 25.110



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende


- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	verdieping
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

0 200 400 600 m

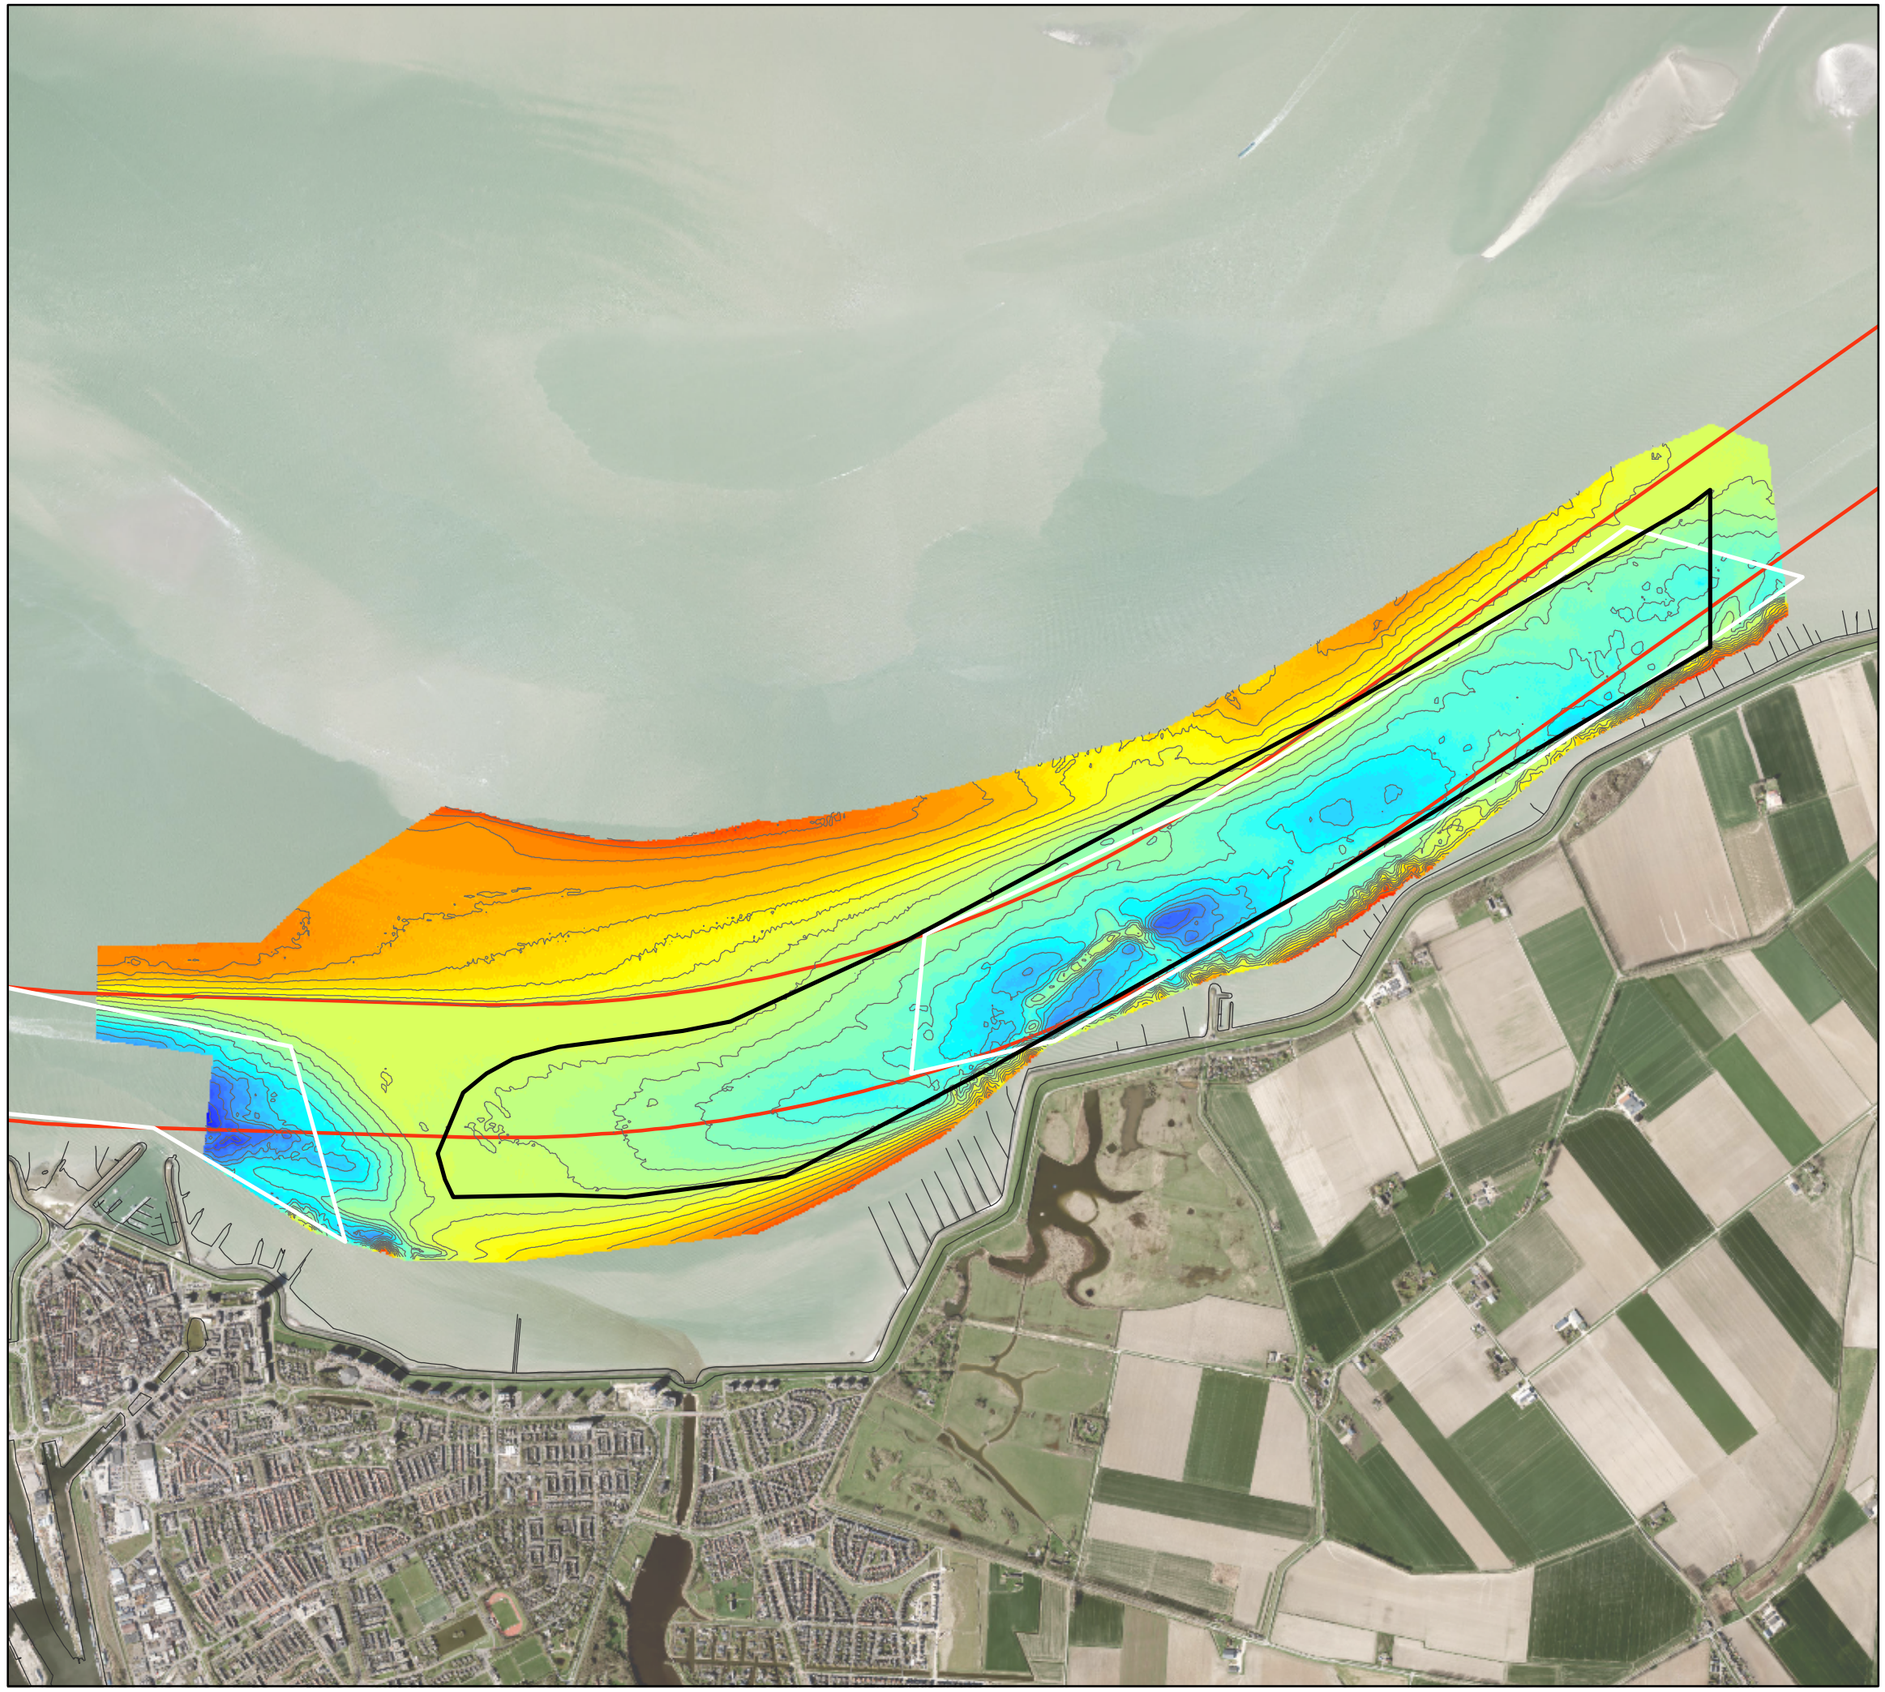

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SH31

12/05/2025 (T84)

11640_SH31_BT84
Rapport nr. 25.110



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

Diepte in m [NAP]

1.88 - 2.00	22.01 - 23.00
2.01 - 3.00	23.01 - 24.00
3.01 - 4.00	24.01 - 25.00
4.01 - 5.00	25.01 - 26.00
5.01 - 6.00	26.01 - 27.00
6.01 - 7.00	27.01 - 28.00
7.01 - 8.00	28.01 - 29.00
8.01 - 9.00	29.01 - 30.00
9.01 - 10.00	30.01 - 31.00
10.01 - 11.00	31.01 - 32.00
11.01 - 12.00	32.01 - 33.00
12.01 - 13.00	33.01 - 34.00
13.01 - 14.00	34.01 - 35.00
14.01 - 15.00	35.01 - 36.00
15.01 - 16.00	36.01 - 37.00
16.01 - 17.00	37.01 - 38.00
17.01 - 18.00	38.01 - 39.00
18.01 - 19.00	39.01 - 40.00
19.01 - 20.00	40.01 - 41.00
20.01 - 21.00	41.01 - 42.00
21.01 - 22.00	

N
W E
S

0 250 500 750 1000 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)


Stortvak	Stortvolume
85	2 032
86	26 928
87	28 305
88	28 983
89	26 777
90	12 348
91	25 974
92	27 036
93	28 039
94	28 199
95	28 657
96	25 617
97	6 034
98	28 649
99	30 428
100	28 233
101	28 245
102	21 329
103	20 985
104	27 203
105	23 302
106	20 607
107	26 634
108	22 282
109	26 556
110	5 960
111	21 252
112	23 229
113	21 055
114	22 844
115	25 932
116	4 169
117	1 860
118	21 187
119	22 922
120	16 959
121	26 768
122	1 803
123	15 641
124	20 764
125	21 086
126	21 085
127	26 794
128	28 713
129	30 554
130	23 666
131	26 791
132	13 700
169	22 175
170	30 634
171	30 542
172	26 973
173	1 728
175	135 177
176	163 318
177	154 705
178	153 217
179	1 725
181	165 247
182	153 583
183	149 102
184	134 111
185	1 565
187	125 171
188	136 908
189	107 030
190	112 170
193	126 518
194	140 569

Totaal: 6136931 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 3044854 m³

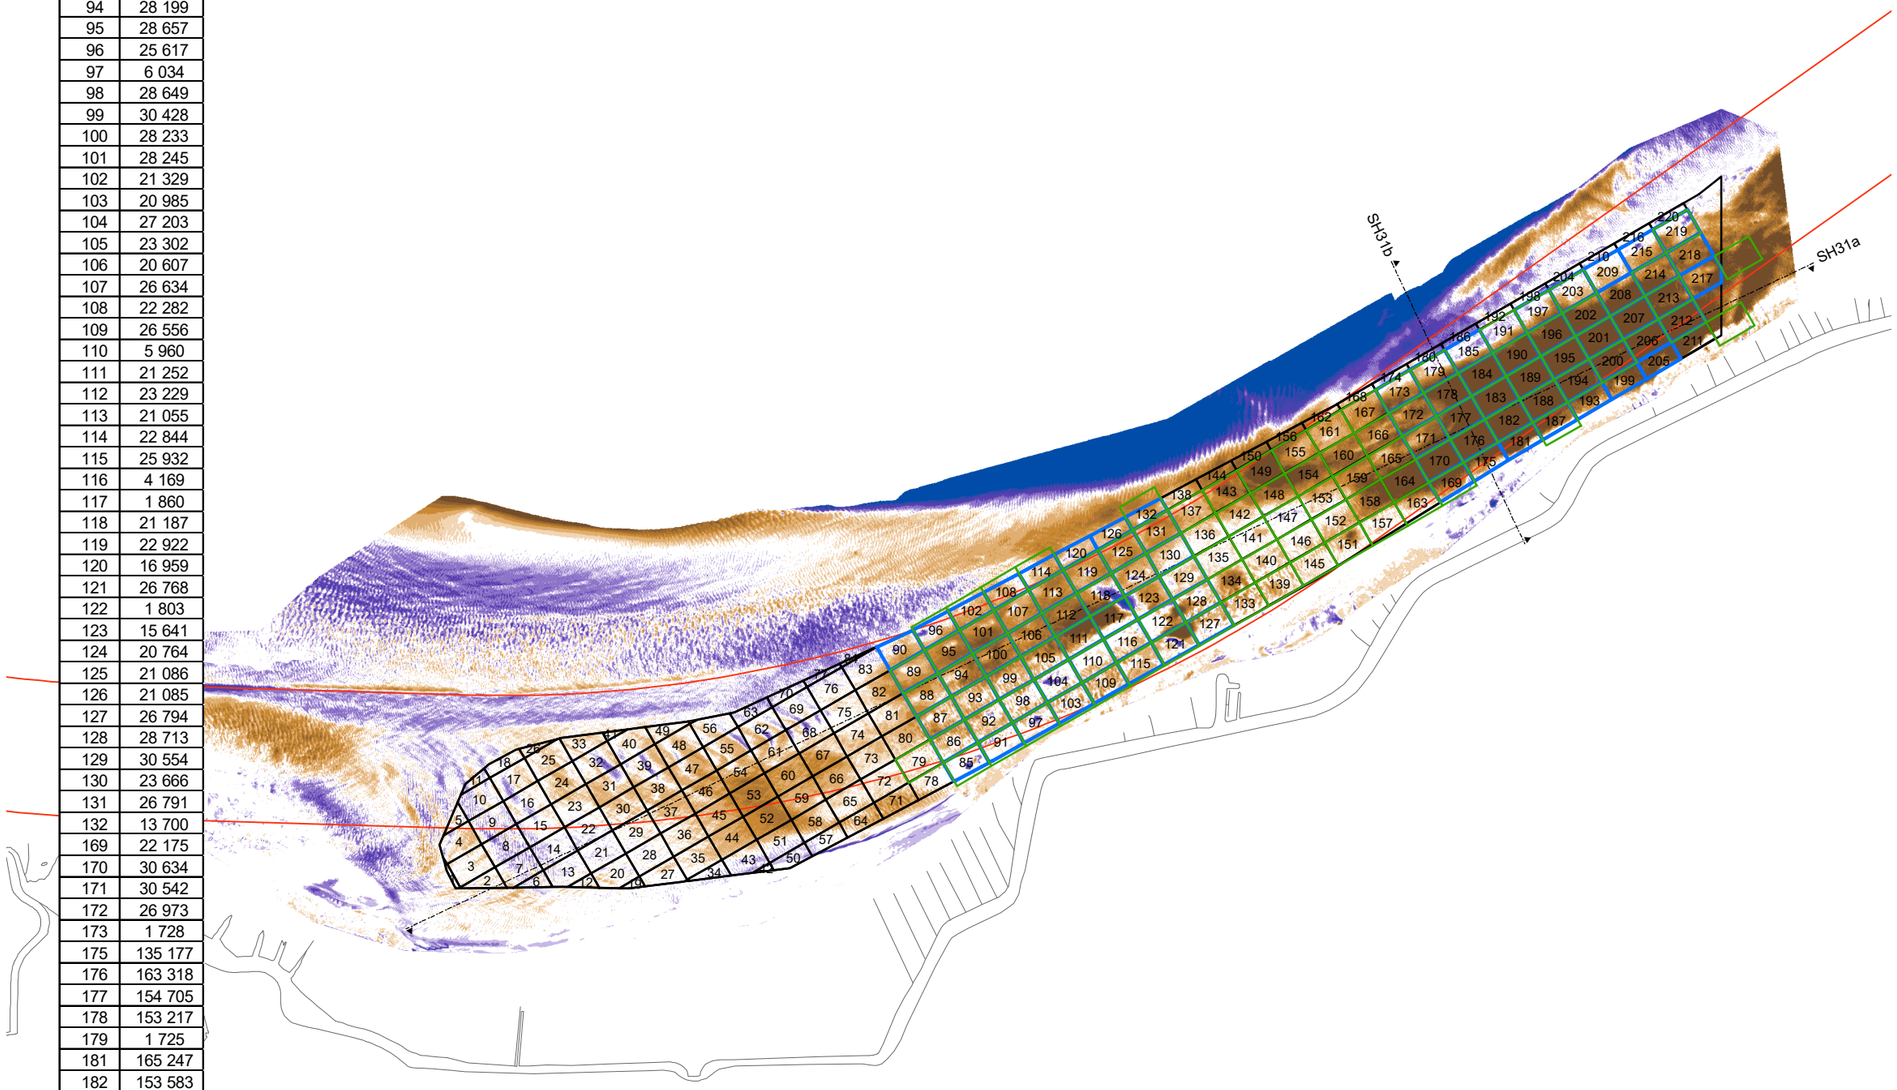

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH31

26/04/2022 (T62) - 12/05/2025 (T84)

11640_SH31_VT84-T62
Rapport nr. 25.110



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	verdieping
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

0 200 400 600 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)


Stortvak	Stortvolume
86	5 553
87	9 361
88	9 571
89	9 533
90	4 169
91	5 413
92	9 583
93	9 367
94	9 300
95	9 432
96	9 499
98	9 655
99	9 553
100	9 449
101	9 729
103	4 146
104	9 689
105	9 465
106	8 783
107	9 372
108	5 575
109	9 636
111	3 991
112	9 444
113	9 572
114	5 619
115	6 720
118	9 601
119	9 428
120	9 497
121	9 623
123	4 045
124	9 362
125	9 486
126	9 677
127	9 505
128	9 520
129	9 417
130	9 618
131	9 578
132	4 076
169	9 311
170	9 782
171	9 604
172	9 663
175	9 578
176	9 565
177	9 387
178	5 523
181	5 619
182	5 391
183	5 391
184	5 611
193	5 626
194	9 714
195	5 420
196	5 494
197	9 523
199	9 618
200	9 481
201	10 840
202	5 538
203	5 354
205	4 076
206	15 125
207	5 509
208	5 501
209	5 545
212	5 626

Totaal: 607436 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 351710 m³

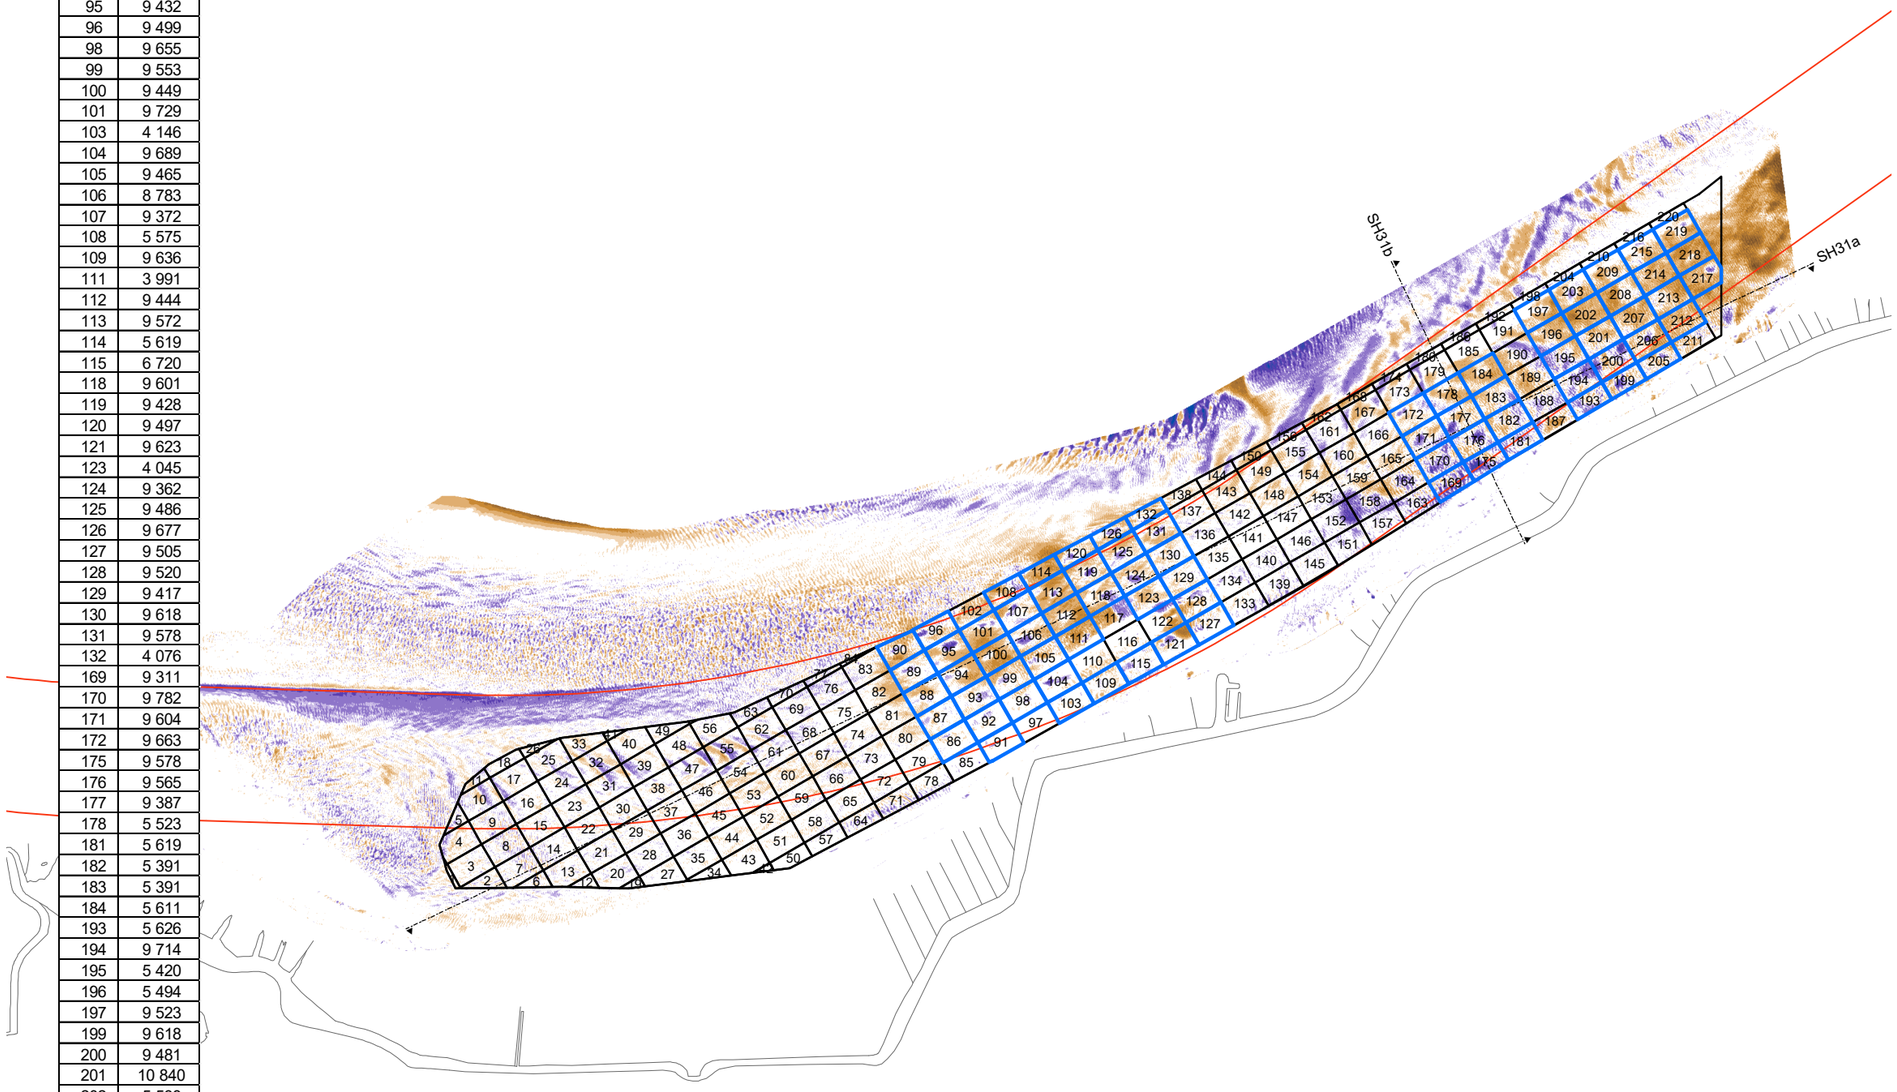

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH31

22/01/2025 (T83) - 12/05/2025 (T84)

11640_SH31_VT84-T83
Rapport nr. 25.110



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende


- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	verdieping
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

0 200 400 600 m

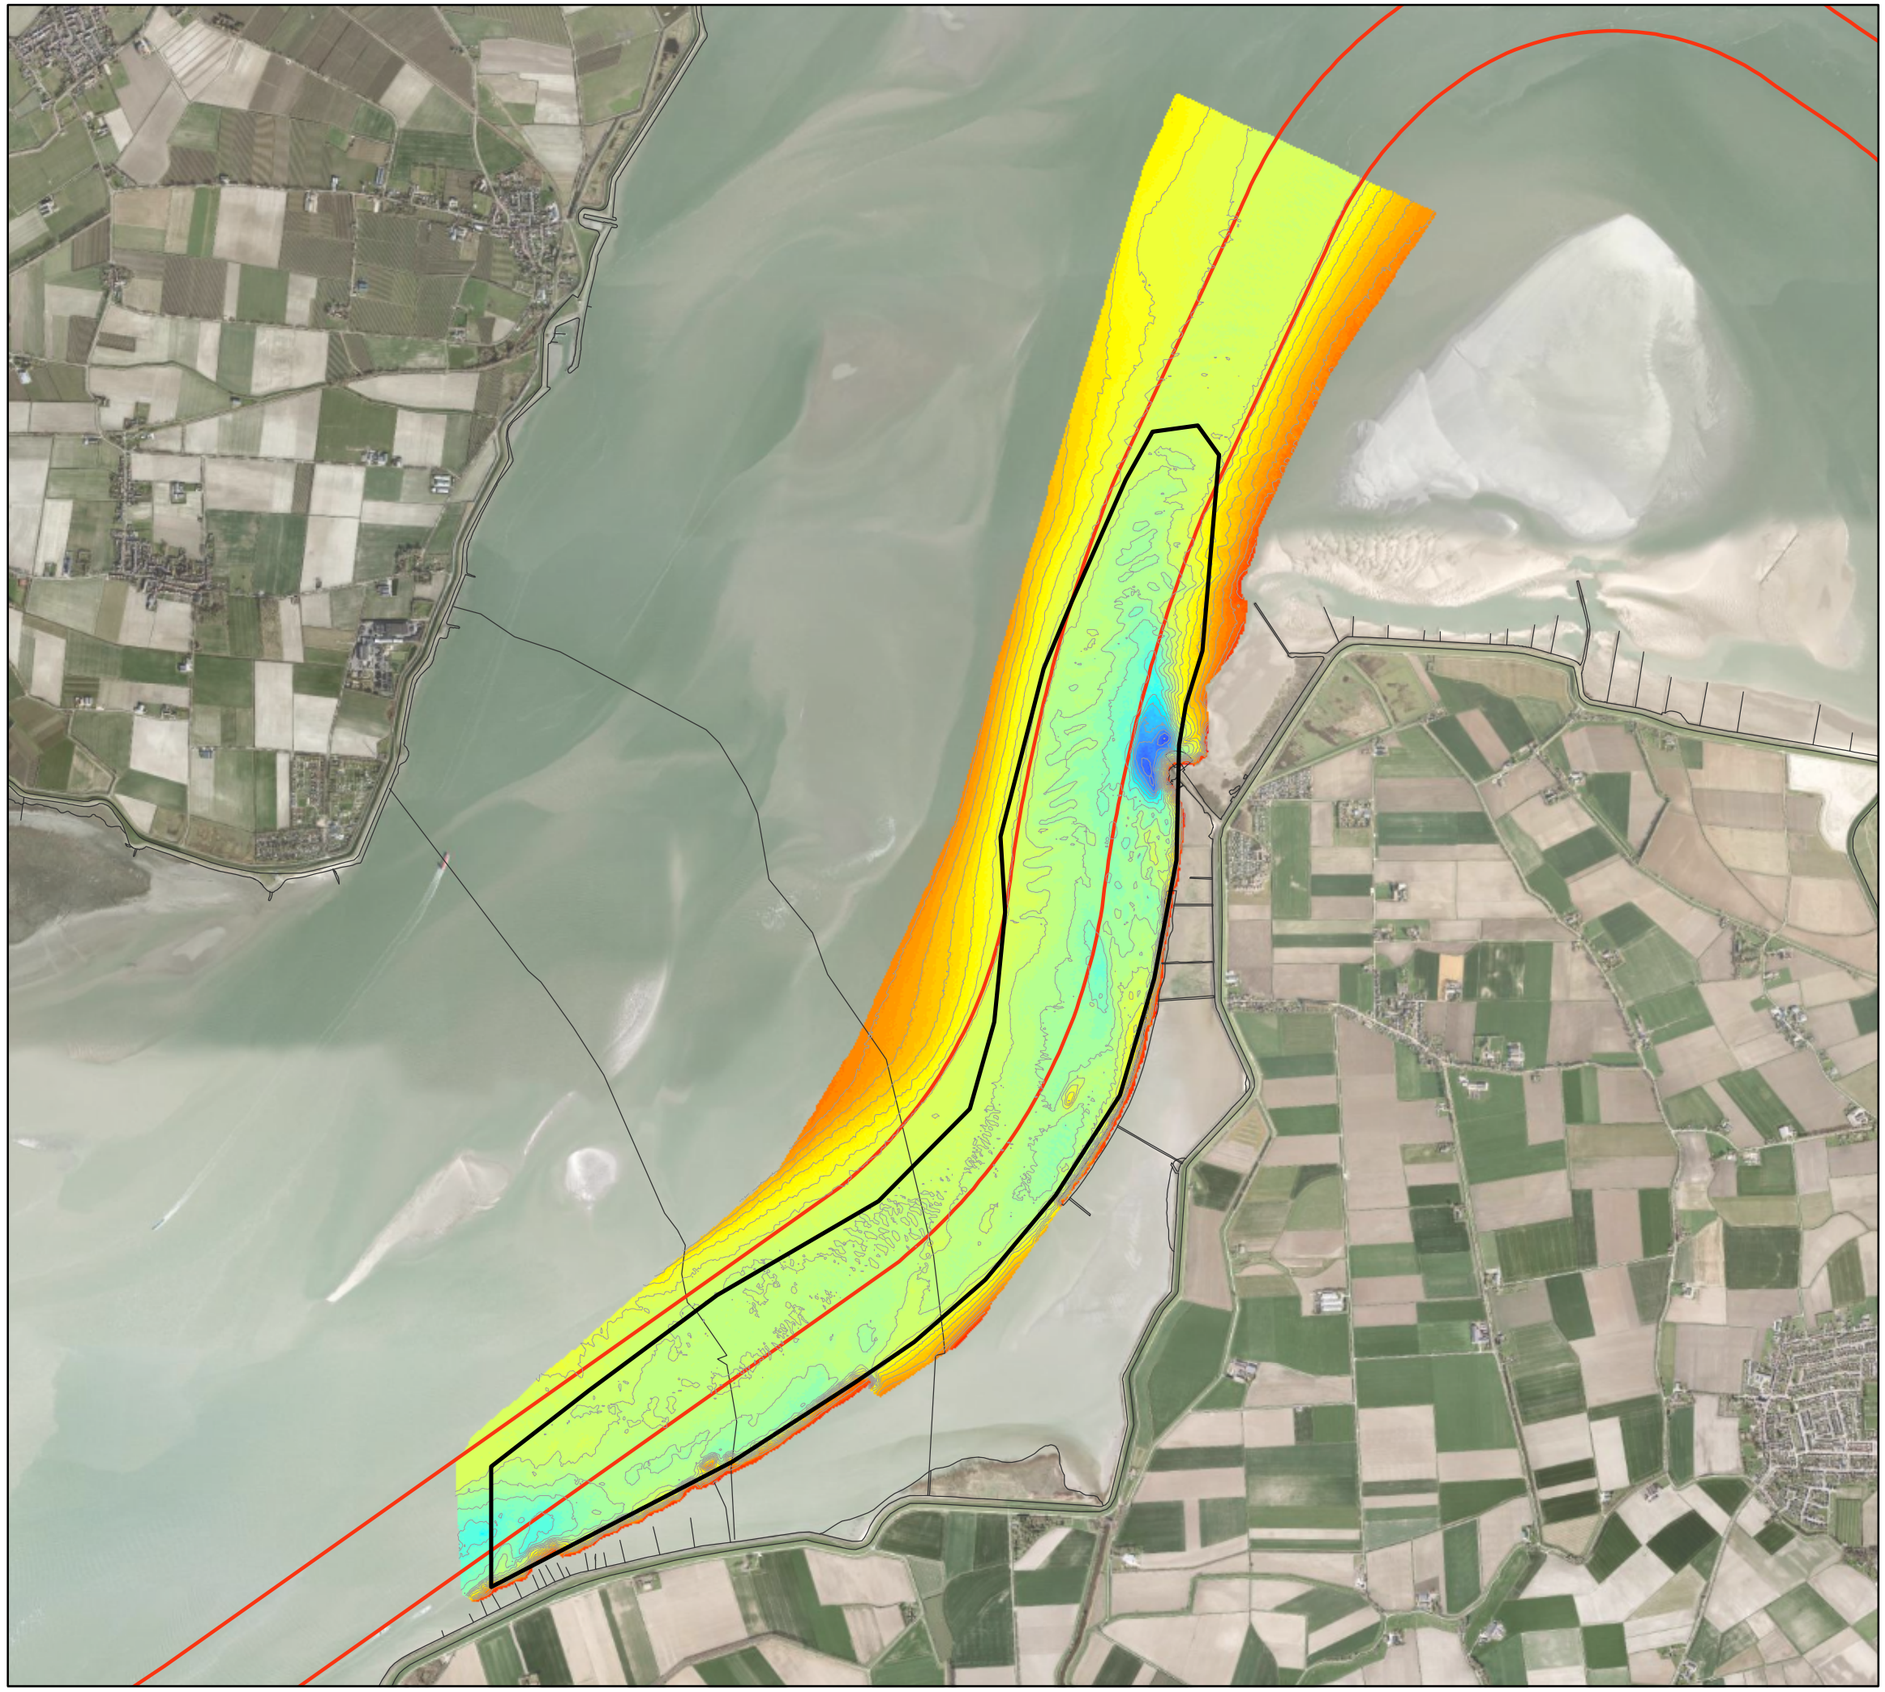

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SH41

13/05/2025 (T4)

11640_SH41_BT4
Rapport nr. 25.110



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

Diepte in m [NAP]

- 1.88 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00
- 25.01 - 26.00
- 26.01 - 27.00
- 27.01 - 28.00
- 28.01 - 29.00
- 29.01 - 30.00
- 30.01 - 31.00
- 31.01 - 32.00
- 32.01 - 33.00
- 33.01 - 34.00
- 34.01 - 35.00
- 35.01 - 36.00
- 36.01 - 37.00
- 37.01 - 38.00
- 38.01 - 39.00
- 39.01 - 40.00
- 40.01 - 41.00
- 41.01 - 42.00


N
W E
S

0 250 500 750 1000 m

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -782339 m³

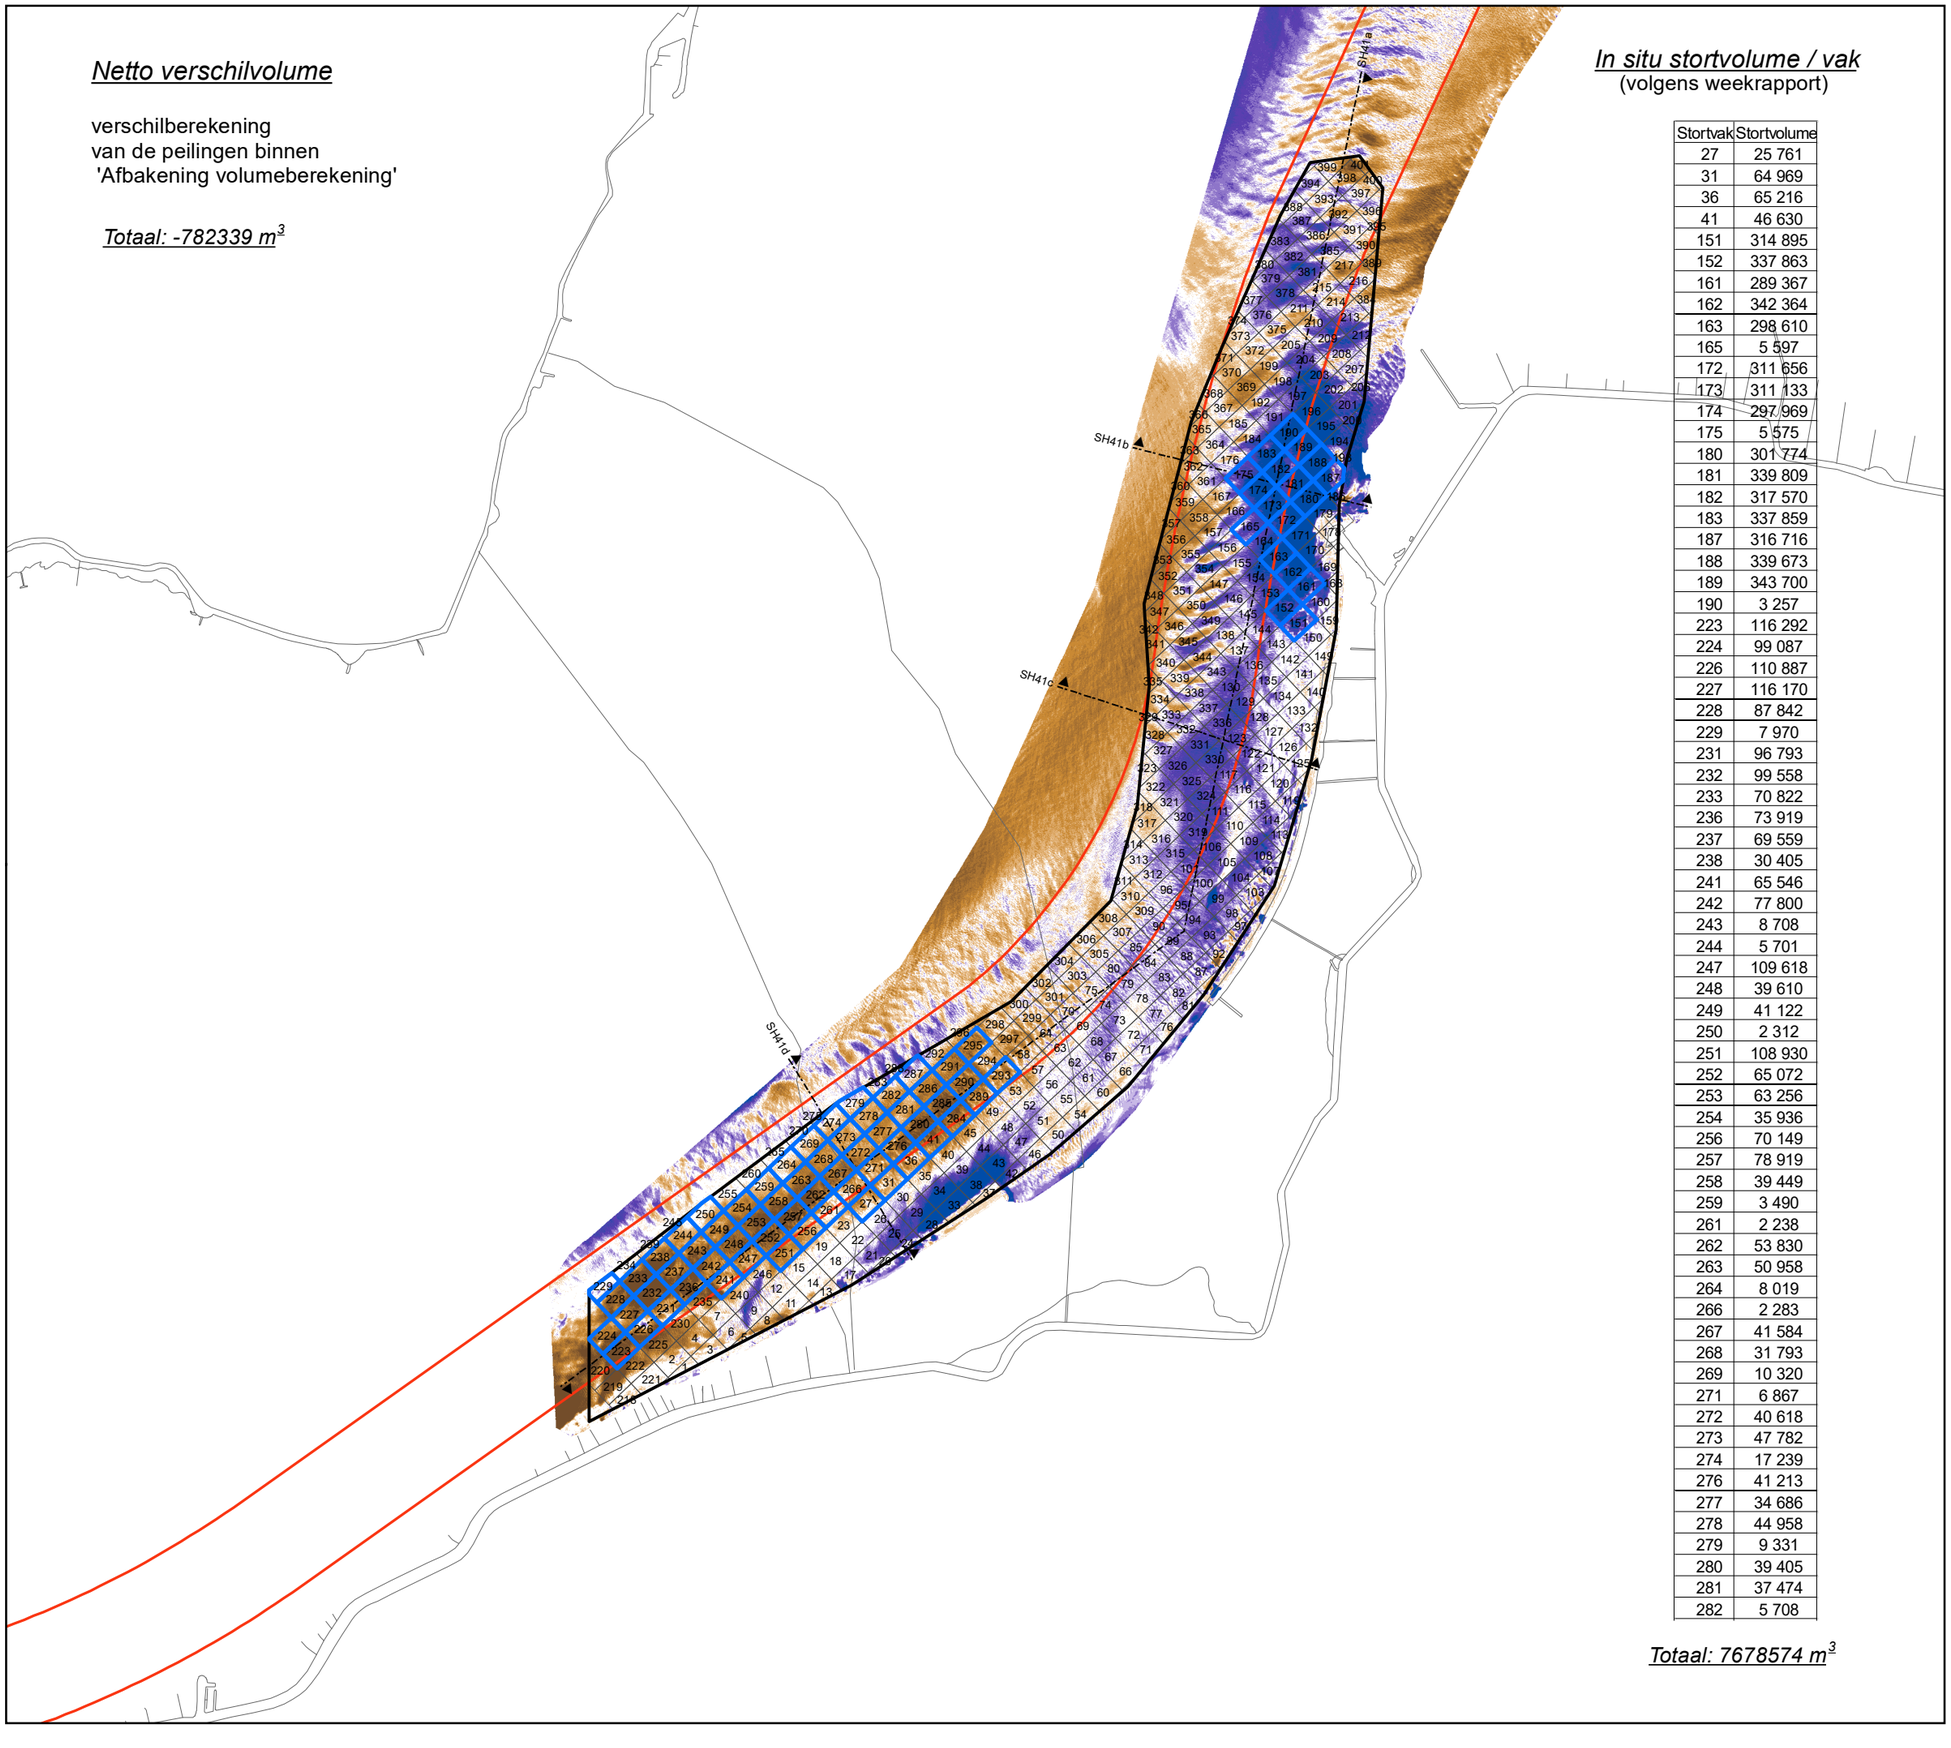

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
27	25 761
31	64 969
36	65 216
41	46 630
151	314 895
152	337 863
161	289 367
162	342 364
163	298 610
165	5 597
172	311 656
173	311 133
174	297 969
175	5 575
180	301 774
181	339 809
182	317 570
183	337 859
187	316 716
188	339 673
189	343 700
190	3 257
223	116 292
224	99 087
226	110 887
227	116 170
228	87 842
229	7 970
231	96 793
232	99 558
233	70 822
236	73 919
237	69 559
238	30 405
241	65 546
242	77 800
243	8 708
244	5 701
247	109 618
248	39 610
249	41 122
250	2 312
251	108 930
252	65 072
253	63 256
254	35 936
256	70 149
257	78 919
258	39 449
259	3 490
261	2 238
262	53 830
263	50 958
264	8 019
266	2 283
267	41 584
268	31 793
269	10 320
271	6 867
272	40 618
273	47 782
274	17 239
276	41 213
277	34 686
278	44 958
279	9 331
280	39 405
281	37 474
282	5 708

Totaal: 7678574 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH41

18/07/2022 (T0) - 13/05/2025 (T4)

11640_SH41_VT4-T0
Rapport nr. 25.110



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50


N
W E
S

0 500 1000 1500 2000 m

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 191586 m³

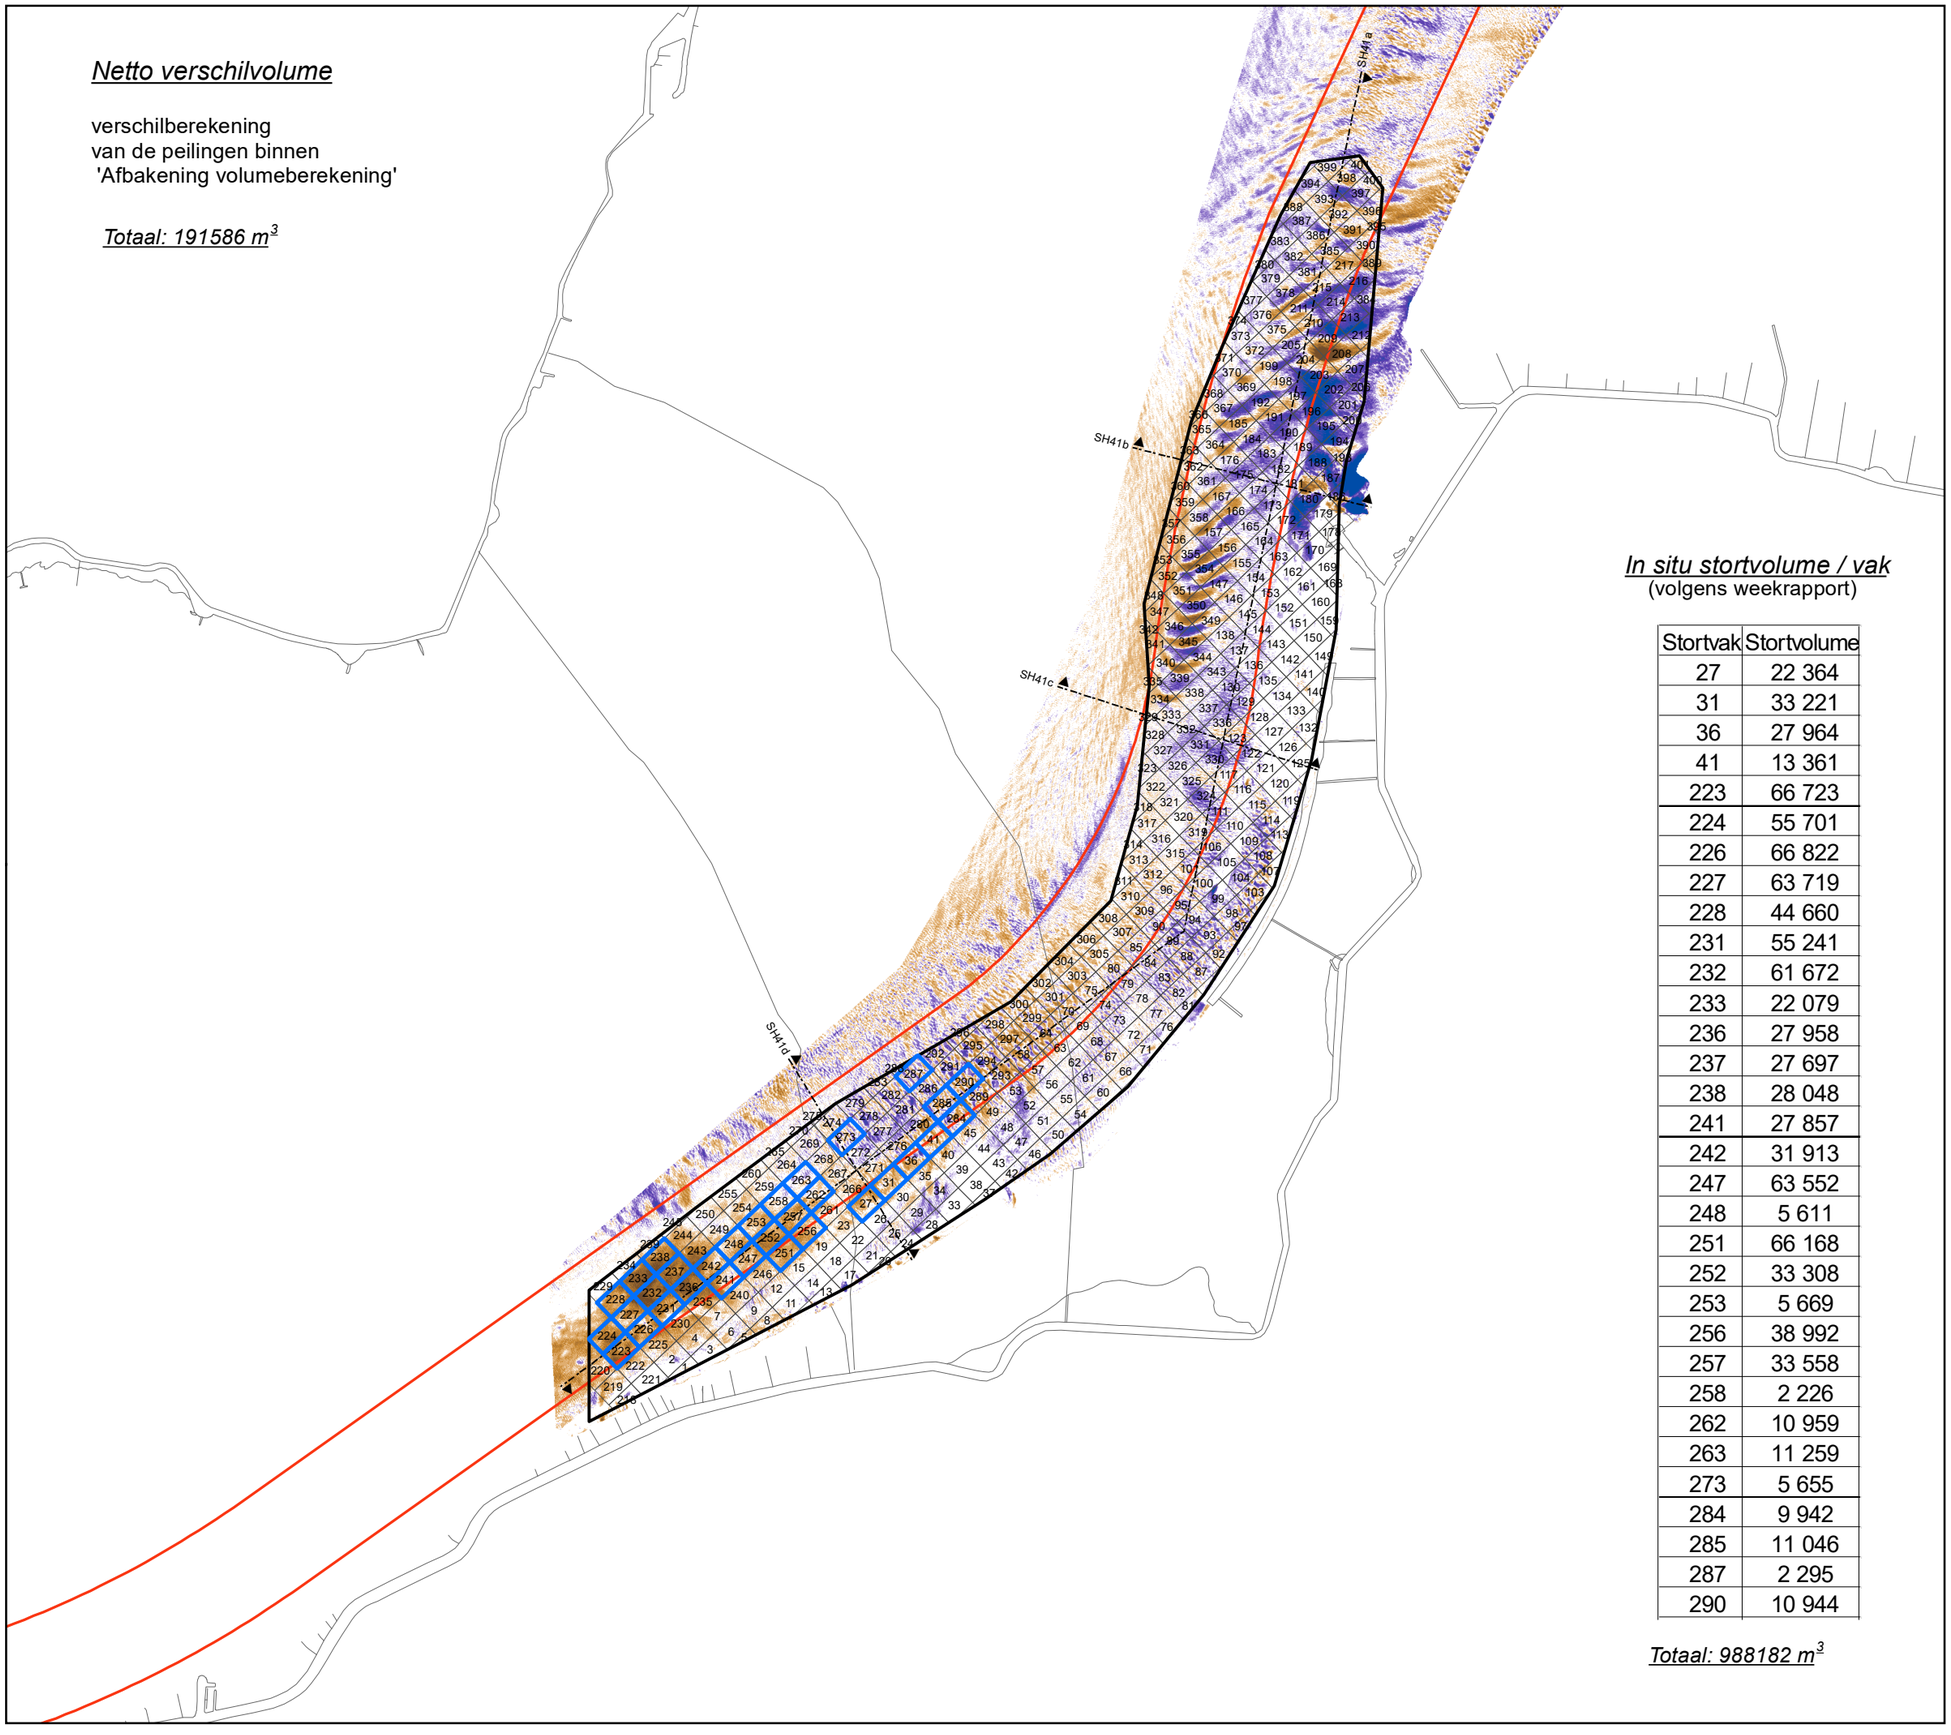

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
27	22 364
31	33 221
36	27 964
41	13 361
223	66 723
224	55 701
226	66 822
227	63 719
228	44 660
231	55 241
232	61 672
233	22 079
236	27 958
237	27 697
238	28 048
241	27 857
242	31 913
247	63 552
248	5 611
251	66 168
252	33 308
253	5 669
256	38 992
257	33 558
258	2 226
262	10 959
263	11 259
273	5 655
284	9 942
285	11 046
287	2 295
290	10 944

Totaal: 988182 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH41

25/01/2025 (T3) - 13/05/2025 (T4)

11640_SH41_VT4-T3
Rapport nr. 25.110



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende


- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	verdieping
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

0 500 1000 1500 2000 m

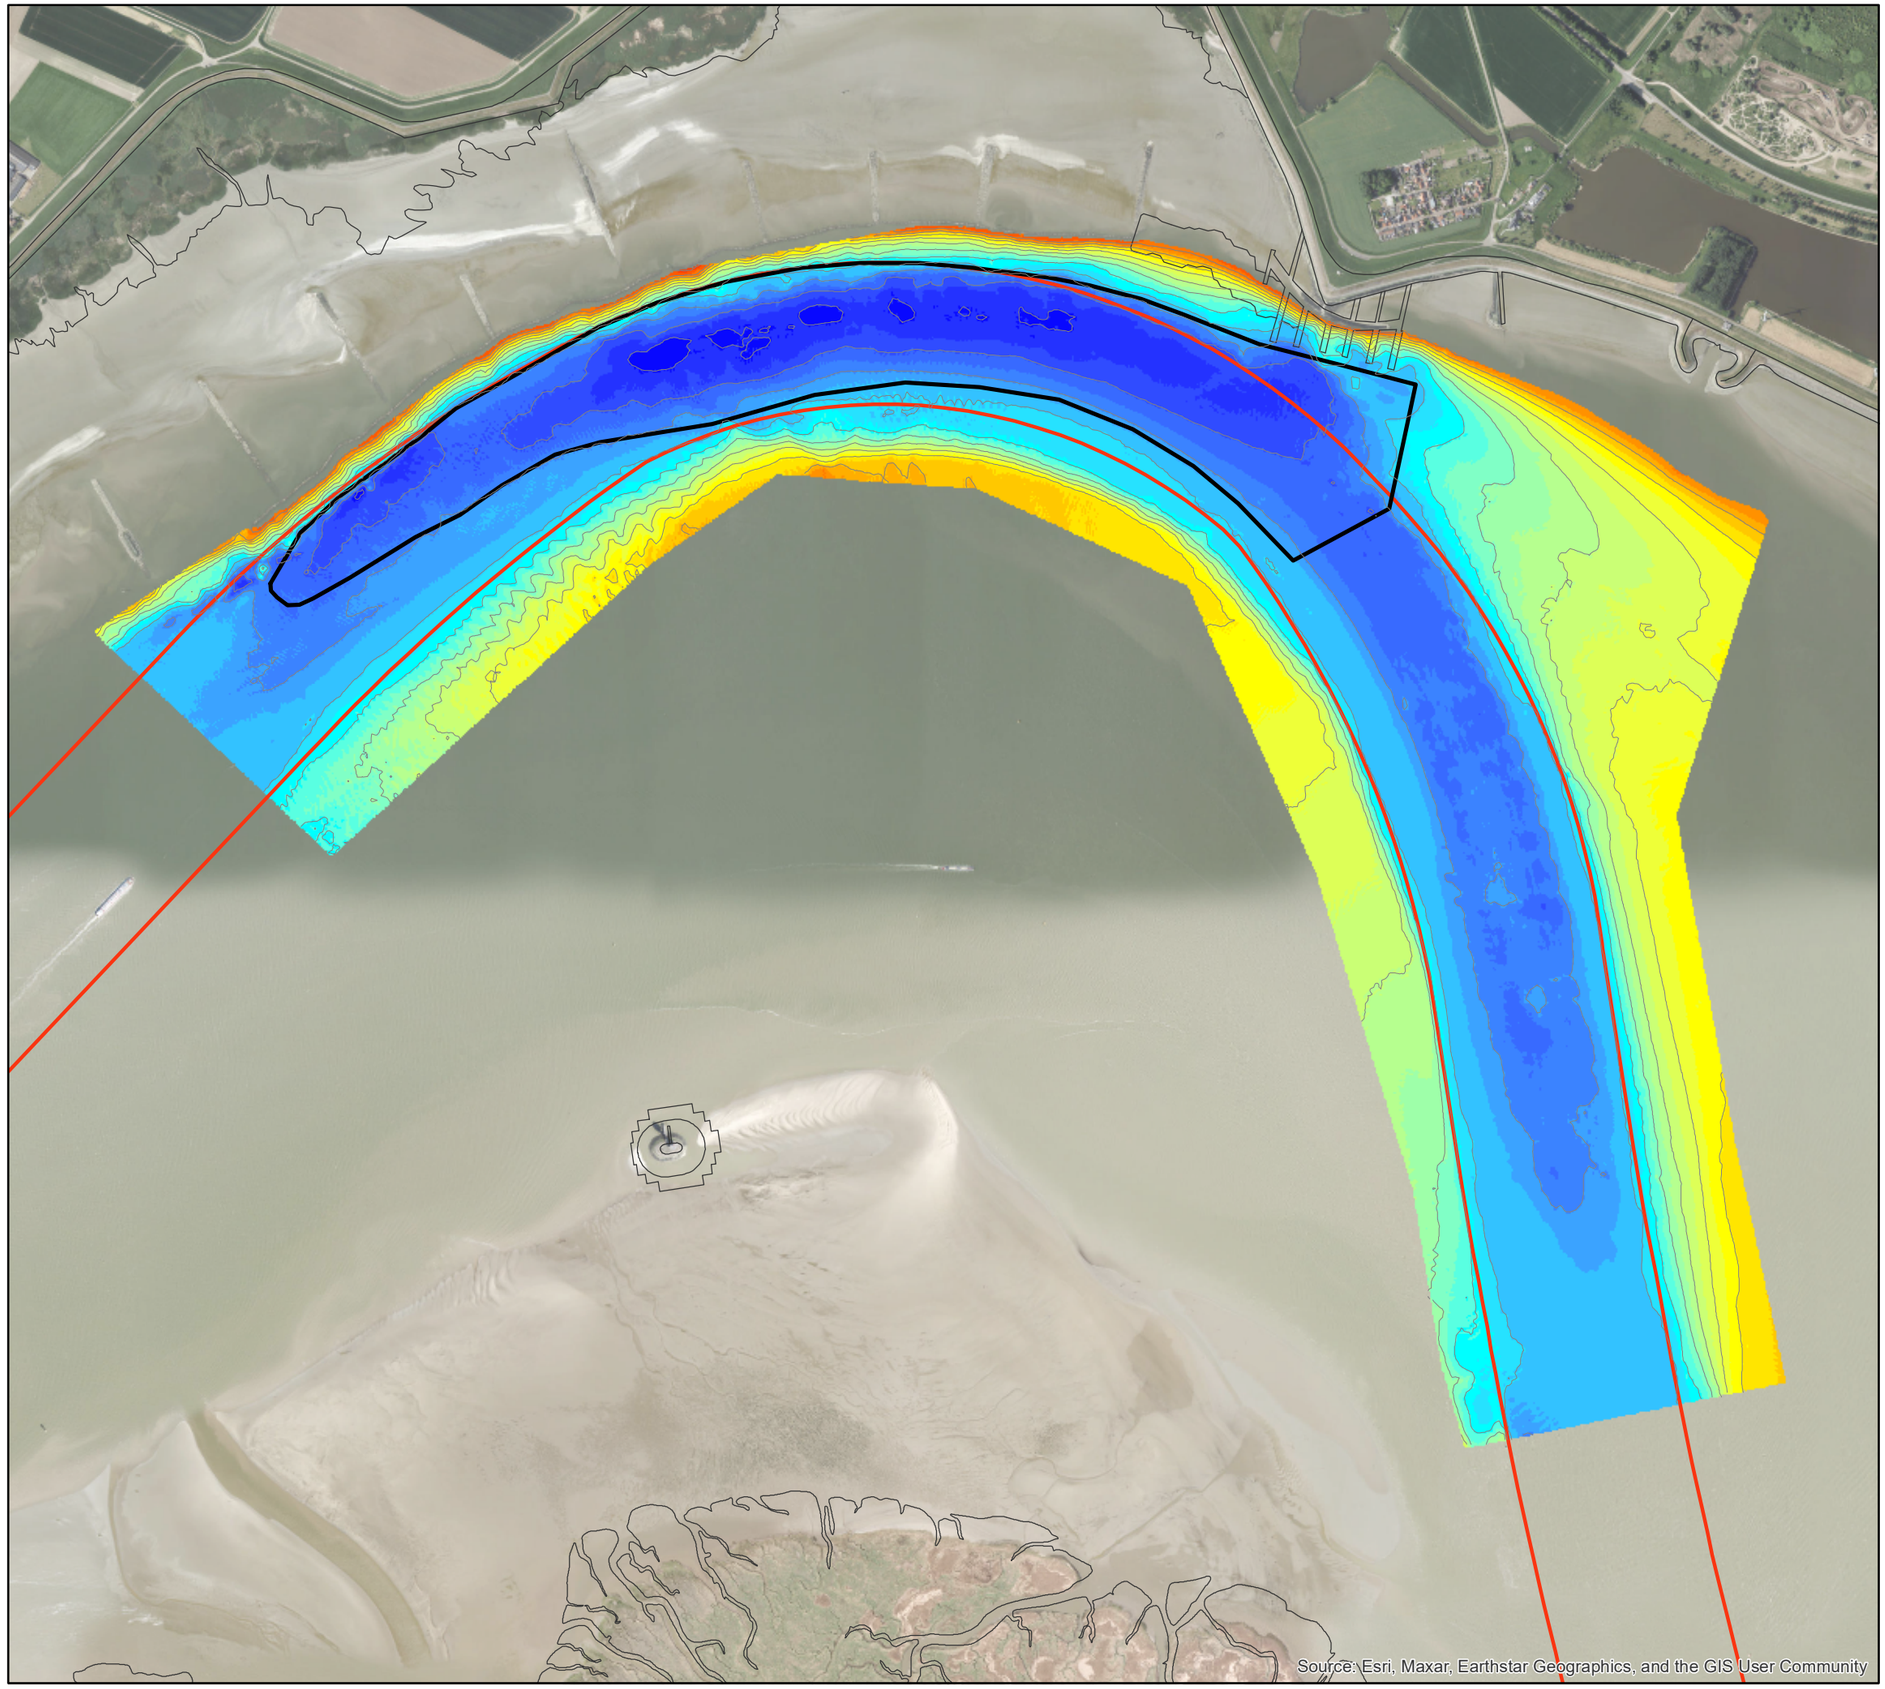

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SH61

08/04/2025 (T21)

11640_SH61_BT21
Rapport nr. 25.110



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

Diepte in m [NAP]

- 0.09 - 1.00
- 1.01 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00

N
W E
S

0 150 300 450 600

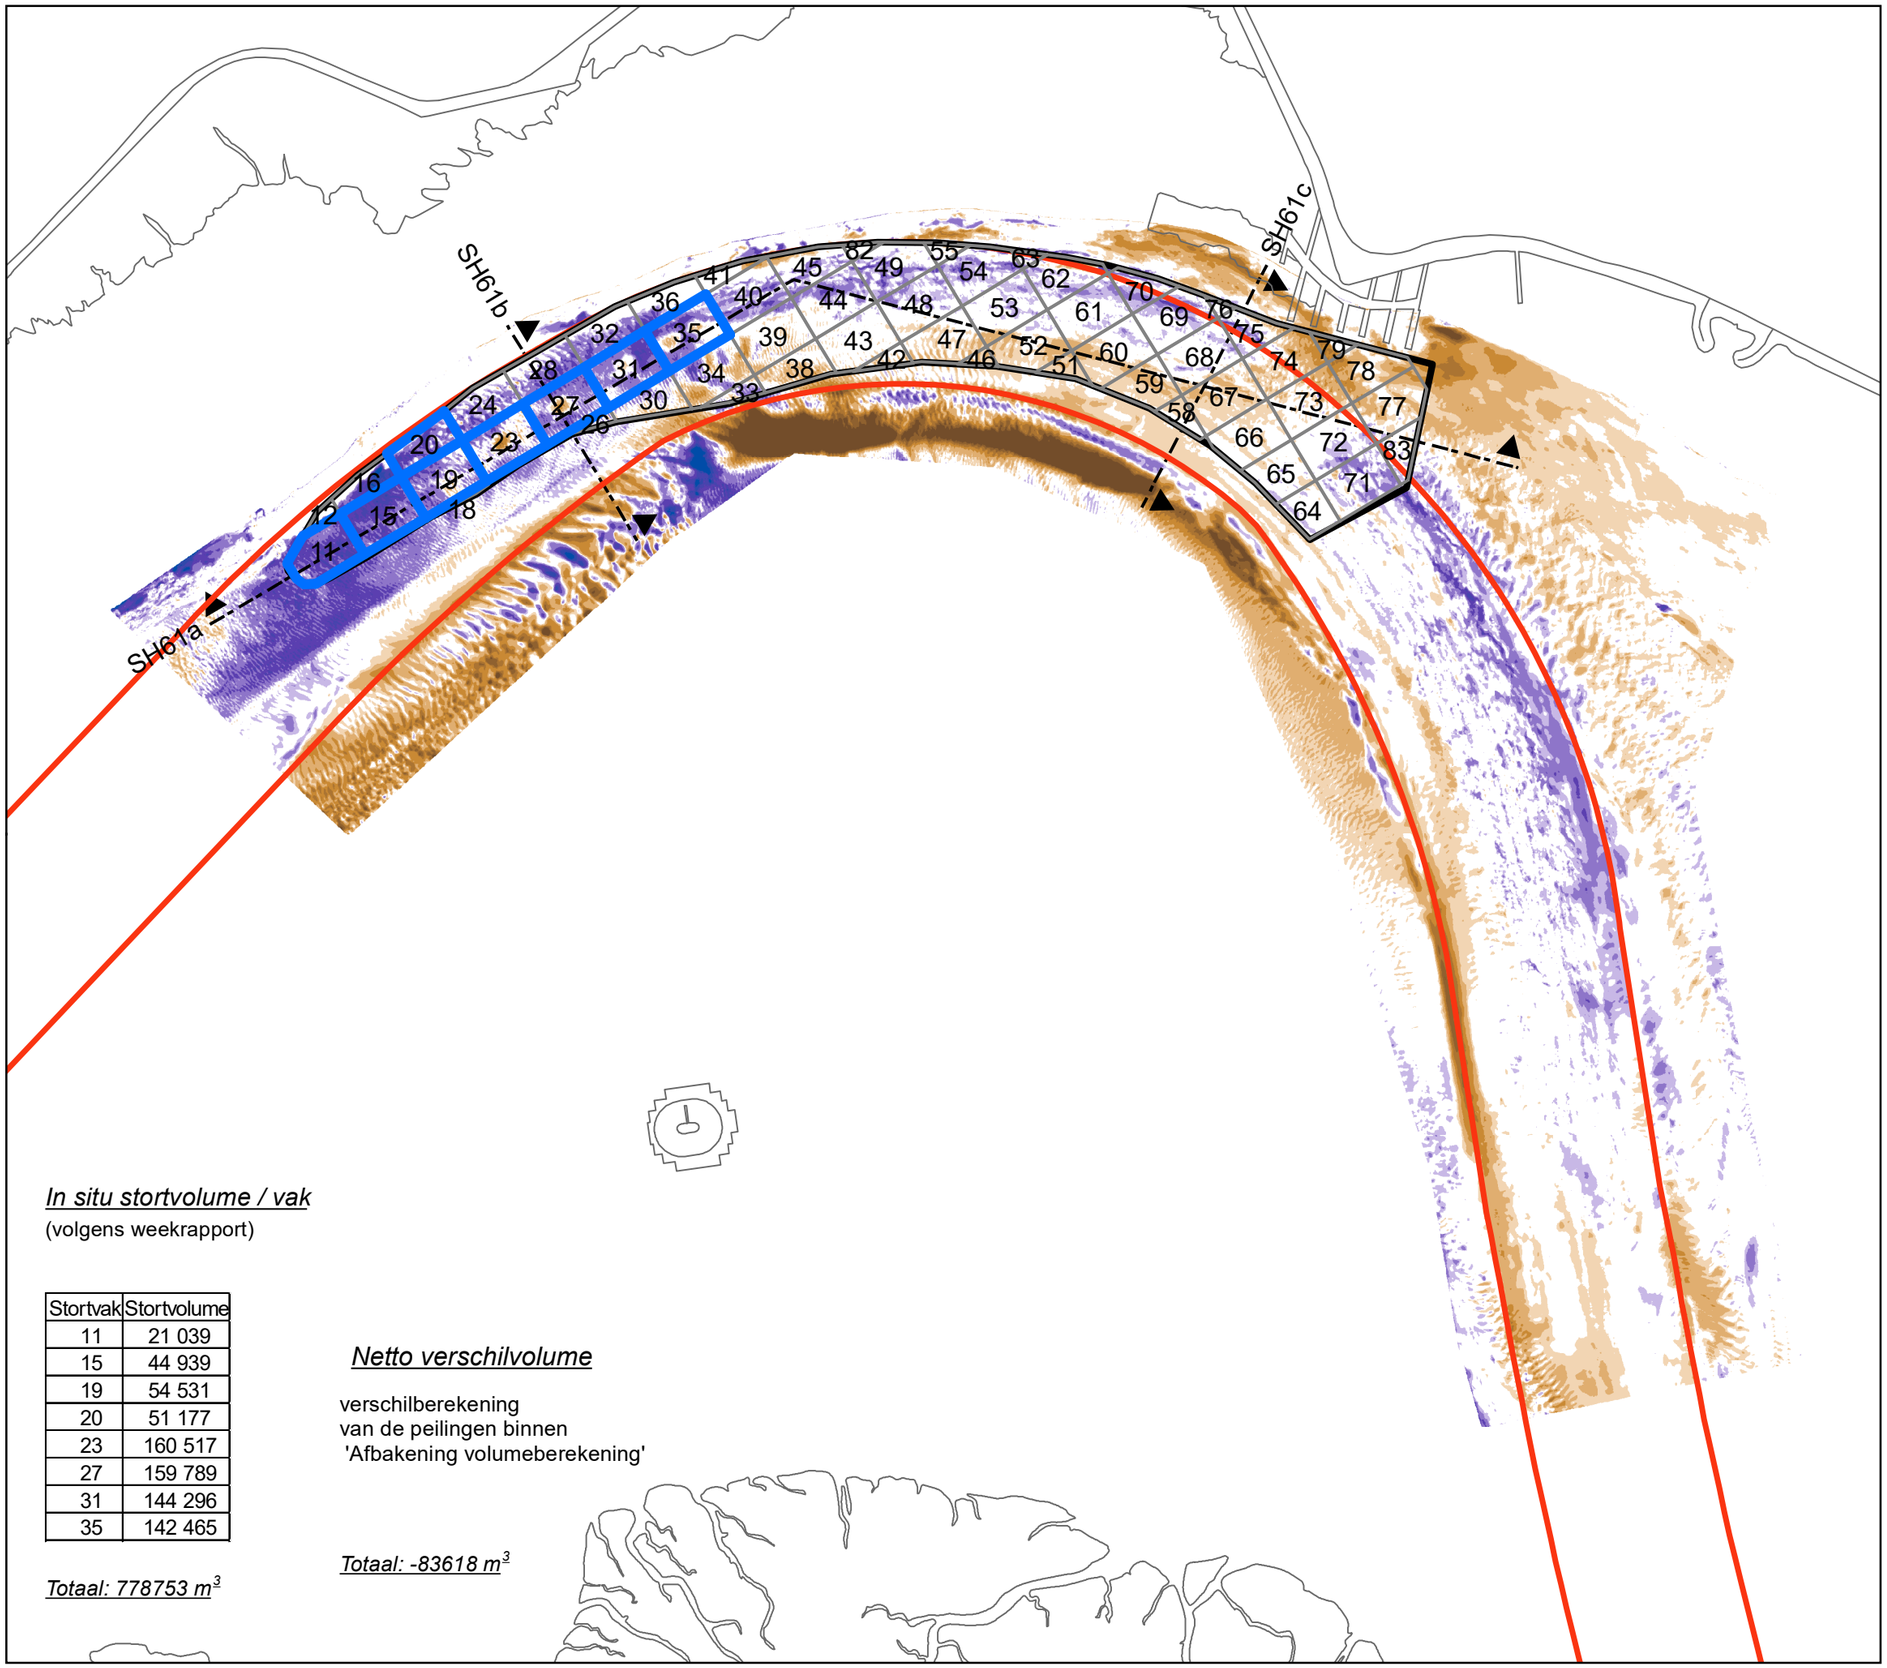

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
11	21 039
15	44 939
19	54 531
20	51 177
23	160 517
27	159 789
31	144 296
35	142 465

Totaal: 778753 m^3

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -83618 m^3

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH61

08/03/2021 (T0) - 08/04/2025 (T21)

11640_SH61_VT21-T0
Rapport nr. 25.110



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	verdieping
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

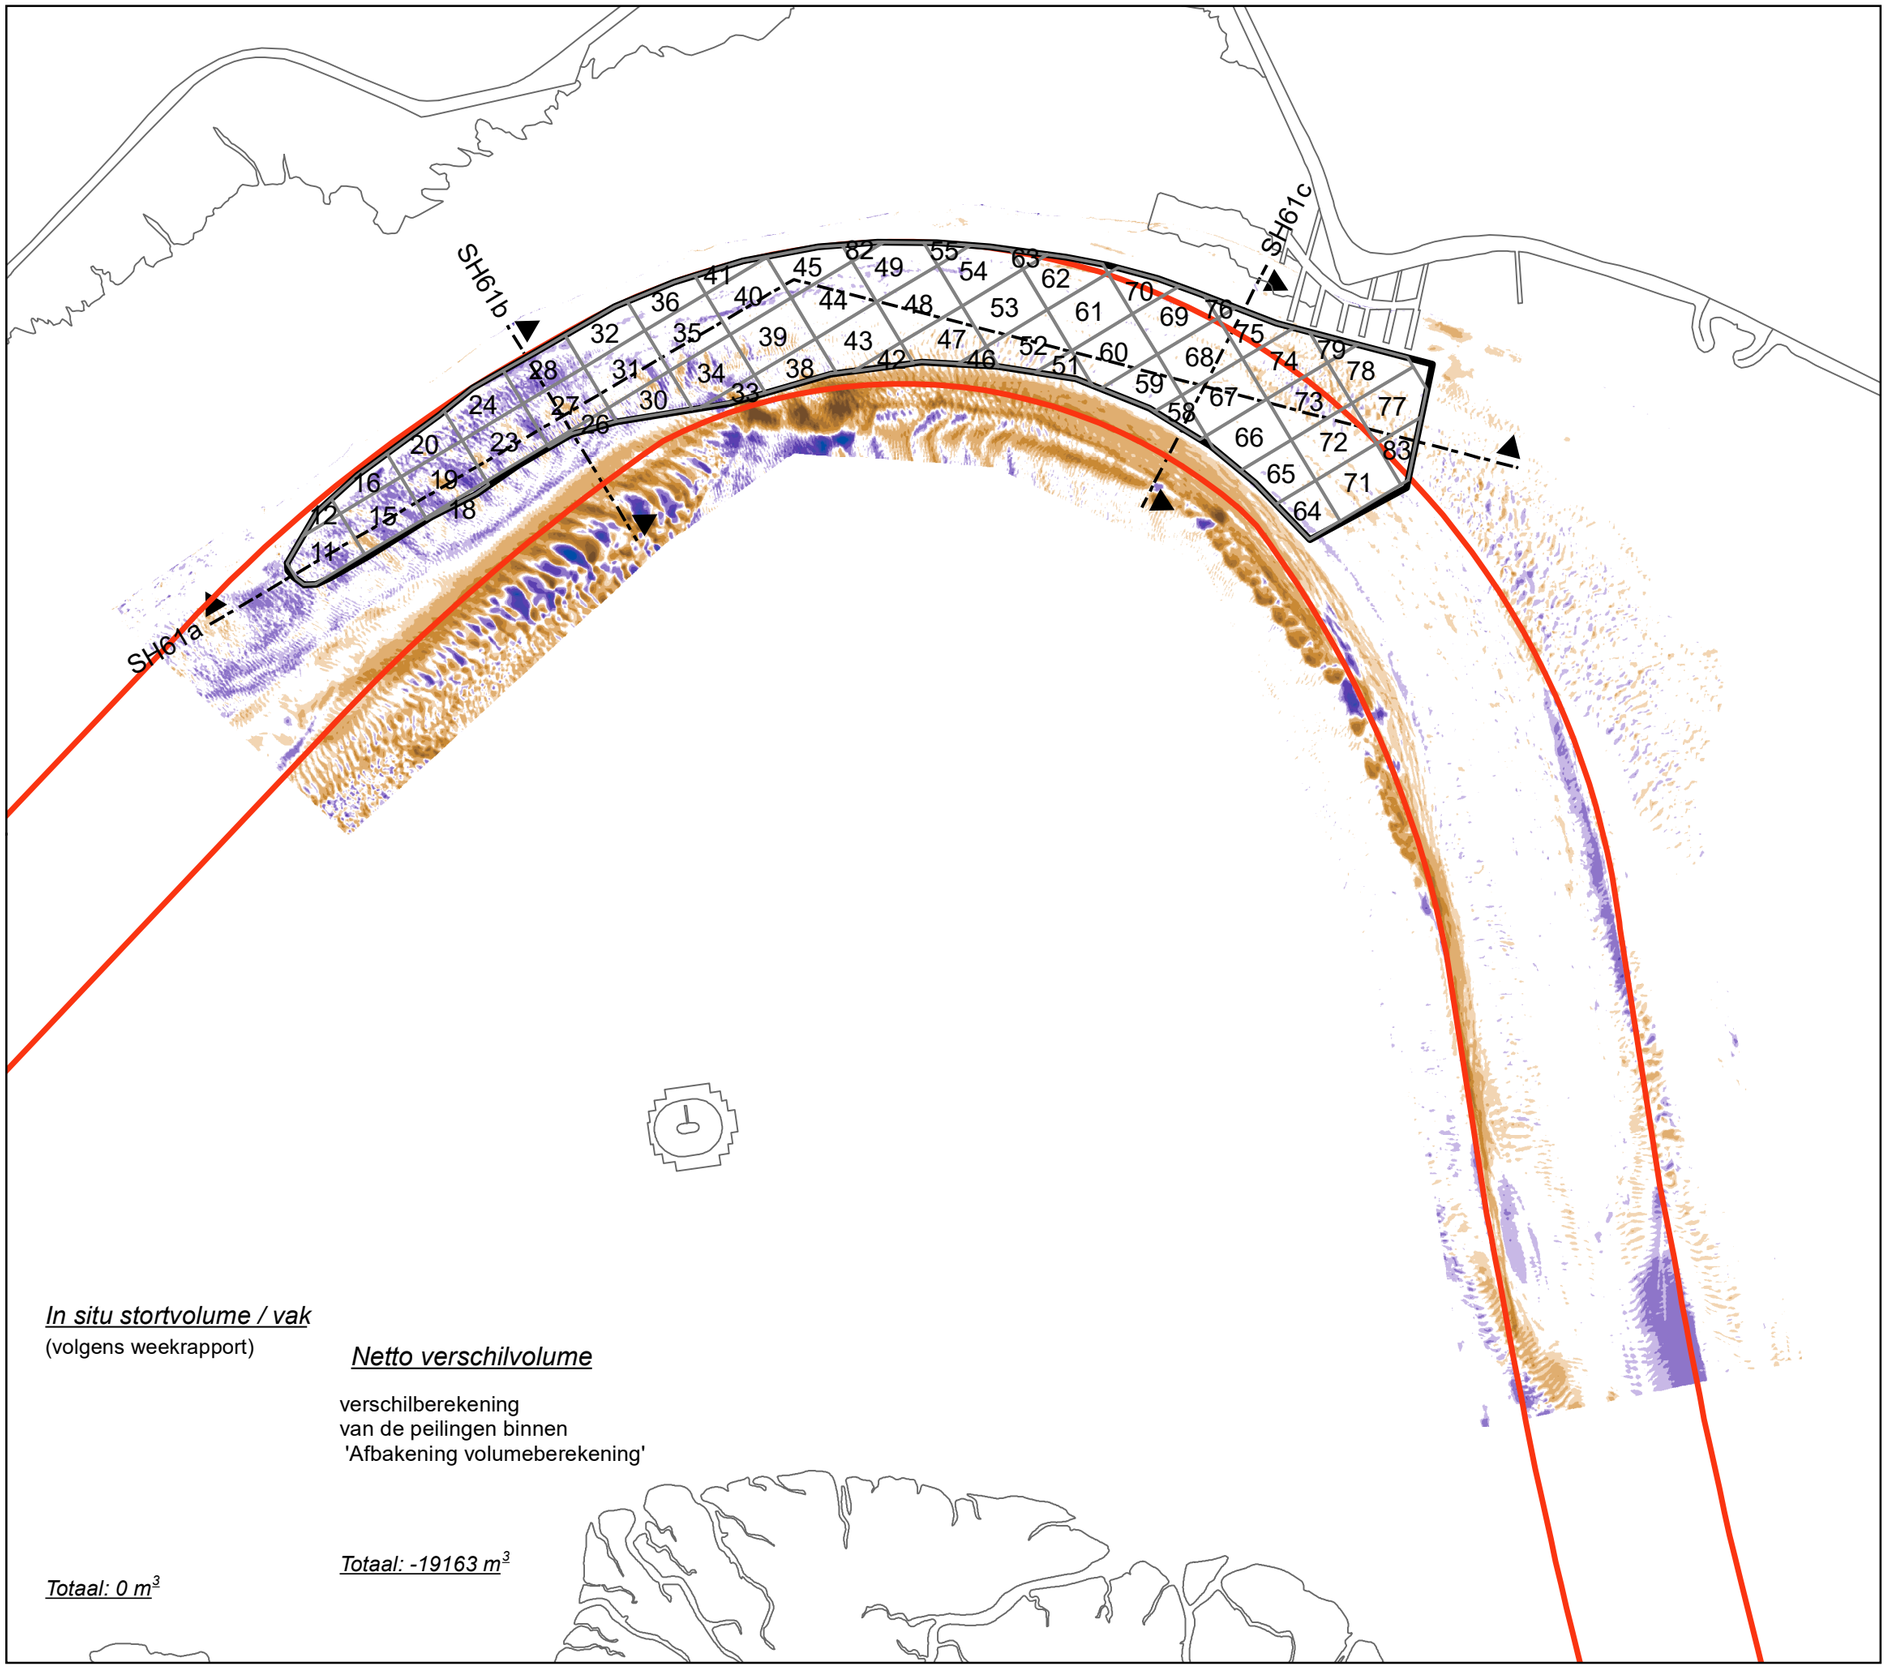

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Totaal: 0 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -19163 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH61

13/11/2024 (T20) - 08/04/2025 (T21)

11640_SH61_VT21-T20
Rapport nr. 25.110



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	verdieping
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W
E
S

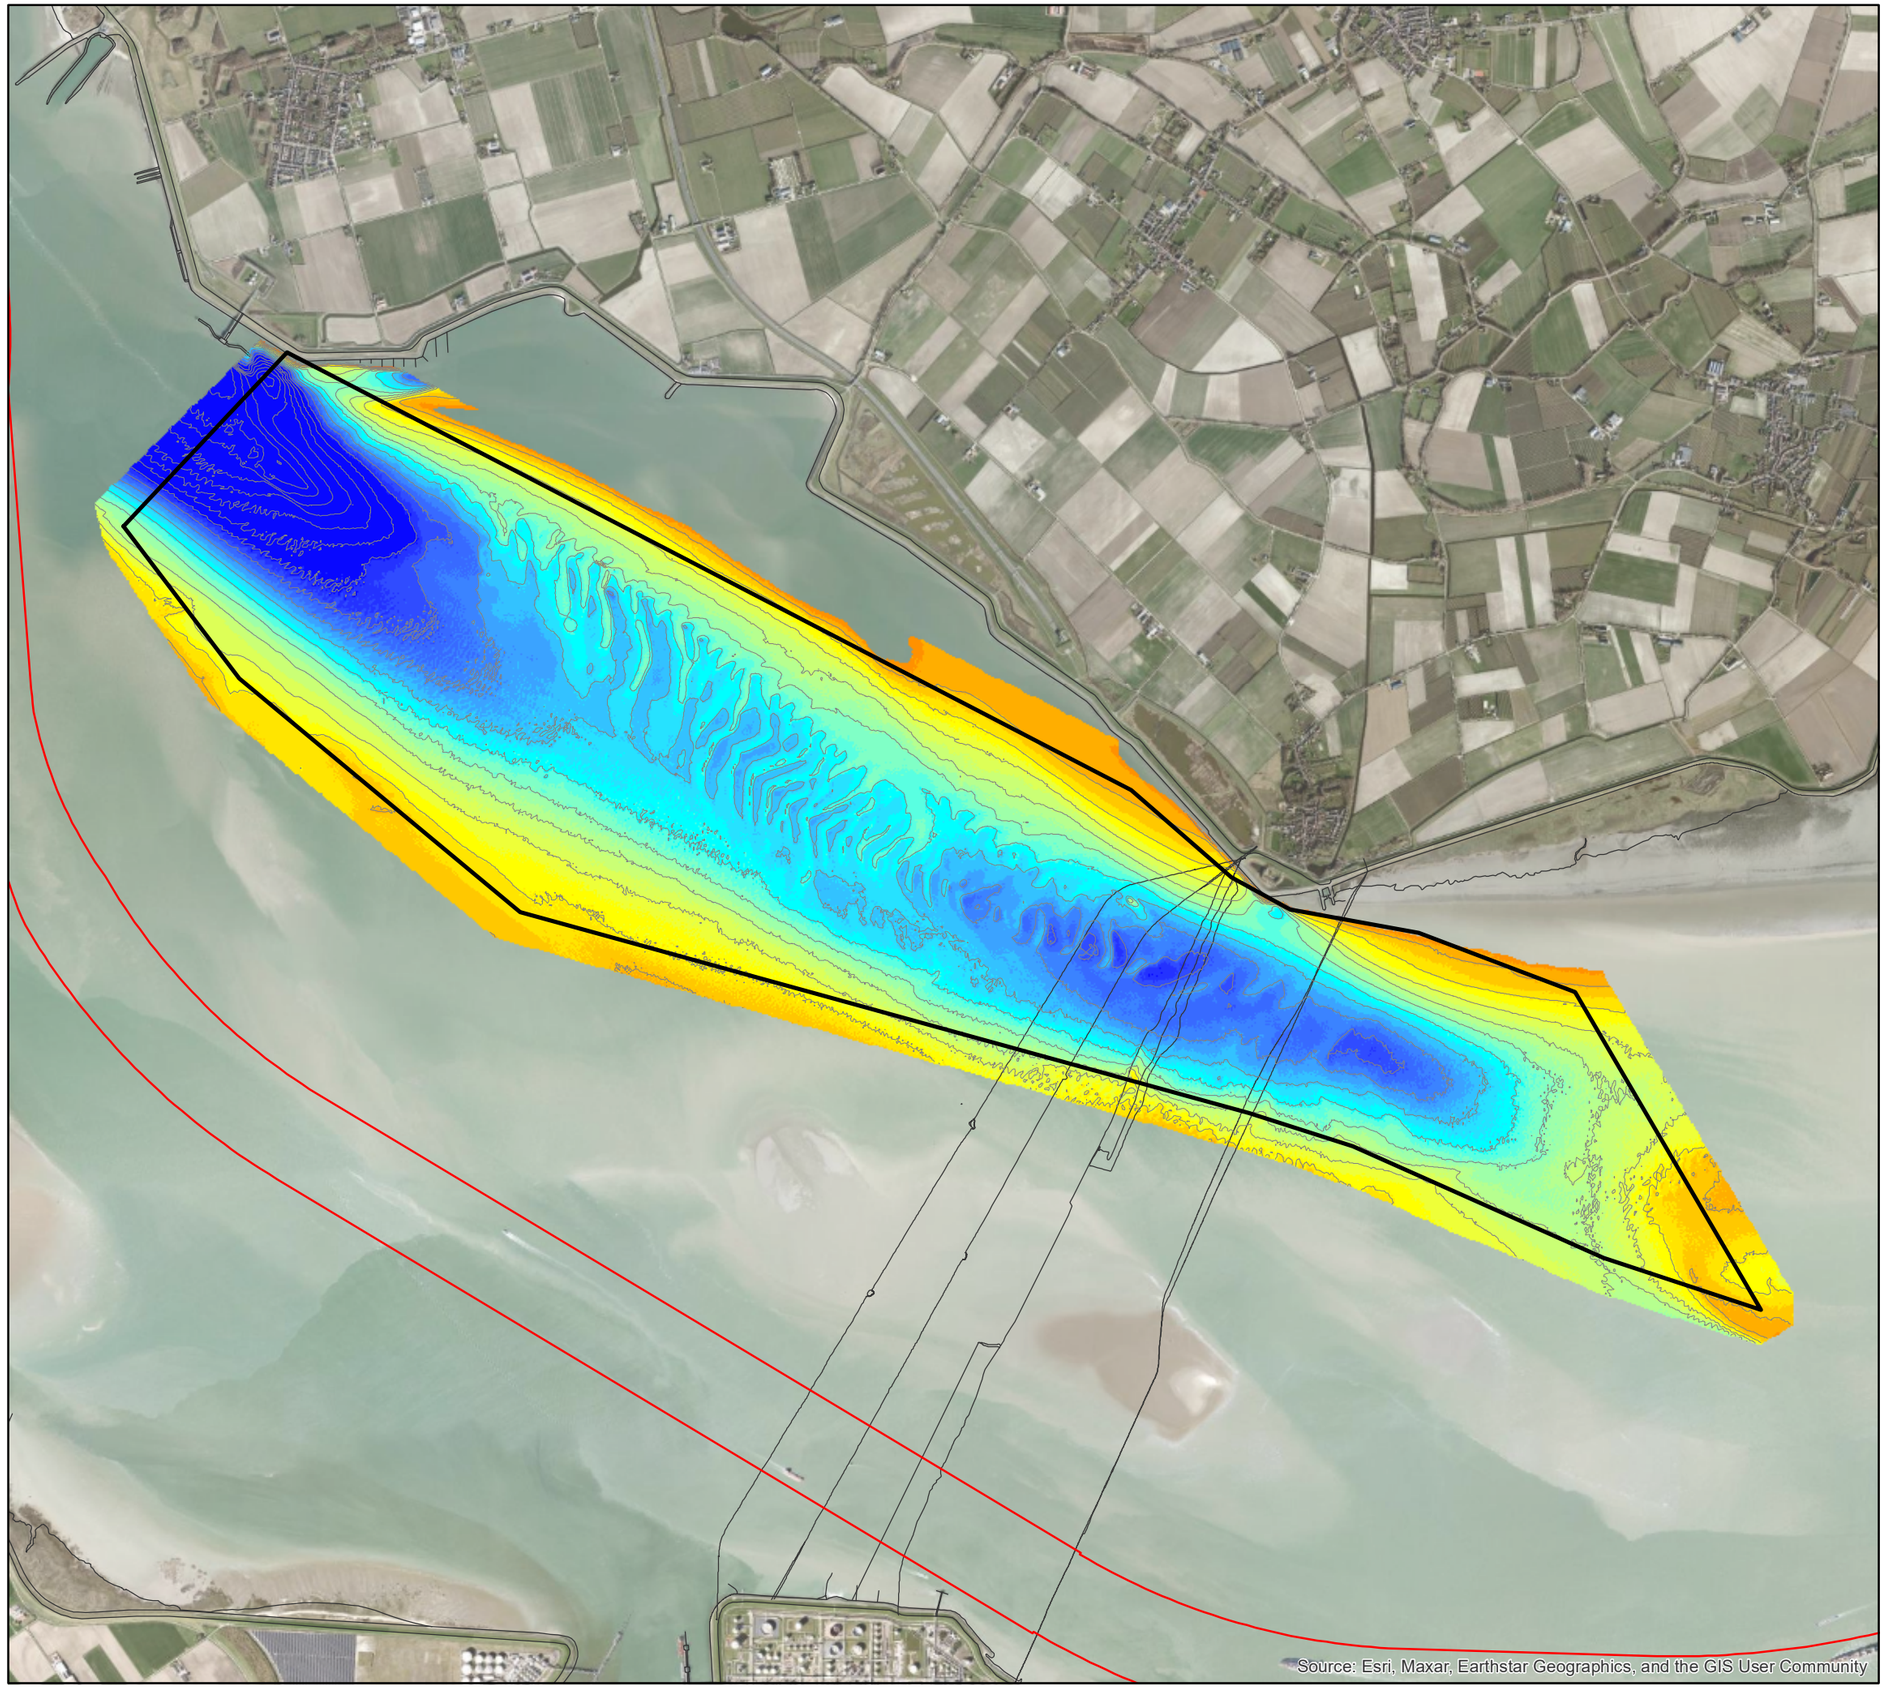

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SN31

05/05/2025 (T4)

11640_SN31_BT4
Rapport nr. 25.110



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

Diepte in m [NAP]

- 0.09 - 1.00
- 1.01 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00

N
W E
S

0 200 400 600 800 1000 m

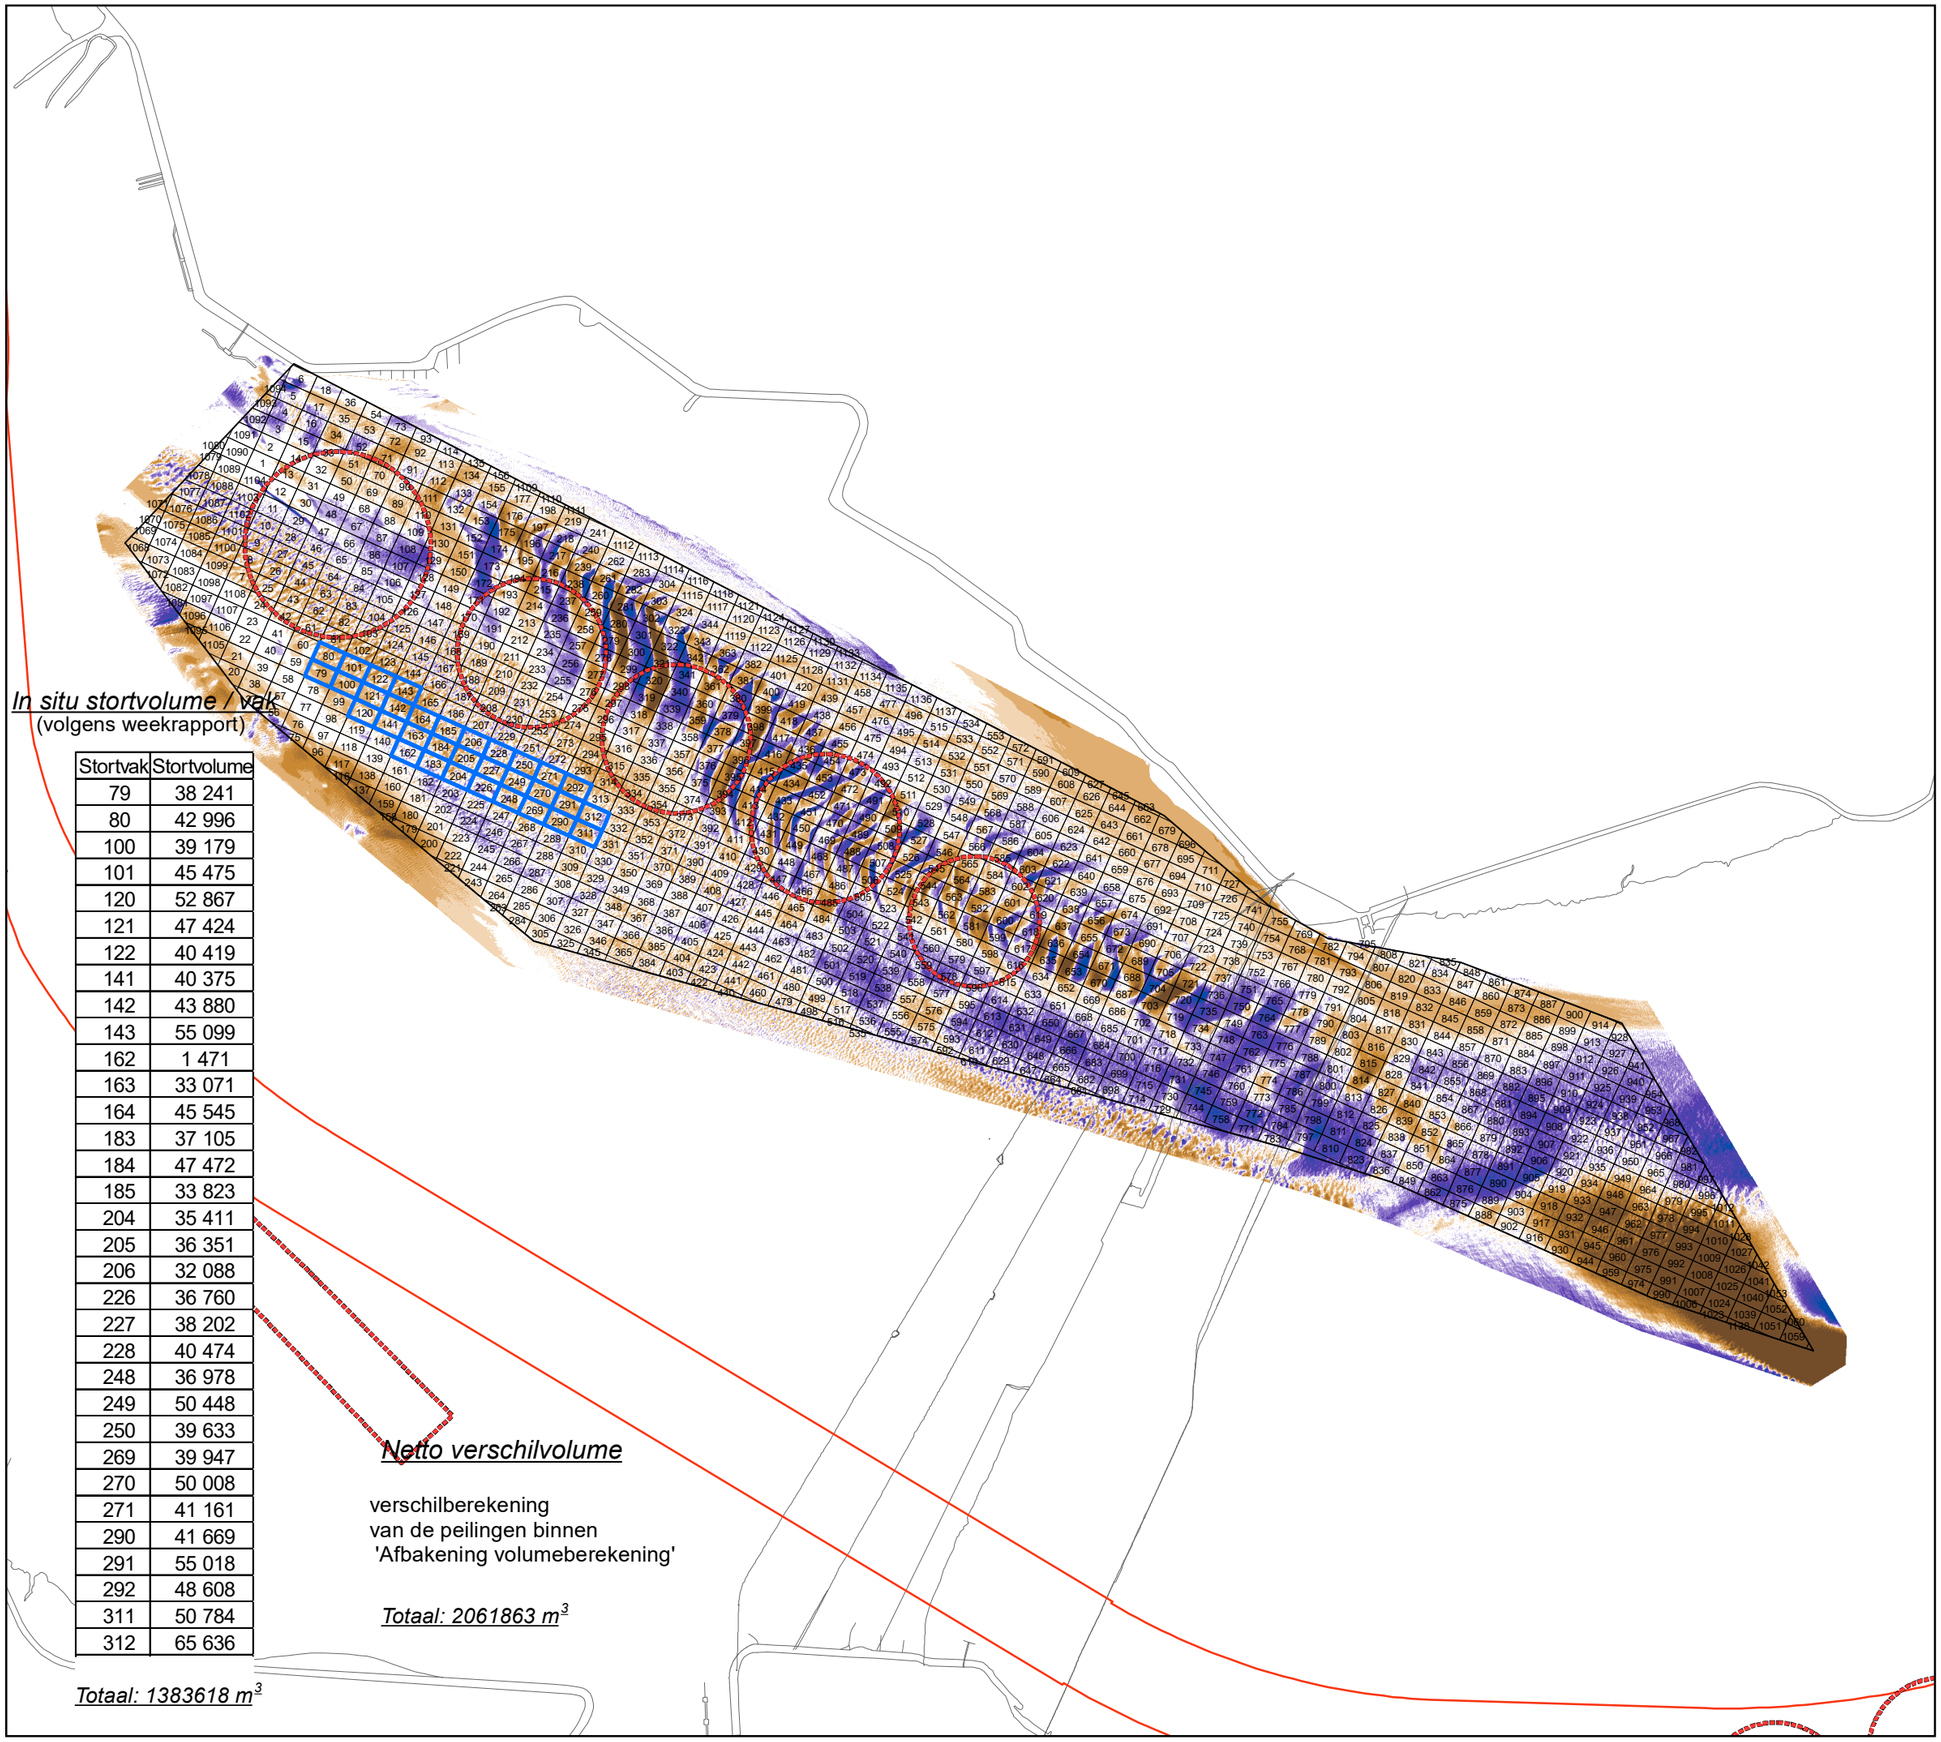

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
79	38 241
80	42 996
100	39 179
101	45 475
120	52 867
121	47 424
122	40 419
141	40 375
142	43 880
143	55 099
162	1 471
163	33 071
164	45 545
183	37 105
184	47 472
185	33 823
204	35 411
205	36 351
206	32 088
226	36 760
227	38 202
228	40 474
248	36 978
249	50 448
250	39 633
269	39 947
270	50 008
271	41 161
290	41 669
291	55 018
292	48 608
311	50 784
312	65 636

Totaal: 1383618 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 2061863 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SN31

05/07/2022 (T0) - 05/05/2025 (T4)

11640_SN31_VT4-T0
Rapport nr. 25.110



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende


- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	verdieping
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

0 500 1000 1500 2000 2500 m

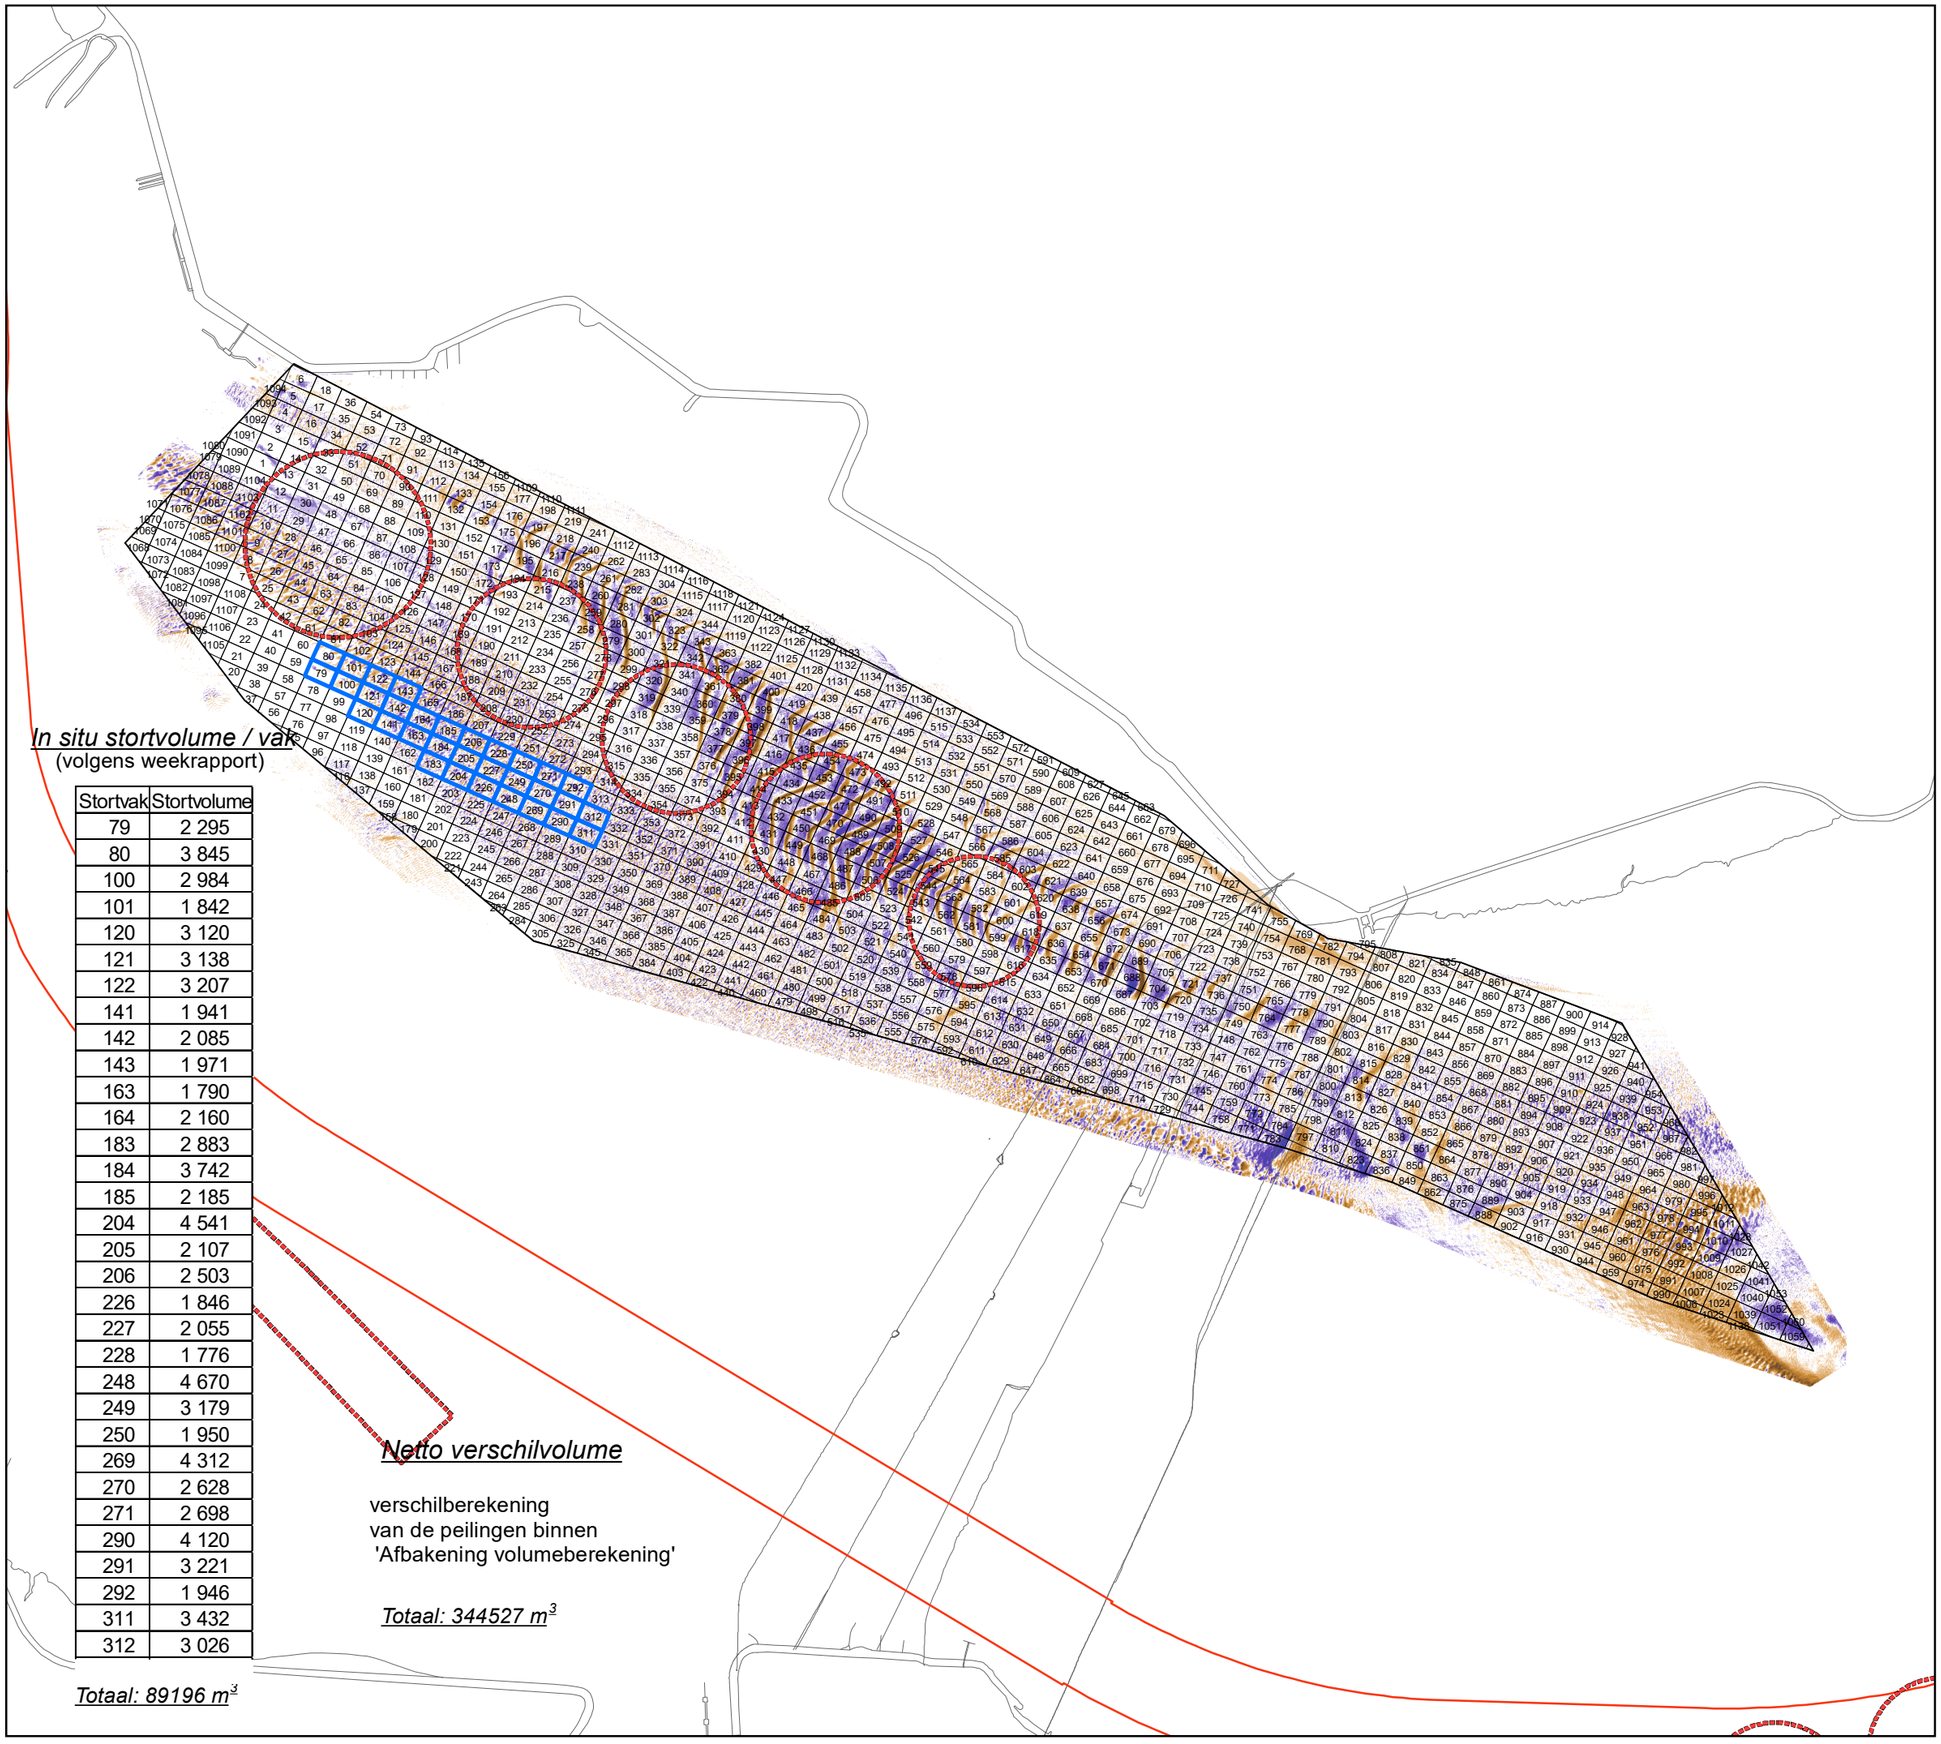

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
79	2 295
80	3 845
100	2 984
101	1 842
120	3 120
121	3 138
122	3 207
141	1 941
142	2 085
143	1 971
163	1 790
164	2 160
183	2 883
184	3 742
185	2 185
204	4 541
205	2 107
206	2 503
226	1 846
227	2 055
228	1 776
248	4 670
249	3 179
250	1 950
269	4 312
270	2 628
271	2 698
290	4 120
291	3 221
292	1 946
311	3 432
312	3 026

Totaal: 89196 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 344527 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SN31

13/01/2025 (T3) - 05/05/2025 (T4)

11640_SN31_VT4-T3
Rapport nr. 25.110



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m


verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N
W E
S

0 500 1000 1500 2000 2500 m

A.4 Kaartmateriaal juni en juli 2025

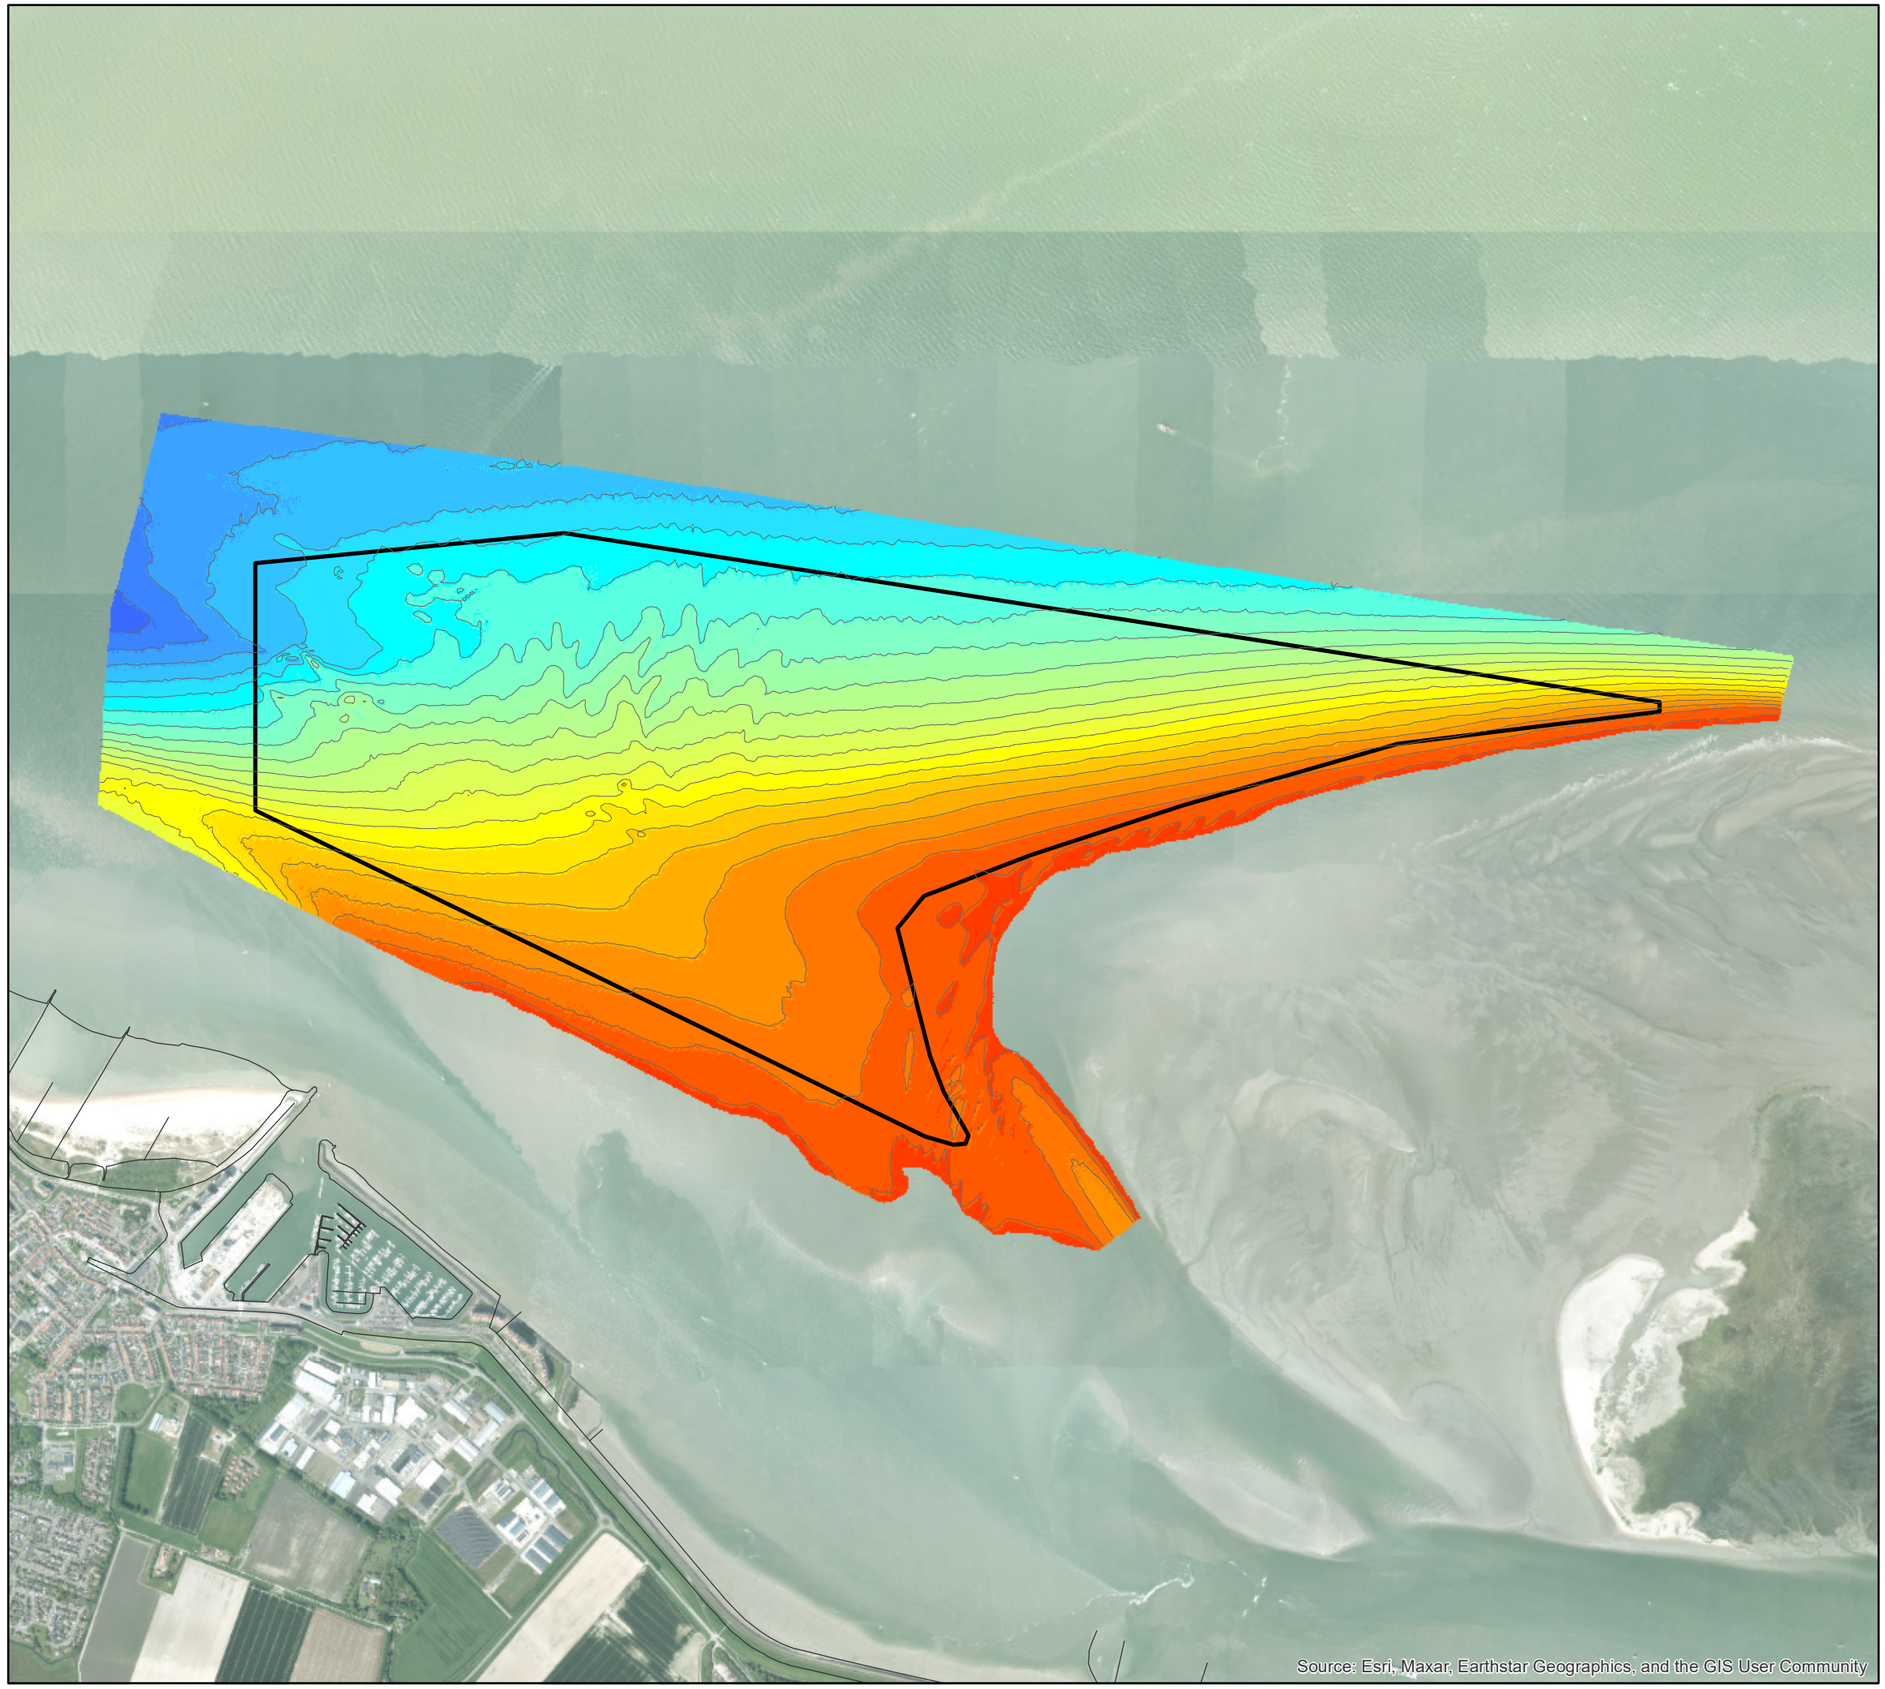

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart Hooge Platen West

01/07/2025 (T165)

11640_HPW_BT165
Rapport nr. 25.152



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

Diepte in m [NAP]

- 0.09 - 1.00
- 1.01 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00

N
W E
S

0 200 400 600 800 1000 m

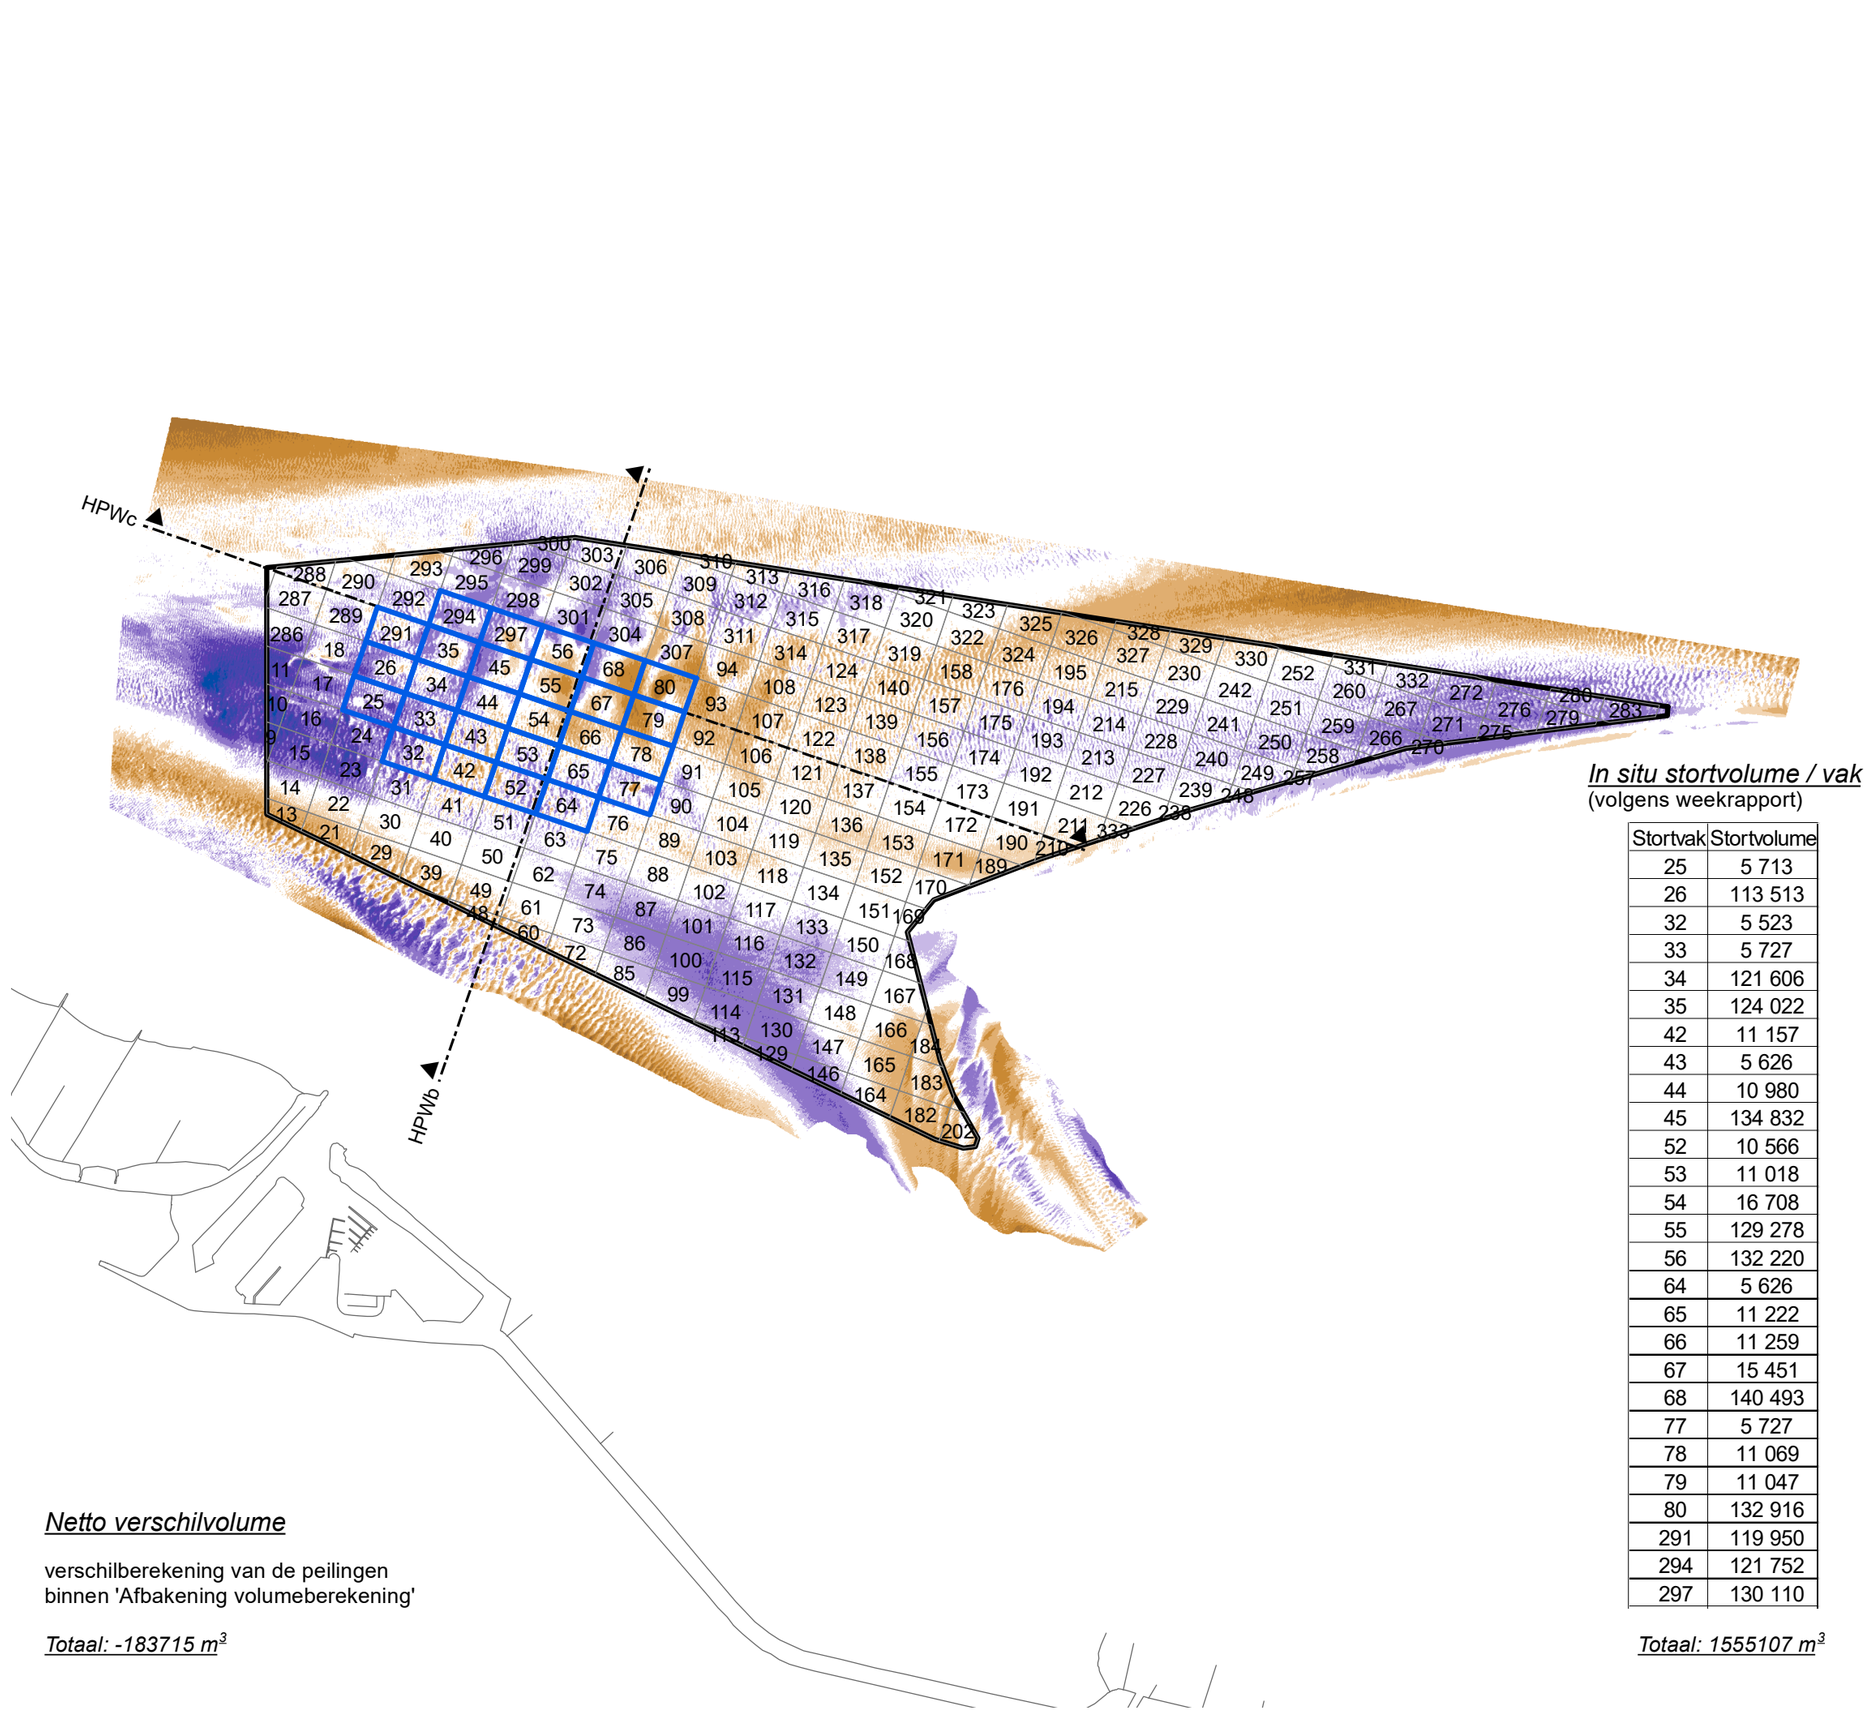

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
25	5 713
26	113 513
32	5 523
33	5 727
34	121 606
35	124 022
42	11 157
43	5 626
44	10 980
45	134 832
52	10 566
53	11 018
54	16 708
55	129 278
56	132 220
64	5 626
65	11 222
66	11 259
67	15 451
68	140 493
77	5 727
78	11 069
79	11 047
80	132 916
291	119 950
294	121 752
297	130 110

Totaal: 1555107 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -183715 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart Hooge Platen West

17/04/2022 (T146) - 01/07/2025 (T165)

11640_HPW_VT165-T146
Rapport nr. 25.152



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken


verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N W E S

0 200 400 600 800 1000 m

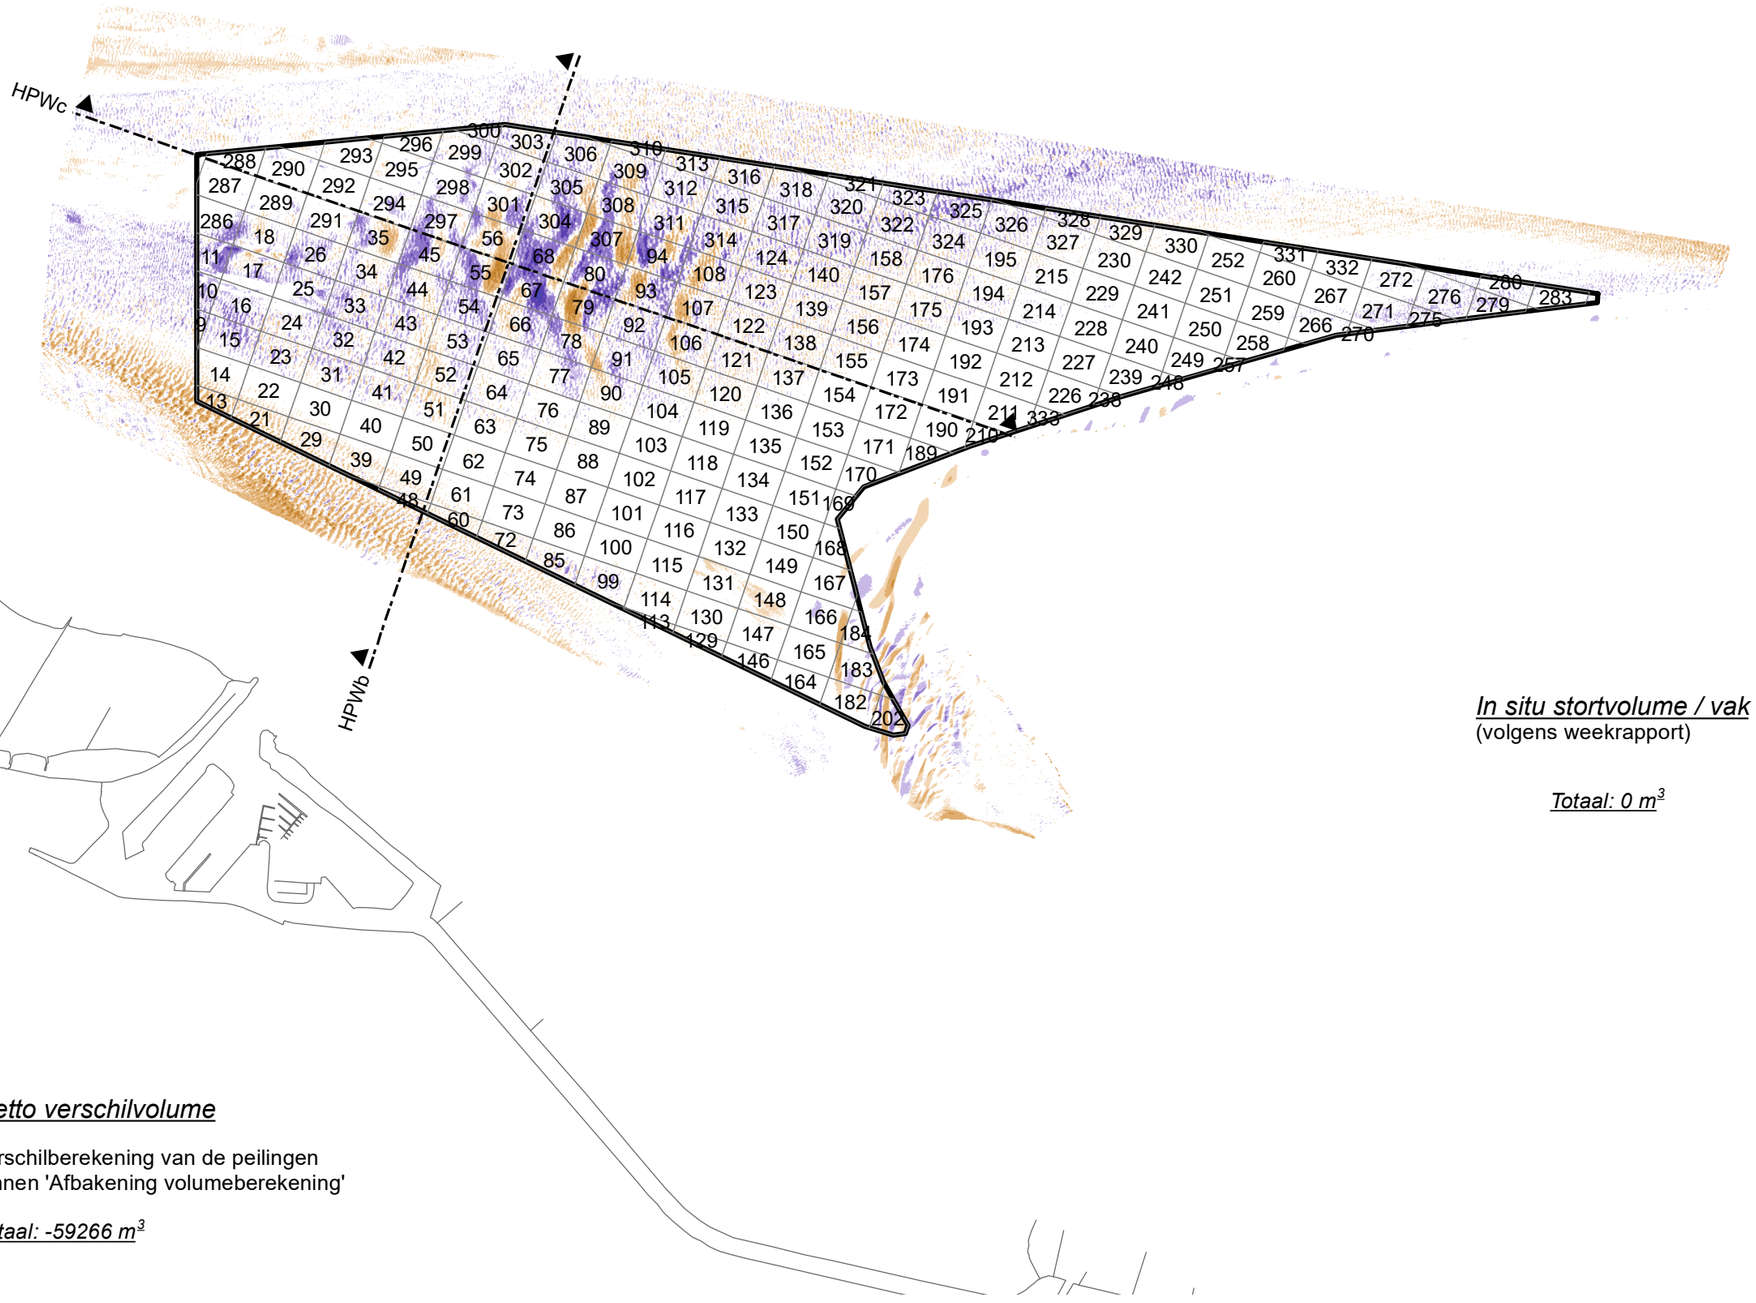

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -59266 m³

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Totaal: 0 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart Hooge Platen West

24/02/2025 (T164) - 01/07/2025 (T165)

11640_HPW_VT165-T164
Rapport nr. 25.152



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende


- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	verdieping
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

0 200 400 600 800 1000 m

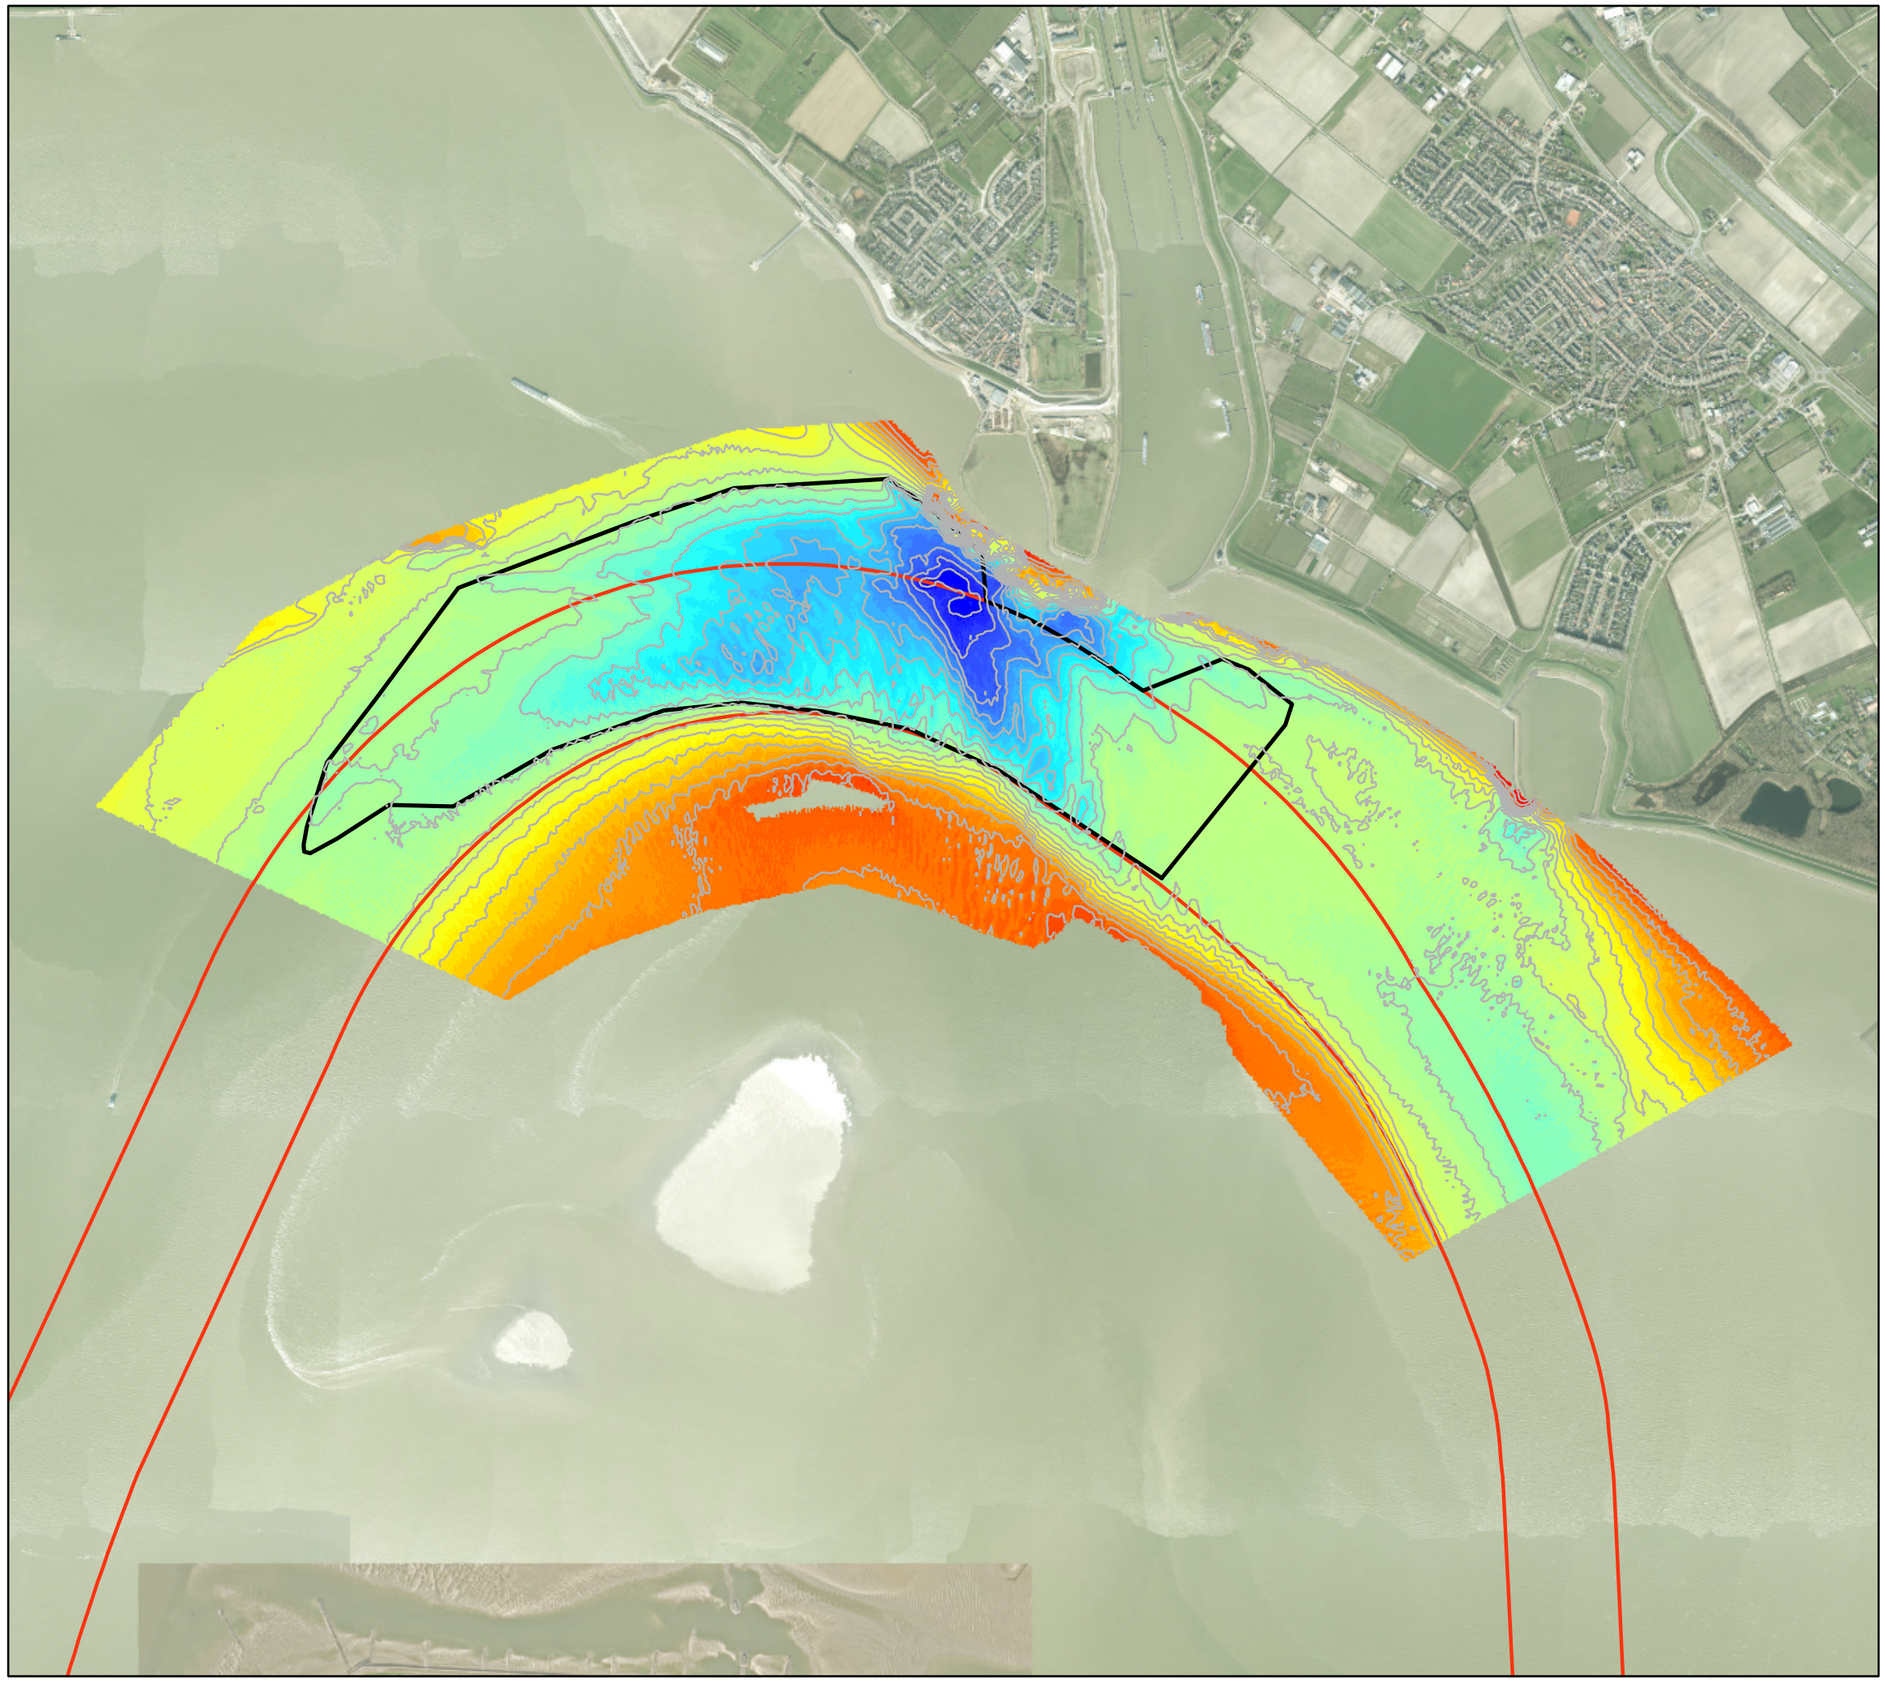

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang


Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025
Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart Put van Hansweert

27/05/2025 (T90)

11640_PVH_BT90
Rapport nr. 25.152



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

Diepte in m [NAP]

1.61 - 2.00	19.01 - 20.00
2.01 - 3.00	20.01 - 21.00
3.01 - 4.00	21.01 - 22.00
4.01 - 5.00	22.01 - 23.00
5.01 - 6.00	23.01 - 24.00
6.01 - 7.00	24.01 - 25.00
7.01 - 8.00	25.01 - 26.00
8.01 - 9.00	26.01 - 27.00
9.01 - 10.00	27.01 - 28.00
10.01 - 11.00	28.01 - 29.00
11.01 - 12.00	29.01 - 30.00
12.01 - 13.00	30.01 - 31.00
13.01 - 14.00	31.01 - 32.00
14.01 - 15.00	32.01 - 33.00
15.01 - 16.00	33.01 - 34.00
16.01 - 17.00	34.01 - 35.00
17.01 - 18.00	35.01 - 36.00
18.01 - 19.00	36.01 - 37.00

N
W E
S

0 200 400 600 800 1000 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)


Stortvak	Stortvolume
93	44 653
94	22 677
125	30 435
126	46 714
127	47 290
128	63 892
129	44 291
159	49 654
160	39 620
161	46 959
162	137 543
163	136 020
193	35 731
194	30 776
195	38 153
196	127 830
197	127 098
221	16 768
229	53 132
230	134 648
231	112 862
232	120 120
254	33 594
255	169 606
287	5 742
288	188 220
289	152 000
321	67 578
322	158 707
323	157 089
356	134 935
464	16 608
468	5 713
469	5 560
475	85 281
476	89 116
478	9 304
483	96 137
484	94 536
485	5 689
486	10 948
490	119 796
491	70 260
492	104 487
493	15 086
494	14 943
498	111 570
499	18 399
500	23 140
513	39 713
514	56 533
516	44 859
517	44 770
518	45 051
519	54 454
520	68 154
523	49 461
524	56 043
525	11 331

Totaal: 3941281 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 2513786 m³

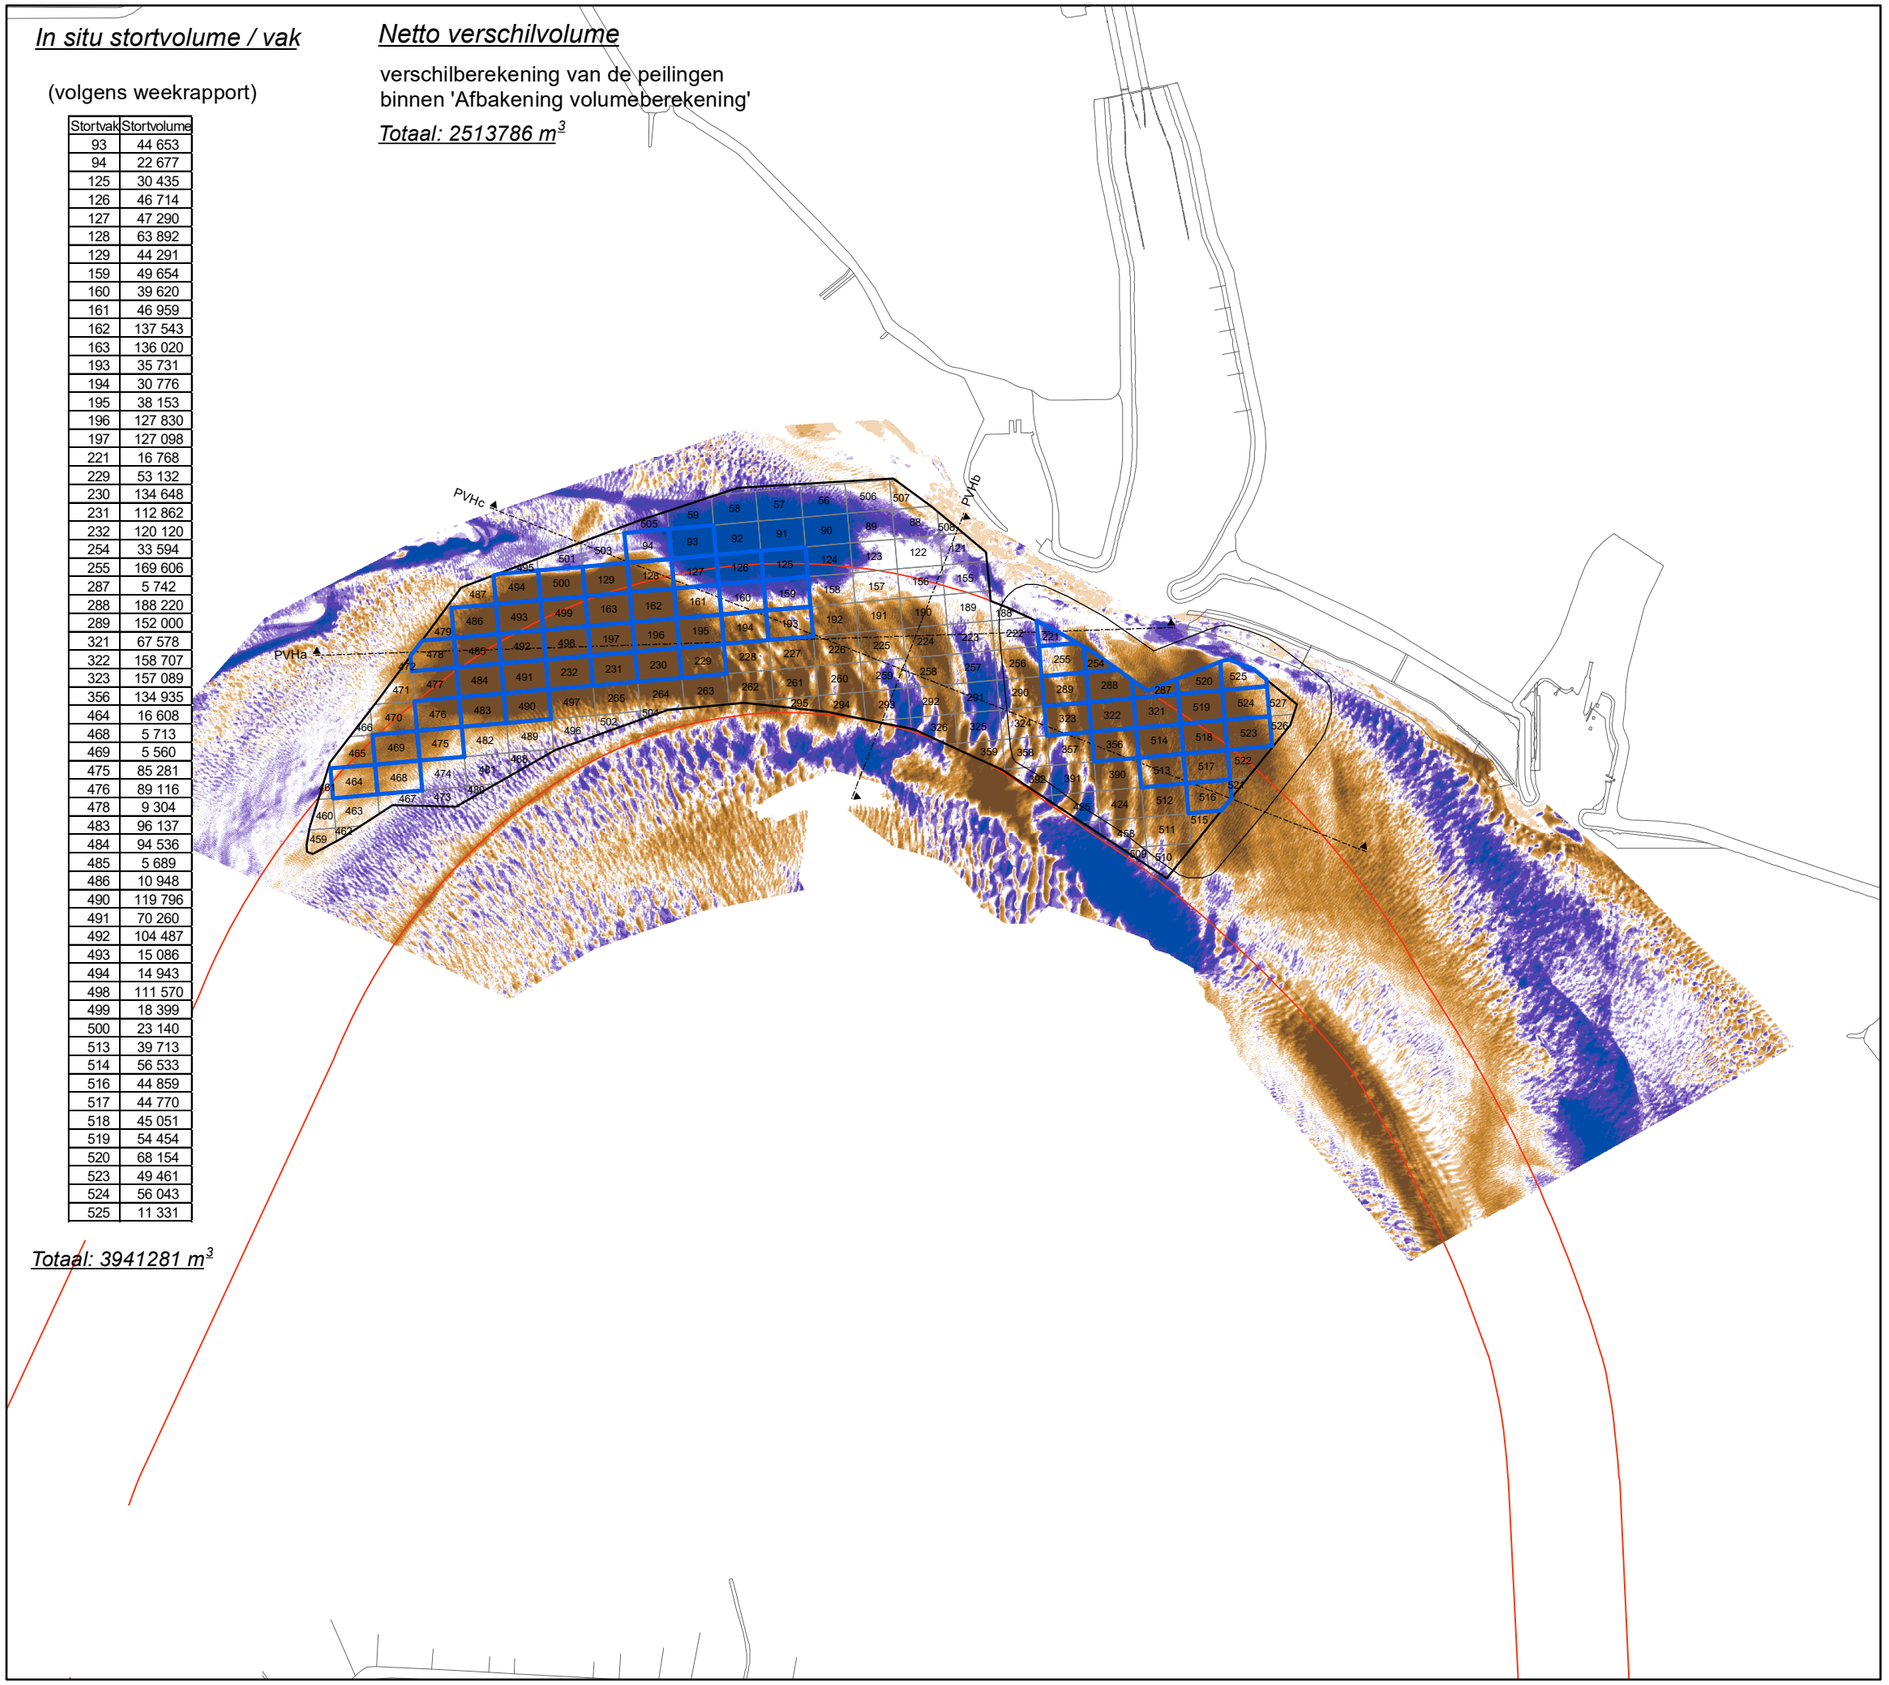

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nrMT/02323_C1_04

Verschilkaart Put van Hansweert

05/05/2022 (T65) - 27/05/2025 (T90)

11640_PVH_VT90-T65

Rapport nr. 25.152



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50

- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N
W E
S

0 200 400 600 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
93	44 653
94	22 677
125	30 435
126	46 714
127	47 290
128	63 892
129	44 291
159	49 654
160	39 620
161	46 959
162	137 543
163	136 020
193	35 731
194	30 776
195	38 153
196	127 830
197	127 098
221	16 768
229	53 132
230	134 648
231	112 862
232	120 120
254	33 594
255	169 606
287	5 742
288	188 220
289	152 000
321	67 578
322	158 707
323	157 089
356	134 935
464	16 608
468	5 713
469	5 560
475	85 281
476	89 116
478	9 304
483	96 137
484	94 536
485	5 689
486	10 948
490	119 796
491	70 260
492	104 487
493	15 086
494	14 943
498	111 570
499	18 399
500	23 140
513	39 713
514	56 533
516	44 859
517	44 770
518	45 051
519	54 454
520	68 154
523	49 461
524	56 043
525	11 331

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 2 978 151 m³

Totaal: 3 941 281 m³

PVHa
PVHb
PVHc

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nrMT/02323_C1_04

Verschilkaart Put van Hansweert

20/09/2022 (T68) - 27/05/2025 (T90)

11640_PVH_VT90-T68

Rapport nr. 25.152



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50

verondieping

- -0.25 - +0.25

verdieping

- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N
W
E
S

0 200 400 600 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)


Stortvak	Stortvolume
126	10 771
127	5 435
128	5 413
159	10 759
160	5 465
161	5 531
162	10 632
163	10 973
193	5 516
195	5 406
196	5 428
197	5 413
229	10 876
230	5 575
464	5 413
498	5 354

Totaal: 113958 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -27854 m³

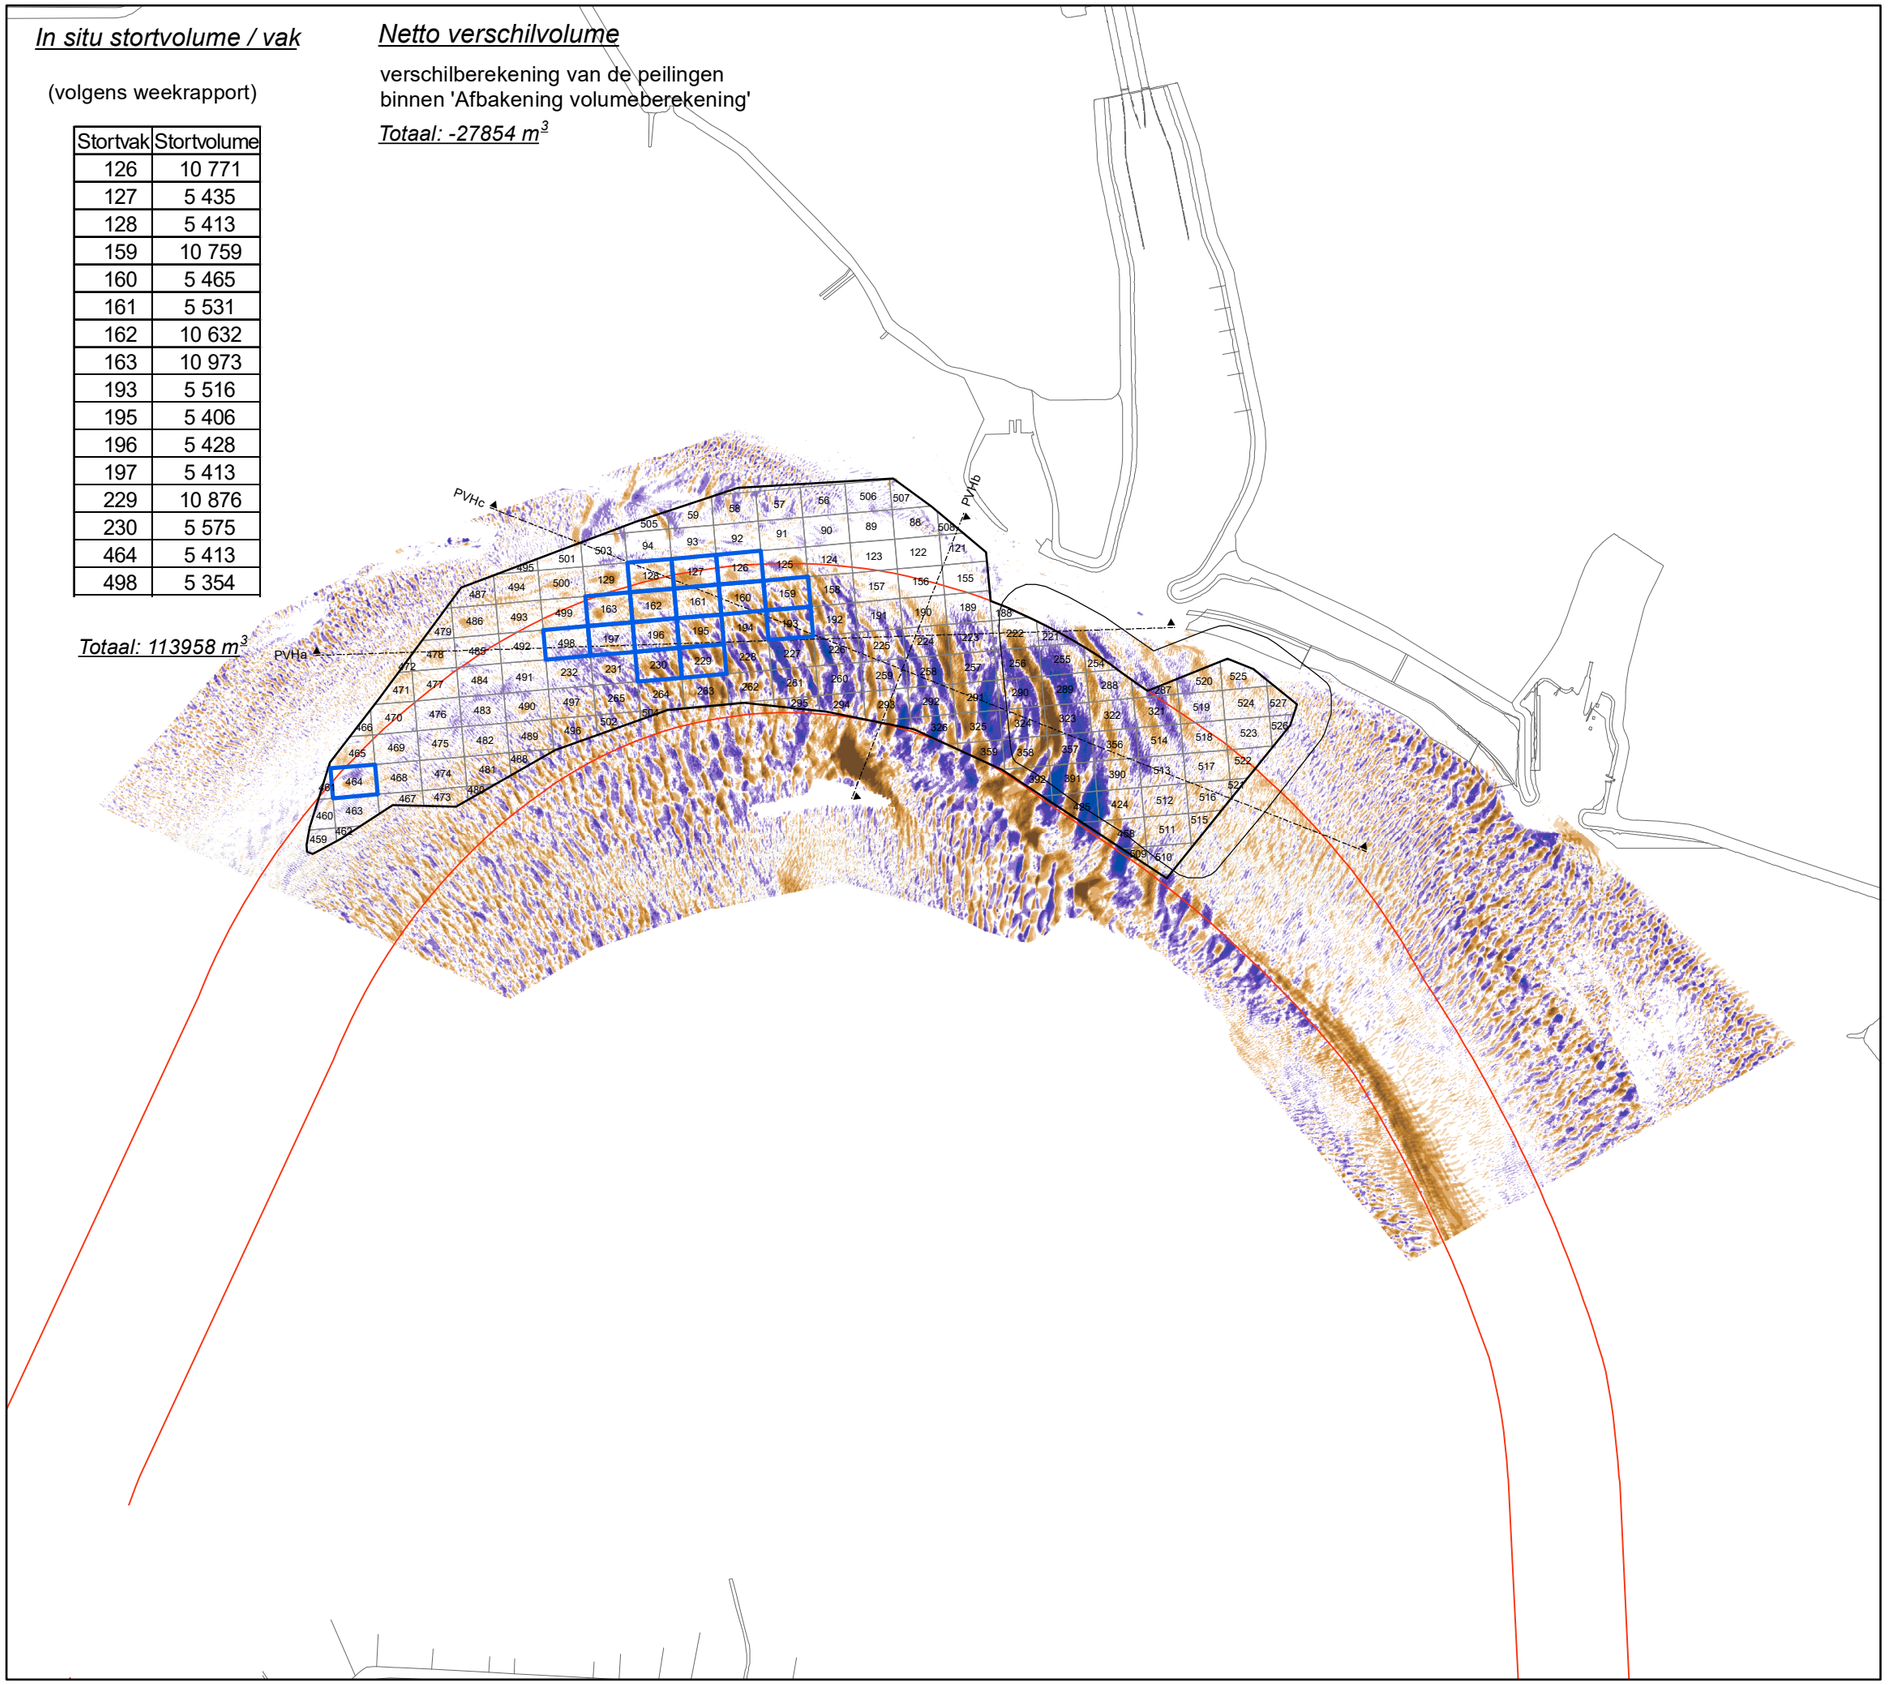

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nrMT/02323_C1_04

Verschilkaart Put van Hansweert

09/04/2025 (T89) - 27/05/2025 (T90)

11640_PVH_VT90-T89

Rapport nr. 25.152



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	verdieping
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

0 200 400 600 m



VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart Plaat van Walsoorden

04/06/2025 (T172)

11640_PWA_BT172
Rapport nr. 25.152



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

Diepte in m [NAP]

- 0.09 - 1.00
- 1.01 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00

N
W E
S

0 300 600 900 1200 1500 m

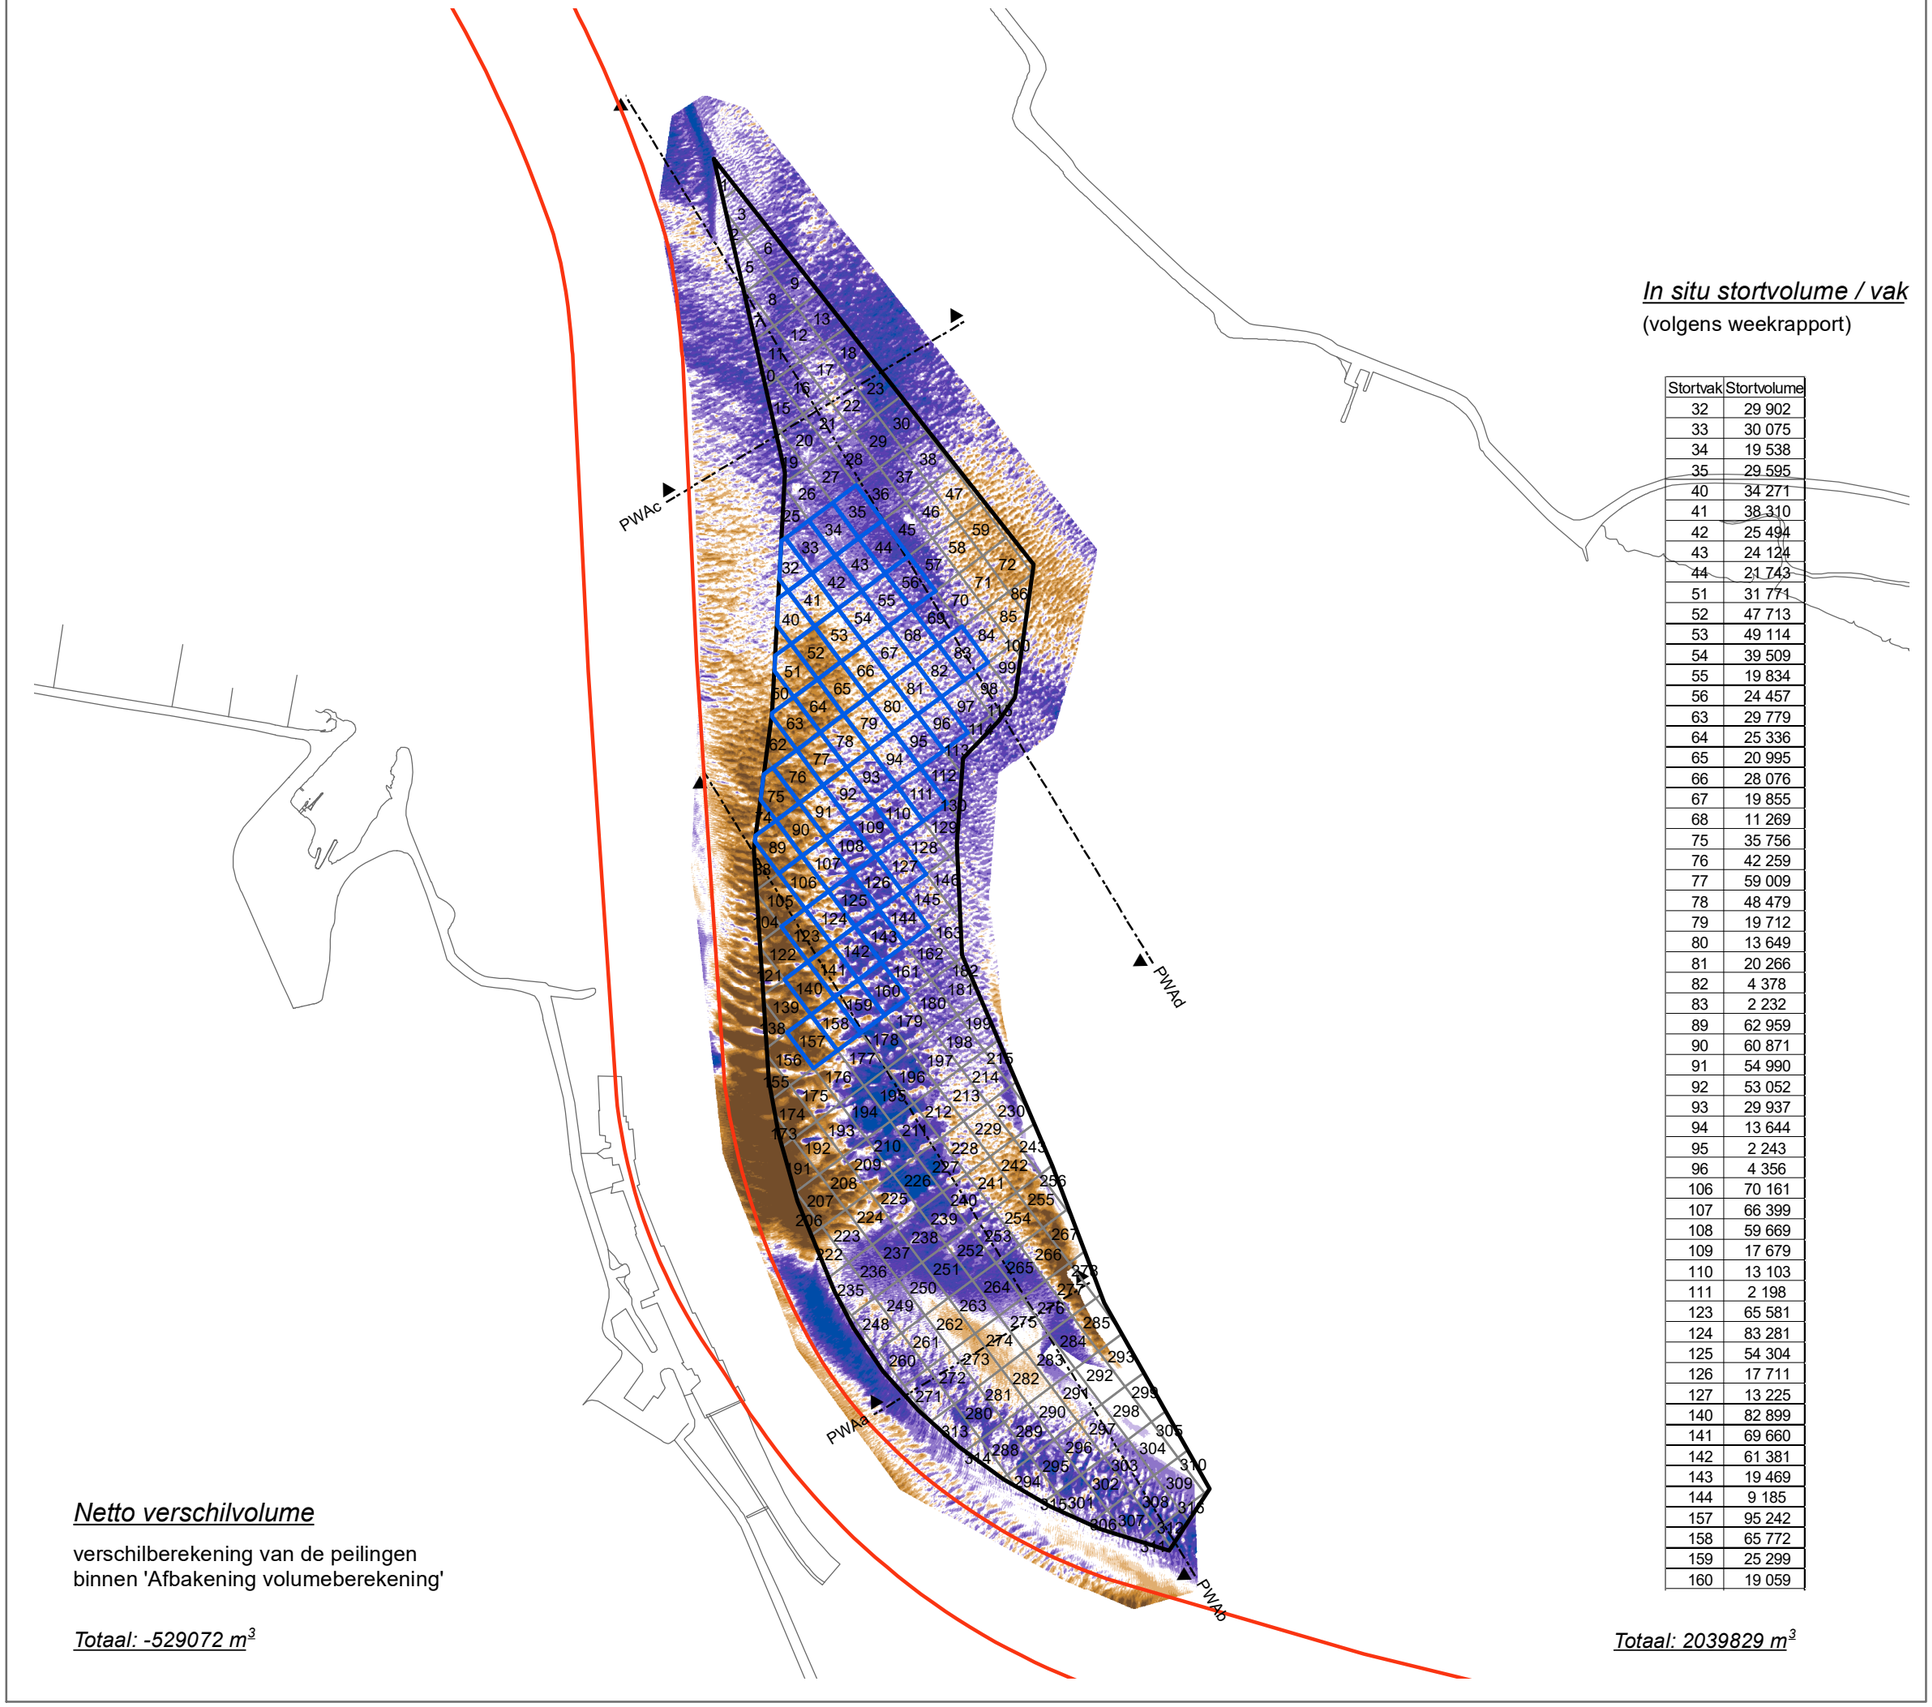

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
32	29 902
33	30 075
34	19 538
35	29 595
40	34 271
41	38 310
42	25 494
43	24 124
44	21 743
51	31 771
52	47 713
53	49 114
54	39 509
55	19 834
56	24 457
63	29 779
64	25 336
65	20 995
66	28 076
67	19 855
68	11 269
75	35 756
76	42 259
77	59 009
78	48 479
79	19 712
80	13 649
81	20 266
82	4 378
83	2 232
89	62 959
90	60 871
91	54 990
92	53 052
93	29 937
94	13 644
95	2 243
96	4 356
106	70 161
107	66 399
108	59 669
109	17 679
110	13 103
111	2 198
123	65 581
124	83 281
125	54 304
126	17 711
127	13 225
140	82 899
141	69 660
142	61 381
143	19 469
144	9 185
157	95 242
158	65 772
159	25 299
160	19 059

Totaal: 2039829 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -529072 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart Plaat van Walsoorden

12/04/2022 (T155) - 04/06/2025 (T172)

11640_PWA_VT172-T155
Rapport nr. 25.152



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken


verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N W E S

0 300 600 900 1200 1500 m

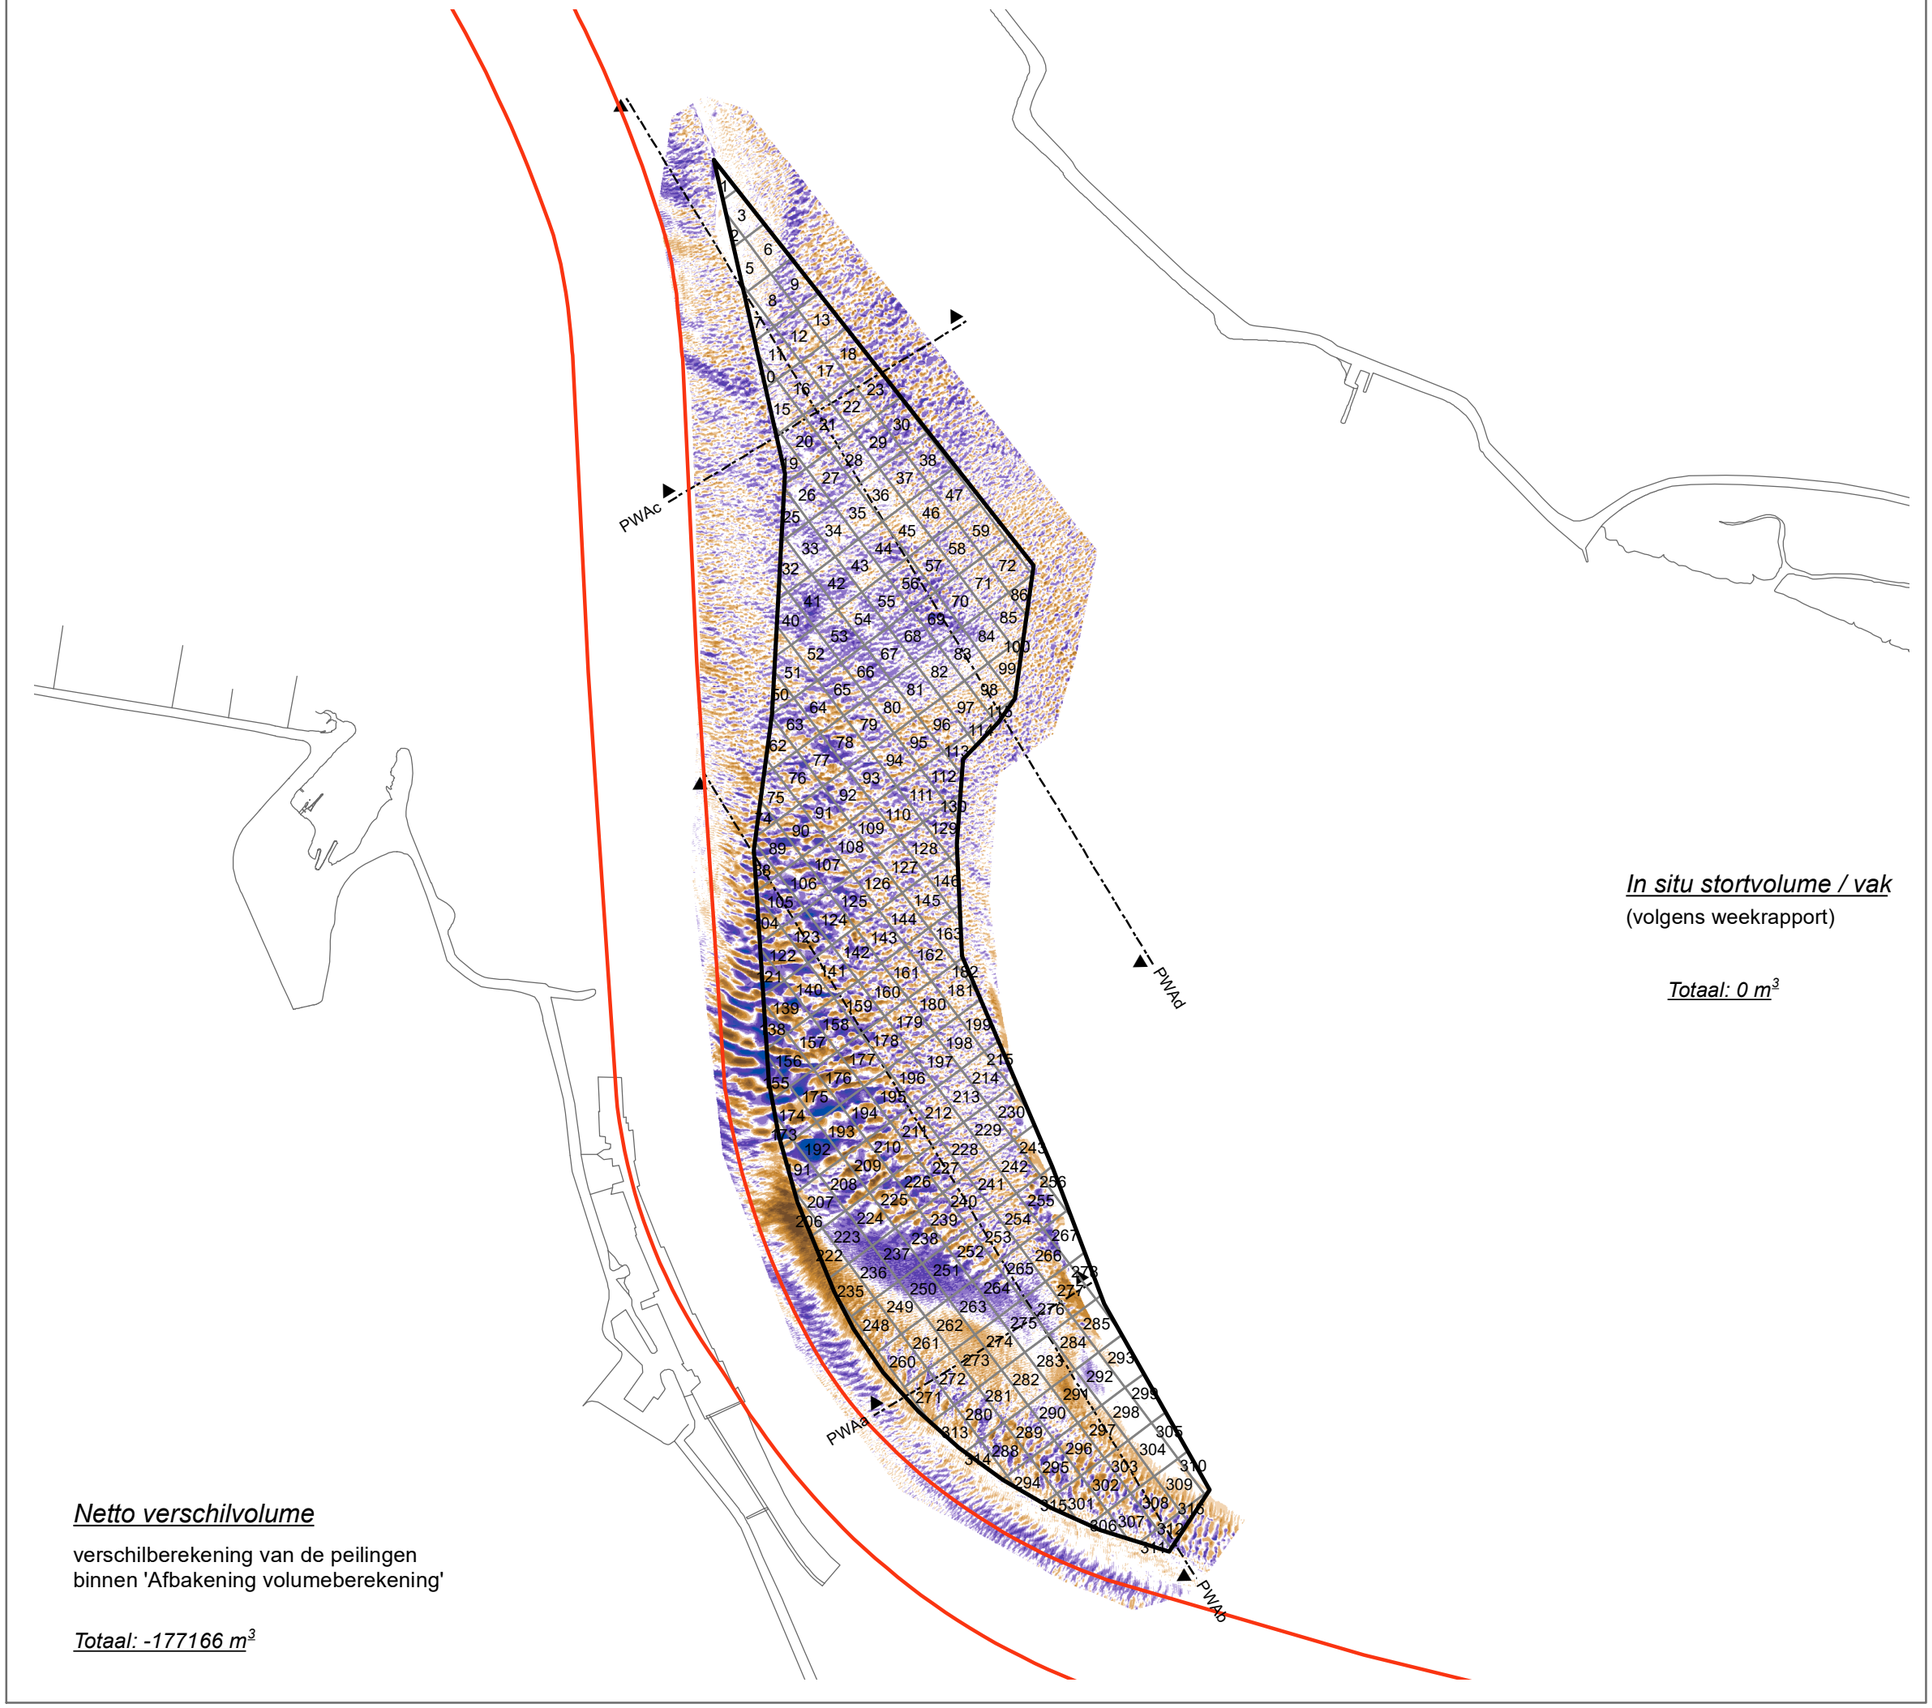

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Totaal: 0 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -177166 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart Plaat van Walsoorden

10/02/2025 (T171) - 04/06/2025 (T172)

11640_PWA_VT172-T171
Rapport nr. 25.152



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken


verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N
W E
S

0 300 600 900 1200 1500 m

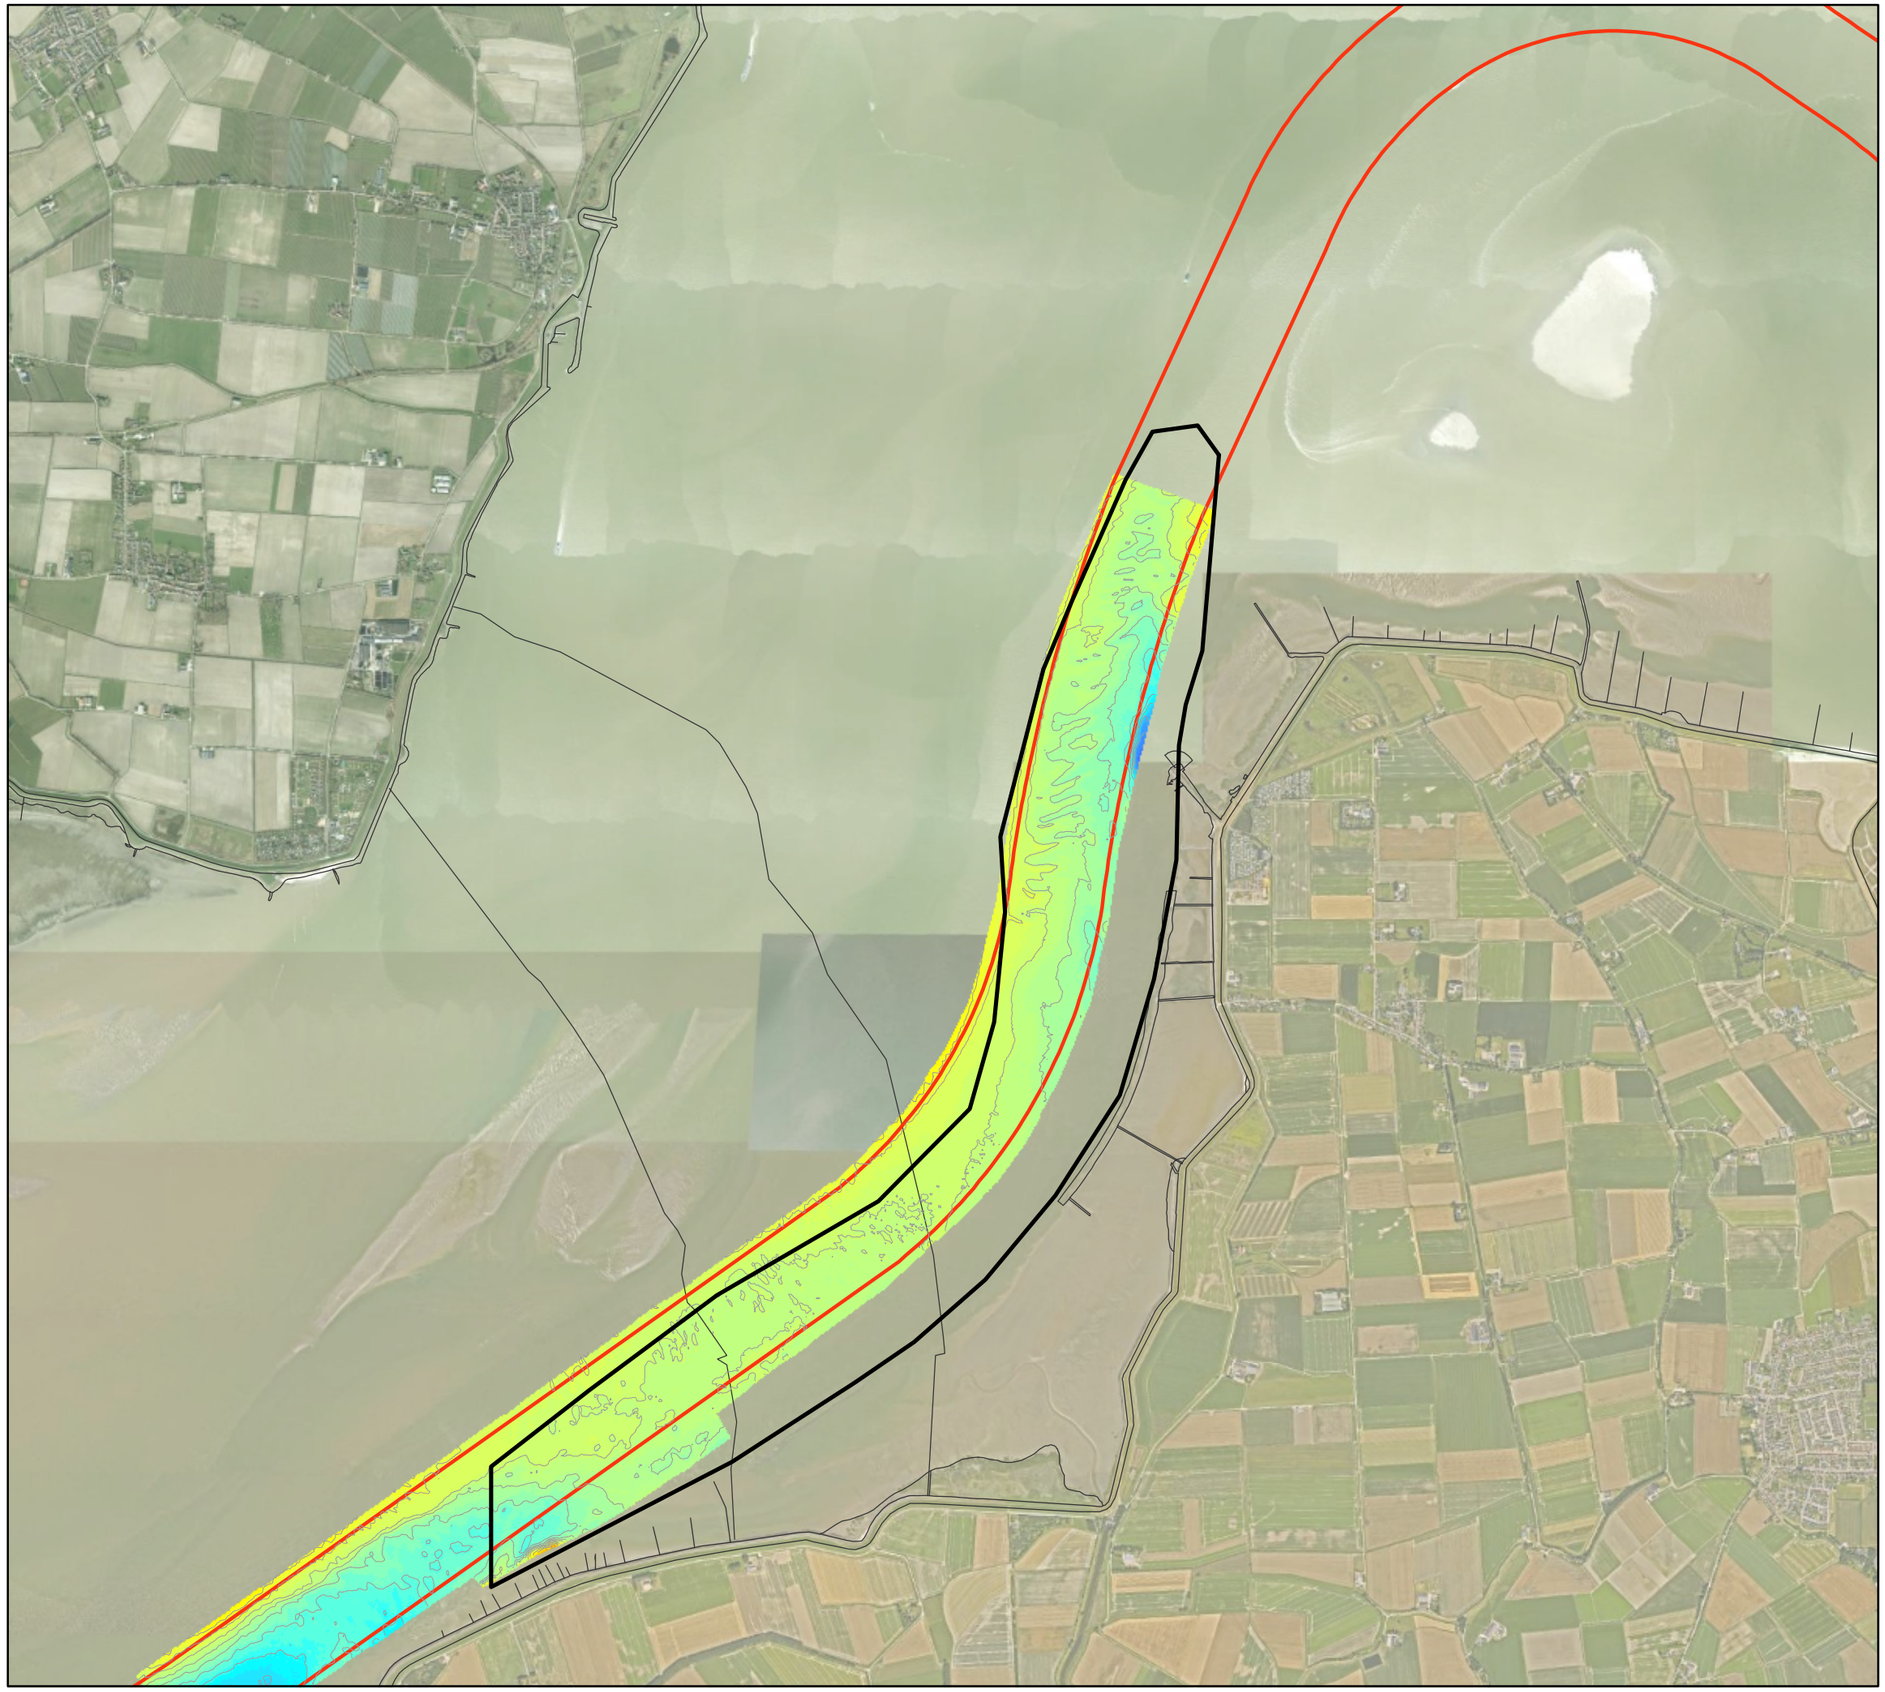

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SH41

23/07/2025 (T5)

11640_SH41_BT5
Rapport nr. 25.152



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

Diepte in m [NAP]

- 1.88 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00
- 25.01 - 26.00
- 26.01 - 27.00
- 27.01 - 28.00
- 28.01 - 29.00
- 29.01 - 30.00
- 30.01 - 31.00
- 31.01 - 32.00
- 32.01 - 33.00
- 33.01 - 34.00
- 34.01 - 35.00
- 35.01 - 36.00
- 36.01 - 37.00
- 37.01 - 38.00
- 38.01 - 39.00
- 39.01 - 40.00
- 40.01 - 41.00
- 41.01 - 42.00


N
W E
S

0 250 500 750 1000 m

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 702834 m³

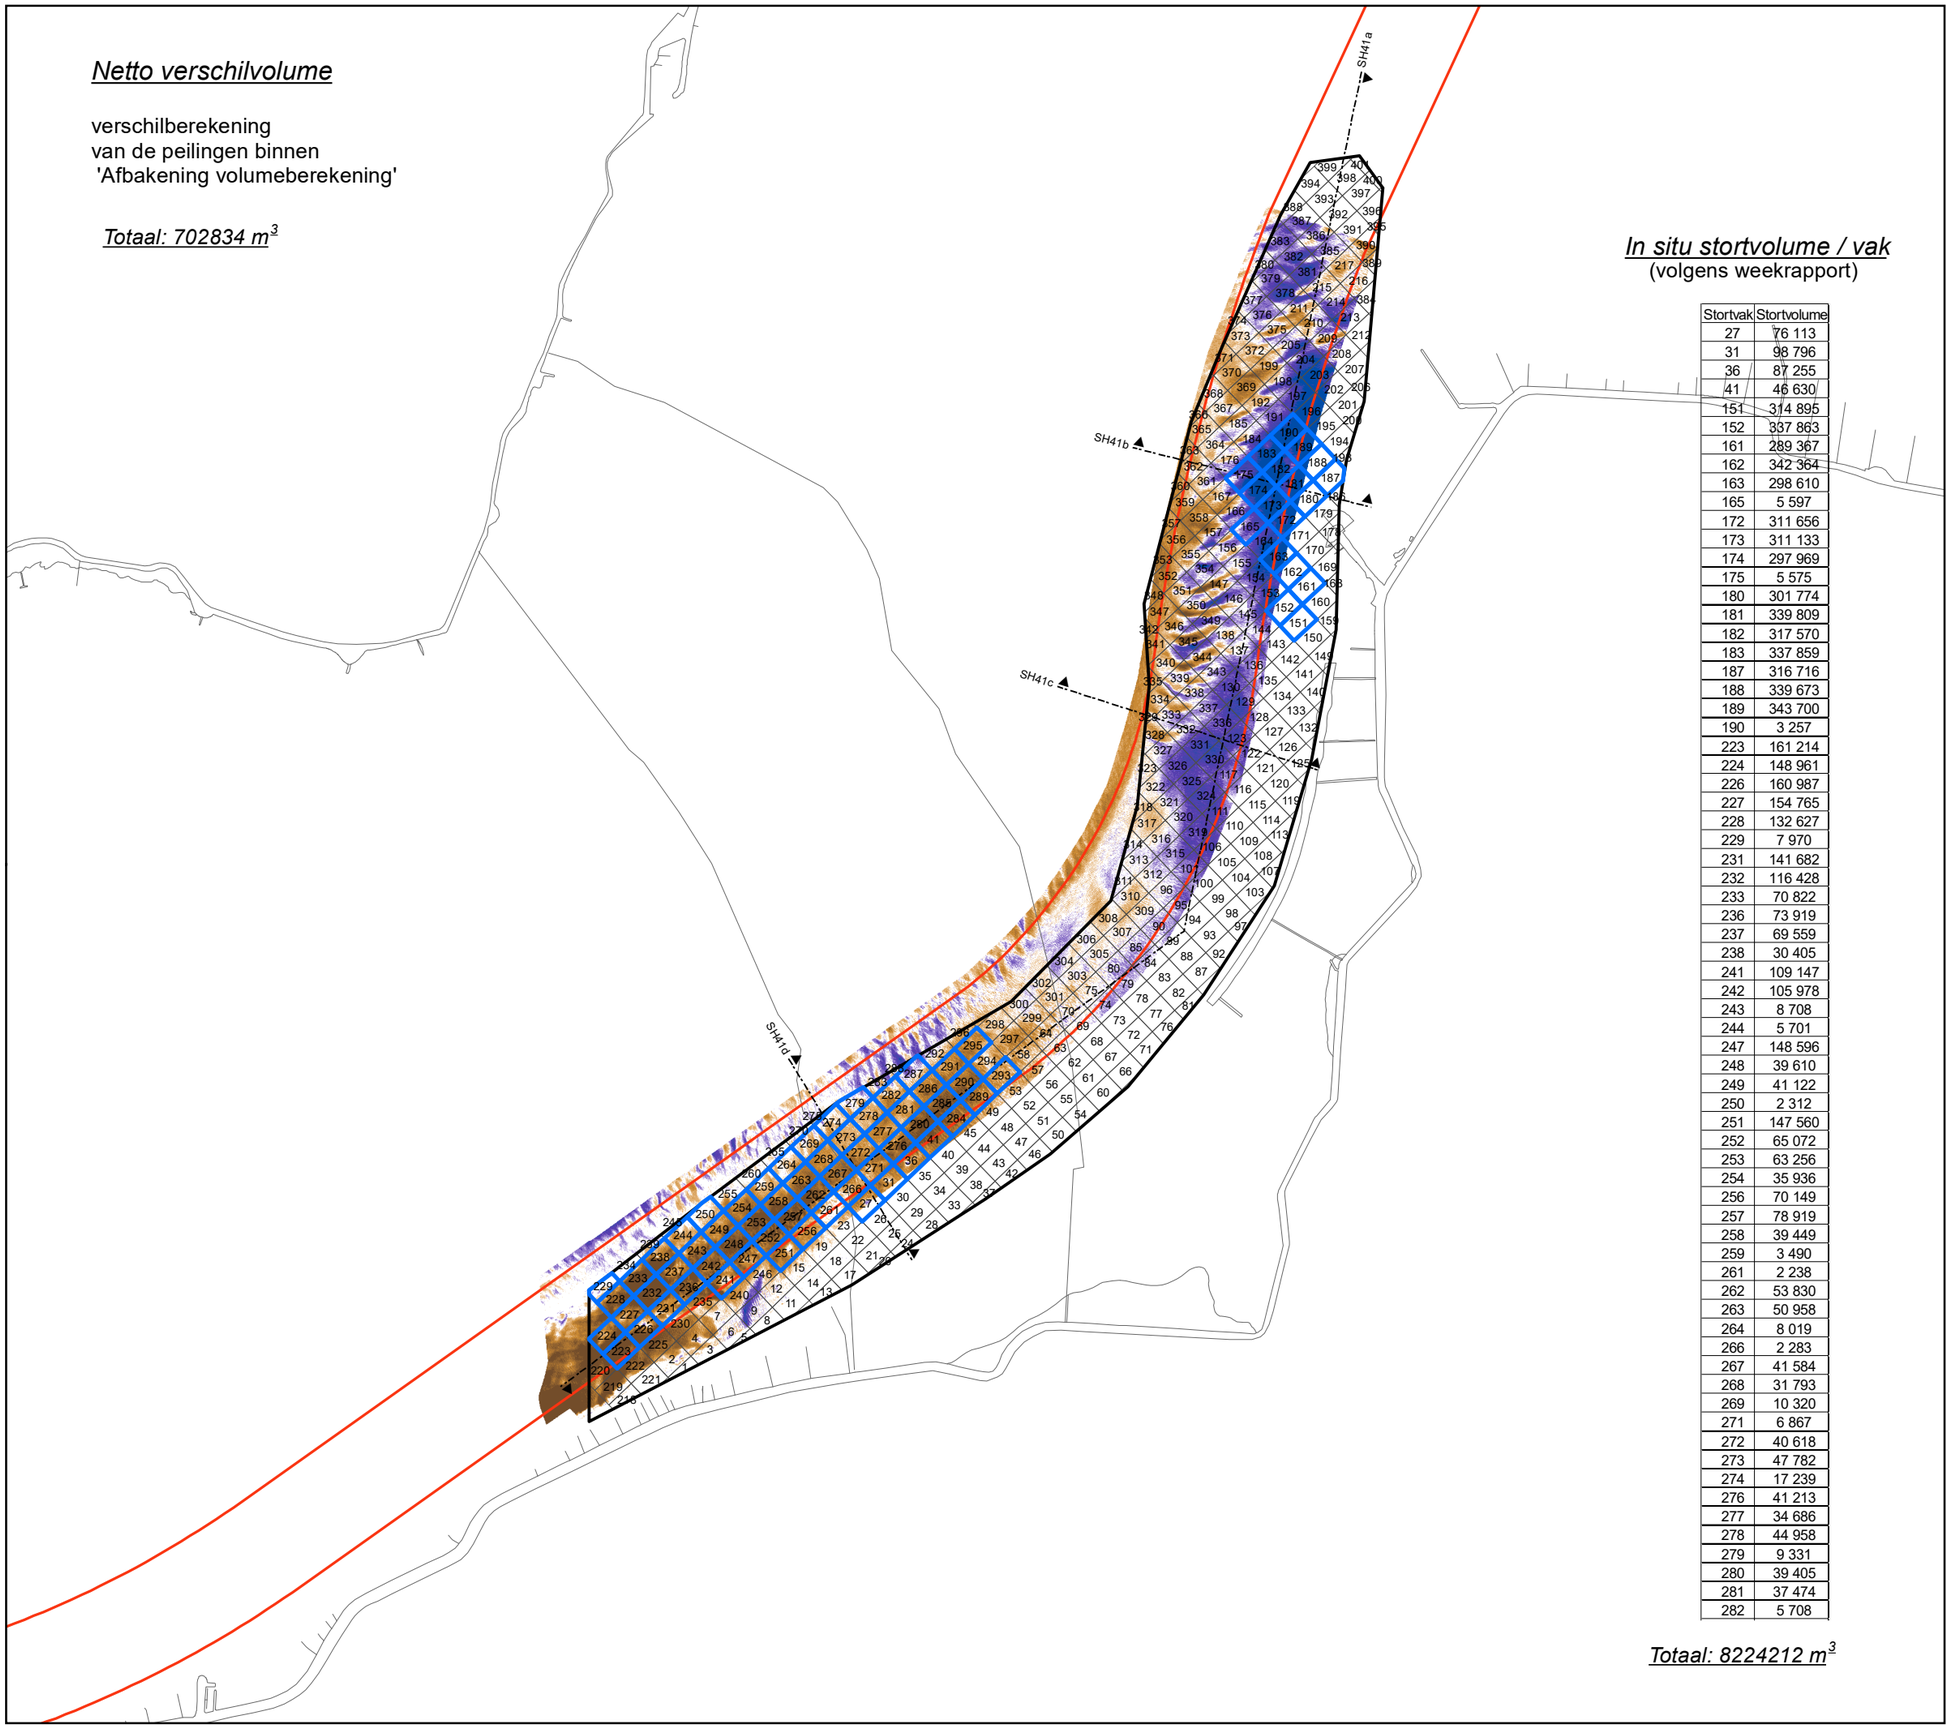

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
27	76 113
31	98 796
36	87 255
41	46 630
151	314 895
152	337 863
161	289 367
162	342 364
163	298 610
165	5 597
172	311 656
173	311 133
174	297 969
175	5 575
180	301 774
181	339 809
182	317 570
183	337 859
187	316 716
188	339 673
189	343 700
190	3 257
223	161 214
224	148 961
226	160 987
227	154 765
228	132 627
229	7 970
231	141 682
232	116 428
233	70 822
236	73 919
237	69 559
238	30 405
241	109 147
242	105 978
243	8 708
244	5 701
247	148 596
248	39 610
249	41 122
250	2 312
251	147 560
252	65 072
253	63 256
254	35 936
256	70 149
257	78 919
258	39 449
259	3 490
261	2 238
262	53 830
263	50 958
264	8 019
266	2 283
267	41 584
268	31 793
269	10 320
271	6 867
272	40 618
273	47 782
274	17 239
276	41 213
277	34 686
278	44 958
279	9 331
280	39 405
281	37 474
282	5 708

Totaal: 8224212 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH41

18/07/2022 (T0) - 23/07/2025 (T5)

11640_SH41_VT5-T0
Rapport nr. 25.152



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	verdieping
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	


N
W E
S

0 500 1000 1500 2000 m

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 163241 m³

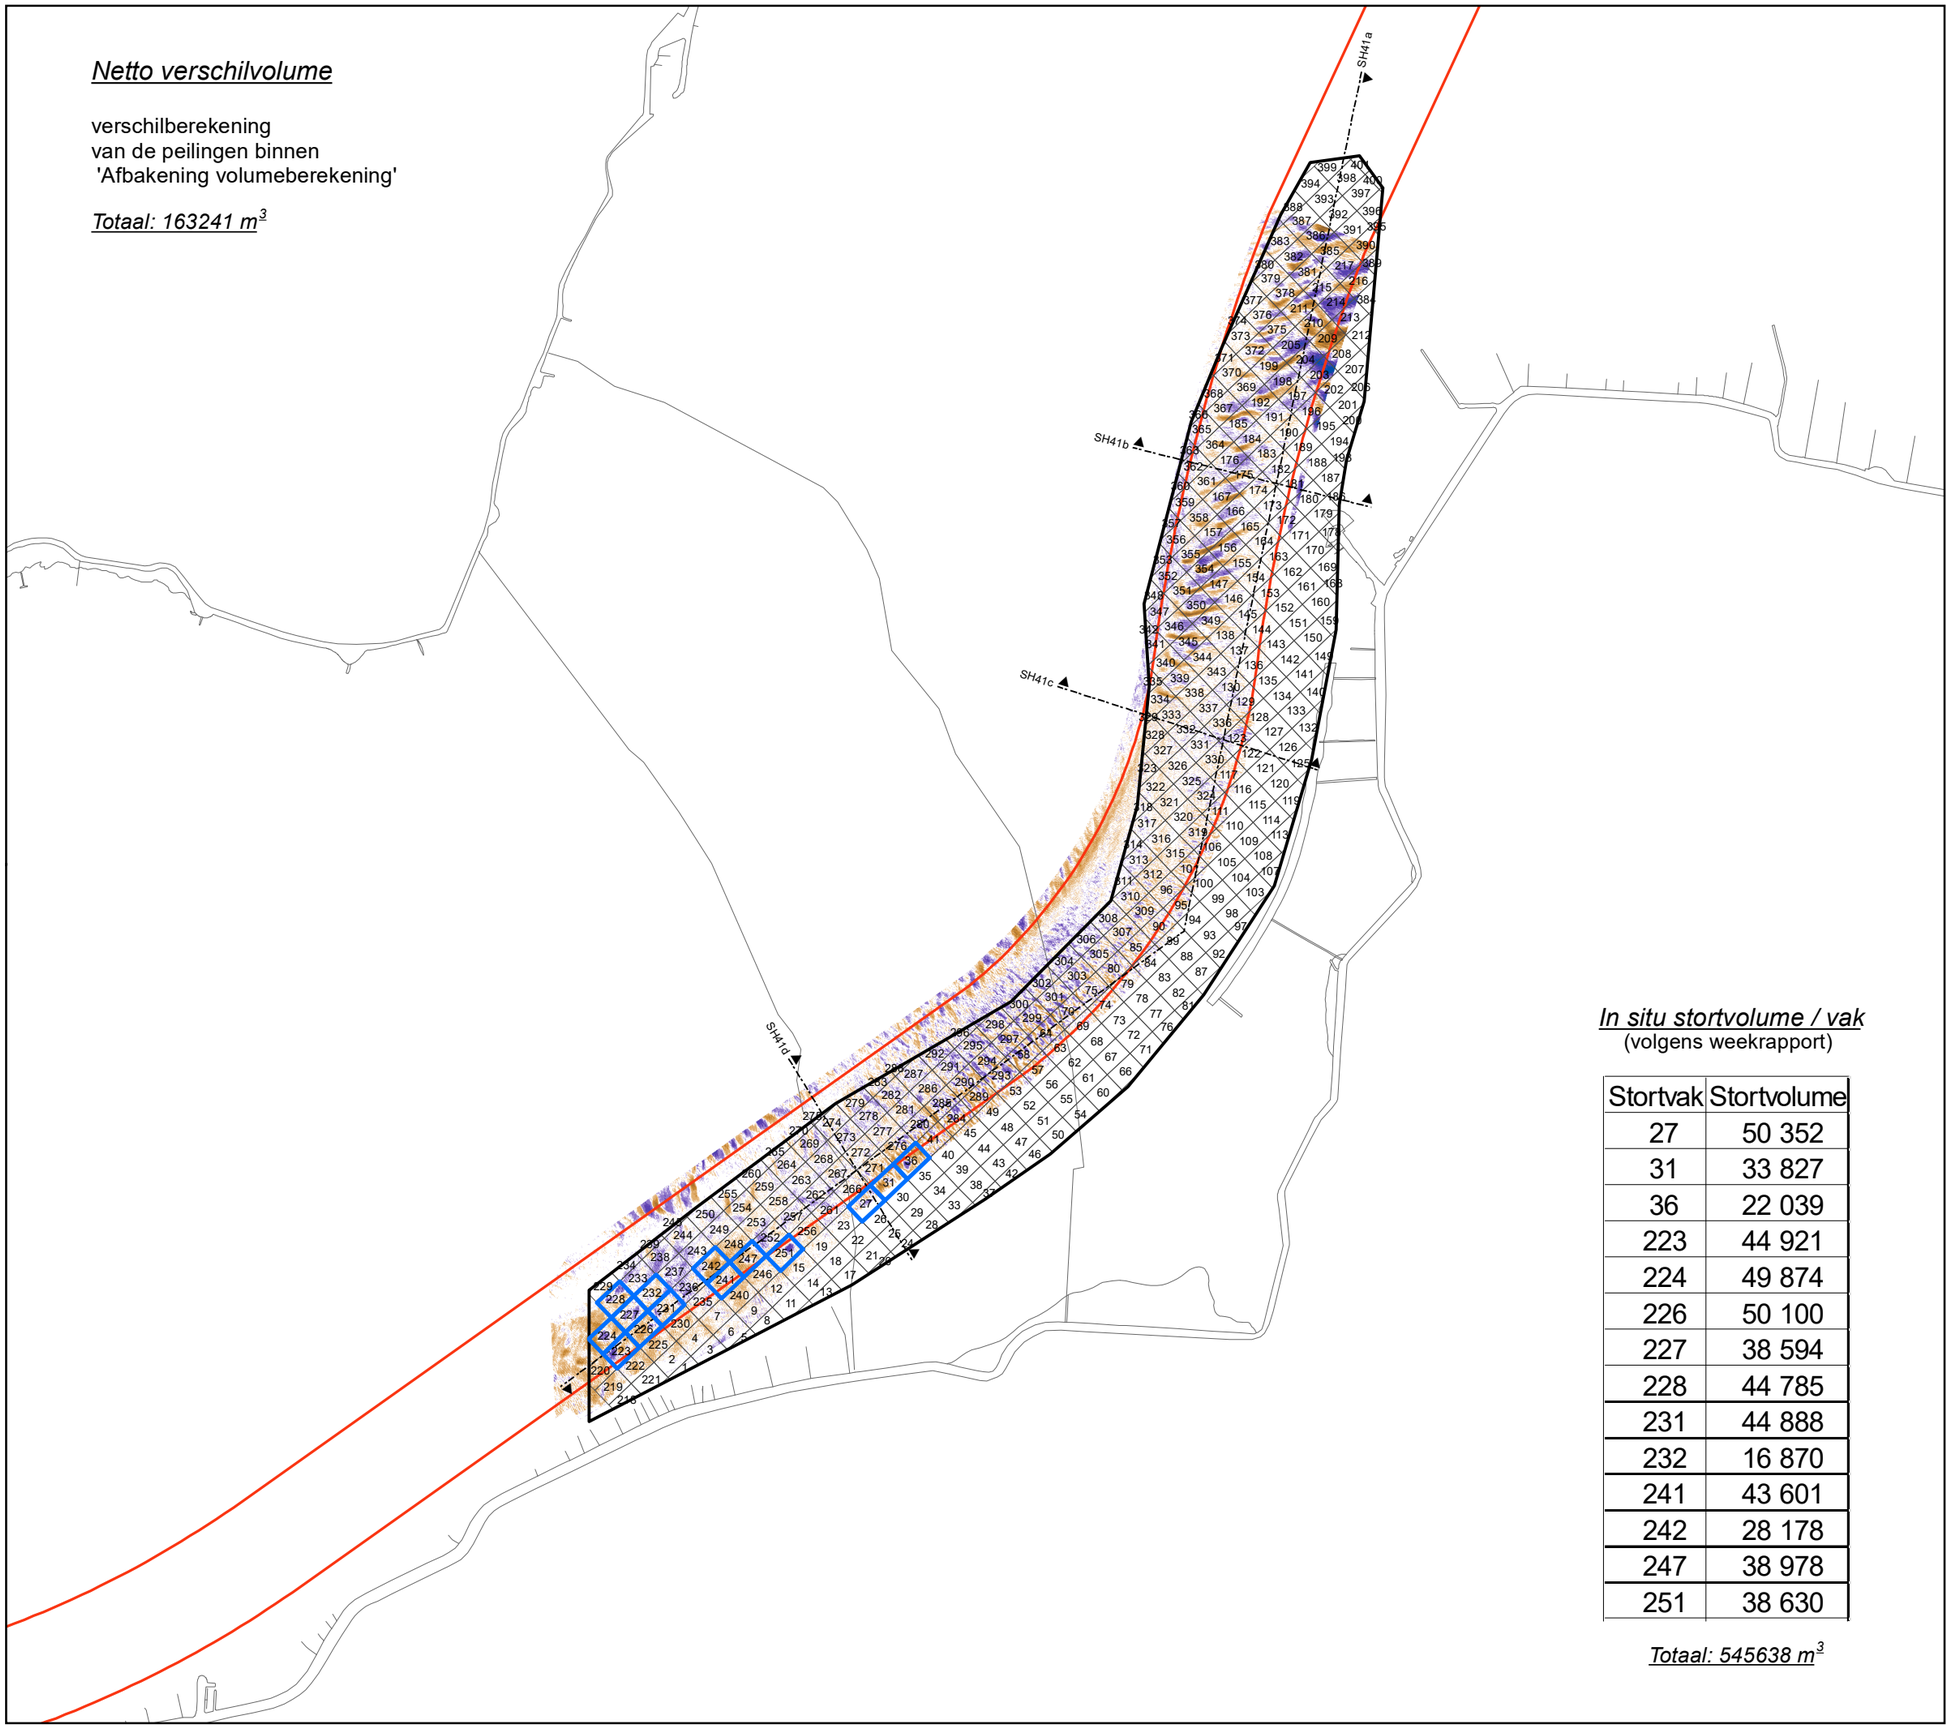

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
27	50 352
31	33 827
36	22 039
223	44 921
224	49 874
226	50 100
227	38 594
228	44 785
231	44 888
232	16 870
241	43 601
242	28 178
247	38 978
251	38 630

Totaal: 545638 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH41

13/05/2025 (T4) - 23/07/2025 (T5)

11640_SH41_VT5-T4
Rapport nr. 25.152



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	verdieping
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

0 500 1000 1500 2000 m



VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SH51

23/05/2025 (T5)

11640_SH51_BT5
Rapport nr. 25.152



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

Diepte in m [NAP]

- 0.09 - 1.00
- 1.01 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00

N
W E
S

0 200 400 600 800 1000 m

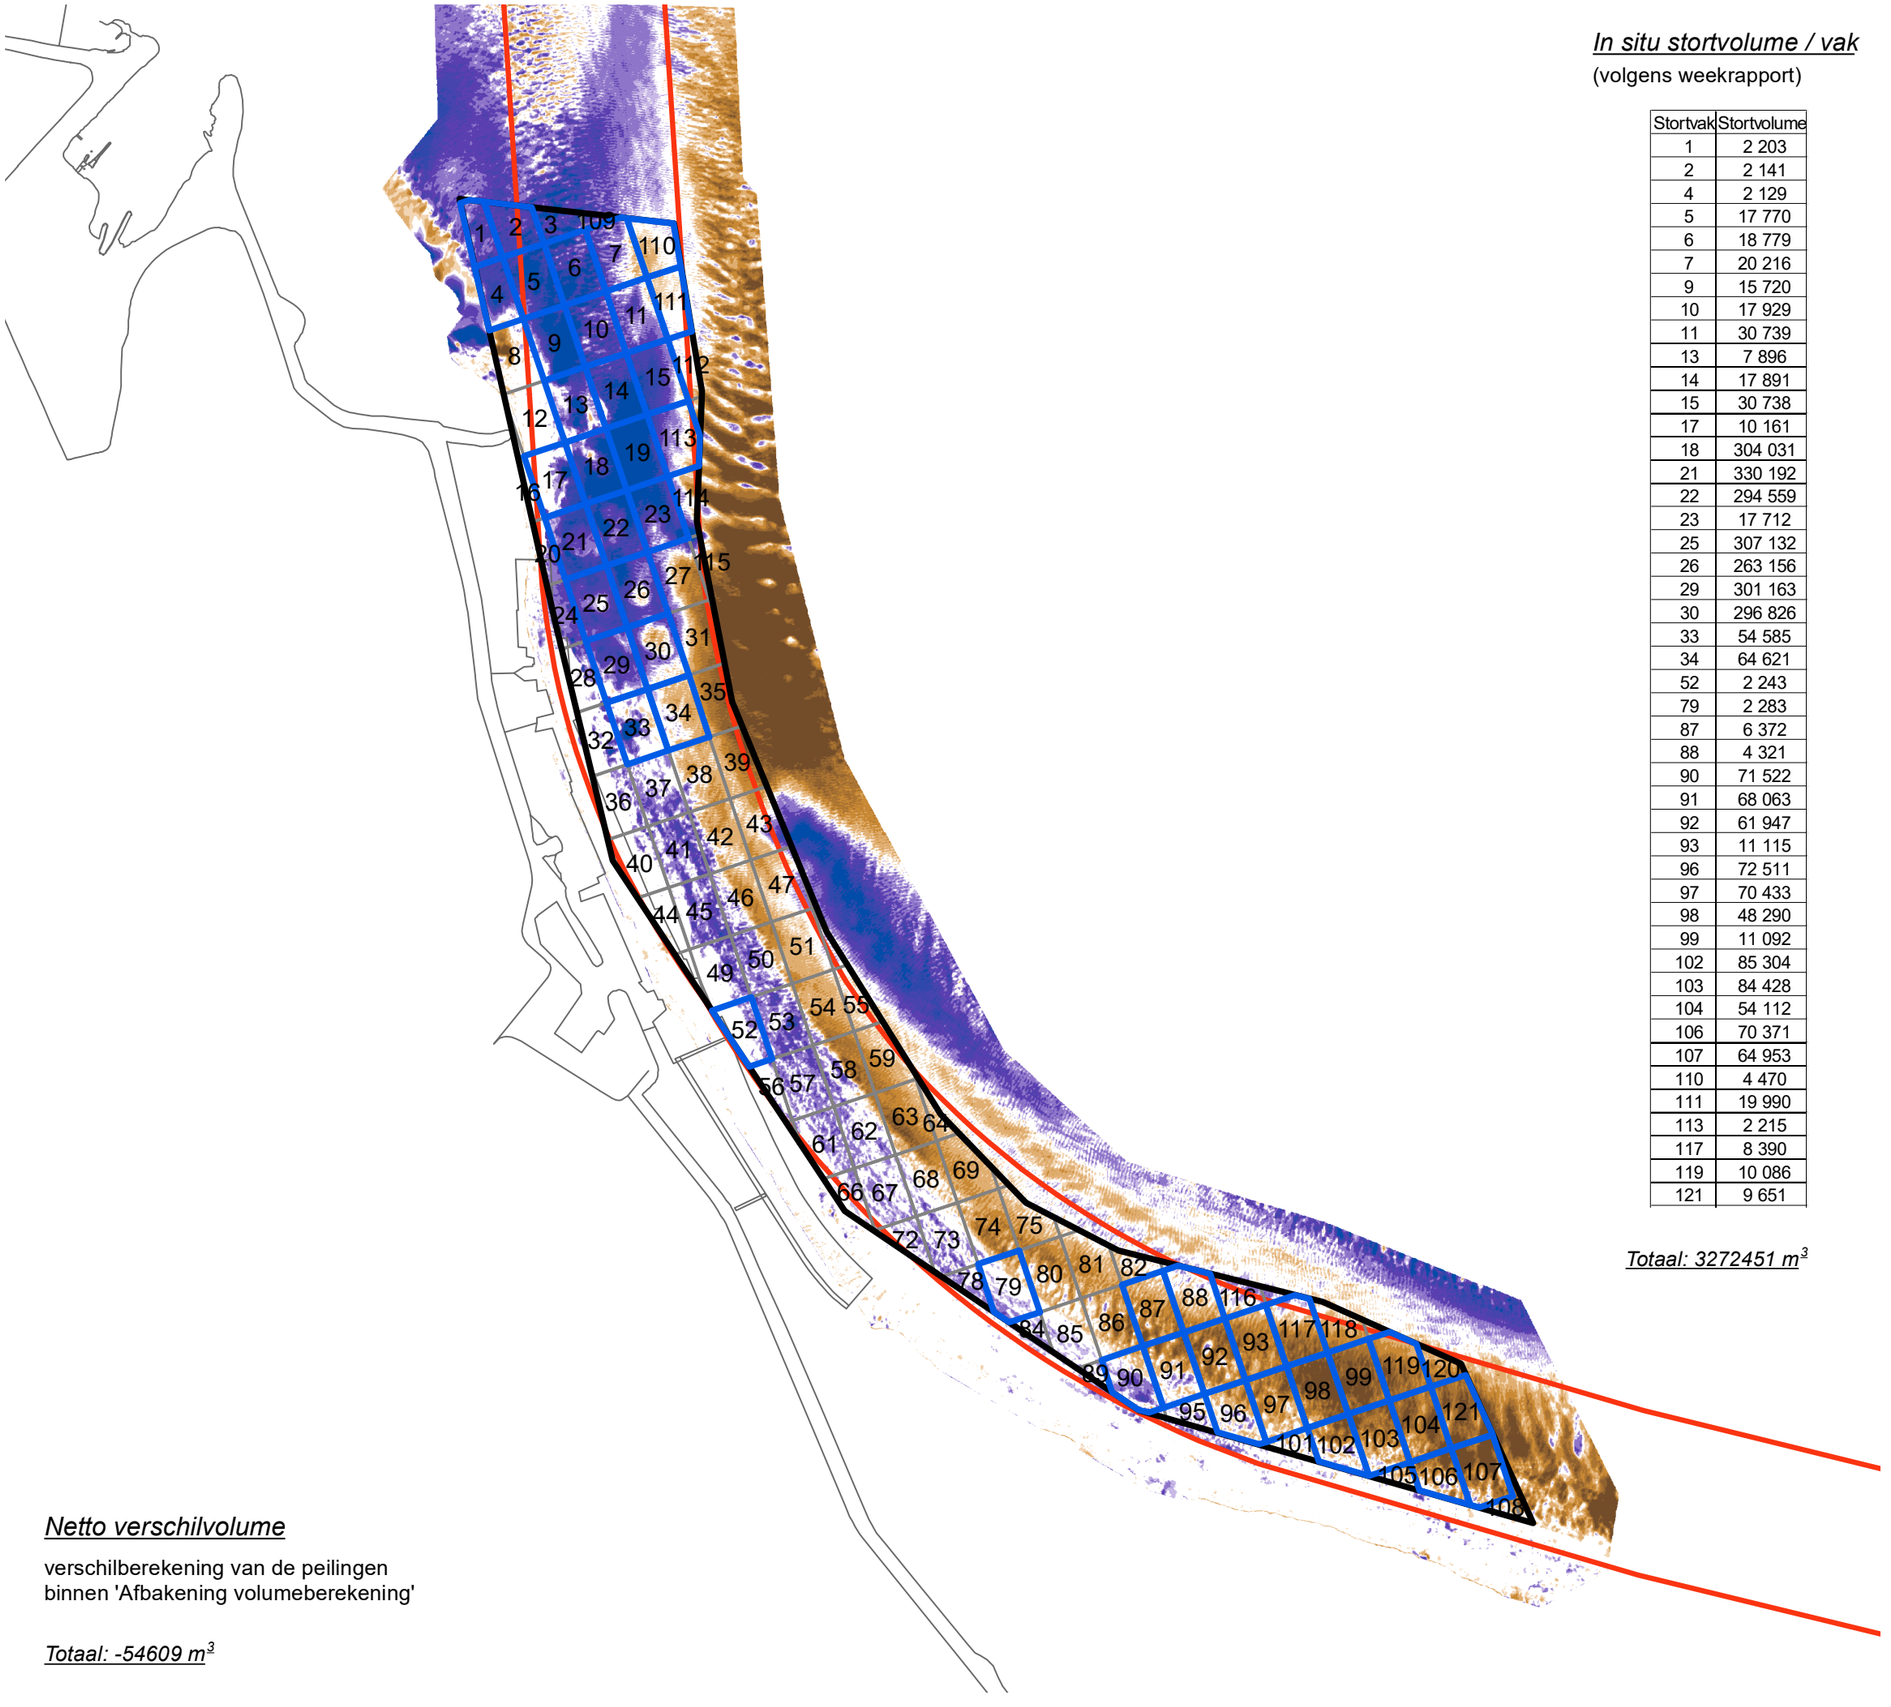

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
1	2 203
2	2 141
4	2 129
5	17 770
6	18 779
7	20 216
9	15 720
10	17 929
11	30 739
13	7 896
14	17 891
15	30 738
17	10 161
18	304 031
21	330 192
22	294 559
23	17 712
25	307 132
26	263 156
29	301 163
30	296 826
33	54 585
34	64 621
52	2 243
79	2 283
87	6 372
88	4 321
90	71 522
91	68 063
92	61 947
93	11 115
96	72 511
97	70 433
98	48 290
99	11 092
102	85 304
103	84 428
104	54 112
106	70 371
107	64 953
110	4 470
111	19 990
113	2 215
117	8 390
119	10 086
121	9 651

Totaal: 3272451 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -54609 m³

VLAAMSE OVERHEID

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH51

07/01/2021 (T0) - 23/05/2025 (T5)

11640_SH51_VT5-T0
Rapport nr. 25.152



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende


- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	verdieping
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

0 300 600 900 1200

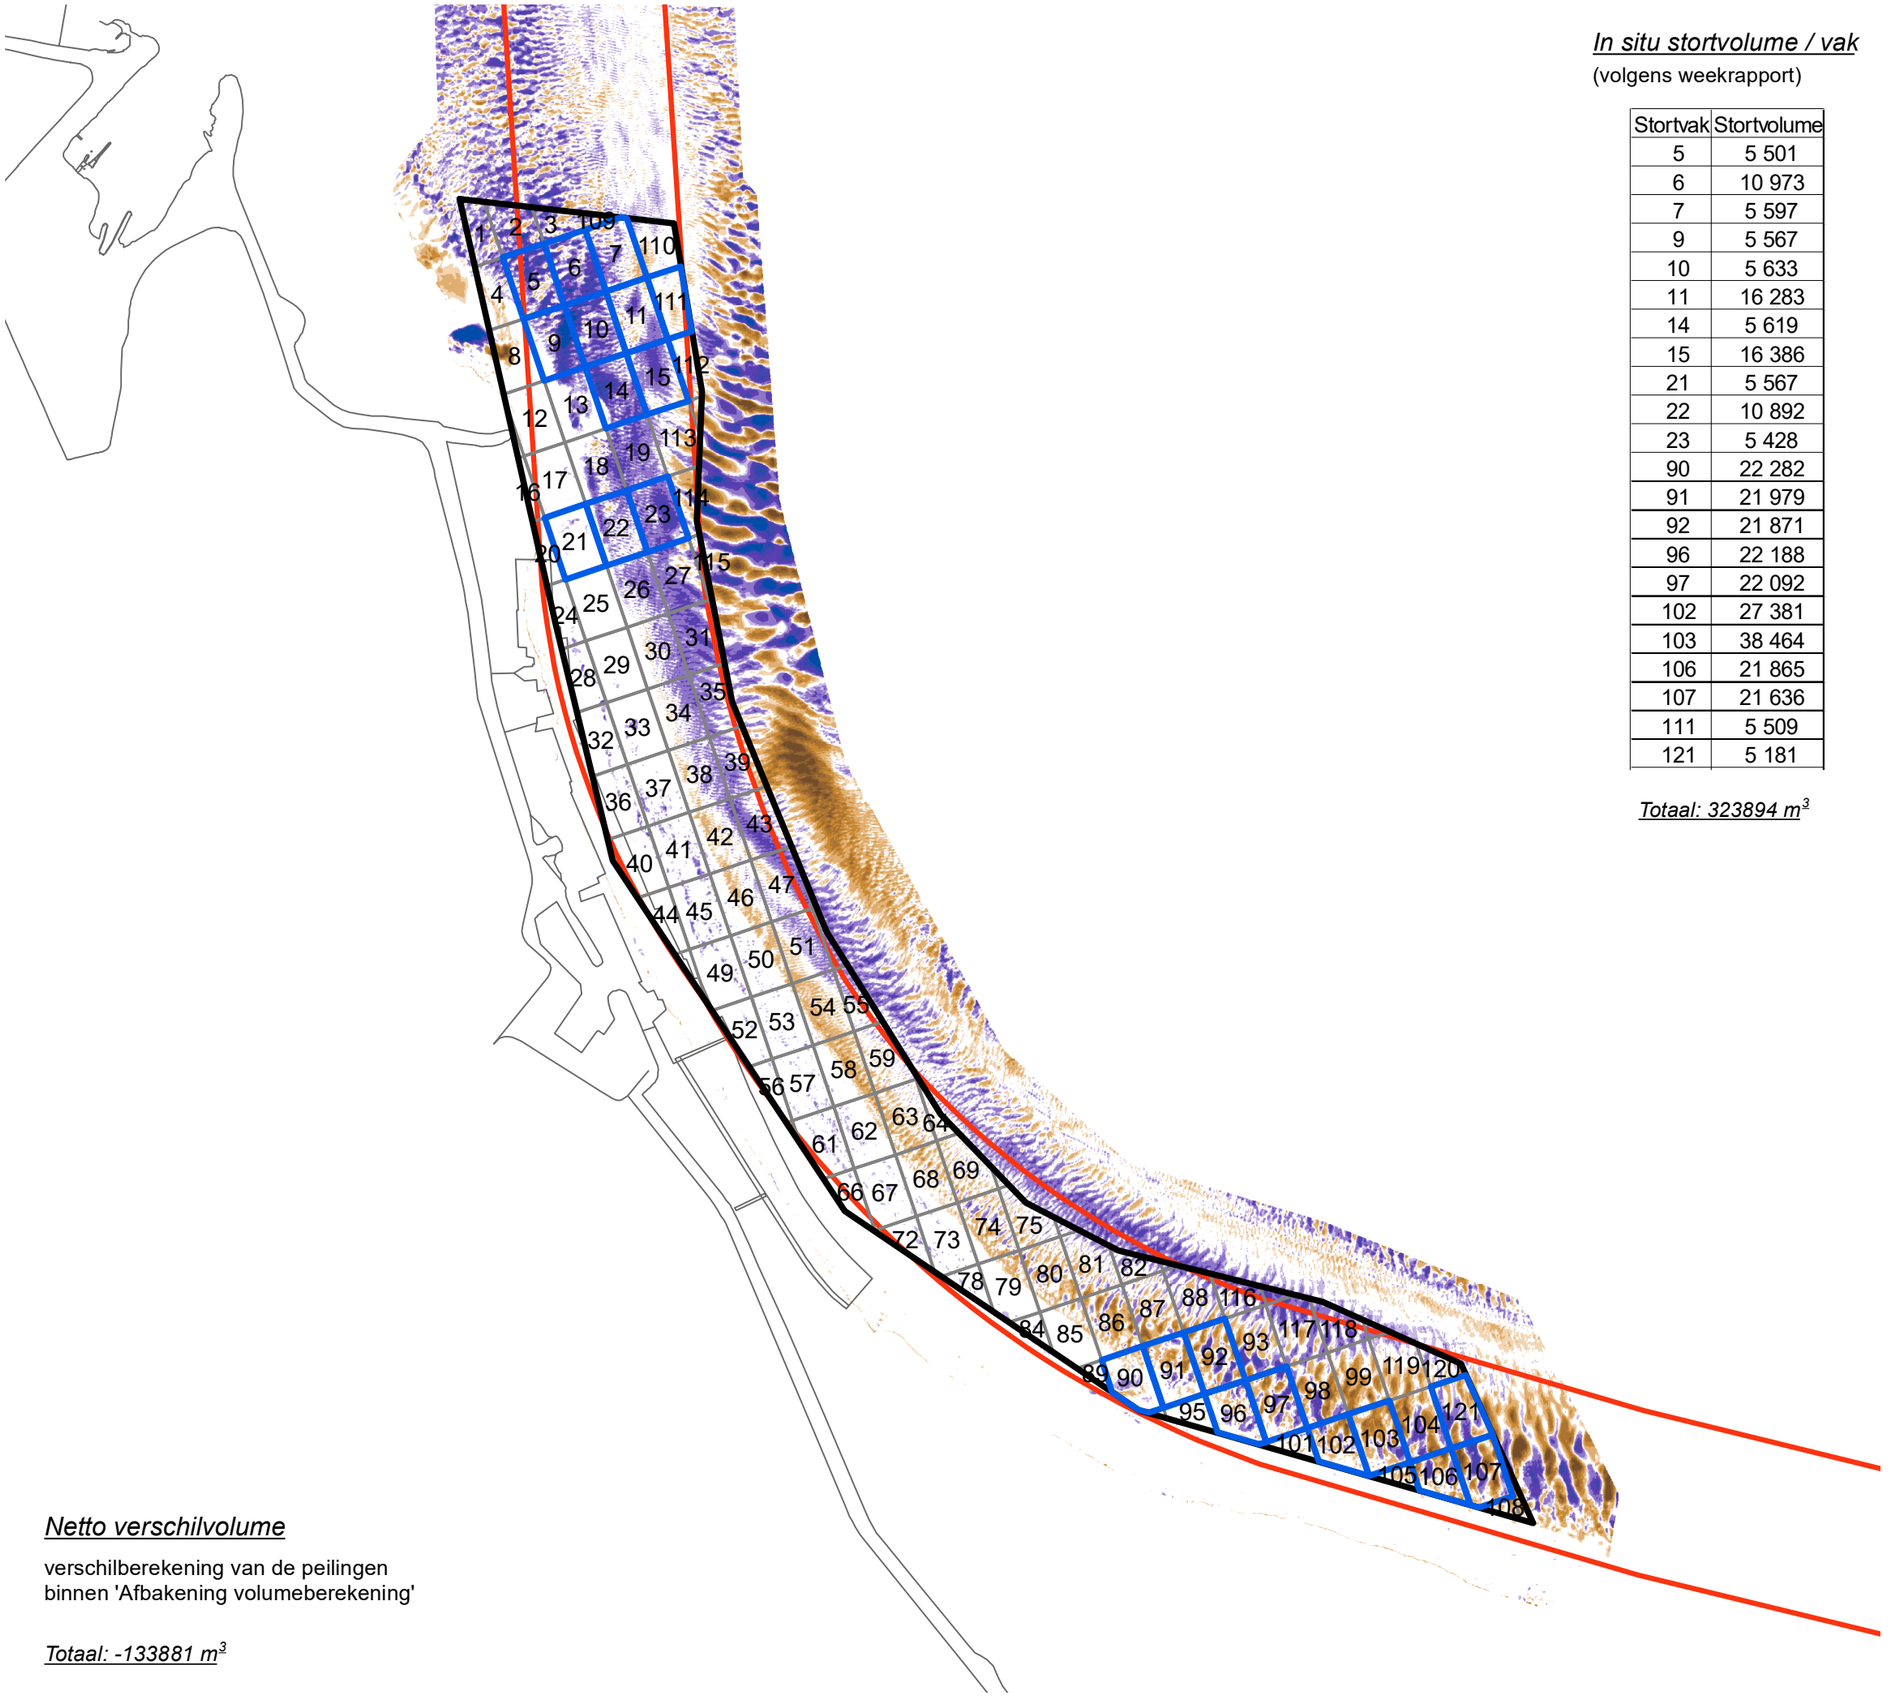

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
5	5 501
6	10 973
7	5 597
9	5 567
10	5 633
11	16 283
14	5 619
15	16 386
21	5 567
22	10 892
23	5 428
90	22 282
91	21 979
92	21 871
96	22 188
97	22 092
102	27 381
103	38 464
106	21 865
107	21 636
111	5 509
121	5 181

Totaal: 323894 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -133881 m³

VLAAMSE OVERHEID

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH51

30/01/2025 (T4) - 23/05/2025 (T5)

11640_SH51_VT5-T4
Rapport nr. 25.152



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m


verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50

- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N W E S

0 300 600 900 1200

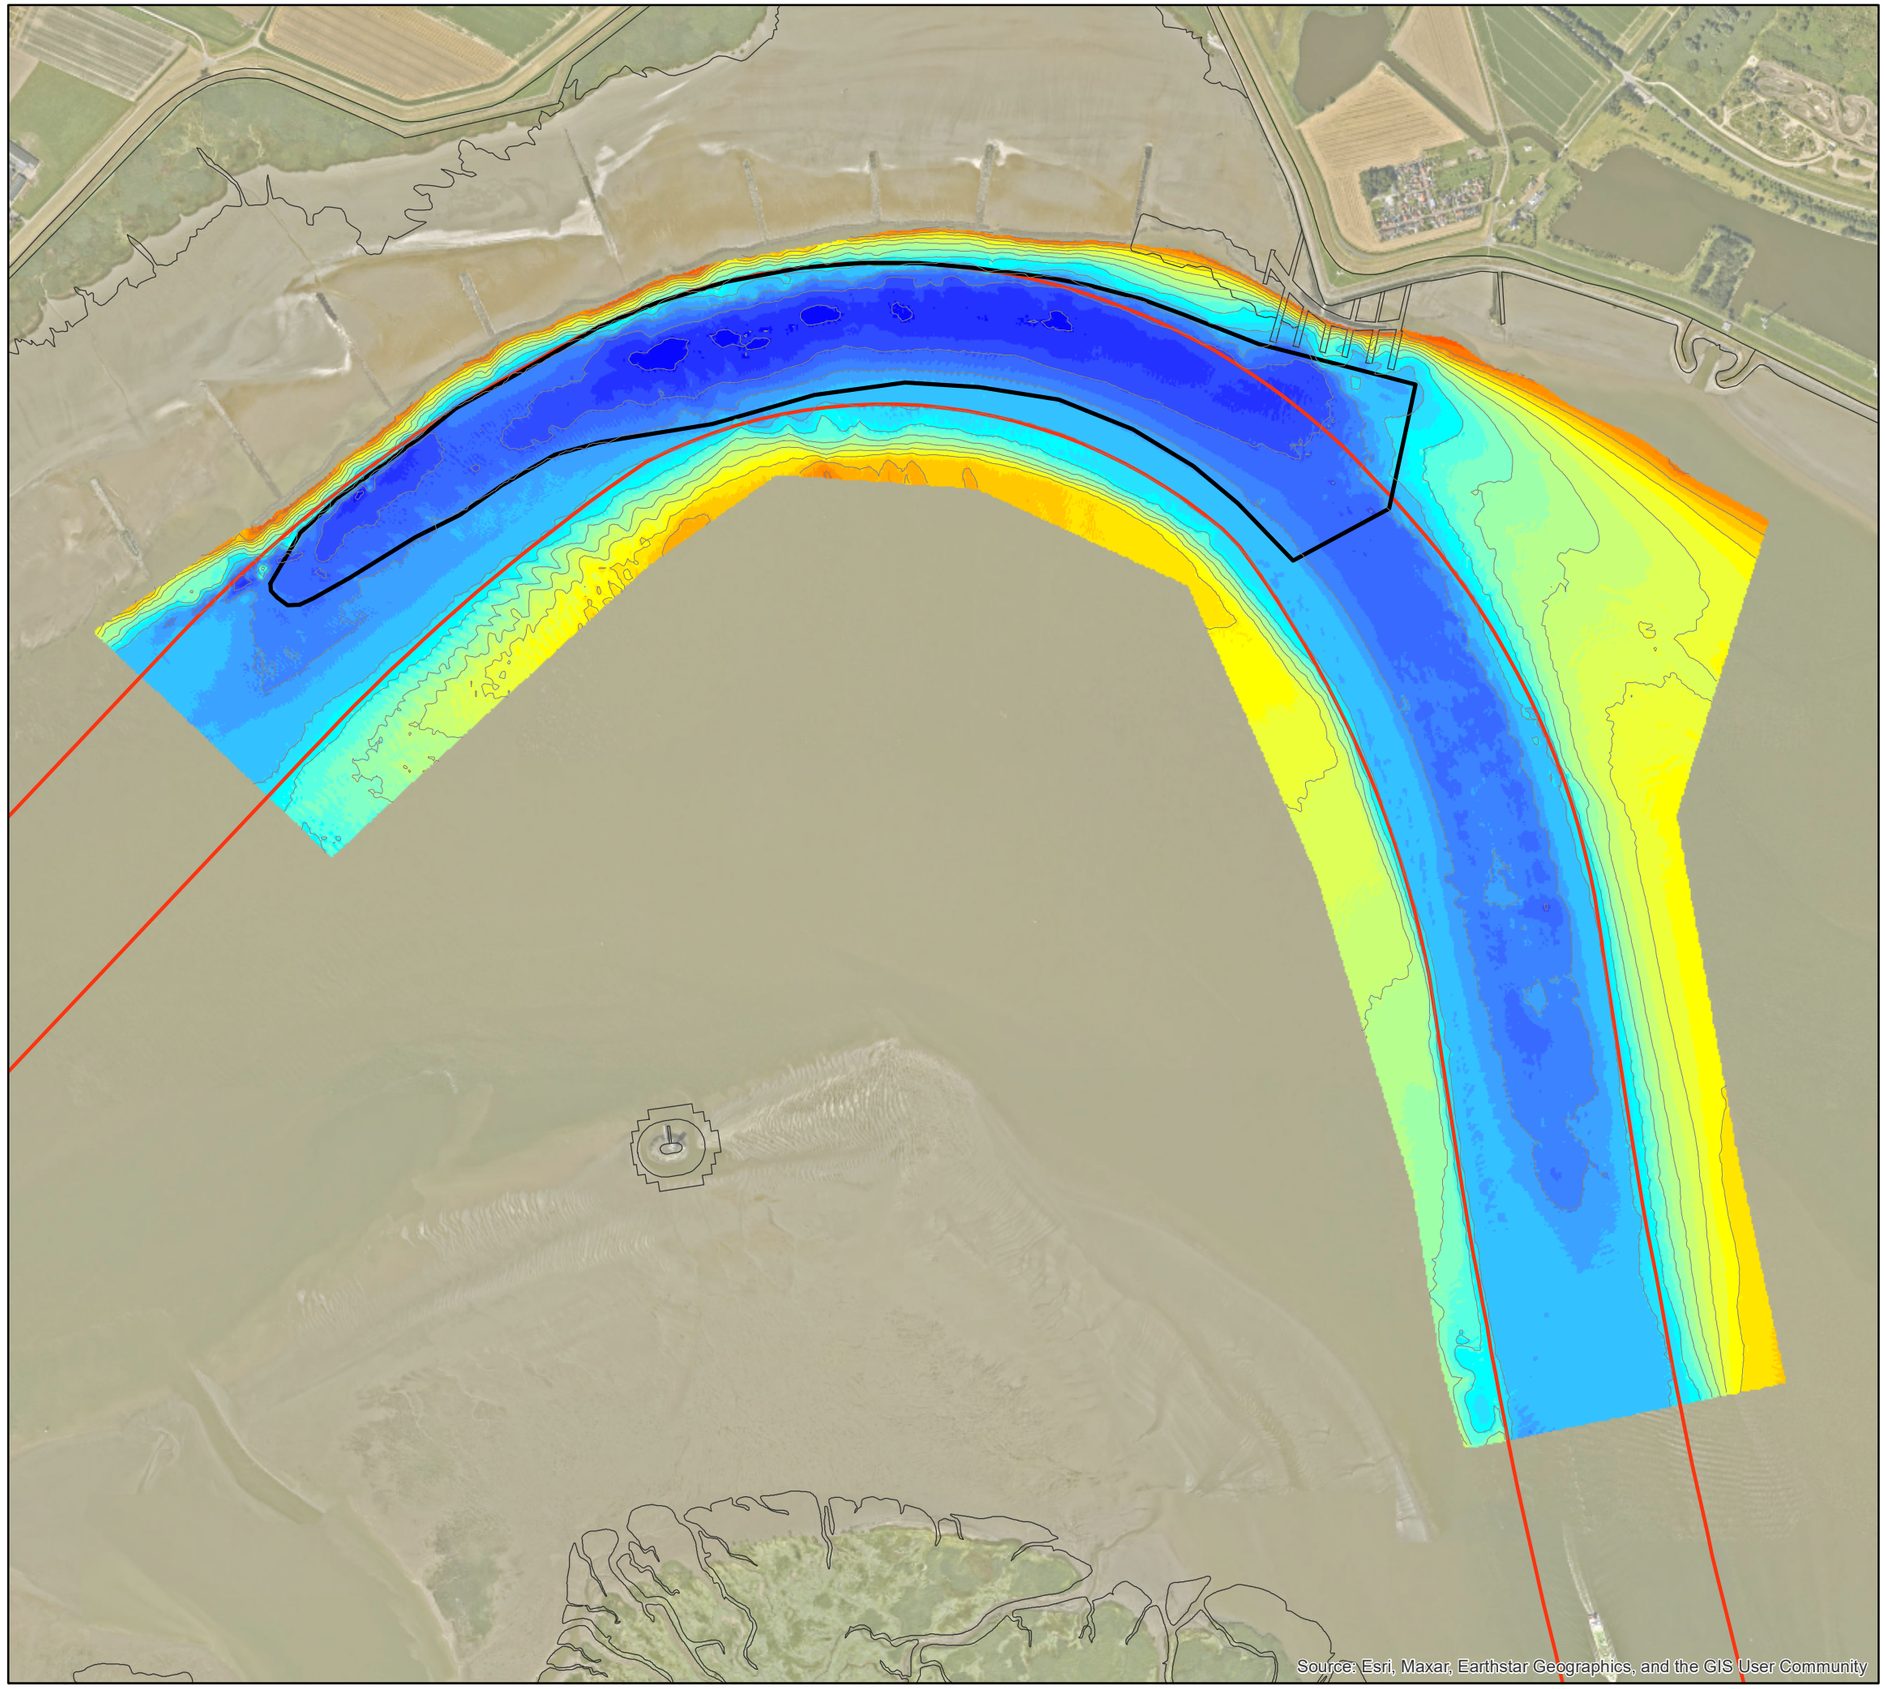

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SH61

02/06/2025 (T22)

11640_SH61_BT22
Rapport nr. 25.152



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

Diepte in m [NAP]

- 0.09 - 1.00
- 1.01 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00

N
W E
S

0 150 300 450 600

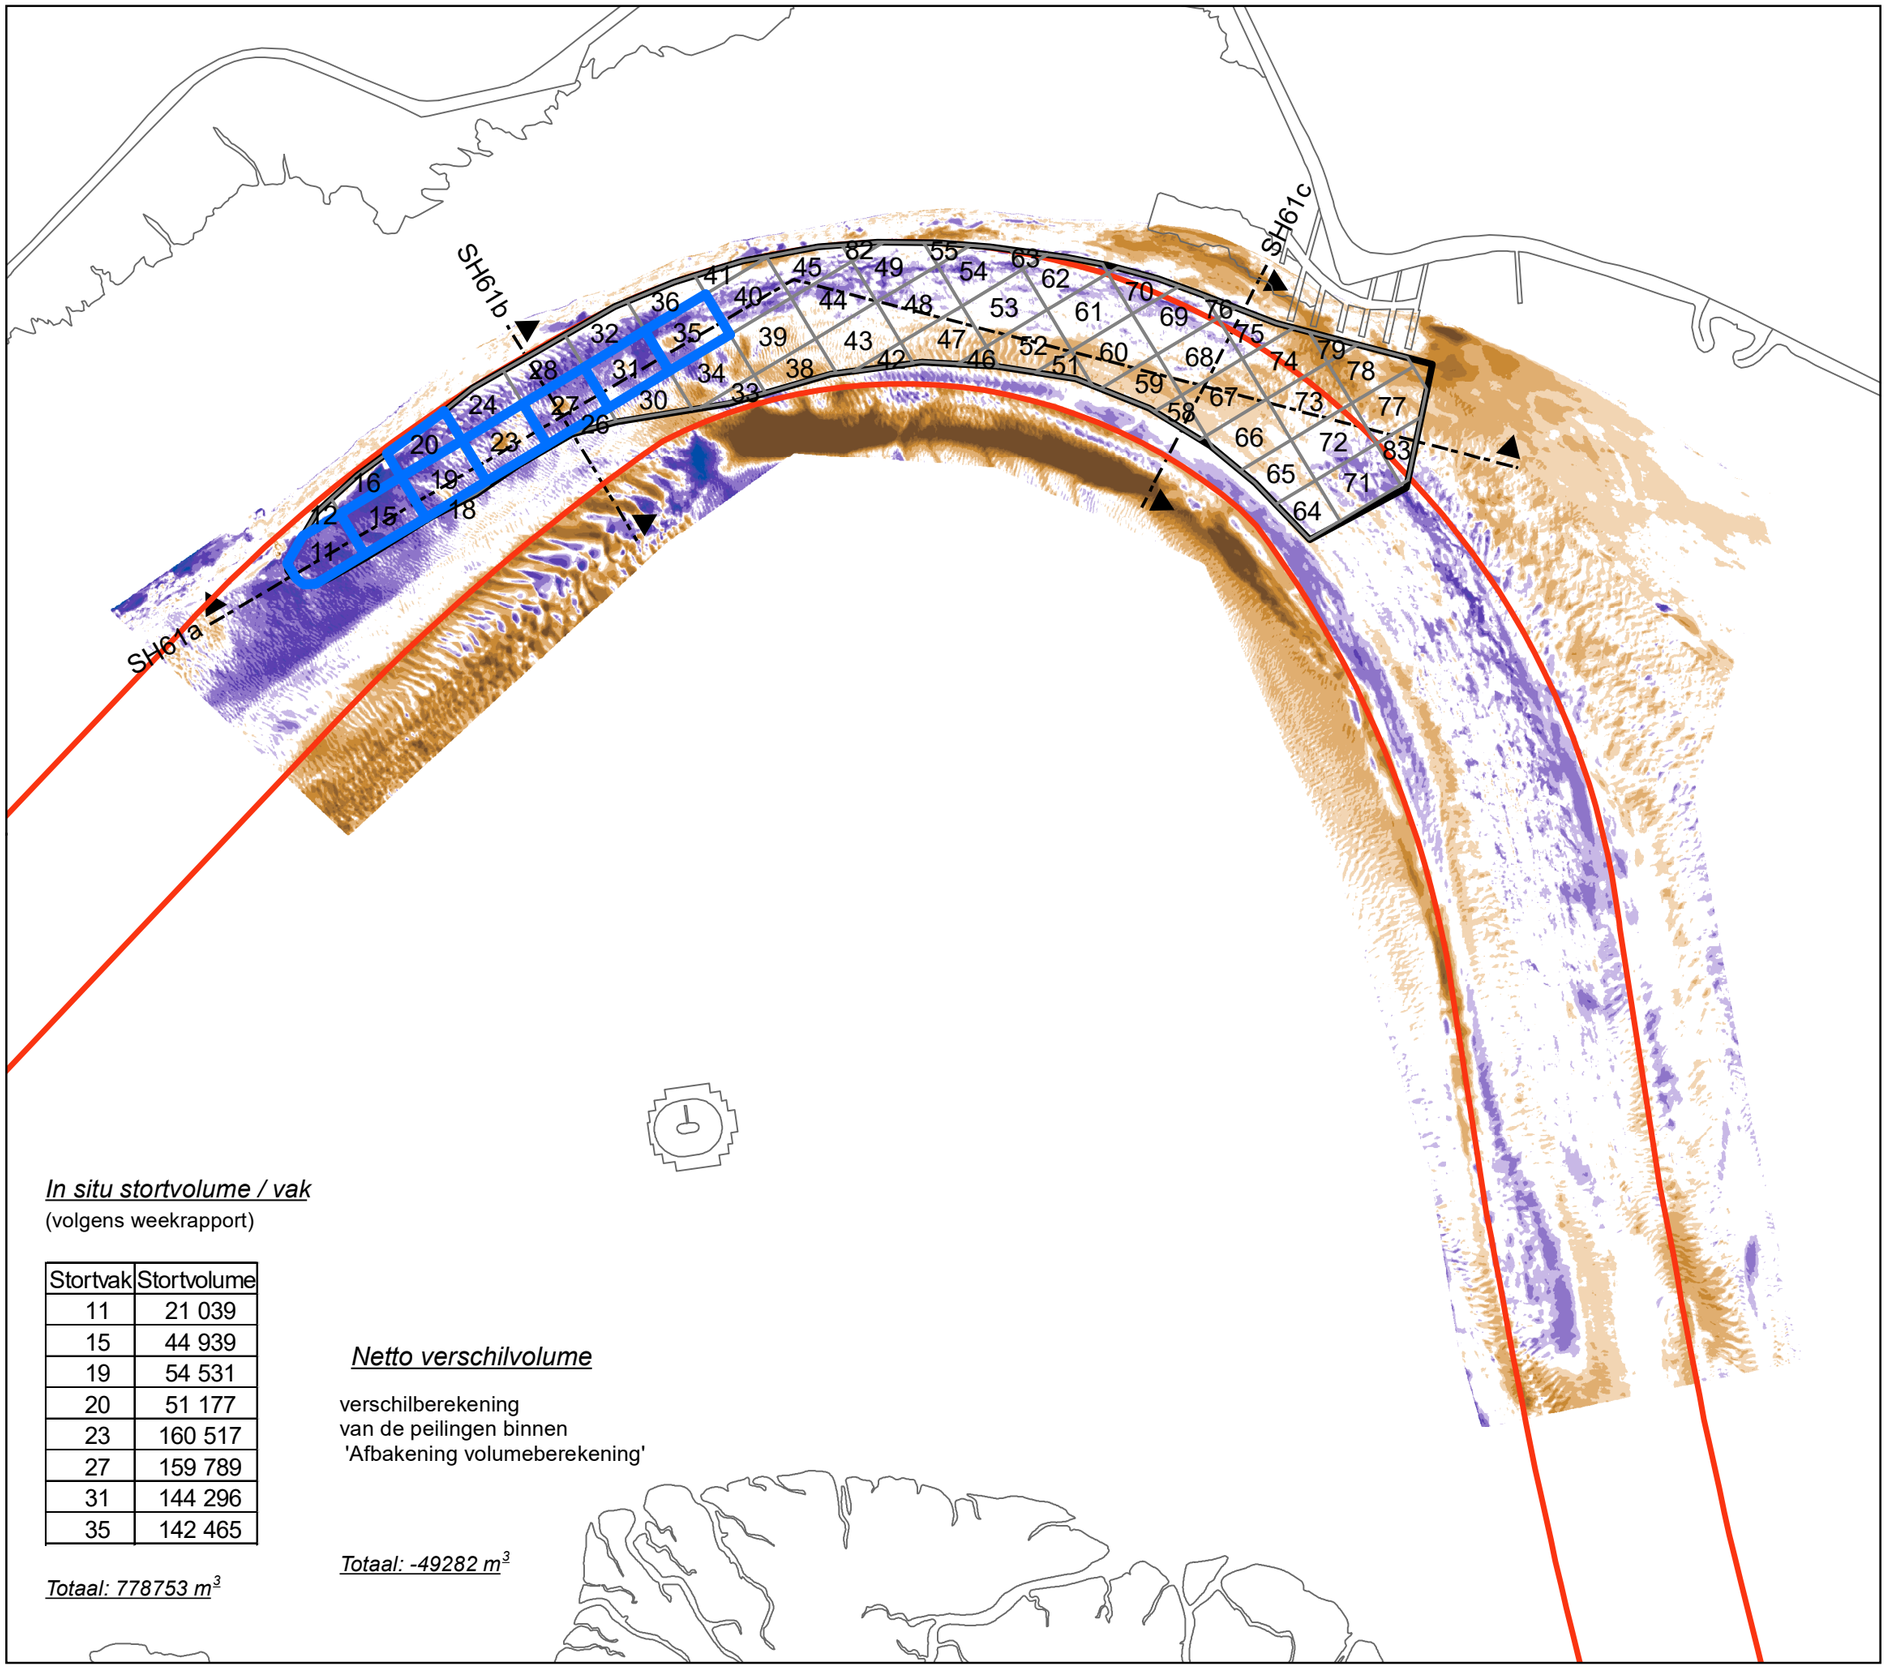

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
11	21 039
15	44 939
19	54 531
20	51 177
23	160 517
27	159 789
31	144 296
35	142 465

Totaal: 778753 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -49282 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang


Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025
Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH61

02/06/2025 (T22) - 08/03/2021 (T0)

11640_SH61_VT22-T0
Rapport nr. 25.152



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende


- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N W E S

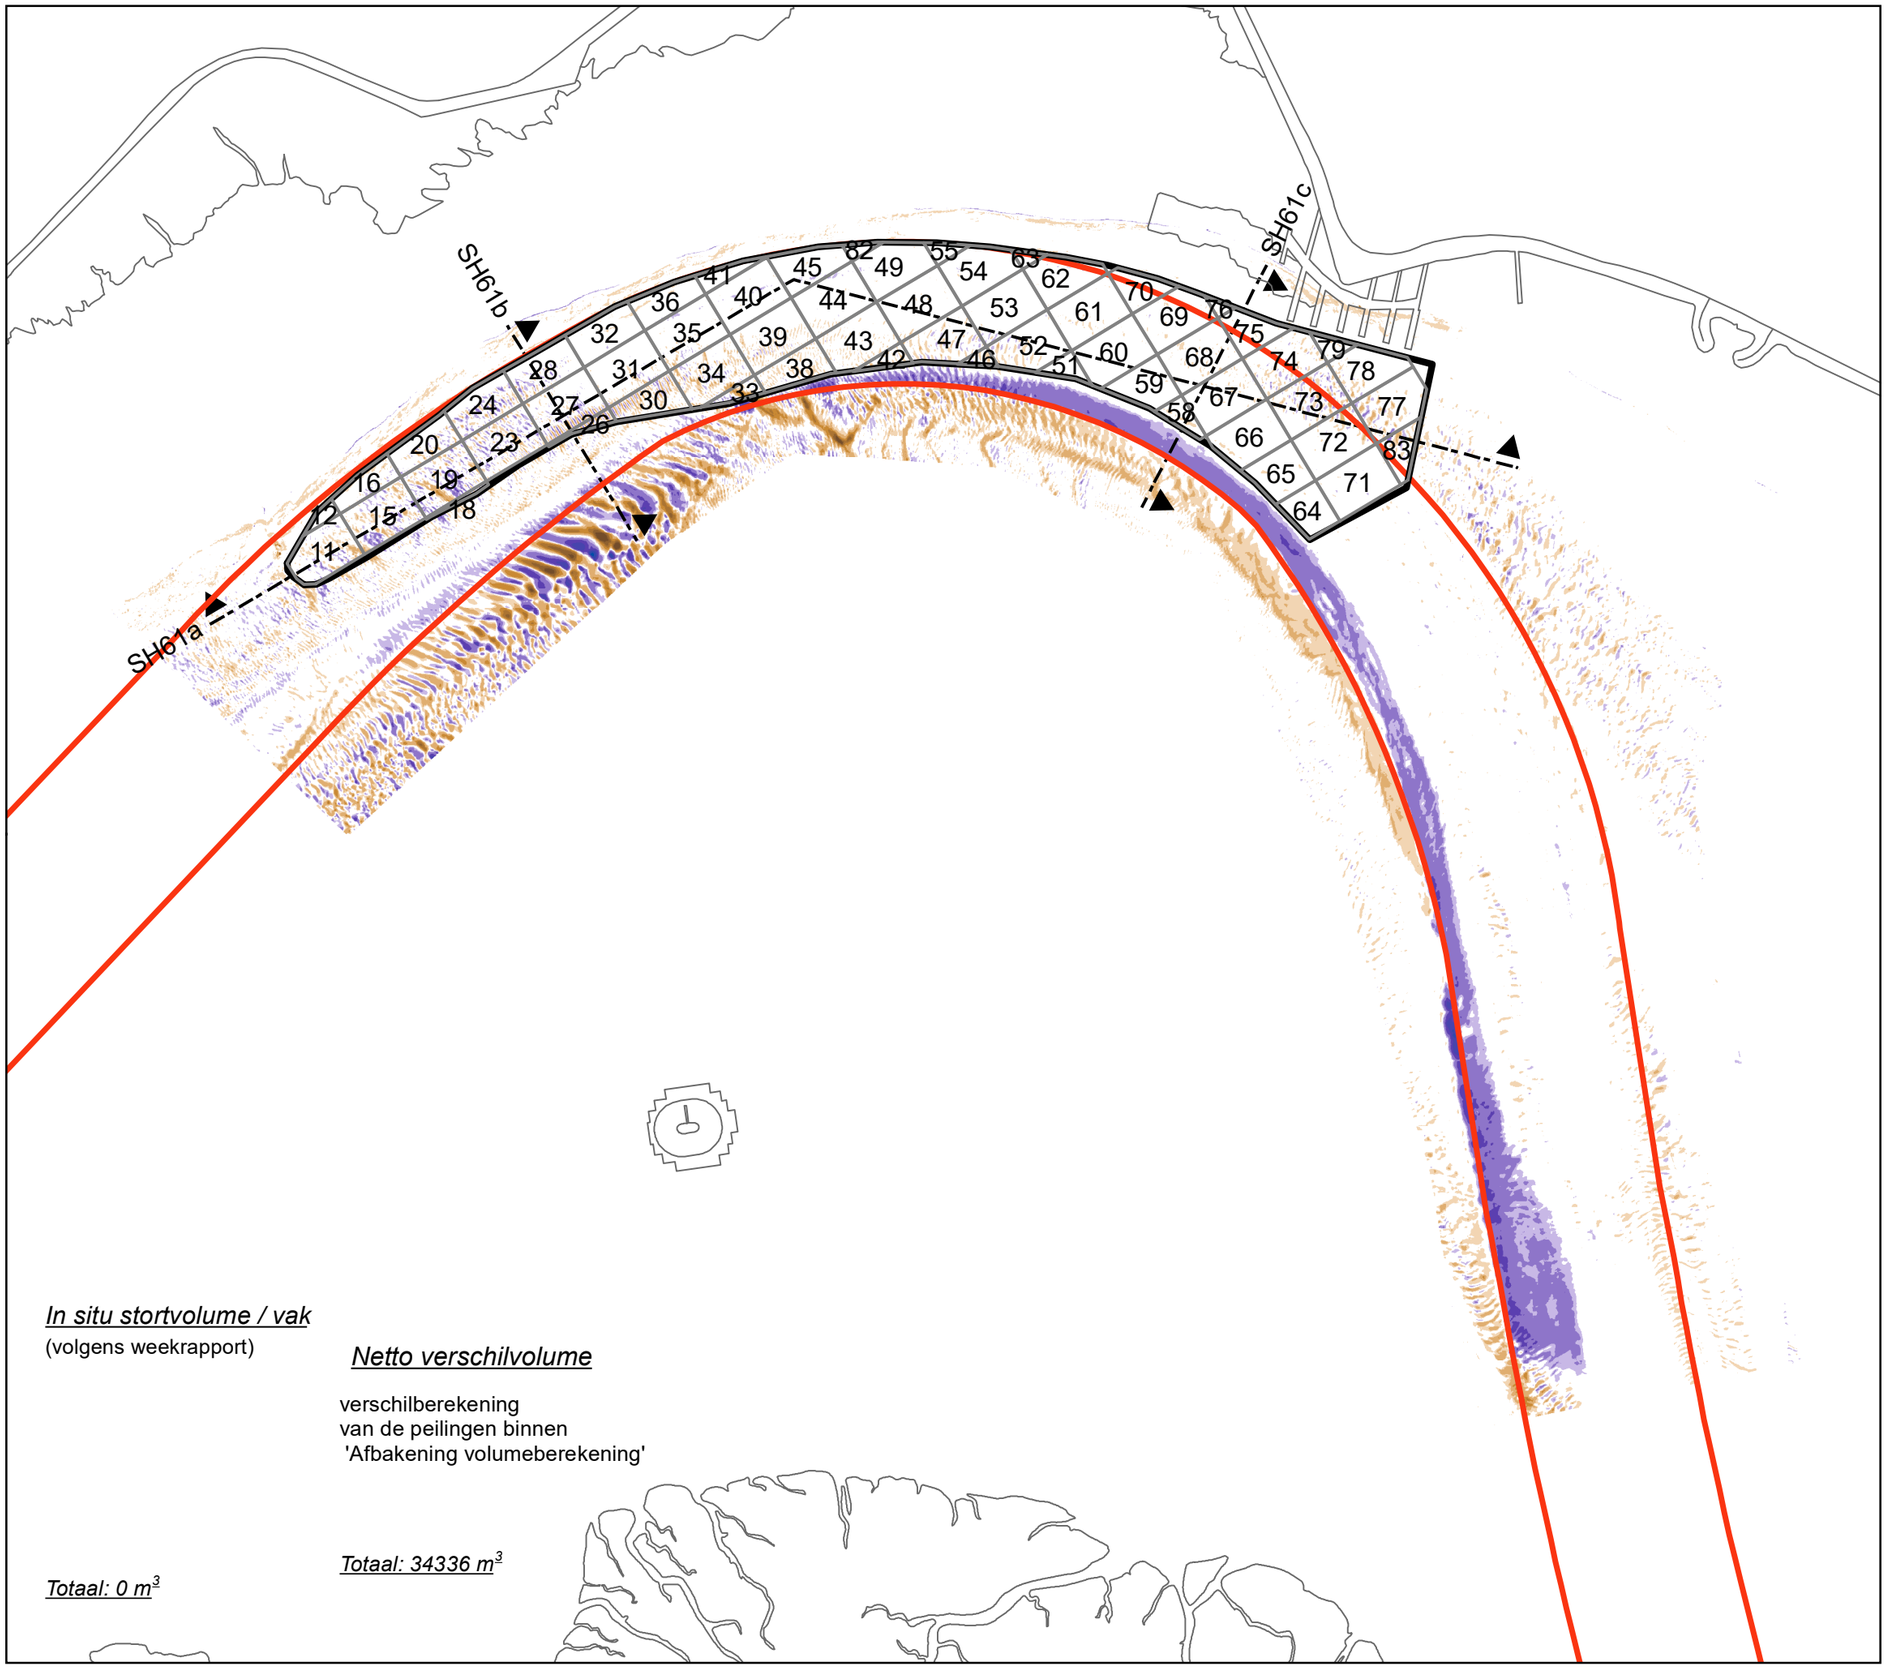

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Totaal: 0 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 34336 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH61

08/04/2025 (T21) - 02/06/2025 (T22)

11640_SH61_VT22-T21
Rapport nr. 25.152



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	verdieping
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W
E
S

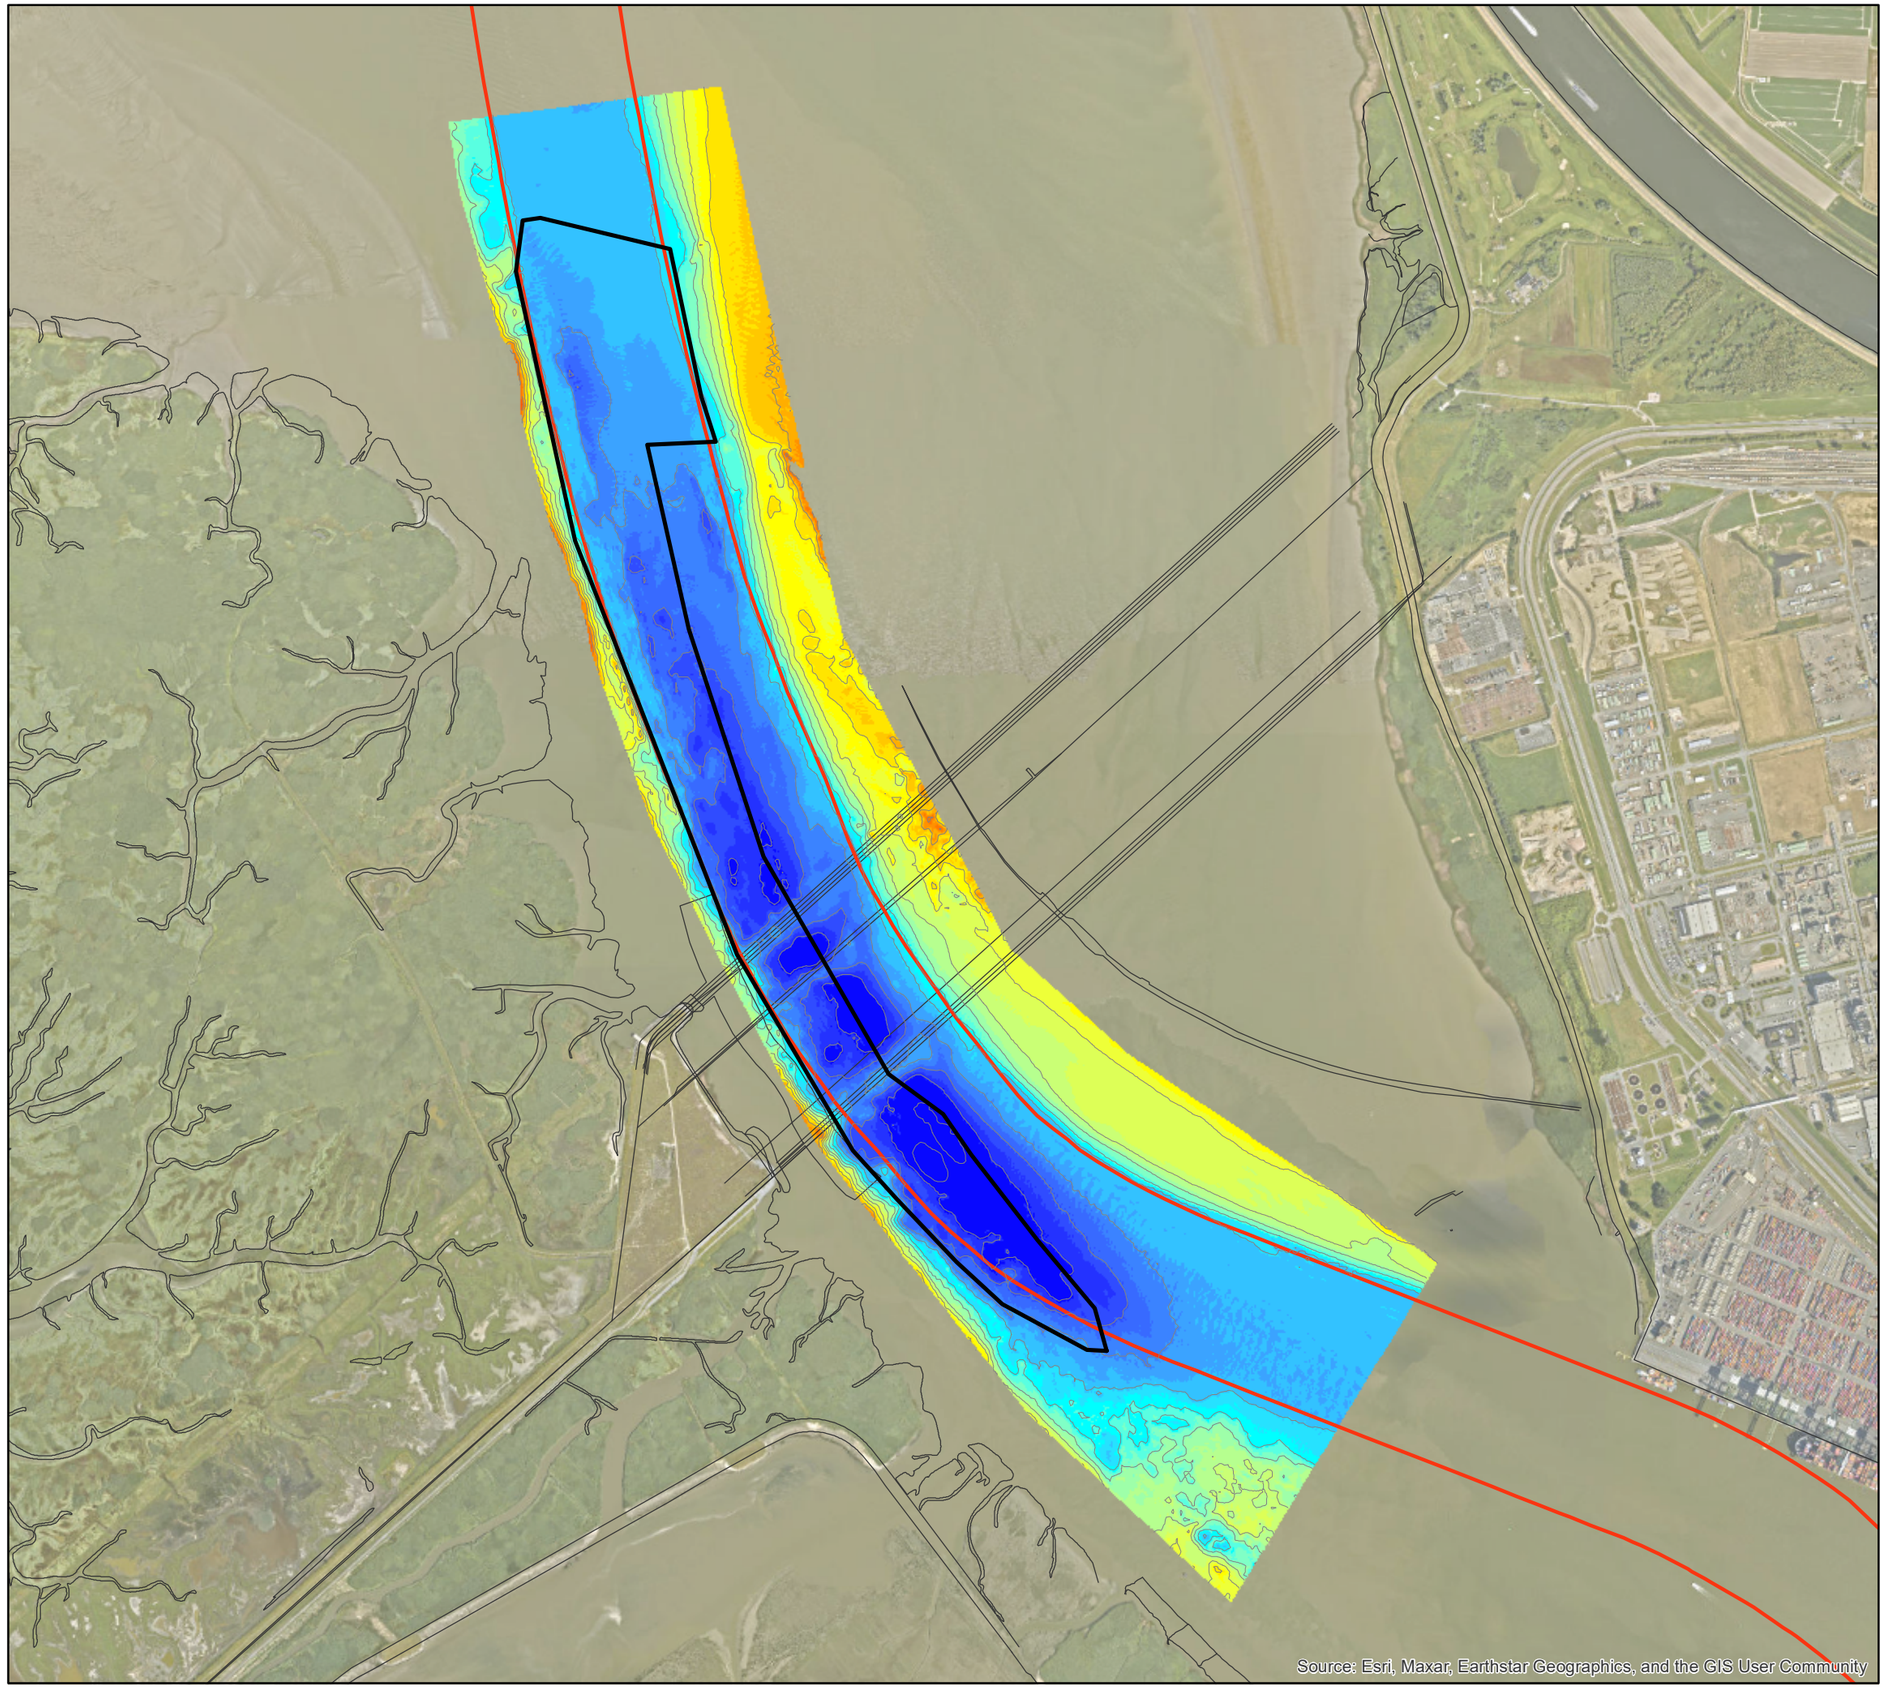

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SH71


03/06/2025 (T42)

11640_SH71_BT42
Rapport nr. 25.152



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

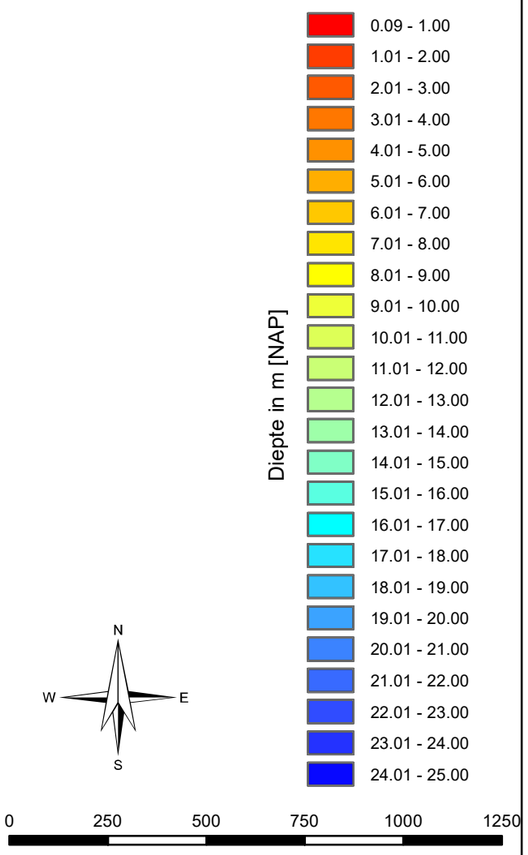

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
1	55 933
2	35 561
4	71 246
5	6 833
21	16 712
22	299 123
23	49 433
24	20 003
25	305 052
26	56 501
28	335 152
29	259 066
32	49 111
46	2 192
47	45 762
50	4 384
51	43 037
52	2 255
53	66 462
56	11 195
57	7 812
59	15 519
60	2 198
62	5 516
63	7 717
64	2 152
65	2 266
67	9 807
68	2 186
69	2 192
73	9 935
74	11 778
77	2 238
78	2 158
79	2 181

Totaal: 1820668 m³

SH71a

SH71b

SH71c

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 37165 m³

VLAAMSE OVERHEID

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH71

07/01/2021 (T0) - 03/06/2025 (T42)

11640_SH71_VT42-T0
Rapport nr. 25.152



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N W E S

0 200 400 600 800 1000

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
21	5 523
22	11 317
25	10 973
26	5 575
28	4 721
29	4 540
51	5 553
53	5 472
57	5 626
59	11 186
62	5 516
63	5 531
67	5 309
73	5 516
74	5 531

Totaal: 97889 m³

SH71a

SH71b

SH71c

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 77671 m³

VLAAMSE OVERHEID

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH71

06/02/2025 (T41) - 03/06/2025 (T42)

11640_SH71_VT42-T41
Rapport nr. 25.152



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken


verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N
W
E
S

A.5 Kaartmateriaal augustus en september 2025

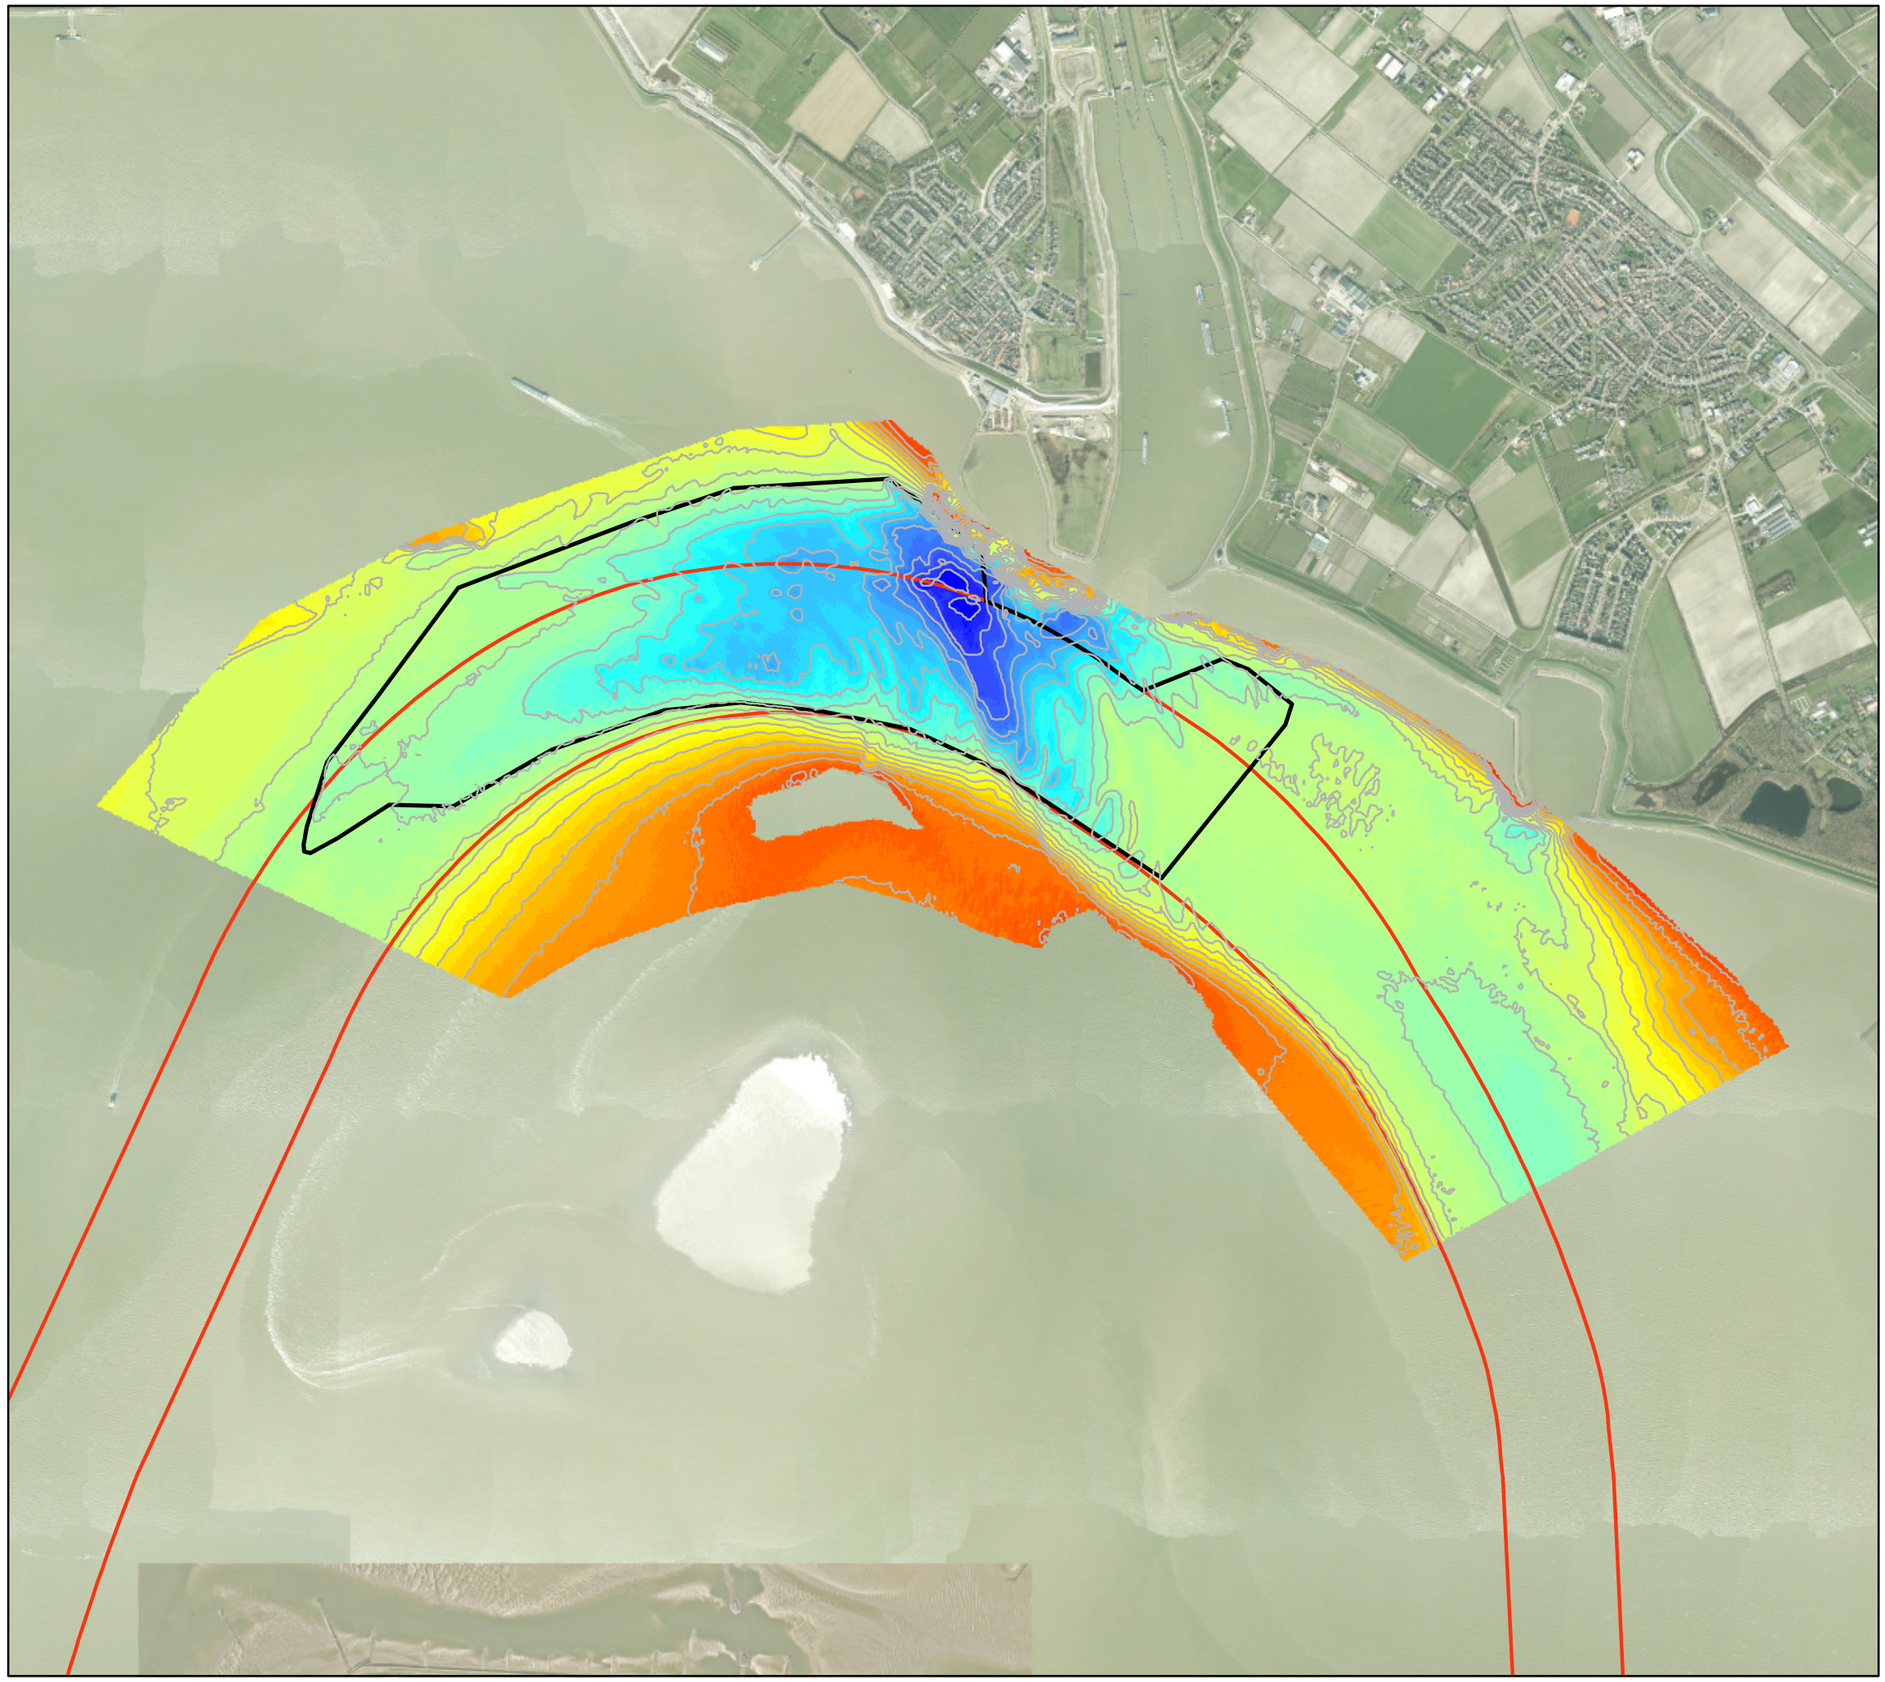

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang


Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025
Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart Put van Hansweert

24/07/2025 (T91)

11640_PVH_BT91
Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

Diepte in m [NAP]

1.61 - 2.00	19.01 - 20.00
2.01 - 3.00	20.01 - 21.00
3.01 - 4.00	21.01 - 22.00
4.01 - 5.00	22.01 - 23.00
5.01 - 6.00	23.01 - 24.00
6.01 - 7.00	24.01 - 25.00
7.01 - 8.00	25.01 - 26.00
8.01 - 9.00	26.01 - 27.00
9.01 - 10.00	27.01 - 28.00
10.01 - 11.00	28.01 - 29.00
11.01 - 12.00	29.01 - 30.00
12.01 - 13.00	30.01 - 31.00
13.01 - 14.00	31.01 - 32.00
14.01 - 15.00	32.01 - 33.00
15.01 - 16.00	33.01 - 34.00
16.01 - 17.00	34.01 - 35.00
17.01 - 18.00	35.01 - 36.00
18.01 - 19.00	36.01 - 37.00

N
W E
S

0 200 400 600 800 1000 m

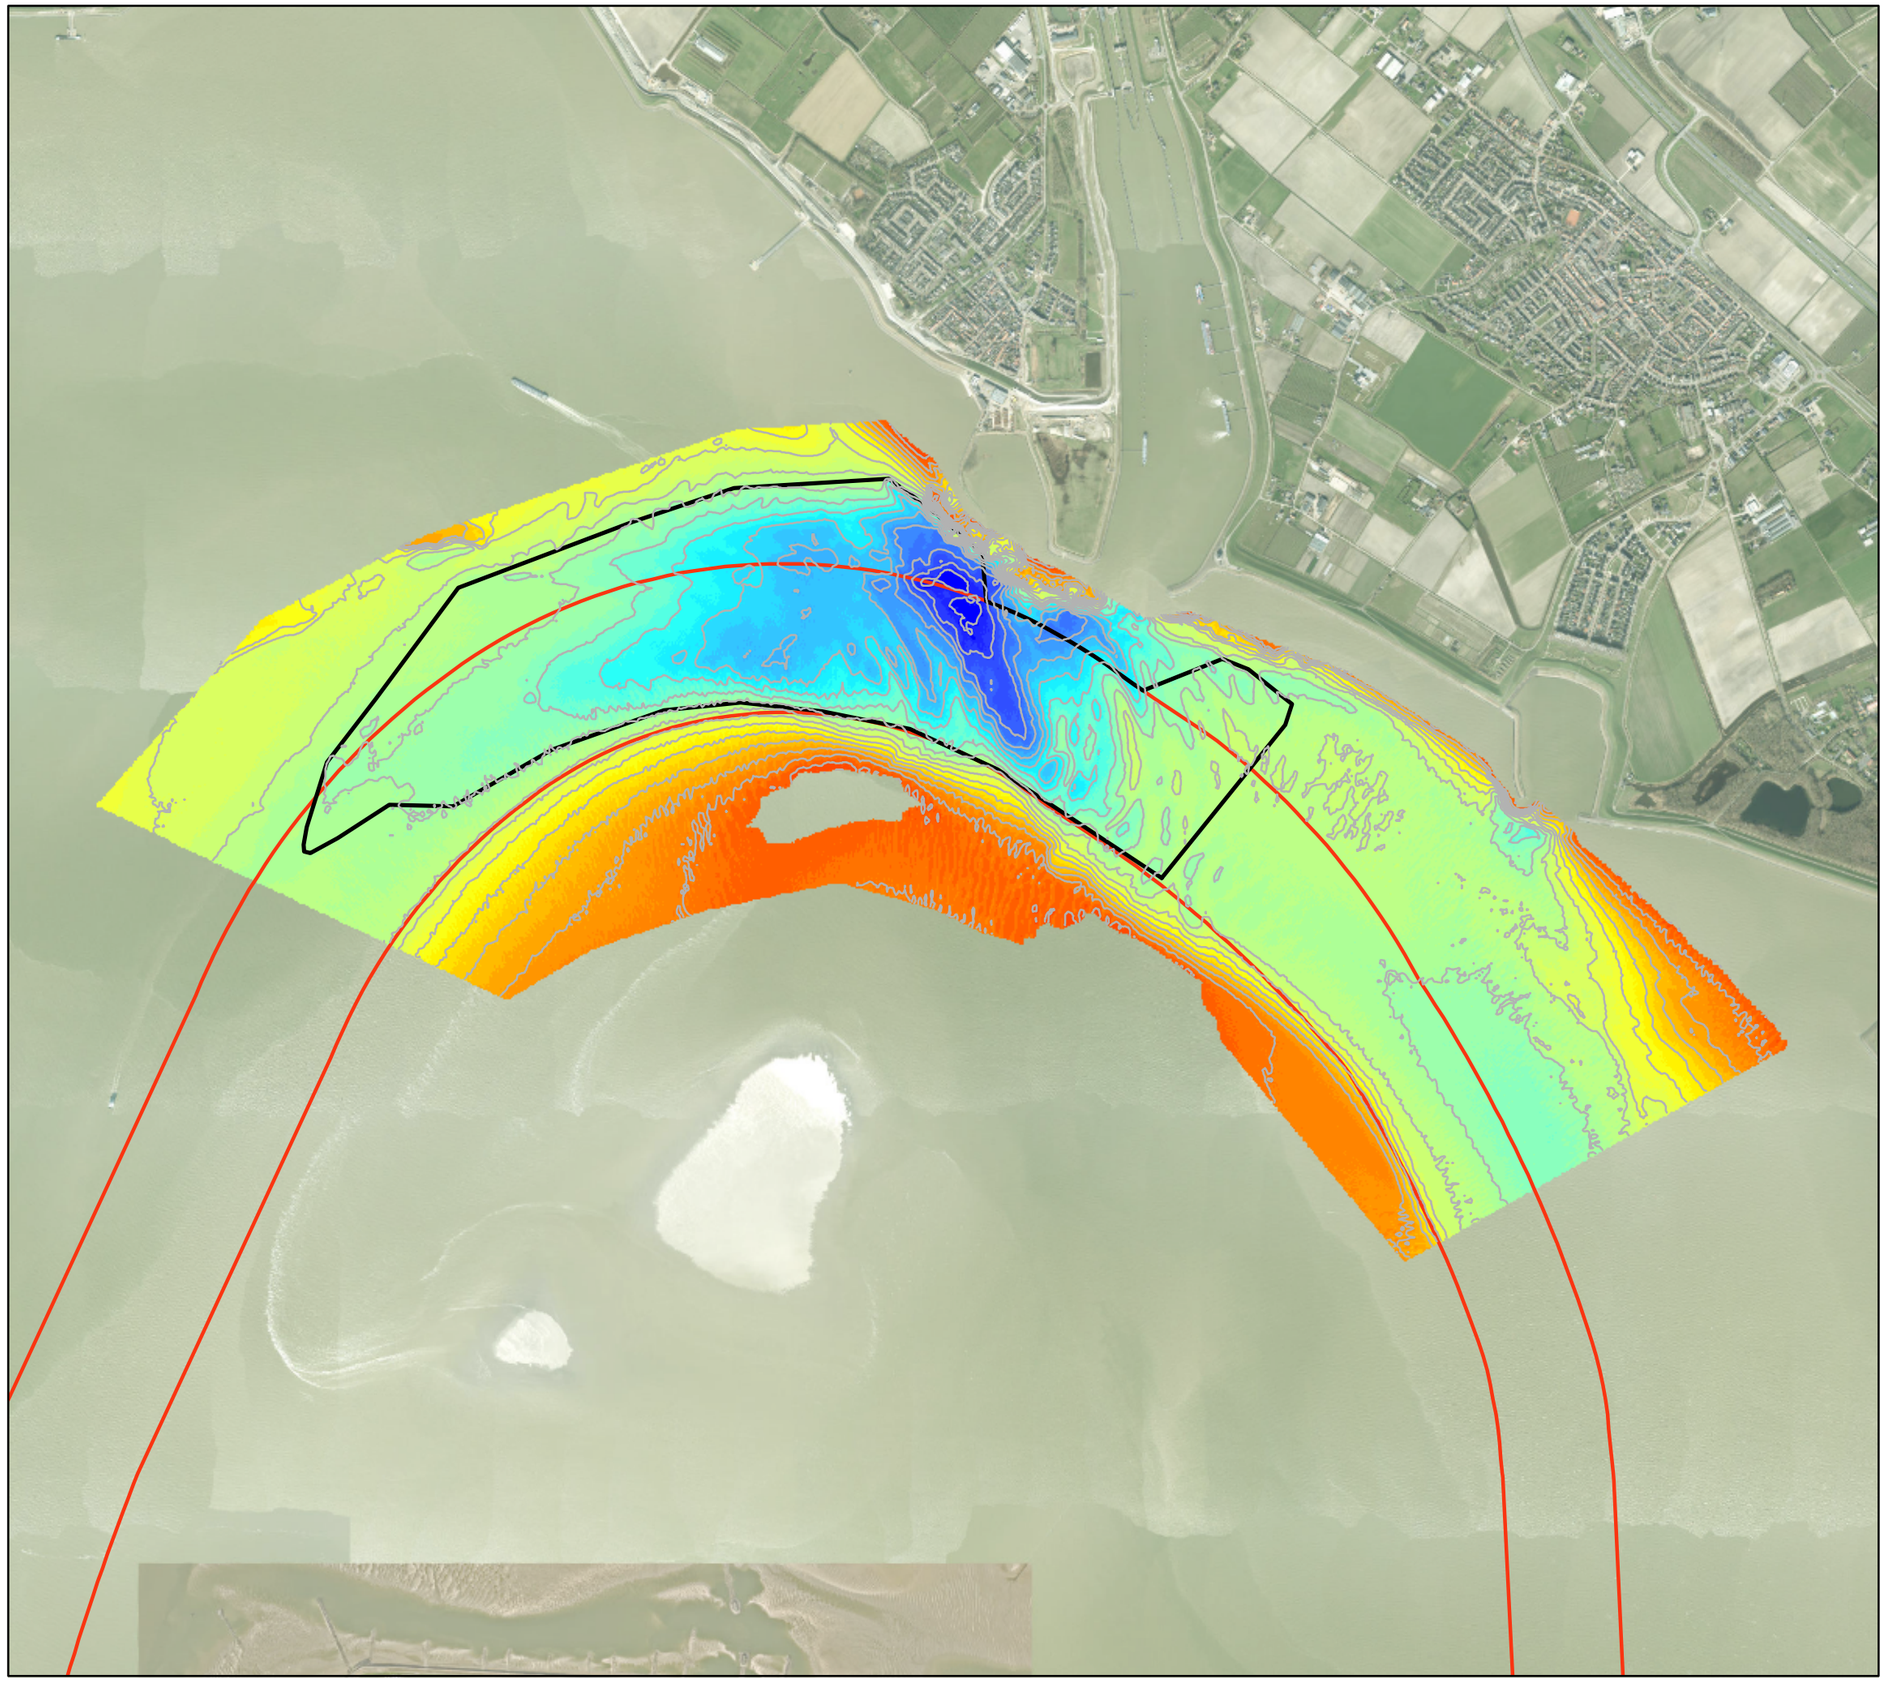

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart Put van Hansweert

21/09/2025 (T92)

11640_PVH_BT92
Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

Diepte in m [NAP]

1.61 - 2.00	19.01 - 20.00
2.01 - 3.00	20.01 - 21.00
3.01 - 4.00	21.01 - 22.00
4.01 - 5.00	22.01 - 23.00
5.01 - 6.00	23.01 - 24.00
6.01 - 7.00	24.01 - 25.00
7.01 - 8.00	25.01 - 26.00
8.01 - 9.00	26.01 - 27.00
9.01 - 10.00	27.01 - 28.00
10.01 - 11.00	28.01 - 29.00
11.01 - 12.00	29.01 - 30.00
12.01 - 13.00	30.01 - 31.00
13.01 - 14.00	31.01 - 32.00
14.01 - 15.00	32.01 - 33.00
15.01 - 16.00	33.01 - 34.00
16.01 - 17.00	34.01 - 35.00
17.01 - 18.00	35.01 - 36.00
18.01 - 19.00	36.01 - 37.00

N
W E
S

0 200 400 600 800 1000 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)


Stortvak	Stortvolume
93	44 653
94	22 677
125	41 621
126	52 340
127	52 703
128	69 518
129	49 880
159	60 884
160	45 150
161	52 556
162	137 543
163	136 020
193	41 343
194	41 741
195	43 713
196	133 441
197	127 098
221	16 768
229	64 448
230	140 310
231	118 546
232	120 120
254	33 594
255	169 606
287	5 742
288	188 220
289	152 000
321	67 578
322	158 707
323	157 089
356	134 935
464	16 608
468	5 713
469	5 560
475	85 281
476	89 116
478	9 304
483	96 137
484	94 536
485	5 689
486	10 948
490	119 796
491	70 260
492	104 487
493	15 086
494	14 943
498	111 570
499	18 399
500	23 140
513	39 713
514	56 533
516	44 859
517	44 770
518	45 051
519	54 454
520	68 154
523	49 461
524	56 043
525	11 331

Totaal: 4 047 488 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 2 550 127 m³

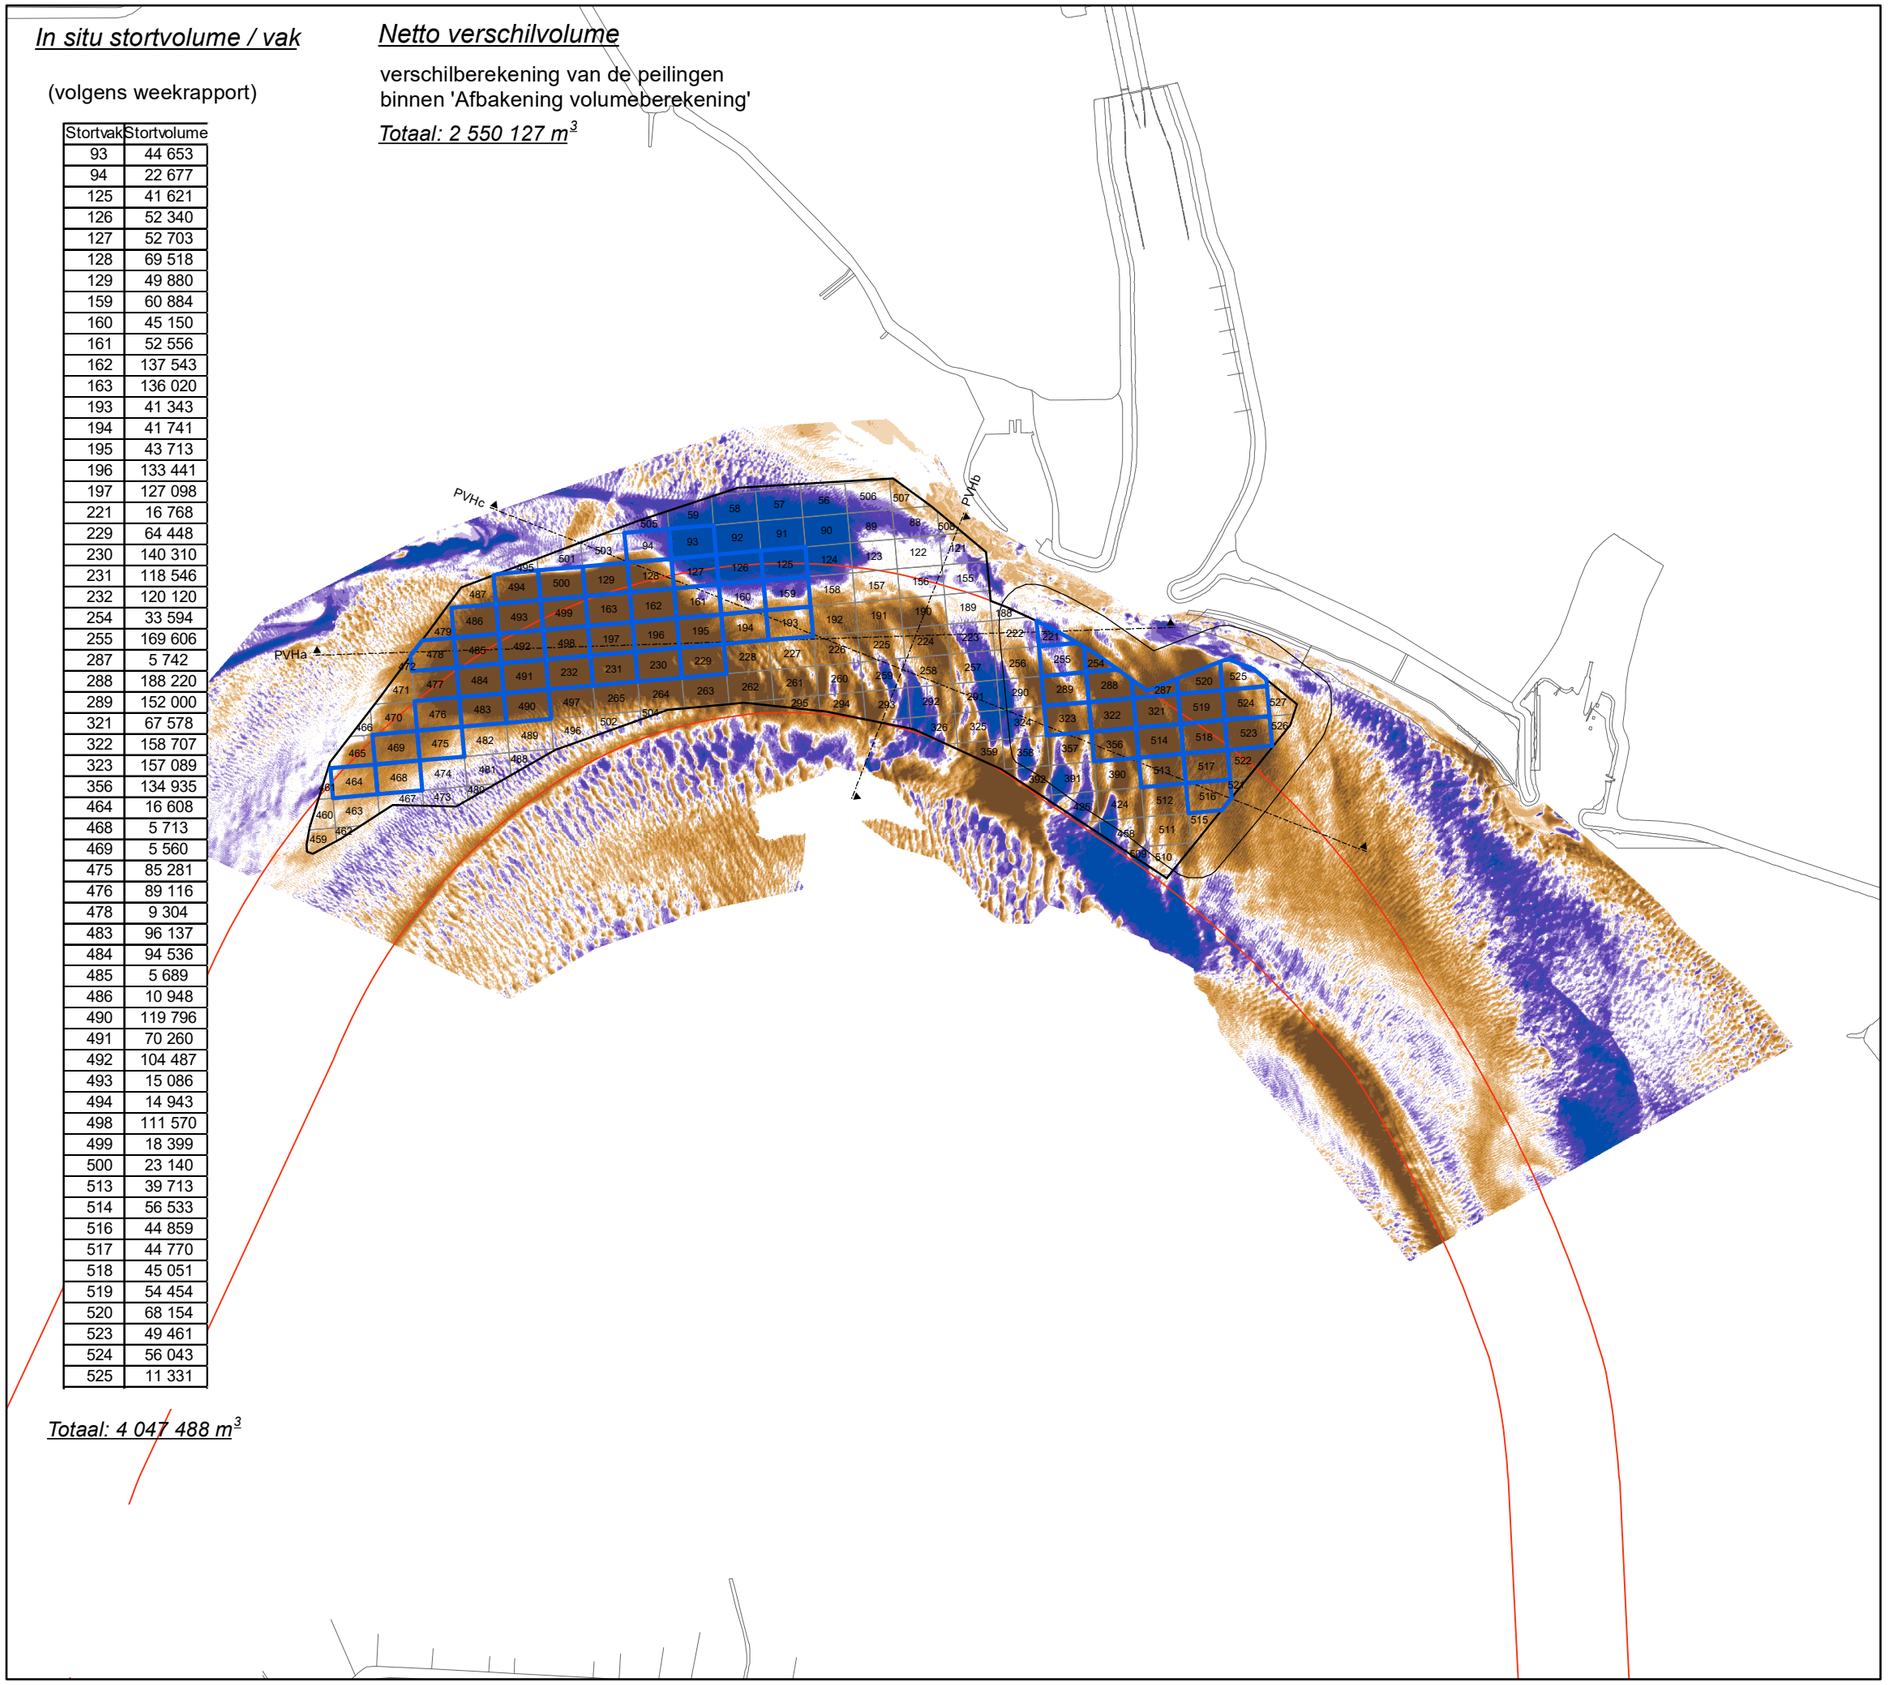

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nrMT/02323_C1_04

Verschilkaart Put van Hansweert

02/05/2022 (T65) - 24/07/2025 (T91)

11640_PVH_VT91-T65

Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	verdieping
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

0 200 400 600 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)


Stortvak	Stortvolume
93	44 653
94	22 677
125	41 621
126	52 340
127	52 703
128	69 518
129	49 880
159	60 884
160	45 150
161	52 556
162	137 543
163	136 020
193	41 343
194	41 741
195	43 713
196	133 441
197	127 098
221	16 768
229	64 448
230	140 310
231	118 546
232	120 120
254	33 594
255	169 606
287	5 742
288	188 220
289	152 000
321	67 578
322	158 707
323	157 089
356	134 935
464	16 608
468	5 713
469	5 560
475	85 281
476	89 116
478	9 304
483	96 137
484	94 536
485	5 689
486	10 948
490	119 796
491	70 260
492	104 487
493	15 086
494	14 943
498	111 570
499	18 399
500	23 140
513	39 713
514	56 533
516	44 859
517	44 770
518	45 051
519	54 454
520	68 154
523	49 461
524	56 043
525	11 331

Totaal: 4 047 488 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 3 014 493 m³

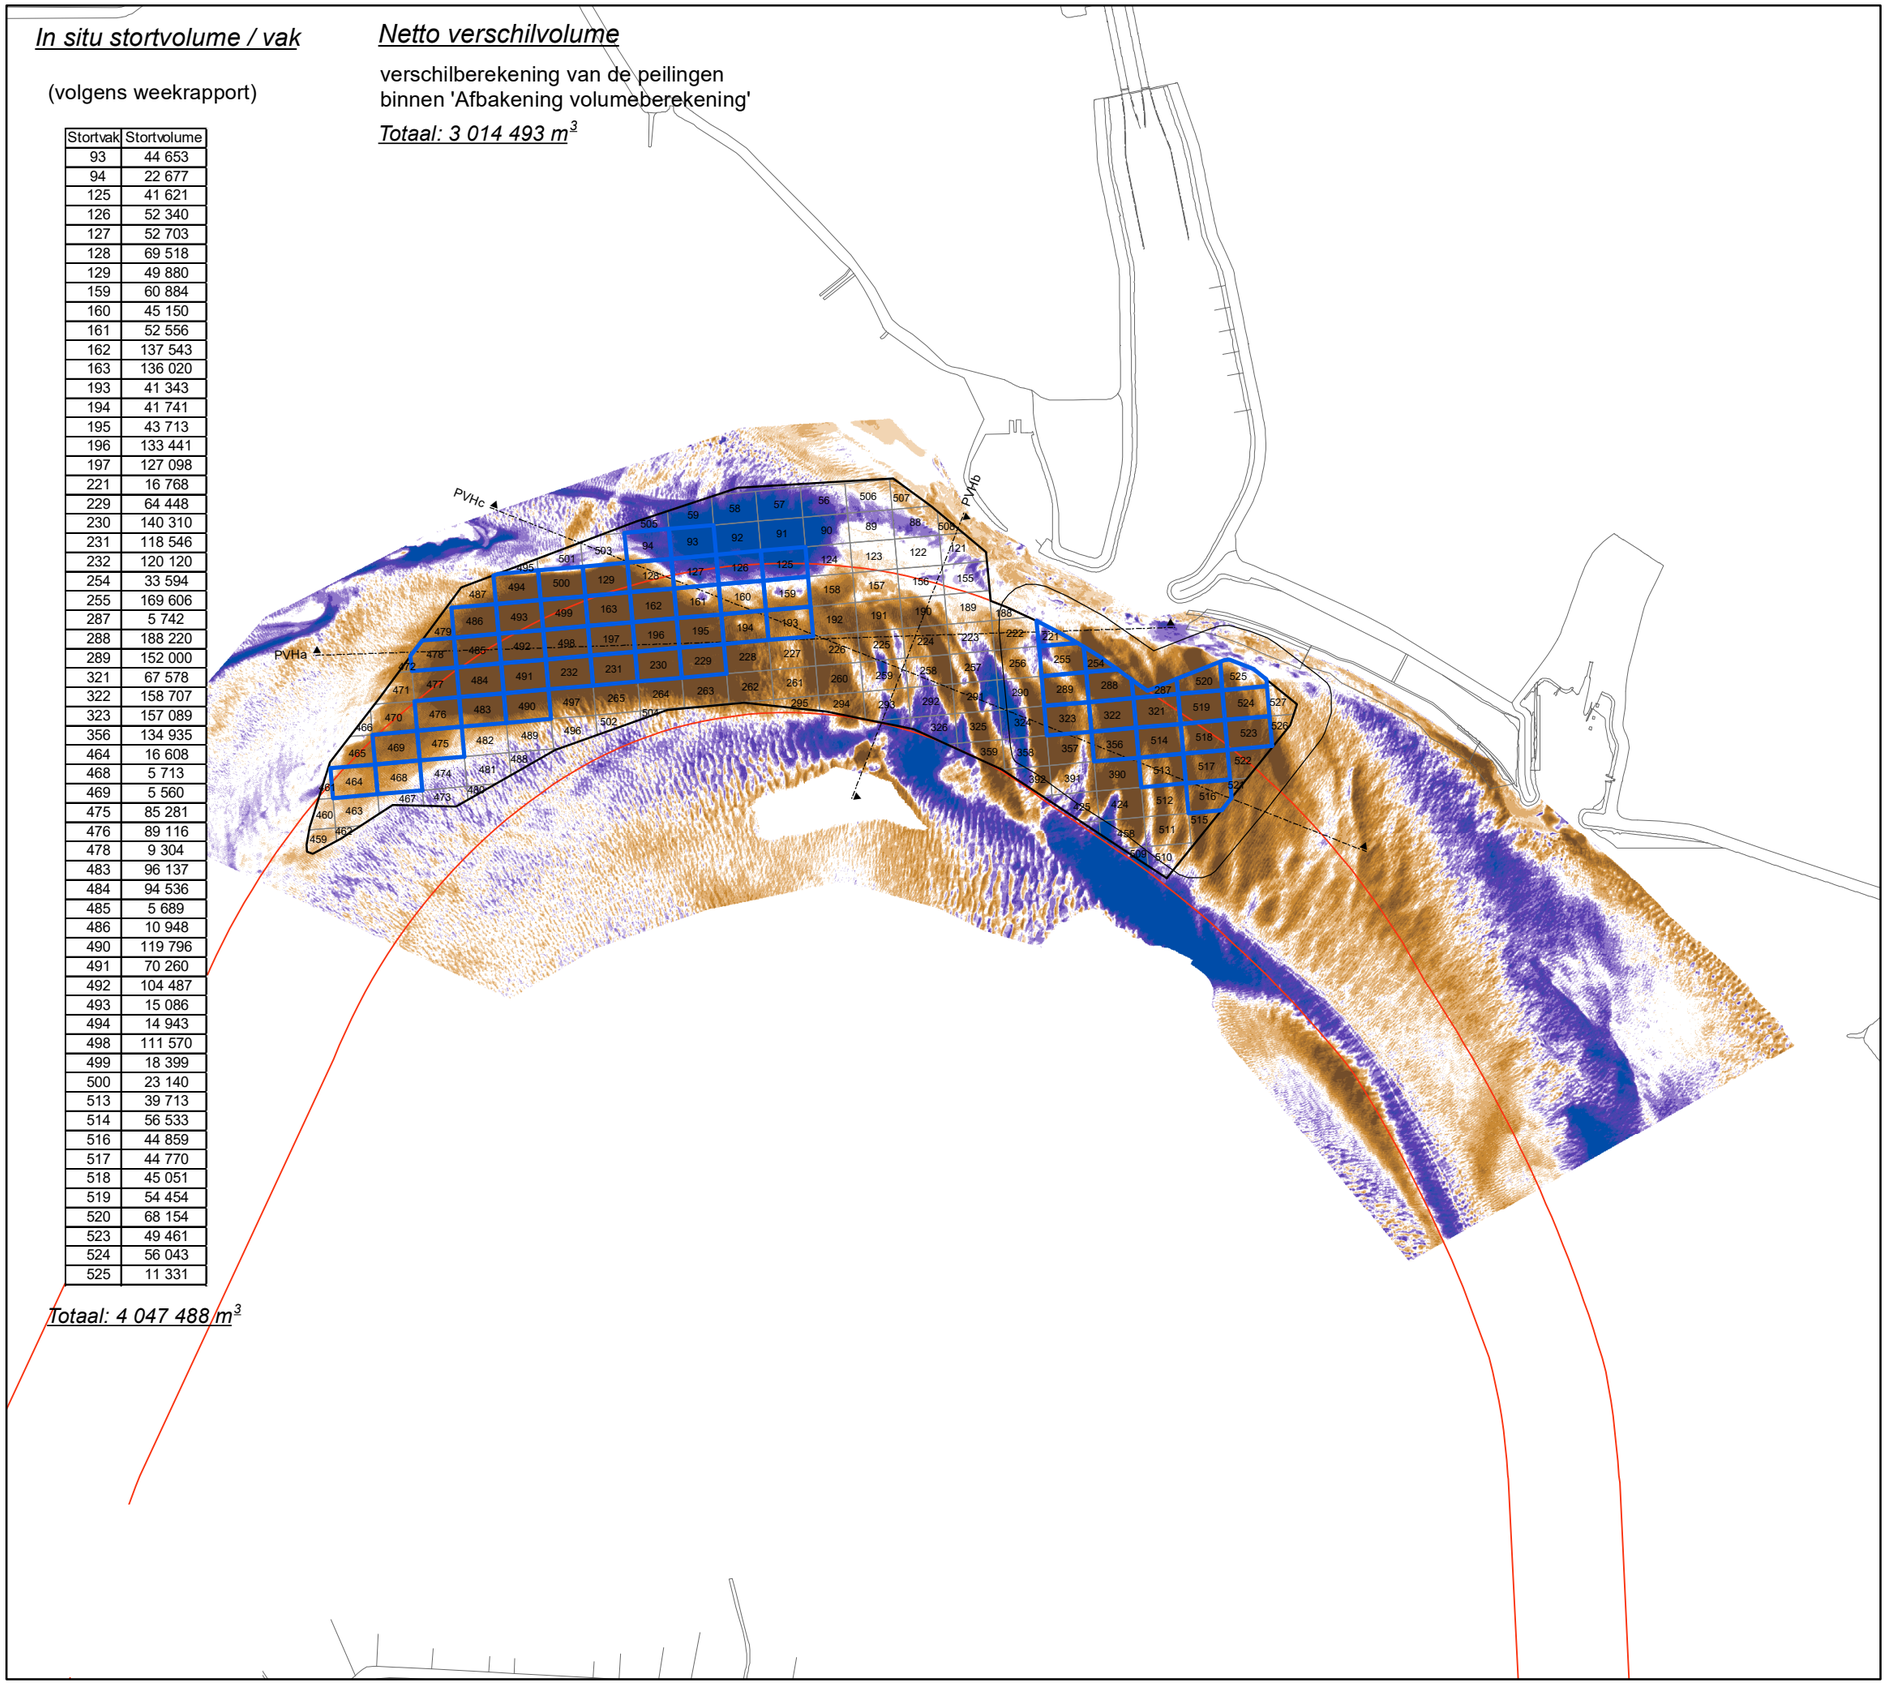

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nrMT/02323_C1_04

Verschilkaart Put van Hansweert

20/09/2022 (T68) - 24/07/2025 (T91)

11640_PVH_VT91-T68

Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	
-0.99 - -0.50	verdieping
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

0 200 400 600 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)


Stortvak	Stortvolume
125	11 186
126	5 626
127	5 413
128	5 626
129	5 589
159	11 230
160	5 531
161	5 597
193	5 611
194	10 965
195	5 560
196	5 611
229	11 317
230	5 662
231	5 684

Totaal: 106 207 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 36 342 m³

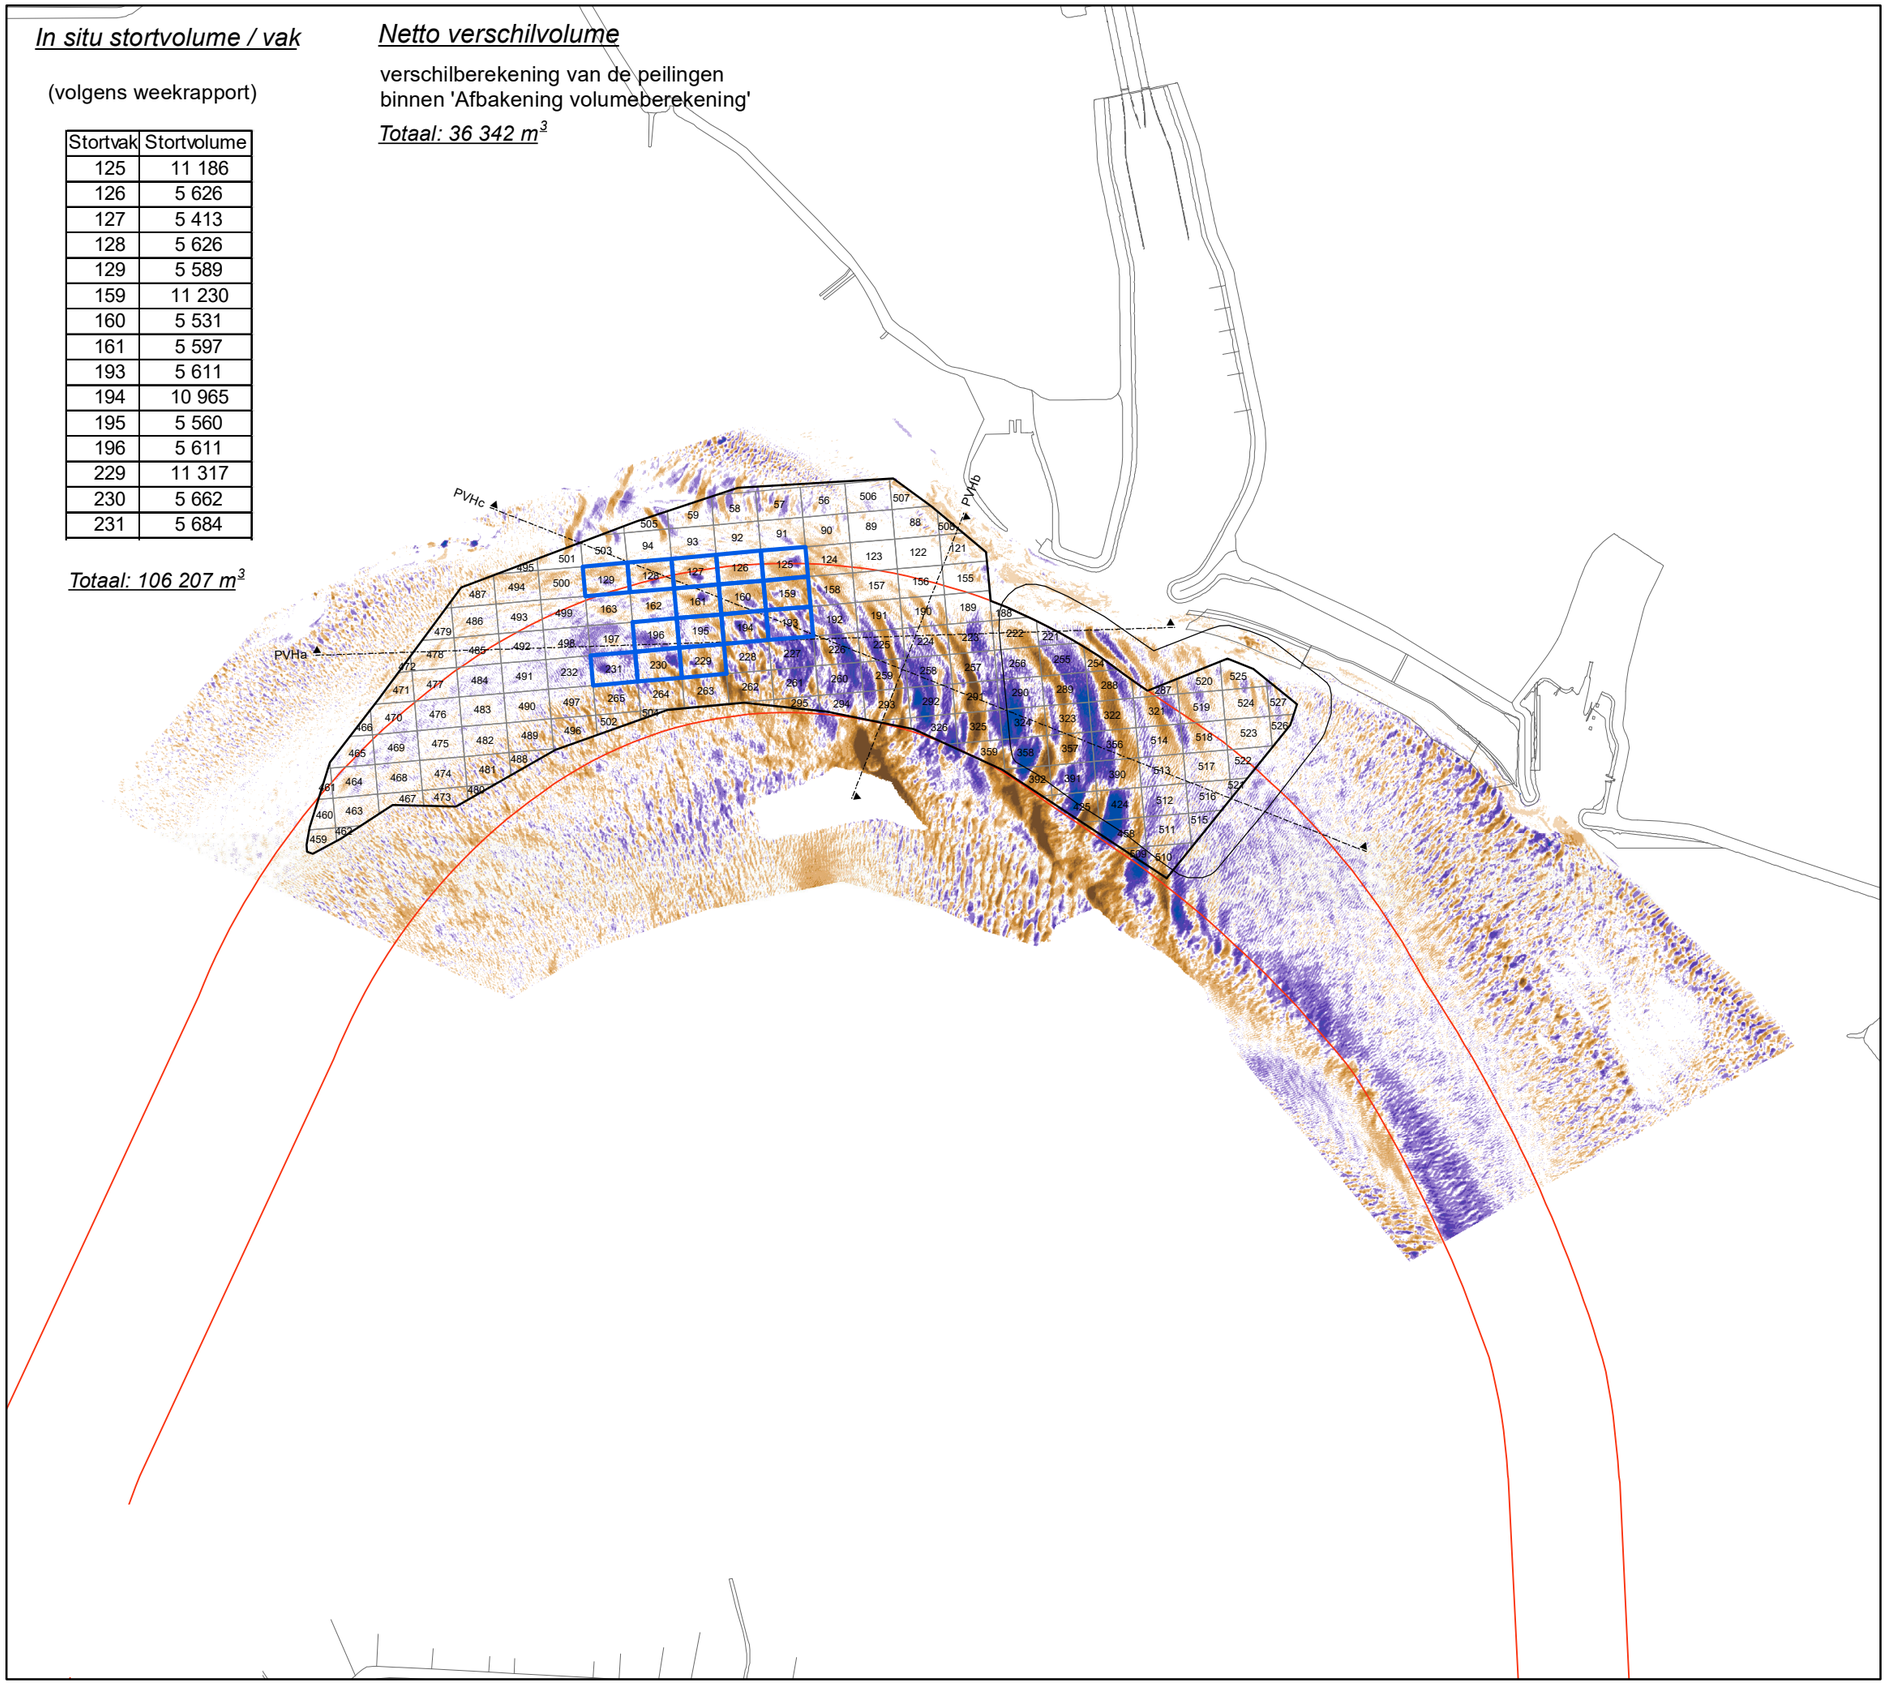

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nrMT/02323_C1_04

Verschilkaart Put van Hansweert

27/05/2025 (T90) - 24/07/2025 (T91)

11640_PVH_VT91-T90

Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50

verondieping

- -0.25 - +0.25
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

verdieping

N
W
E
S

0 200 400 600 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)


Stortvak	Stortvolume
93	44 653
94	22 677
125	41 621
126	56 105
127	58 452
128	75 180
129	55 404
159	60 884
160	50 718
161	58 326
162	137 543
163	136 020
193	41 343
194	41 741
195	43 713
196	133 441
197	127 098
221	16 768
229	64 448
230	140 310
231	118 546
232	120 120
254	33 594
255	169 606
287	5 742
288	188 220
289	152 000
321	67 578
322	158 707
323	157 089
356	134 935
464	16 608
468	5 713
469	5 560
475	85 281
476	89 116
478	9 304
483	96 137
484	94 536
485	5 689
486	10 948
490	125 008
491	75 636
492	104 487
493	15 086
494	14 943
498	111 570
499	18 399
500	23 140
513	39 713
514	56 533
516	44 859
517	44 770
518	45 051
519	54 454
520	68 154
523	49 461
524	56 043
525	11 331

Totaal: 4 090 113 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 2 327 503 m³

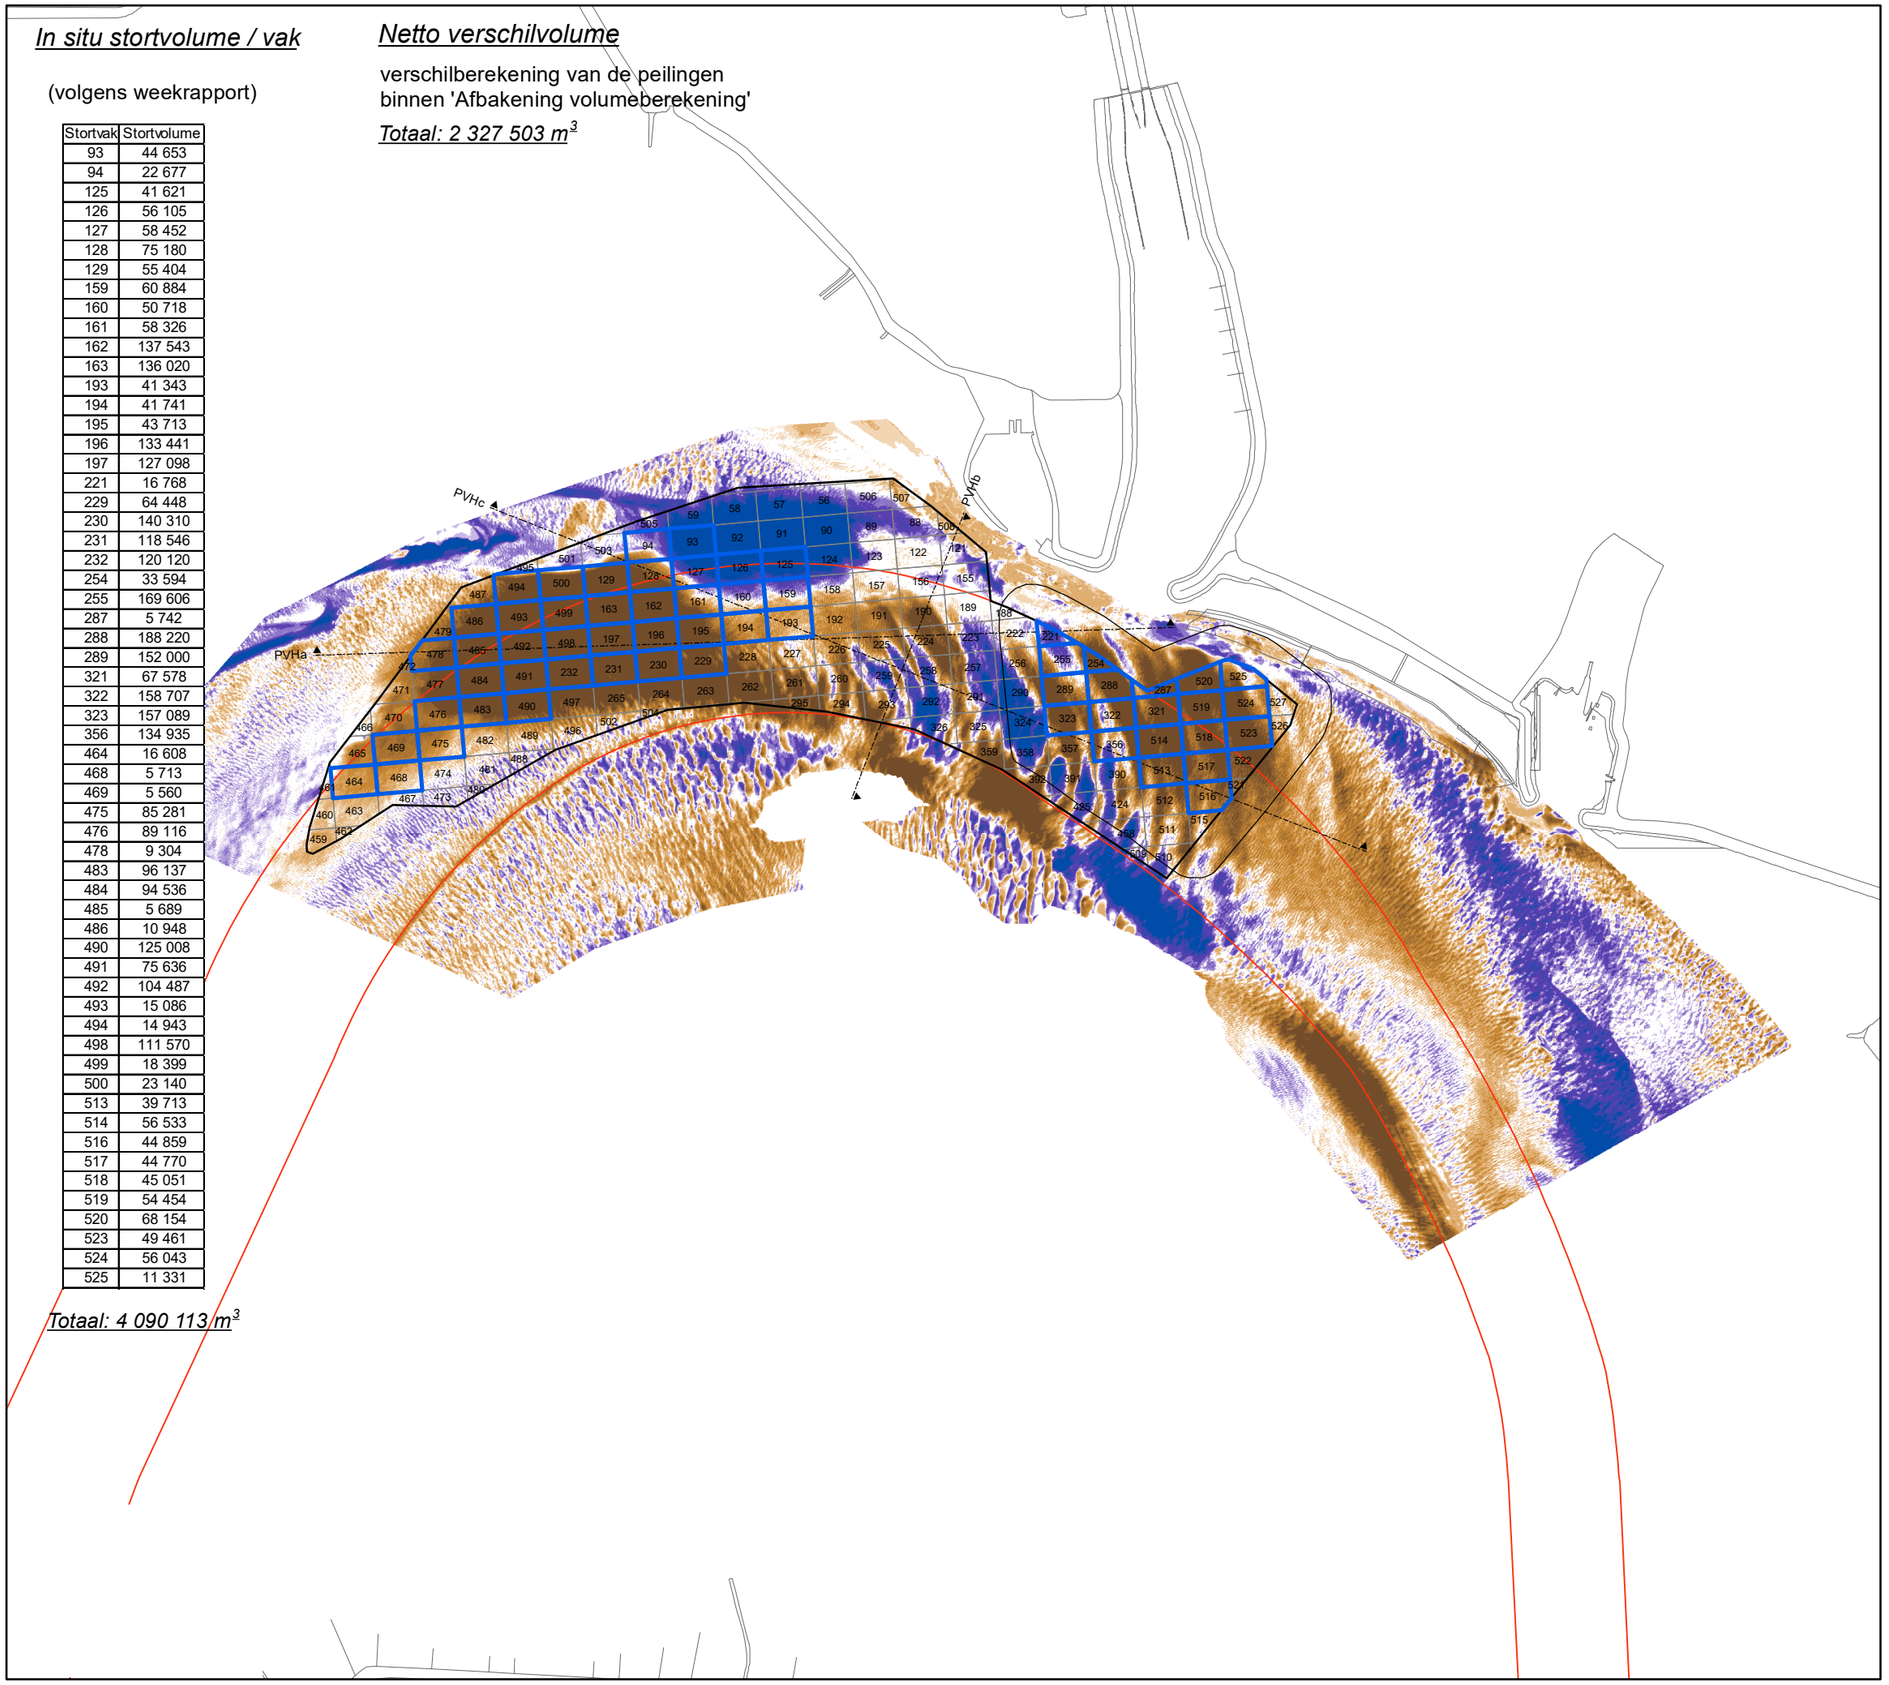

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nrMT/02323_C1_04

Verschilkaart Put van Hansweert

02/05/2022 (T65) - 21/09/2025 (T92)

11640_PVH_VT92-T65

Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	verdieping
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

0 200 400 600 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)


Stortvak	Stortvolume
93	44 653
94	22 677
125	41 621
126	56 105
127	58 452
128	75 180
129	55 404
159	60 884
160	50 718
161	58 326
162	137 543
163	136 020
193	41 343
194	41 741
195	43 713
196	133 441
197	127 098
221	16 768
229	64 448
230	140 310
231	118 546
232	120 120
254	33 594
255	169 606
287	5 742
288	188 220
289	152 000
321	67 578
322	158 707
323	157 089
356	134 935
464	16 608
468	5 713
469	5 560
475	85 281
476	89 116
478	9 304
483	96 137
484	94 536
485	5 689
486	10 948
490	125 008
491	75 636
492	104 487
493	15 086
494	14 943
498	111 570
499	18 399
500	23 140
513	39 713
514	56 533
516	44 859
517	44 770
518	45 051
519	54 454
520	68 154
523	49 461
524	56 043
525	11 331

Totaal: 4 090 113 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 2 791 870 m³

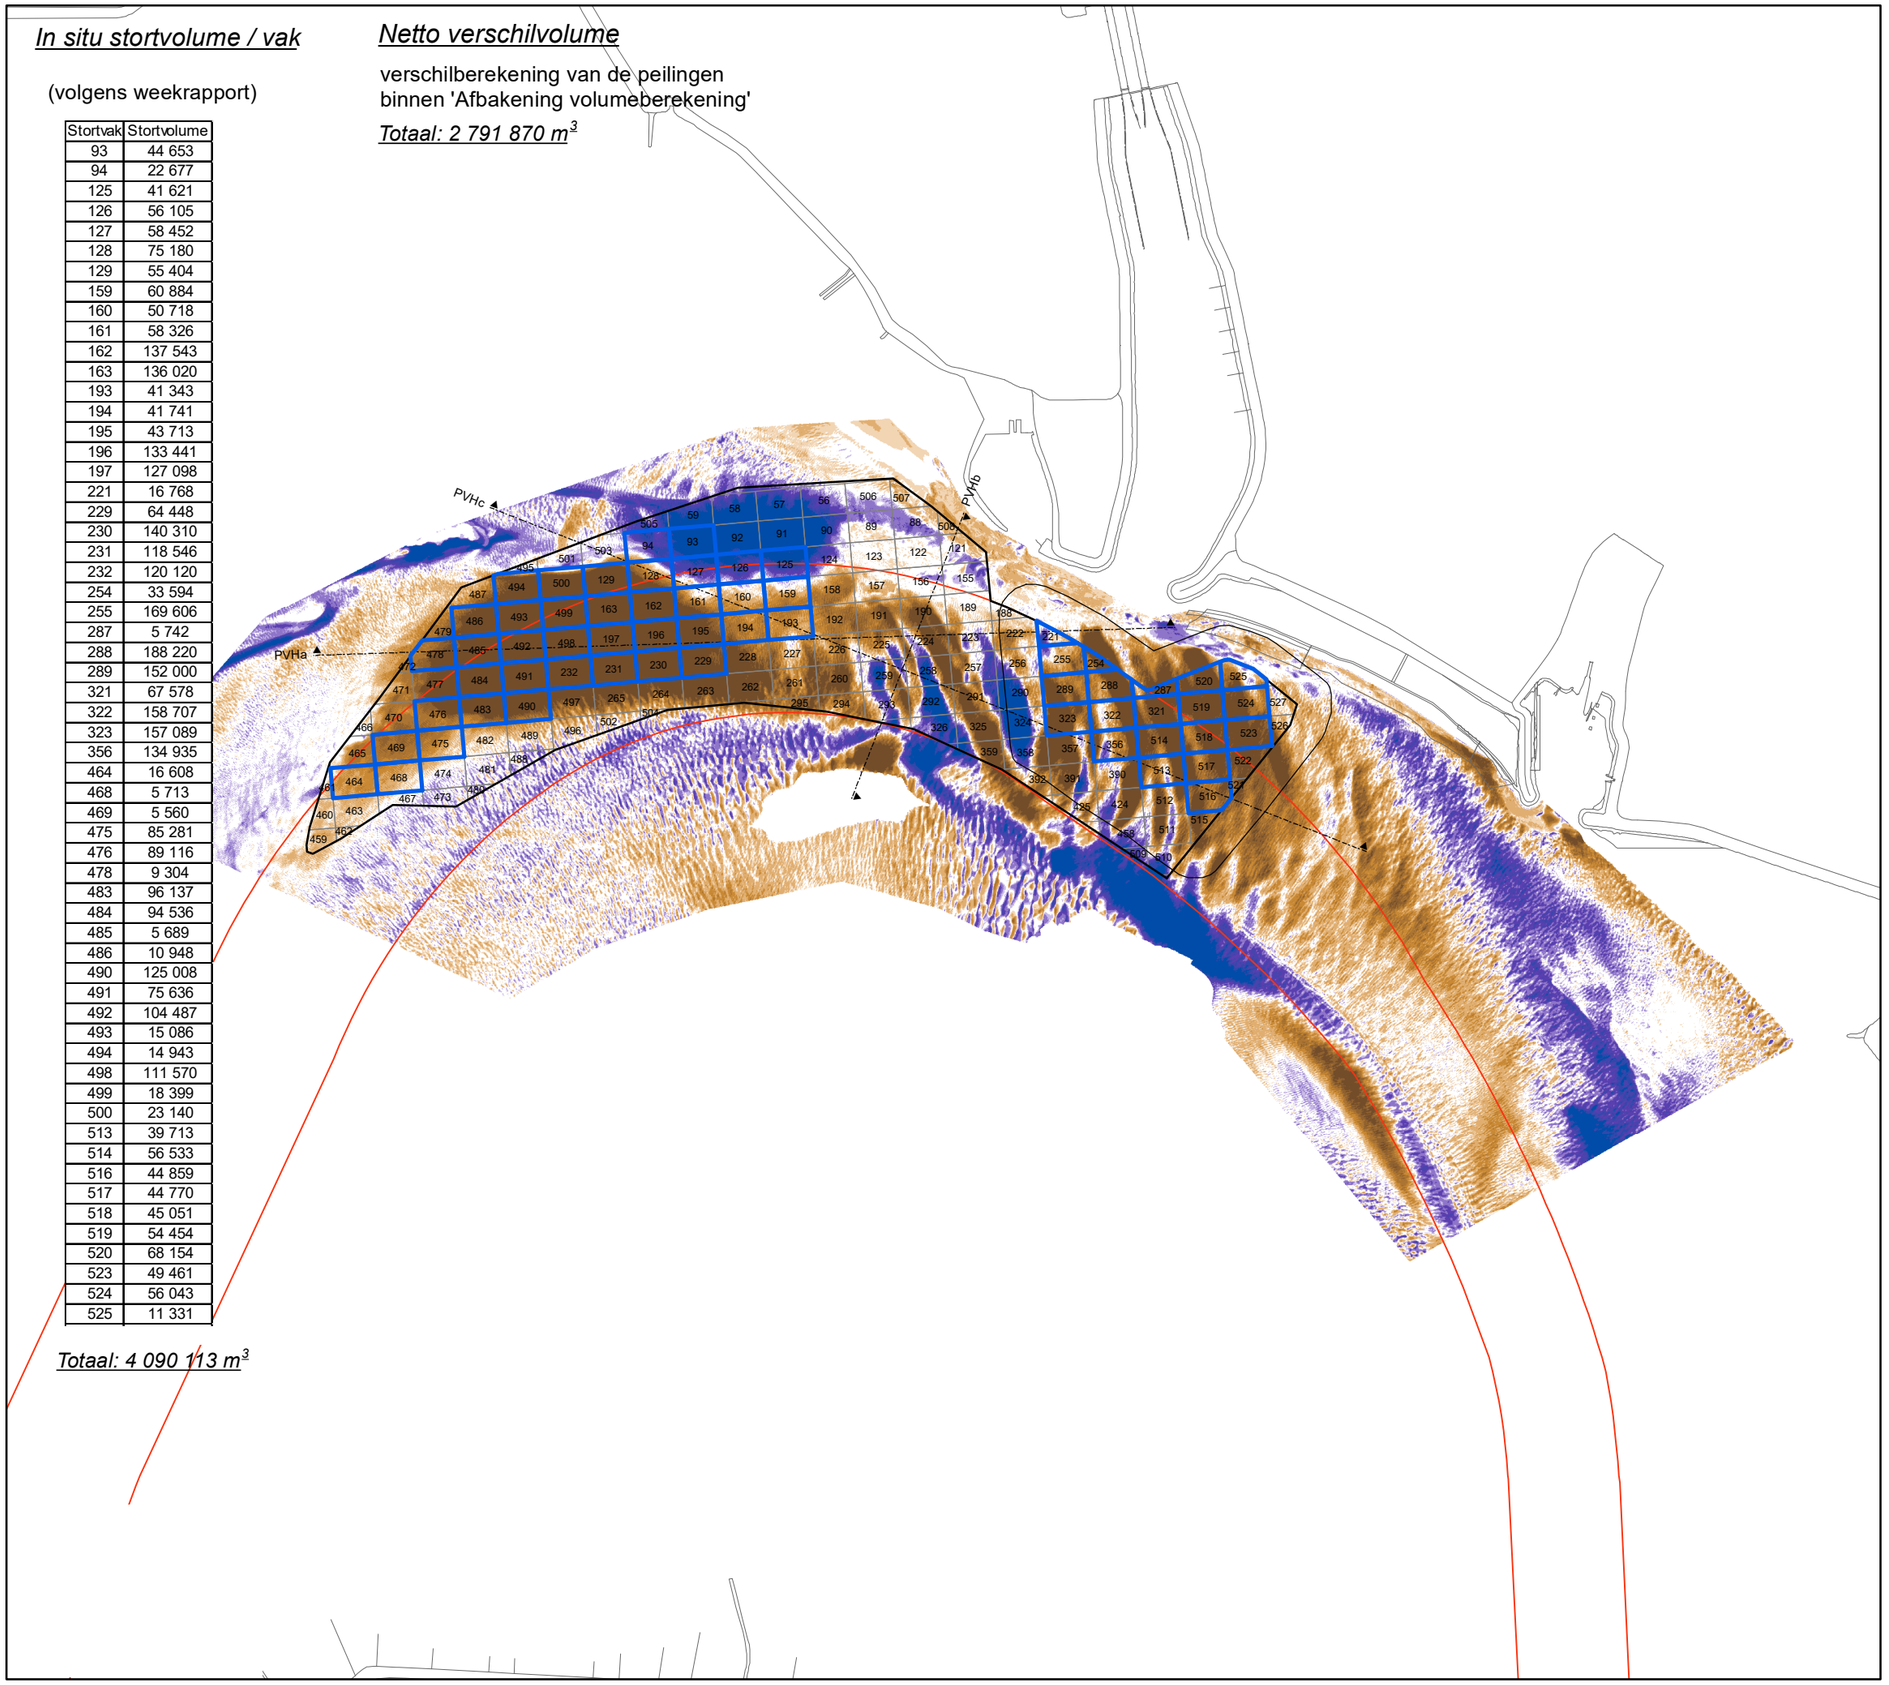

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nrMT/02323_C1_04

Verschilkaart Put van Hansweert

20/09/2022 (T68) - 21/09/2025 (T92)

11640_PVH_VT92-T68

Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	verdieping
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

0 200 400 600 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)


Stortvak	Stortvolume
126	3 765
127	5 749
128	5 662
129	5 523
160	5 567
161	5 771
490	5 212
491	5 376

Totaal: 42 625 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -222 625 m³

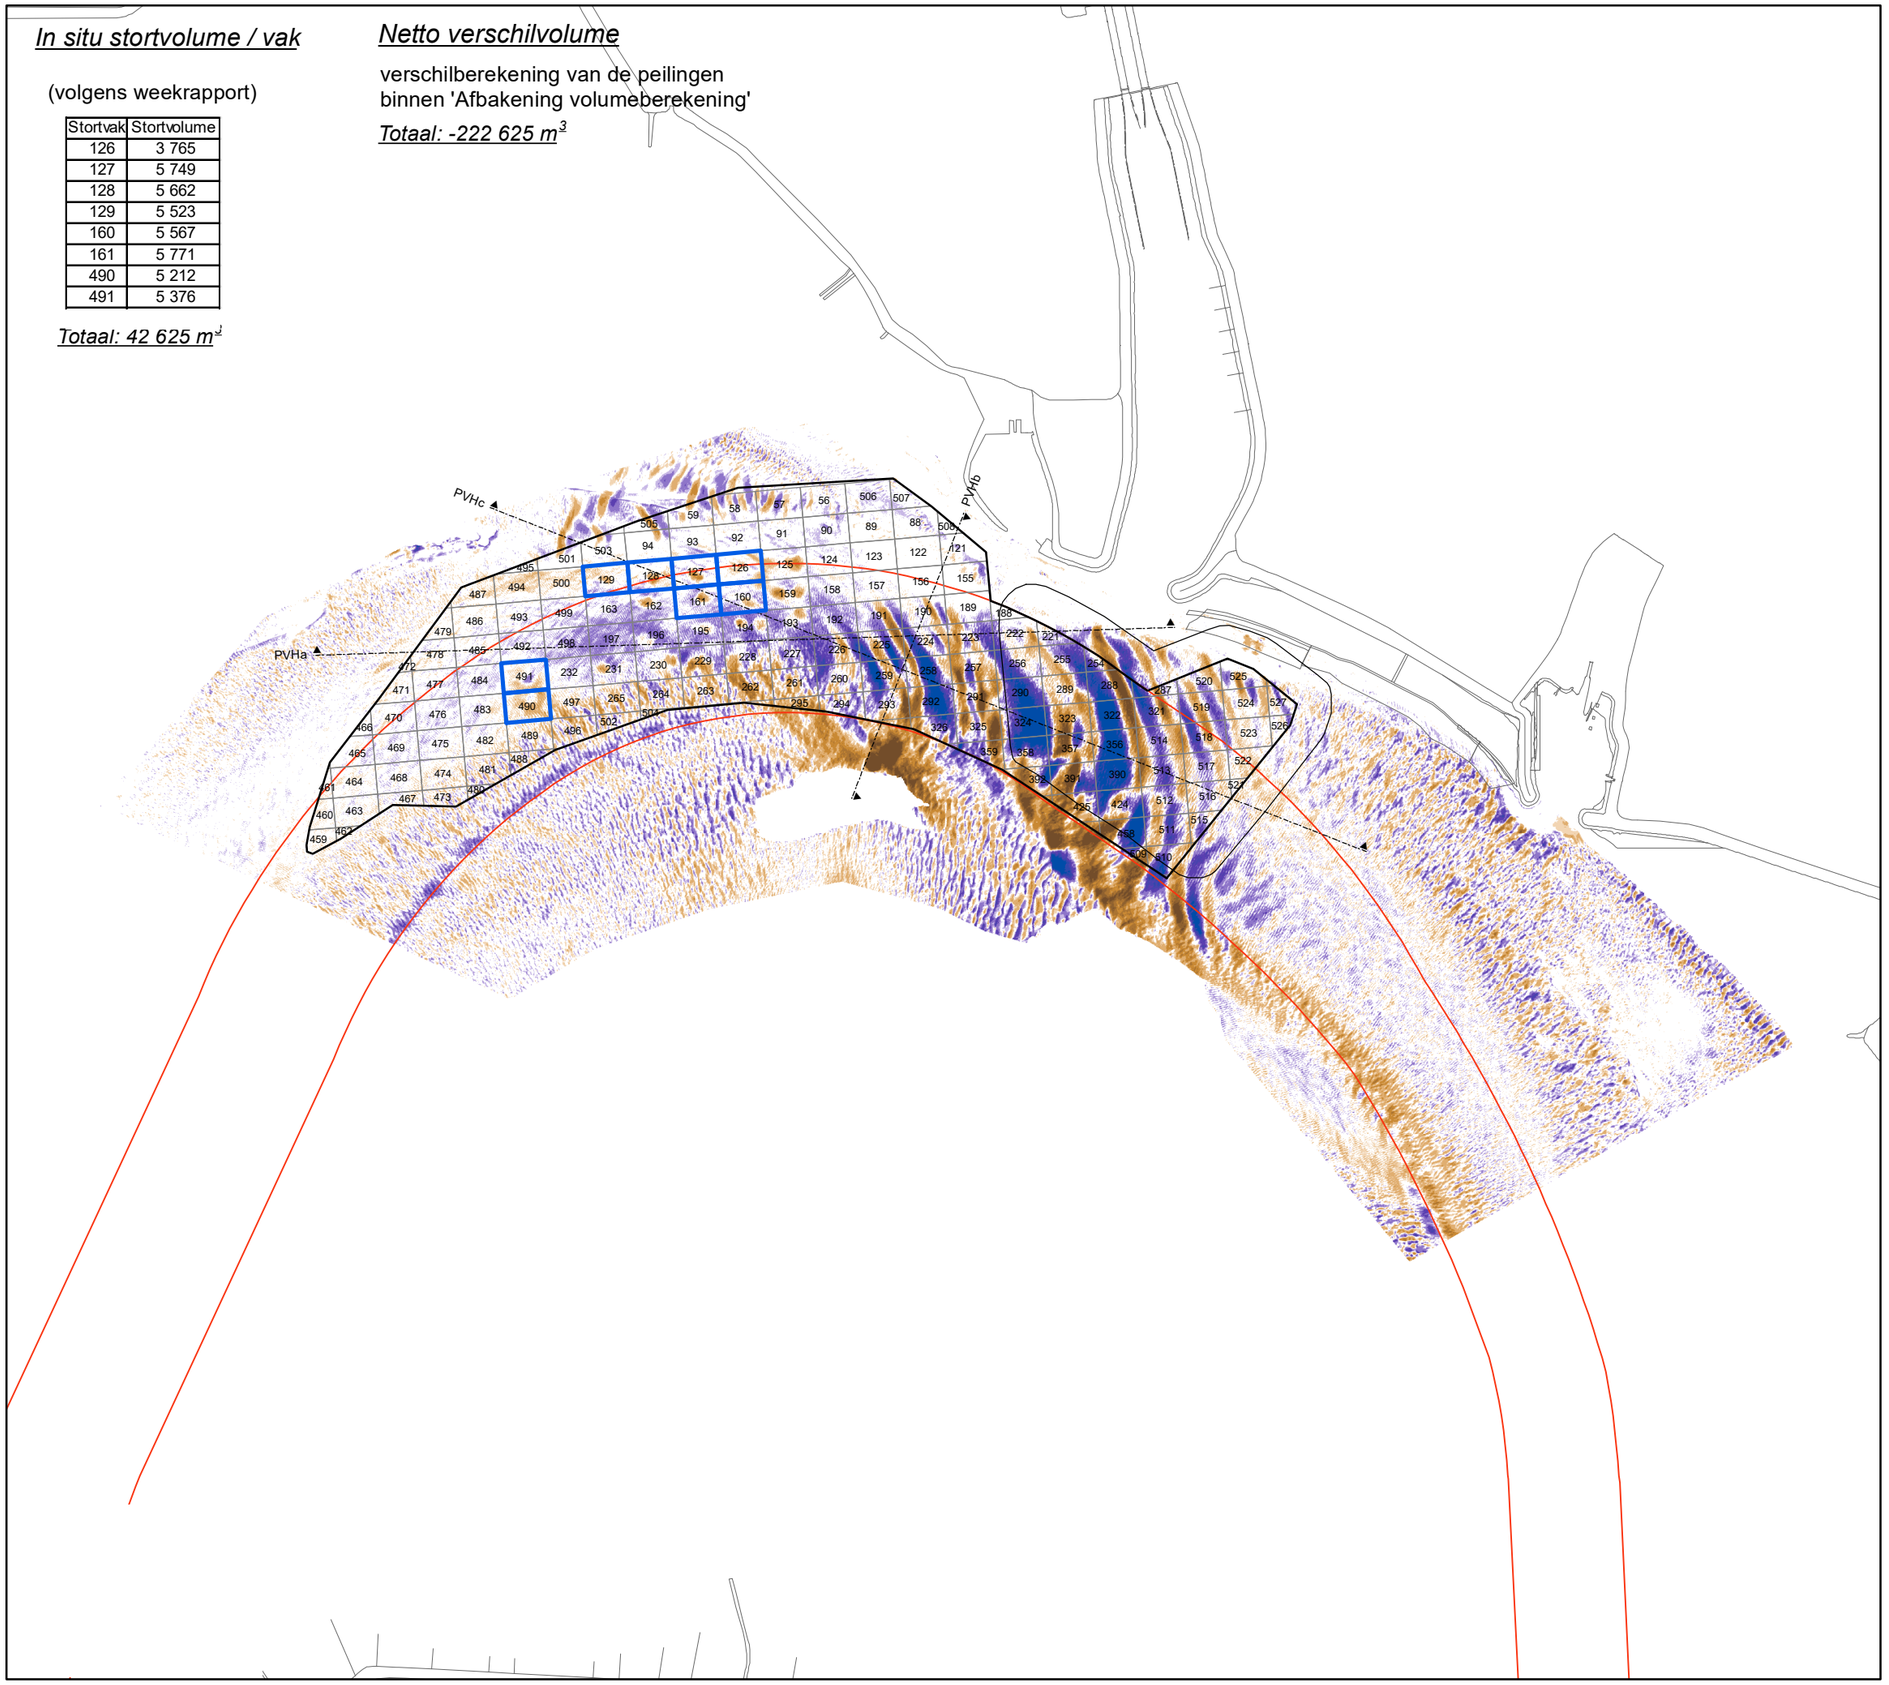

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nrMT/02323_C1_04

Verschilkaart Put van Hansweert

24/07/2025 (T91) - 21/09/2025 (T92)

11640_PVH_VT92-T91

Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m


- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

verondieping

verdieping

N
W
E
S

0 200 400 600 m

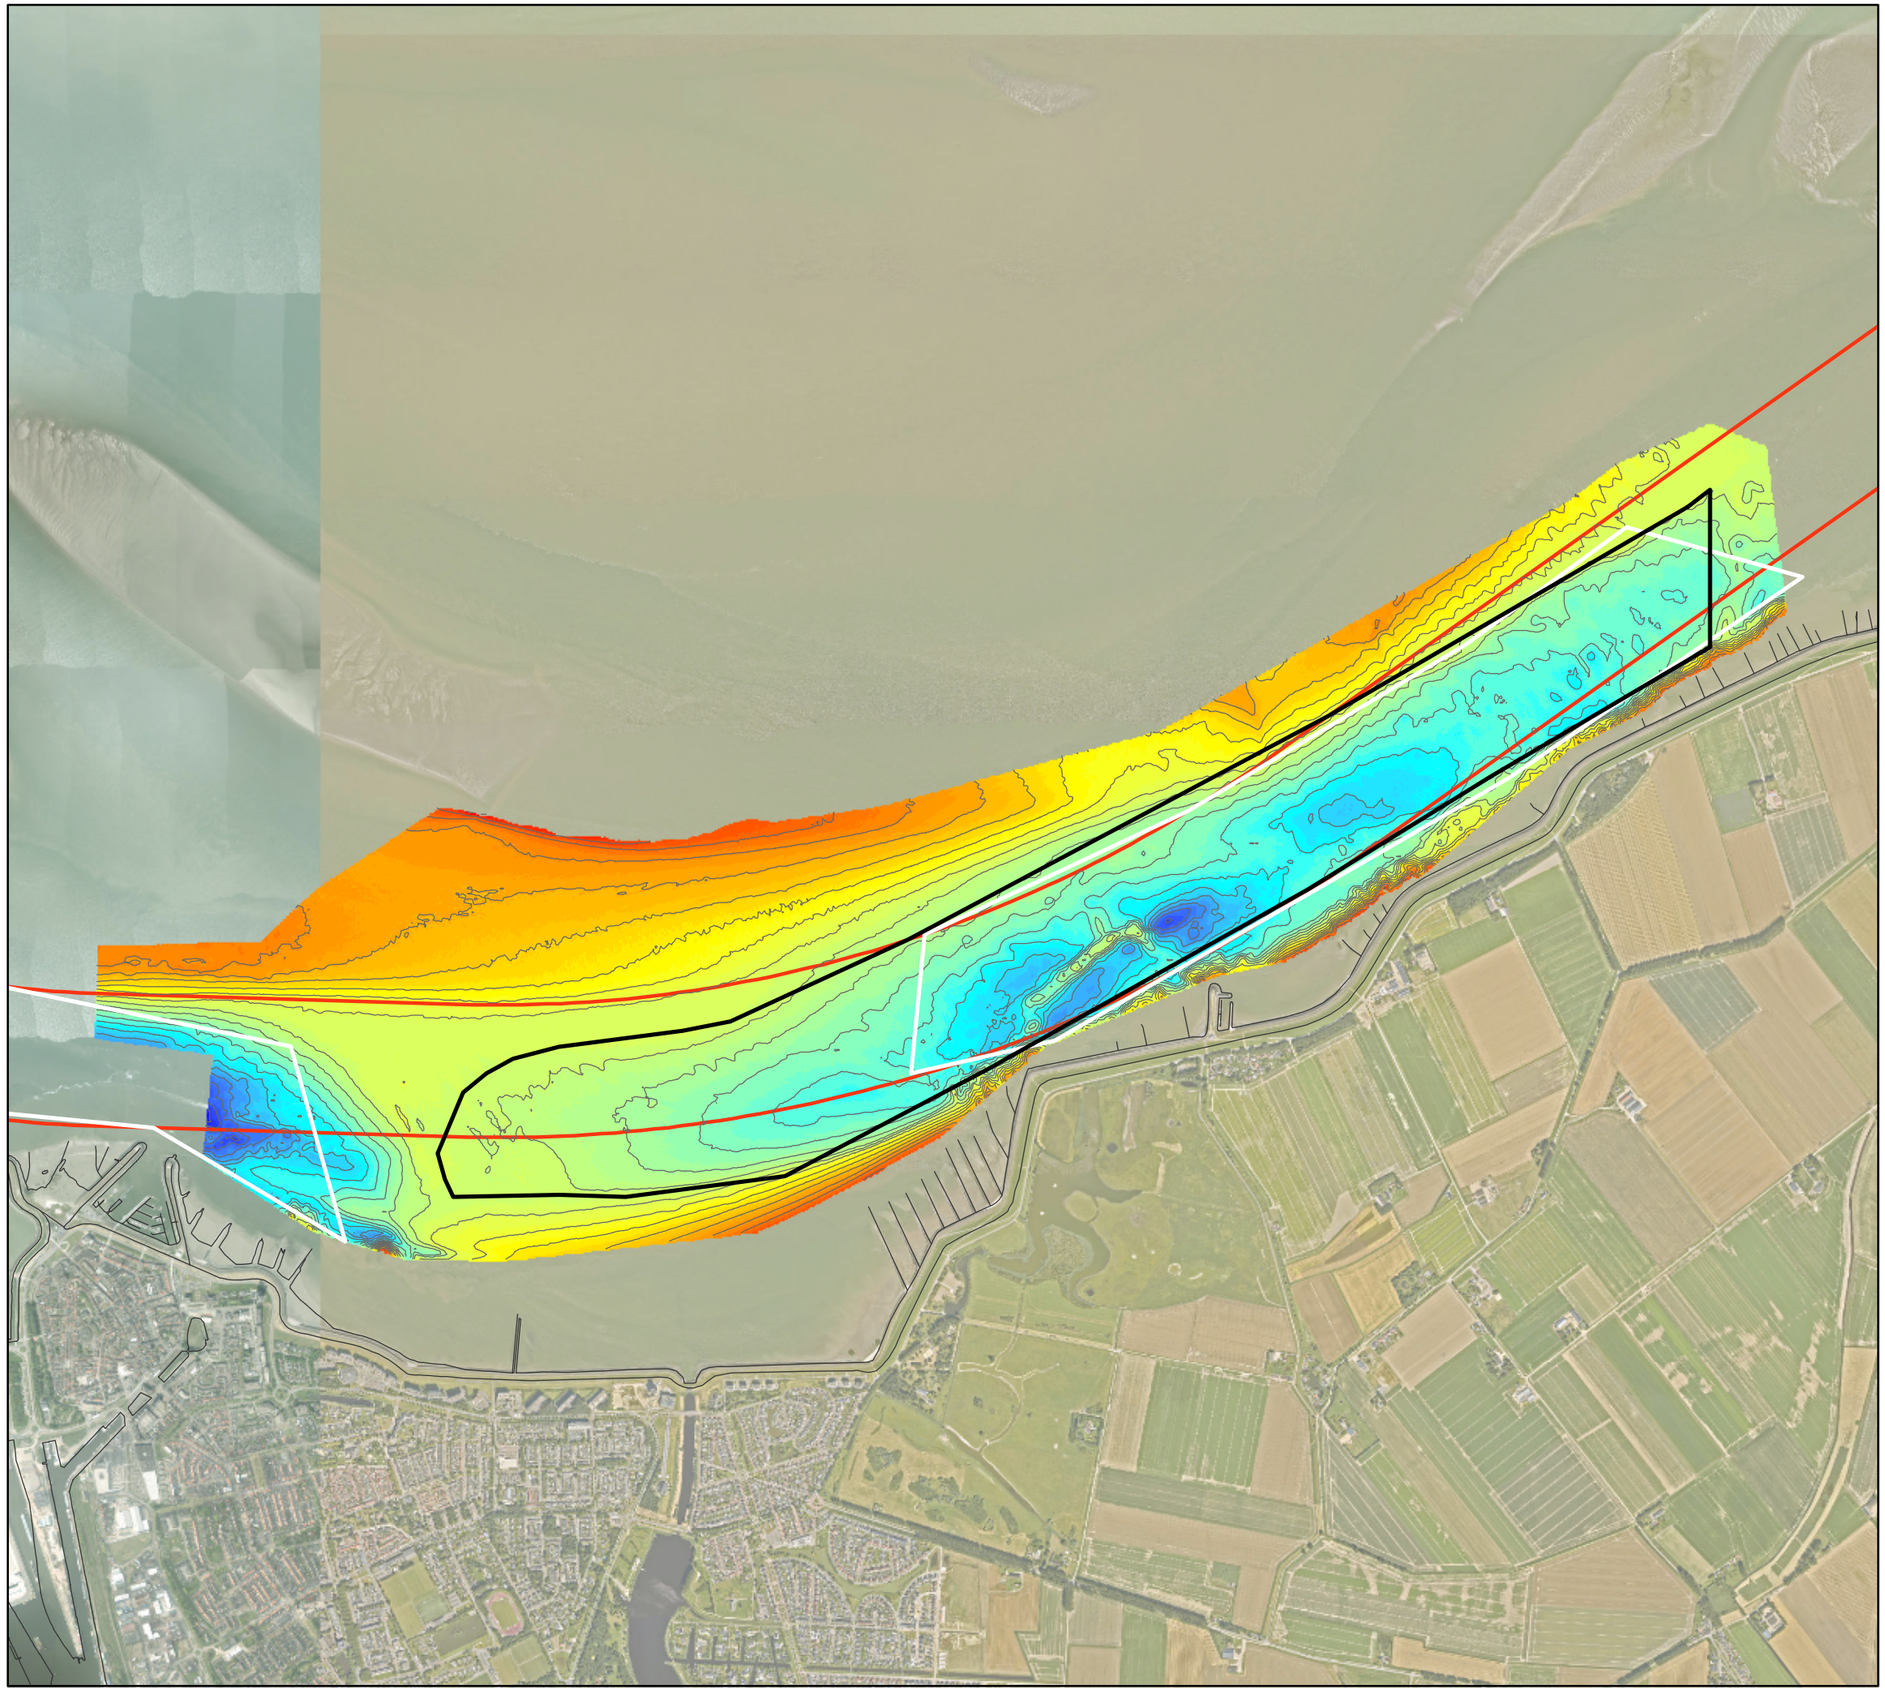

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SH31

17/09/2025 (T85)

11640_SH31_BT85
Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

Diepte in m [NAP]

- 1.88 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00
- 25.01 - 26.00
- 26.01 - 27.00
- 27.01 - 28.00
- 28.01 - 29.00
- 29.01 - 30.00
- 30.01 - 31.00
- 31.01 - 32.00
- 32.01 - 33.00
- 33.01 - 34.00
- 34.01 - 35.00
- 35.01 - 36.00
- 36.01 - 37.00
- 37.01 - 38.00
- 38.01 - 39.00
- 39.01 - 40.00
- 40.01 - 41.00
- 41.01 - 42.00

N
W E
S

0 250 500 750 1000 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)


Stortvak	Stortvolume
85	2 032
86	32 517
87	44 980
88	39 801
89	38 223
90	18 085
91	31 585
92	38 137
93	39 220
94	39 351
95	39 749
96	31 235
97	6 034
98	39 913
99	36 076
100	44 519
101	39 712
102	27 027
103	32 149
104	38 447
105	40 237
106	31 806
107	37 542
108	33 186
109	32 272
110	5 960
111	21 252
112	39 820
113	32 236
114	28 309
115	31 463
116	4 169
117	1 860
118	32 369
119	34 028
120	16 959
121	32 321
122	4 923
123	15 641
124	26 411
125	32 206
126	26 725
127	32 340
128	40 013
129	36 128
130	29 357
131	38 170
132	13 700
169	33 481
170	41 837
171	42 041
172	49 287
173	1 728
175	140 693
176	168 782
177	165 707
178	164 234
179	1 725
181	176 611
182	159 165
183	159 990
184	145 404
185	1 565
187	125 171
188	136 908
189	107 030
190	112 170
193	132 224
194	146 151
195	160 042
196	139 365
197	33 688
199	133 950
200	178 306
201	160 414
202	150 150
203	25 143
205	16 972
206	31 921
207	27 504
208	31 524
209	27 717
212	22 416
213	18 775
214	35 042
215	20 361
217	26 508
218	32 110
219	29 729
311	2 201

Totaal: 6 788 718 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 3 463 765 m³

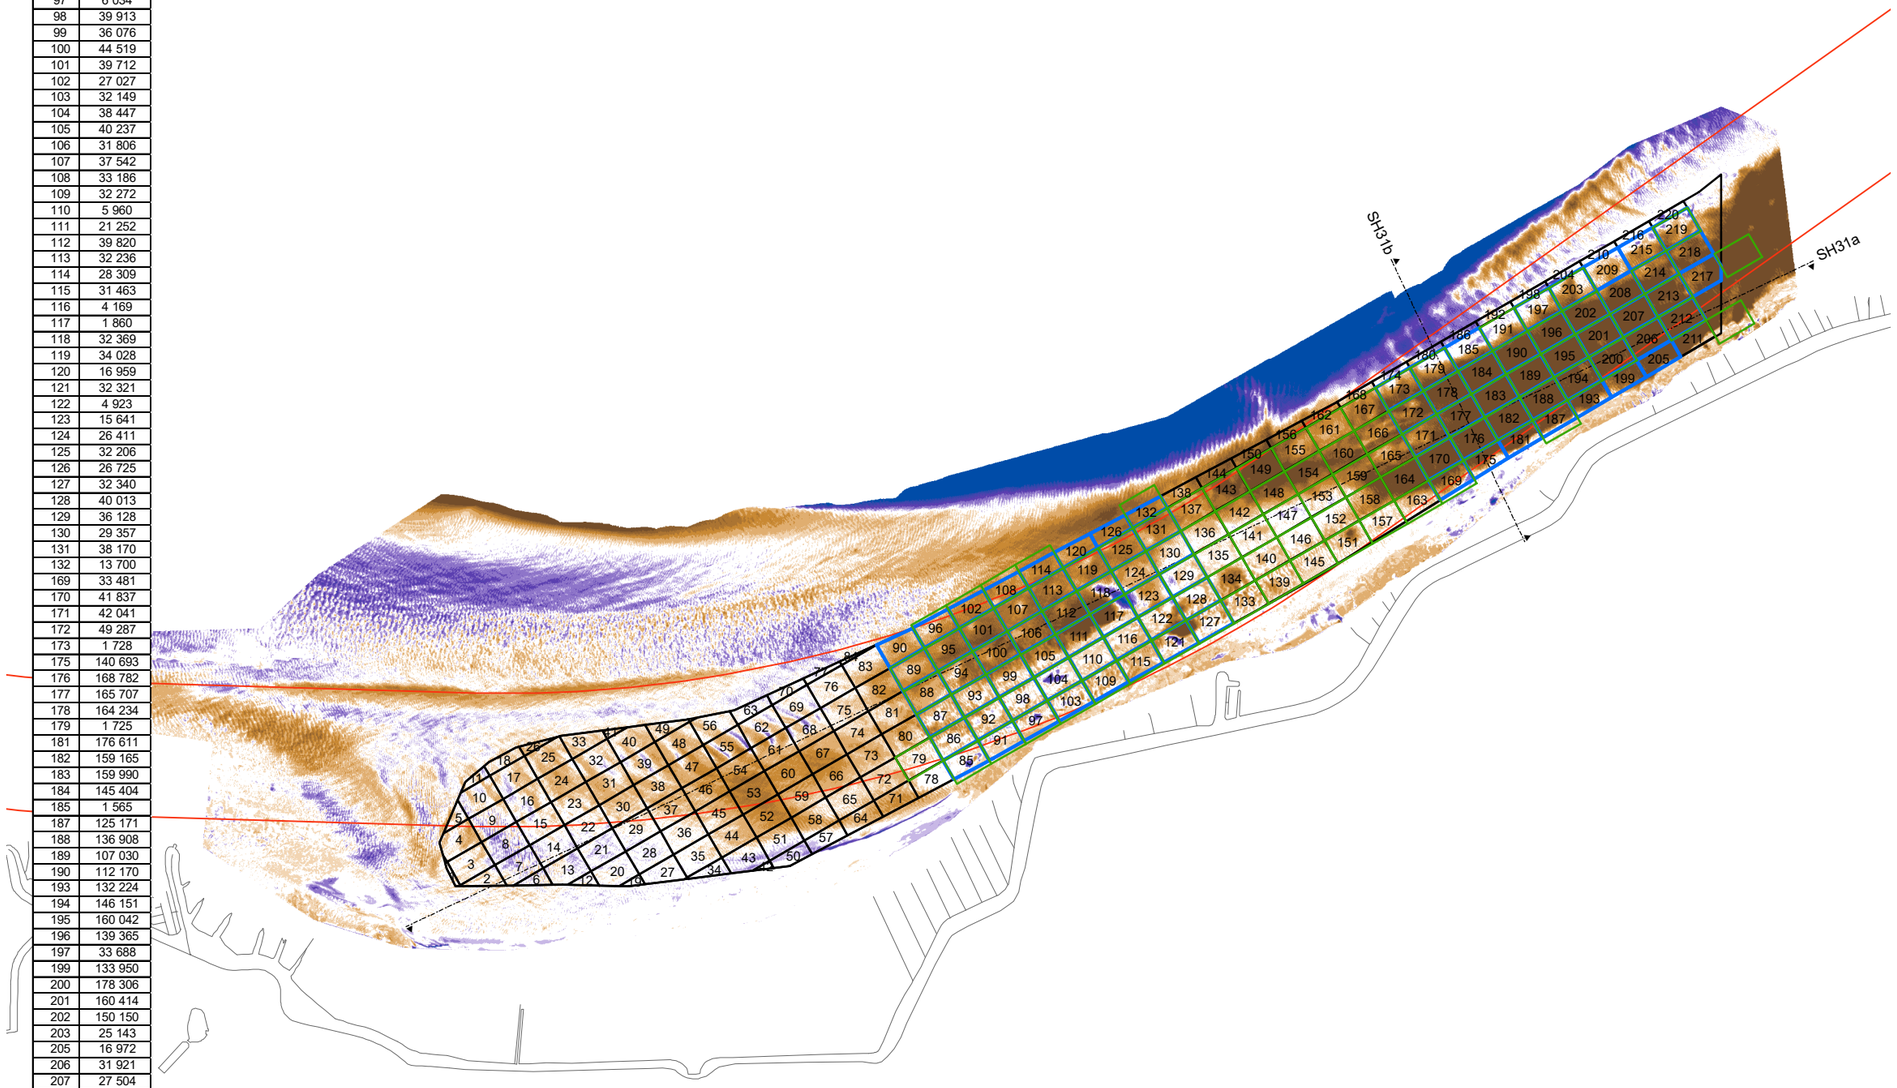

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH31

26/04/2022 (T62) - 17/09/2025 (T85)

11640_SH31_VT85-T62
Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50

-0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N W E S

0 200 400 600 m

In situ stortvolume / vak


(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
86	5 589
87	16 675
88	10 819
89	11 446
90	5 737
91	5 611
92	11 101
93	11 182
94	11 151
95	11 092
96	5 619
98	11 265
99	5 648
100	16 286
101	11 467
102	5 698
103	11 164
104	11 244
105	16 935
106	11 199
107	10 909
108	10 904
109	5 716
112	16 591
113	11 181
114	5 465
115	5 531
118	11 182
119	11 106
121	5 553
122	3 120
124	5 648
125	11 119
126	5 640
127	5 545
128	11 300
129	5 575
130	5 691
131	11 379
169	11 306
170	11 203
171	11 499
172	22 314
175	5 516
176	5 465
177	11 002
178	11 017
181	11 363
182	5 582
183	10 889
184	11 293
193	5 706
194	5 582
195	5 428
196	5 516
197	11 275
199	5 582
200	5 553
201	11 395
202	5 626
203	5 472
205	5 501
206	5 662
207	5 771
208	11 498
209	10 965
212	5 633
213	5 655
214	11 070
215	5 727
217	5 684
218	11 321
219	5 633

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 418 911 m³

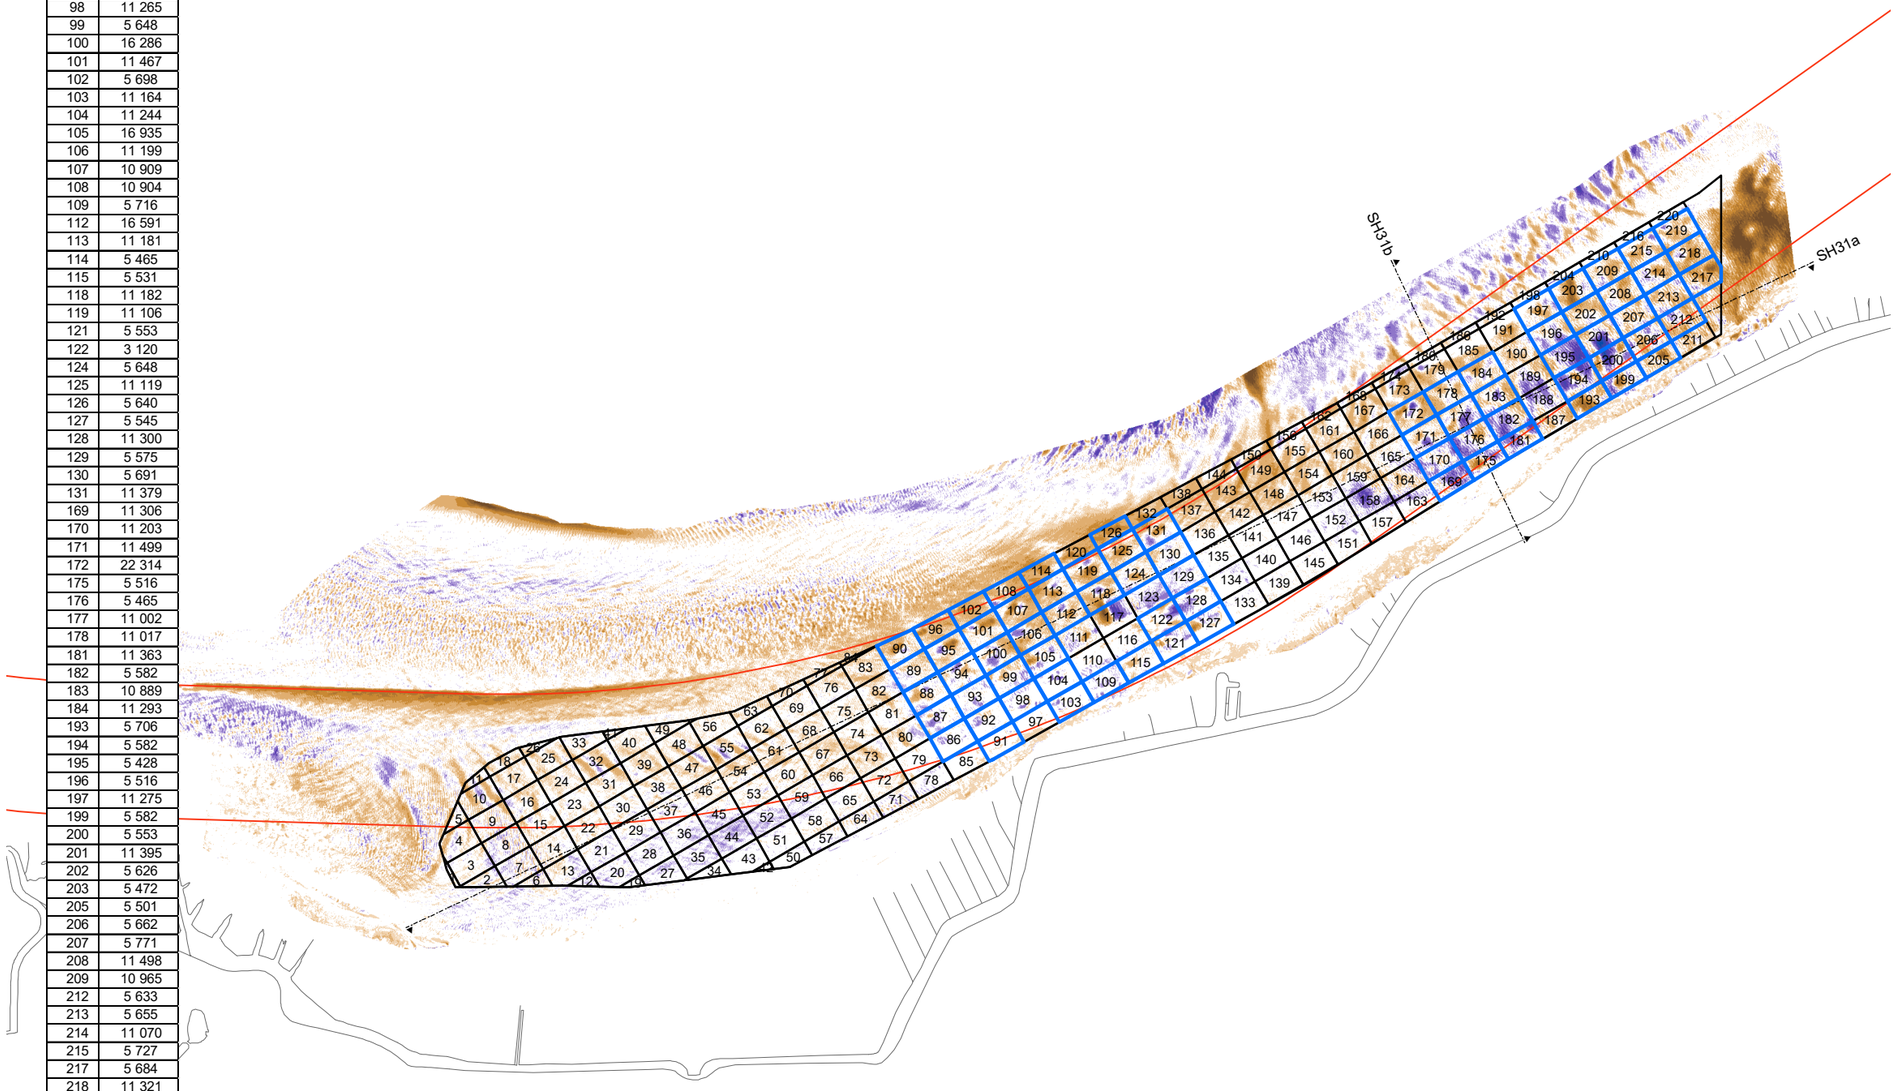

Totaal: 651 787 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH31

12/05/2025 (T84) - 17/09/2025 (T85)

11640_SH31_VT85-T84
Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	verdieping
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

0 200 400 600 m



VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SH41

18/08/2025 (T6)

11640_SH41_BT6
Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

Diepte in m [NAP]

1.88 - 2.00	22.01 - 23.00
2.01 - 3.00	23.01 - 24.00
3.01 - 4.00	24.01 - 25.00
4.01 - 5.00	25.01 - 26.00
5.01 - 6.00	26.01 - 27.00
6.01 - 7.00	27.01 - 28.00
7.01 - 8.00	28.01 - 29.00
8.01 - 9.00	29.01 - 30.00
9.01 - 10.00	30.01 - 31.00
10.01 - 11.00	31.01 - 32.00
11.01 - 12.00	32.01 - 33.00
12.01 - 13.00	33.01 - 34.00
13.01 - 14.00	34.01 - 35.00
14.01 - 15.00	35.01 - 36.00
15.01 - 16.00	36.01 - 37.00
16.01 - 17.00	37.01 - 38.00
17.01 - 18.00	38.01 - 39.00
18.01 - 19.00	39.01 - 40.00
19.01 - 20.00	40.01 - 41.00
20.01 - 21.00	41.01 - 42.00
21.01 - 22.00	

N
W E
S

0 250 500 750 1000 m



VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SH41

17/09/2025 (T7)

11640_SH41_BT7
Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

Diepte in m [NAP]

- 1.88 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00
- 25.01 - 26.00
- 26.01 - 27.00
- 27.01 - 28.00
- 28.01 - 29.00
- 29.01 - 30.00
- 30.01 - 31.00
- 31.01 - 32.00
- 32.01 - 33.00
- 33.01 - 34.00
- 34.01 - 35.00
- 35.01 - 36.00
- 36.01 - 37.00
- 37.01 - 38.00
- 38.01 - 39.00
- 39.01 - 40.00
- 40.01 - 41.00
- 41.01 - 42.00


N
W E
S

0 250 500 750 1000 m

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 1 002 381 m³

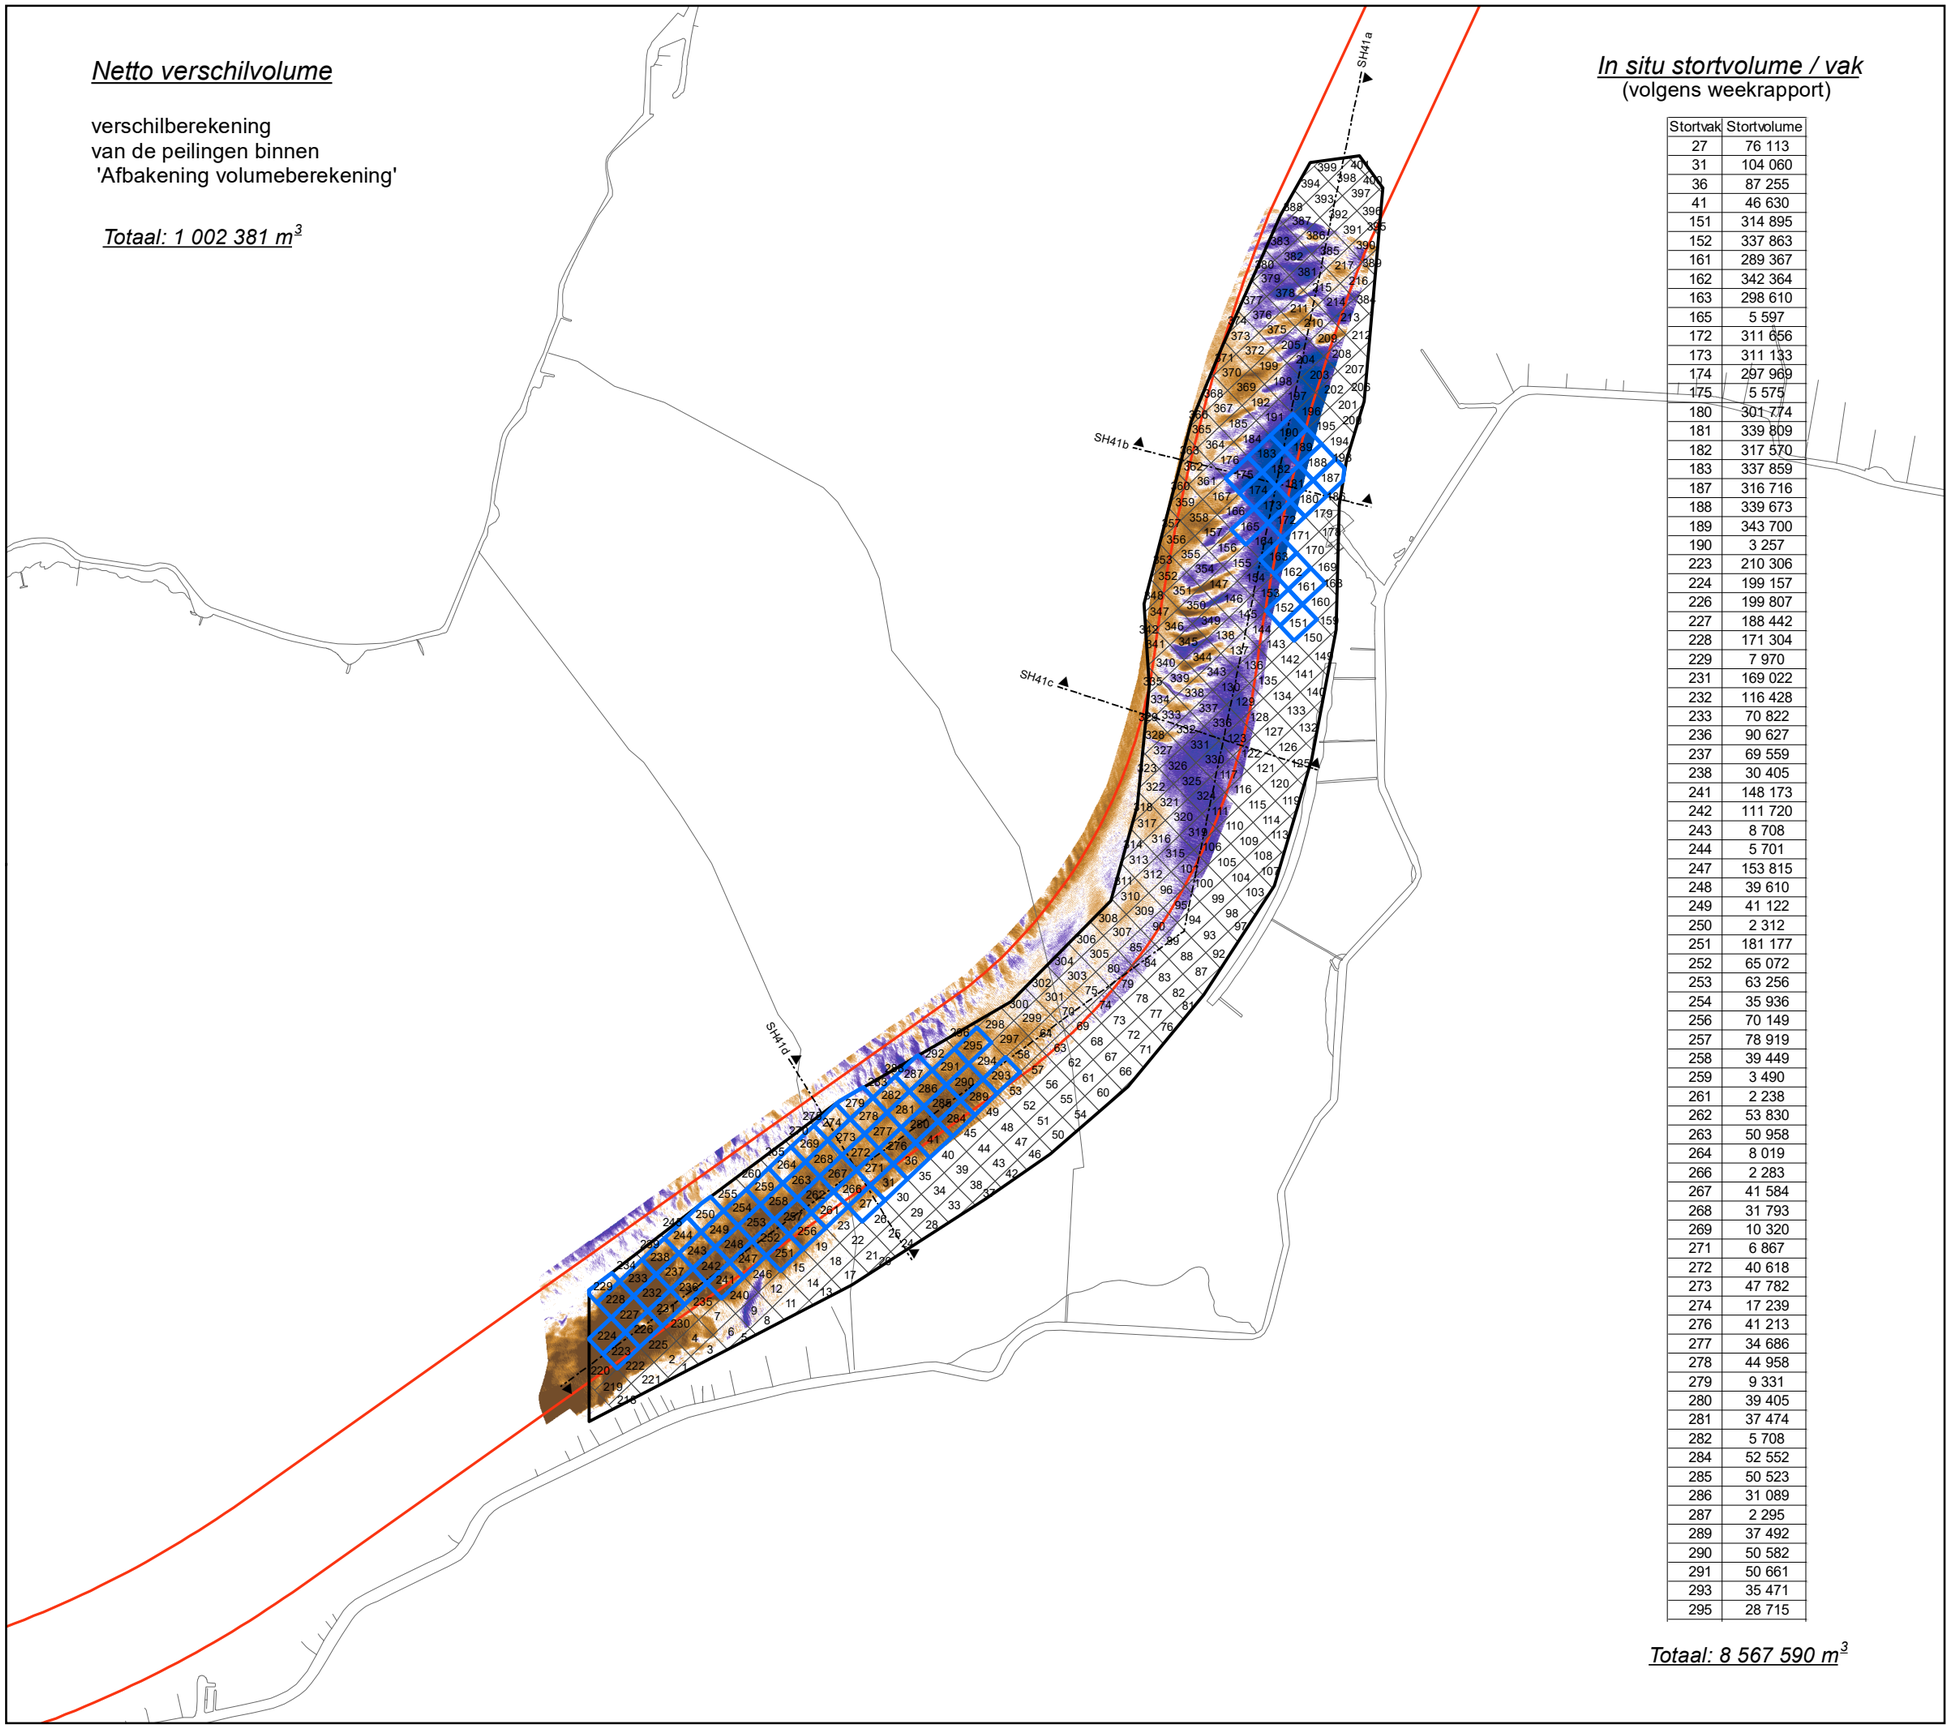

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
27	76 113
31	104 060
36	87 255
41	46 630
151	314 895
152	337 863
161	289 367
162	342 364
163	298 610
165	5 597
172	311 656
173	311 133
174	297 969
175	5 575
180	301 774
181	339 809
182	317 570
183	337 859
187	316 716
188	339 673
189	343 700
190	3 257
223	210 306
224	199 157
226	199 807
227	188 442
228	171 304
229	7 970
231	169 022
232	116 428
233	70 822
236	90 627
237	69 559
238	30 405
241	148 173
242	111 720
243	8 708
244	5 701
247	153 815
248	39 610
249	41 122
250	2 312
251	181 177
252	65 072
253	63 256
254	35 936
256	70 149
257	78 919
258	39 449
259	3 490
261	2 238
262	53 830
263	50 958
264	8 019
266	2 283
267	41 584
268	31 793
269	10 320
271	6 867
272	40 618
273	47 782
274	17 239
276	41 213
277	34 686
278	44 958
279	9 331
280	39 405
281	37 474
282	5 708
284	52 552
285	50 523
286	31 089
287	2 295
289	37 492
290	50 582
291	50 661
293	35 471
295	28 715

Totaal: 8 567 590 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH41

18/07/2022 (T0) - 18/08/2025 (T6)

11640_SH41_VT6-T0
Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50


N W E S

0 500 1000 1500 2000 m

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 299 526 m³

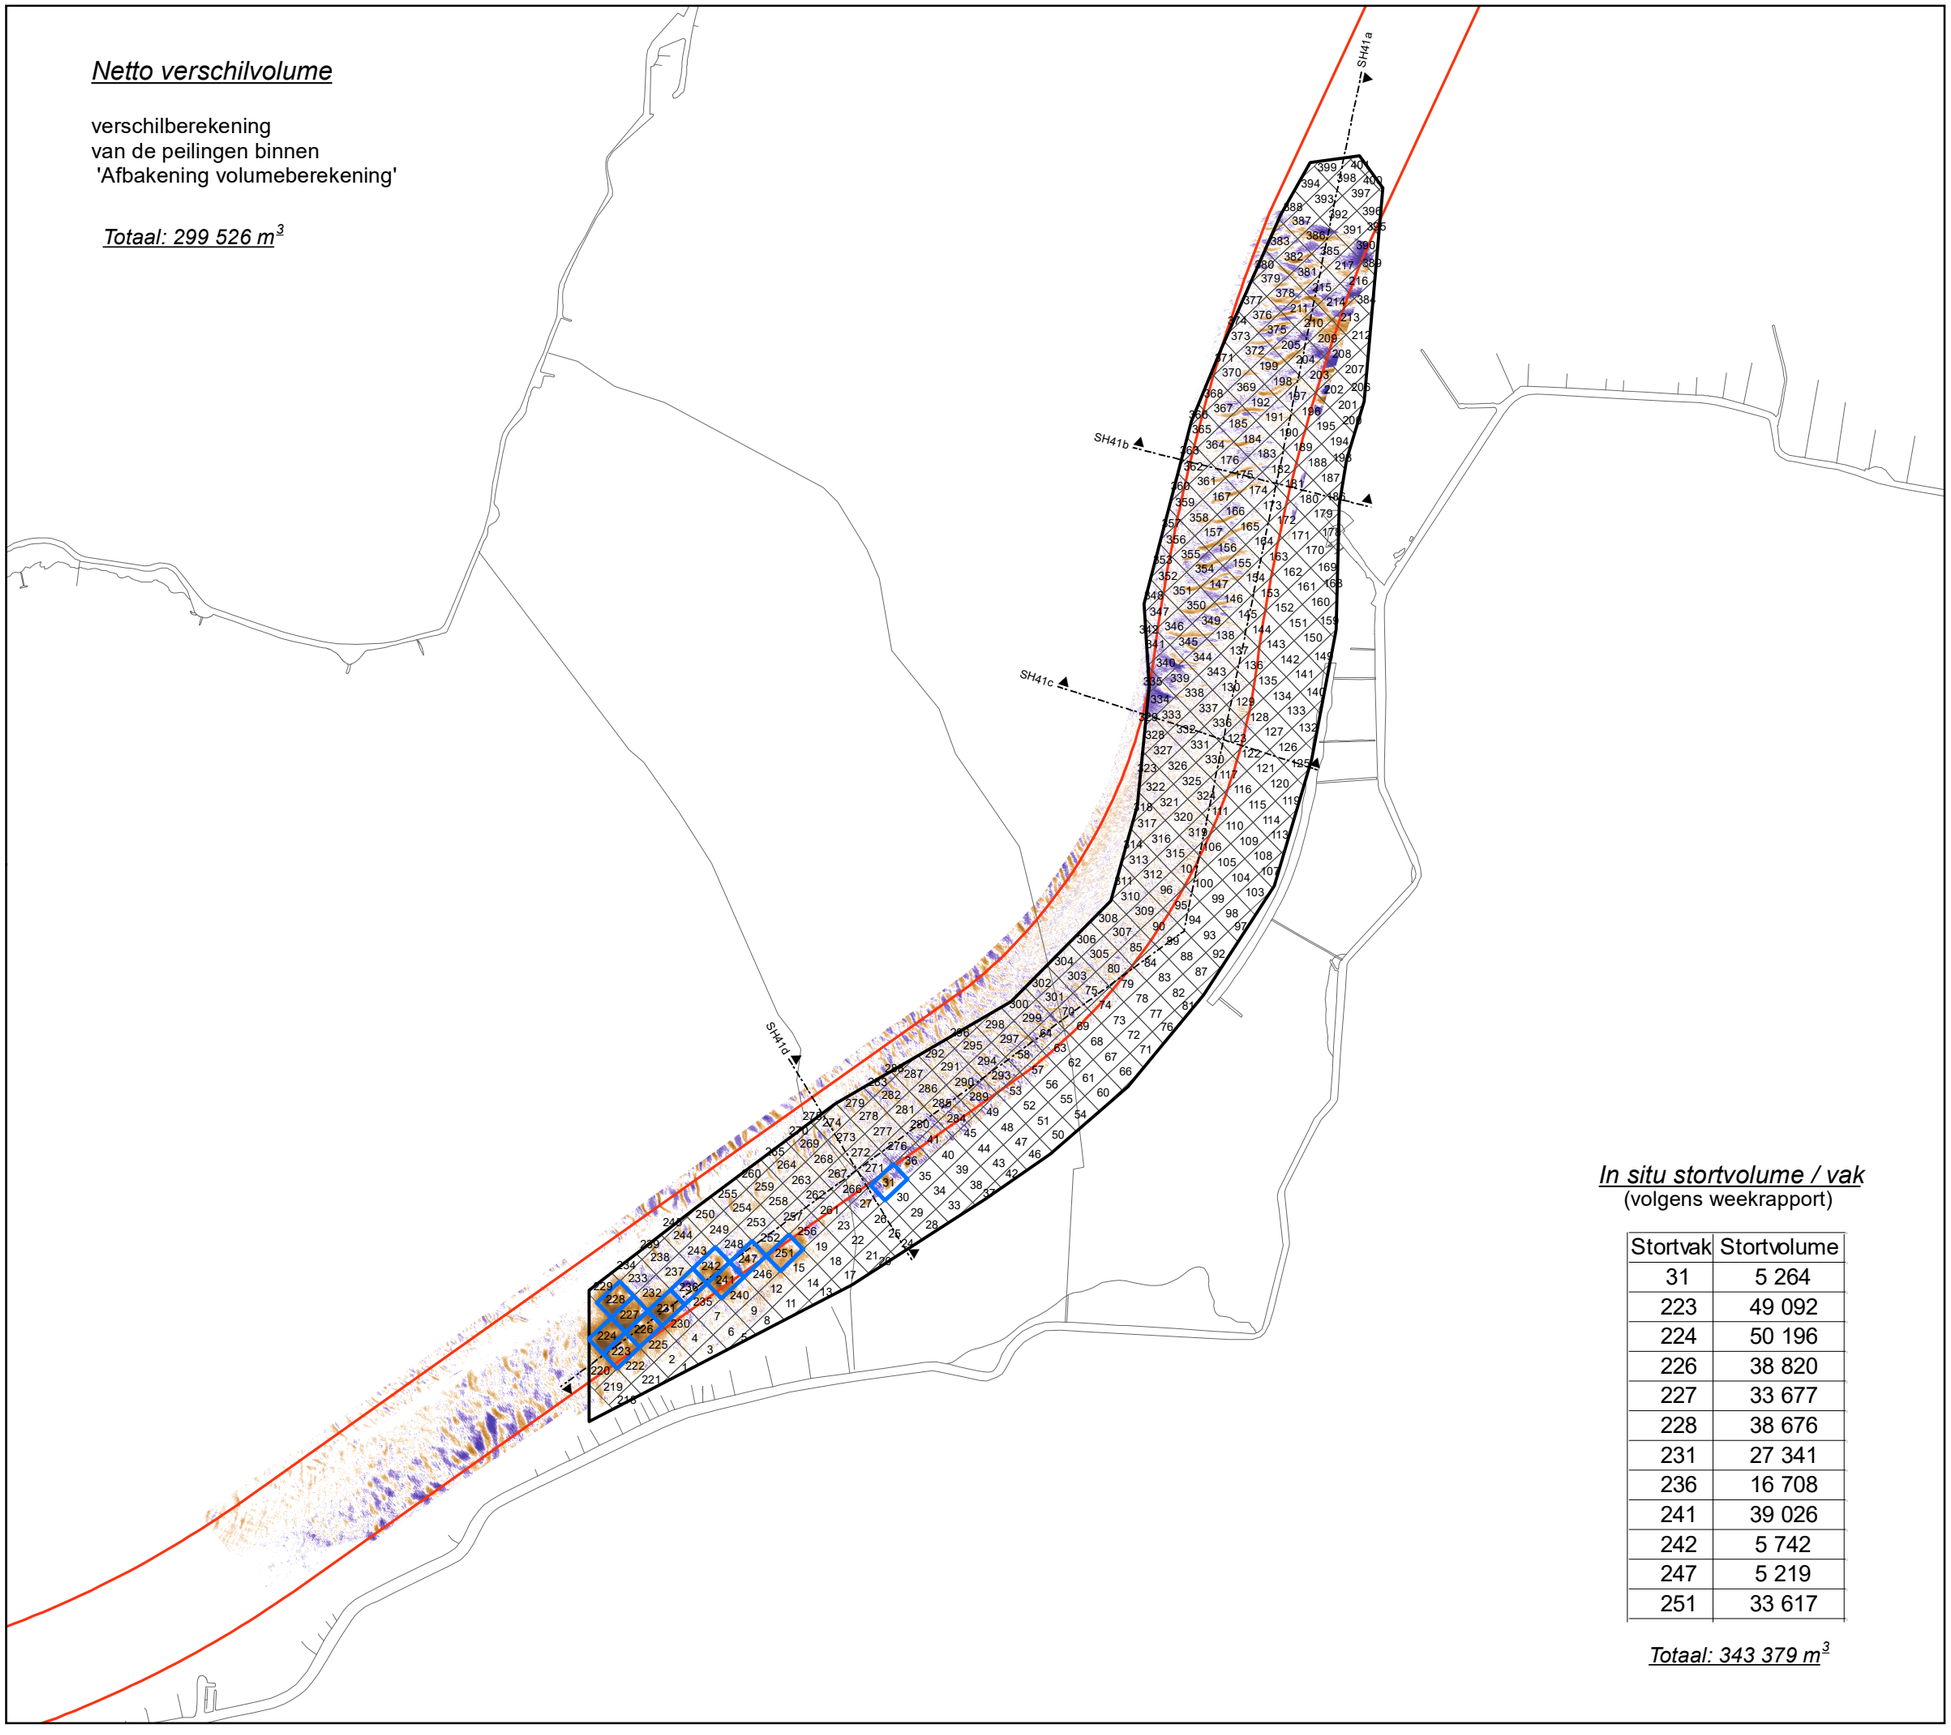

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
31	5 264
223	49 092
224	50 196
226	38 820
227	33 677
228	38 676
231	27 341
236	16 708
241	39 026
242	5 742
247	5 219
251	33 617

Totaal: 343 379 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH41

23/07/2025 (T5) - 18/08/2025 (T6)

11640_SH41_VT6-T5
Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	verdieping
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	


N
W E
S

0 500 1000 1500 2000 m

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 8 095 m³

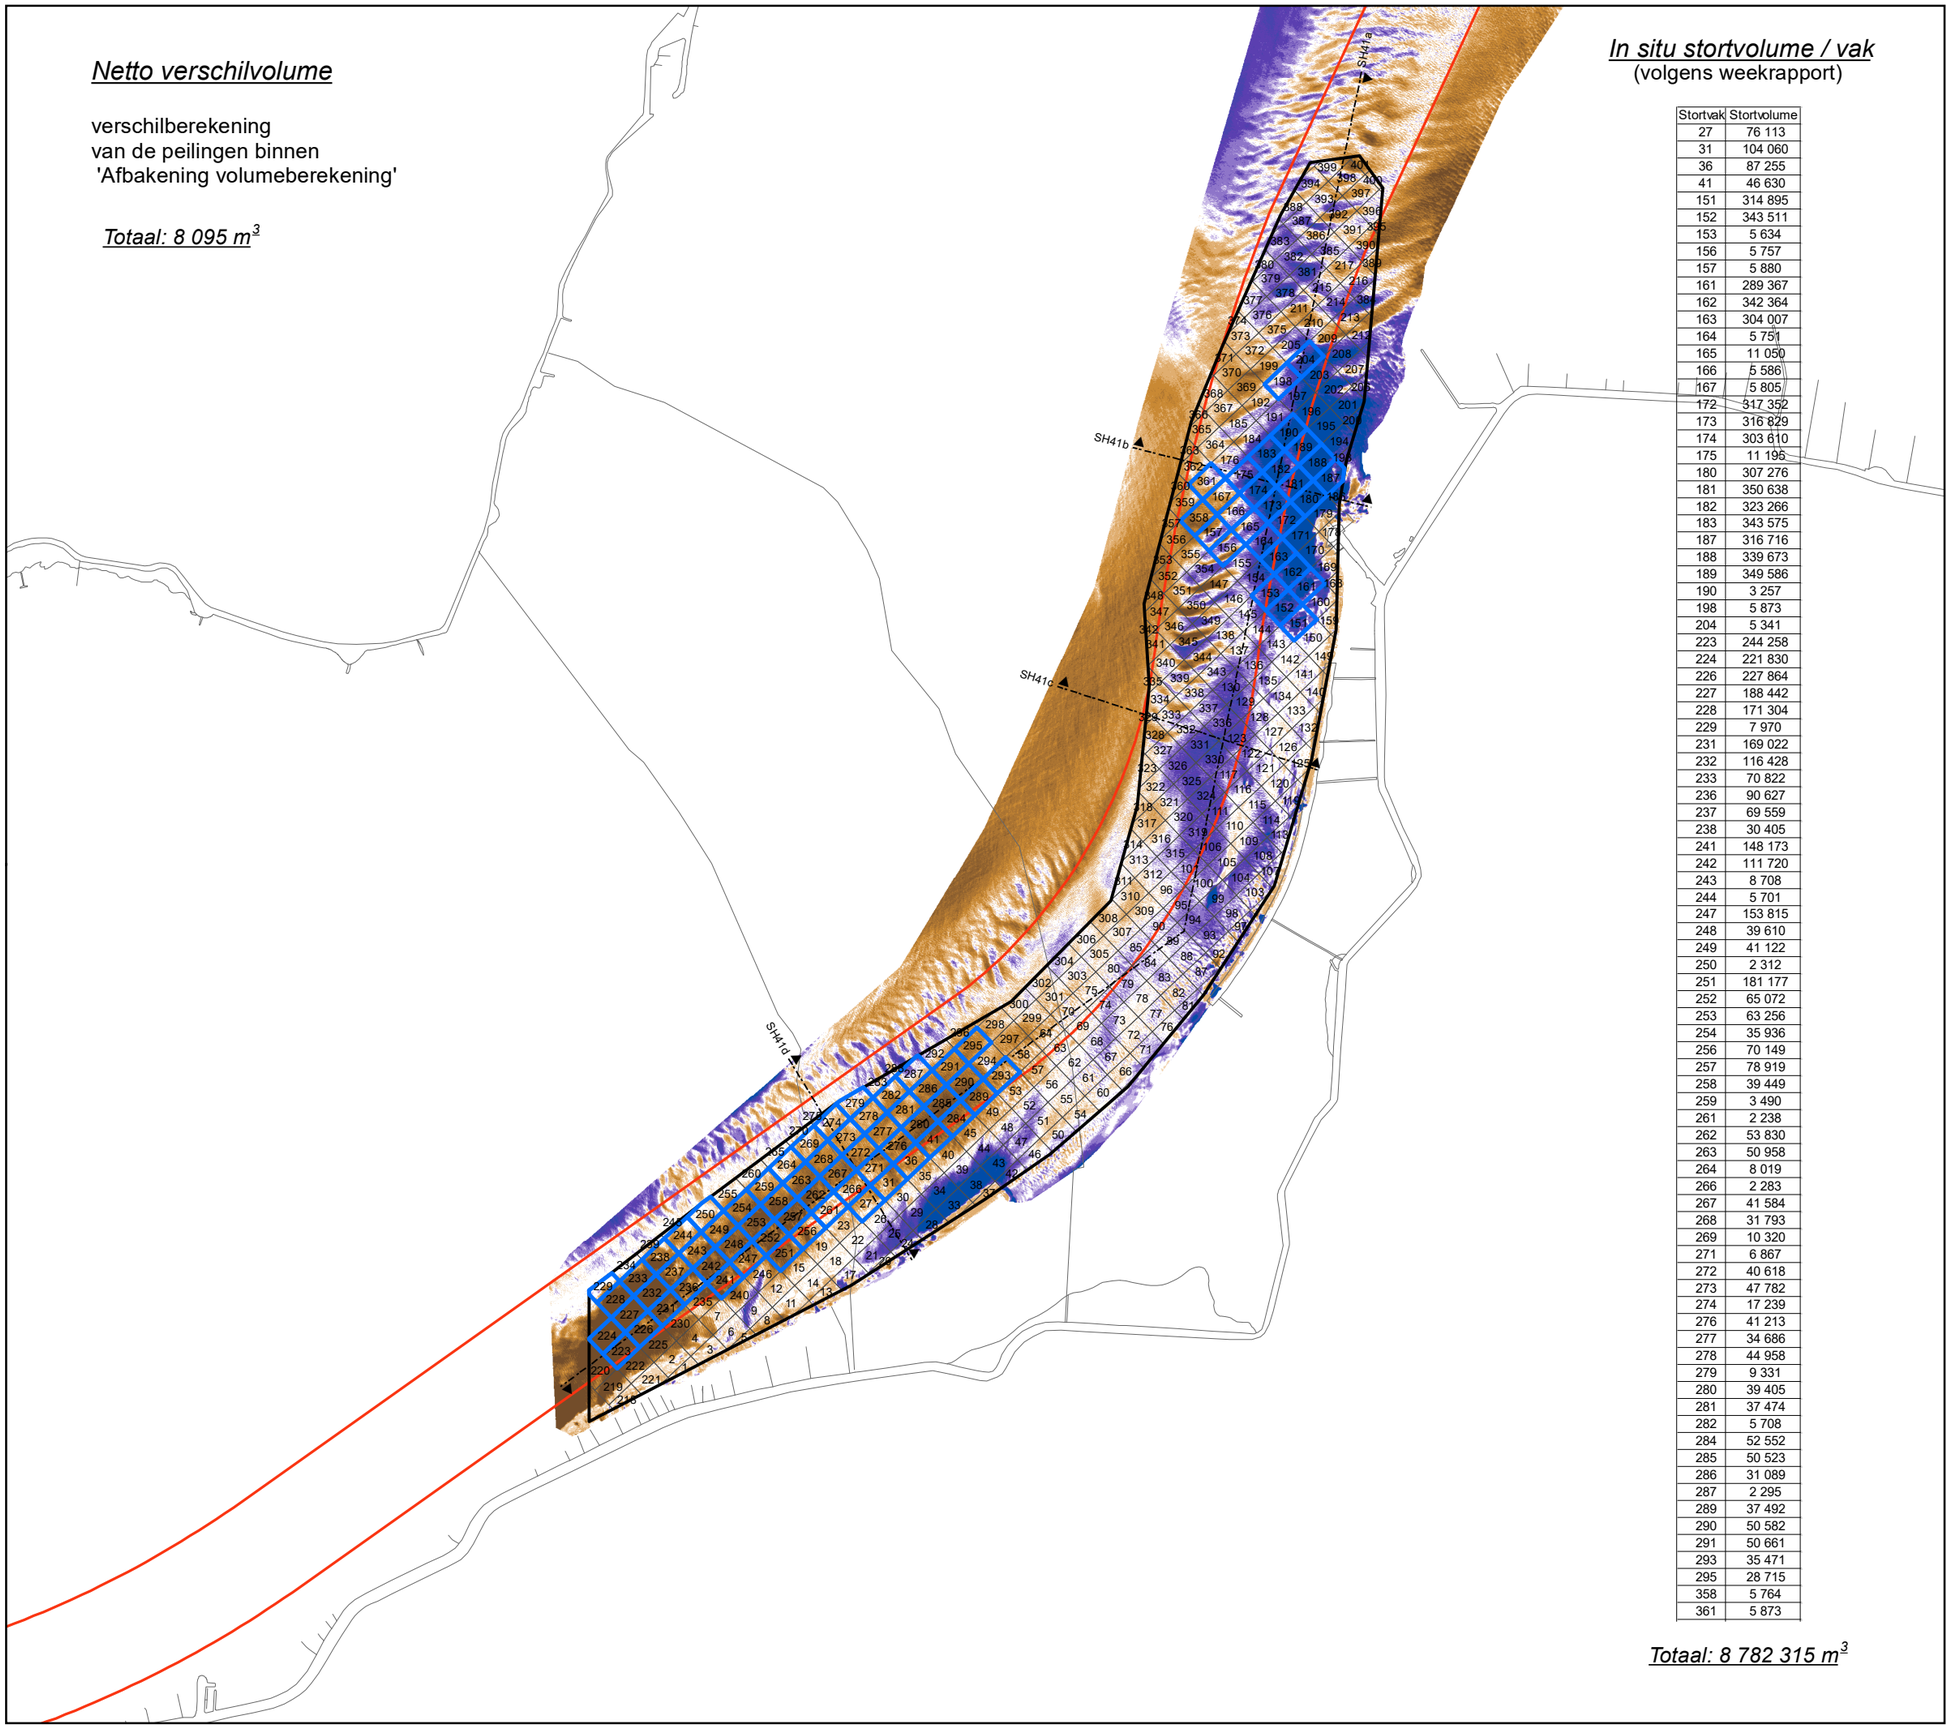

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
27	76 113
31	104 060
36	87 255
41	46 630
151	314 895
152	343 511
153	5 634
156	5 757
157	5 880
161	289 367
162	342 364
163	304 007
164	5 751
165	11 050
166	5 586
167	5 805
172	317 352
173	316 829
174	303 610
175	11 195
180	307 276
181	350 638
182	323 266
183	343 575
187	316 716
188	339 673
189	349 586
190	3 257
198	5 873
204	5 341
223	244 258
224	221 830
226	227 864
227	188 442
228	171 304
229	7 970
231	169 022
232	116 428
233	70 822
236	90 627
237	69 559
238	30 405
241	148 173
242	111 720
243	8 708
244	5 701
247	153 815
248	39 610
249	41 122
250	2 312
251	181 177
252	65 072
253	63 256
254	35 936
256	70 149
257	78 919
258	39 449
259	3 490
261	2 238
262	53 830
263	50 958
264	8 019
266	2 283
267	41 584
268	31 793
269	10 320
271	6 867
272	40 618
273	47 782
274	17 239
276	41 213
277	34 686
278	44 958
279	9 331
280	39 405
281	37 474
282	5 708
284	52 552
285	50 523
286	31 089
287	2 295
289	37 492
290	50 582
291	50 661
293	35 471
295	28 715
358	5 764
361	5 873

Totaal: 8 782 315 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH41

18/07/2022 (T0) - 17/09/2025 (T7)

11640_SH41_VT7-T0
Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50


N W E S

0 500 1000 1500 2000 m

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 267 249 m³

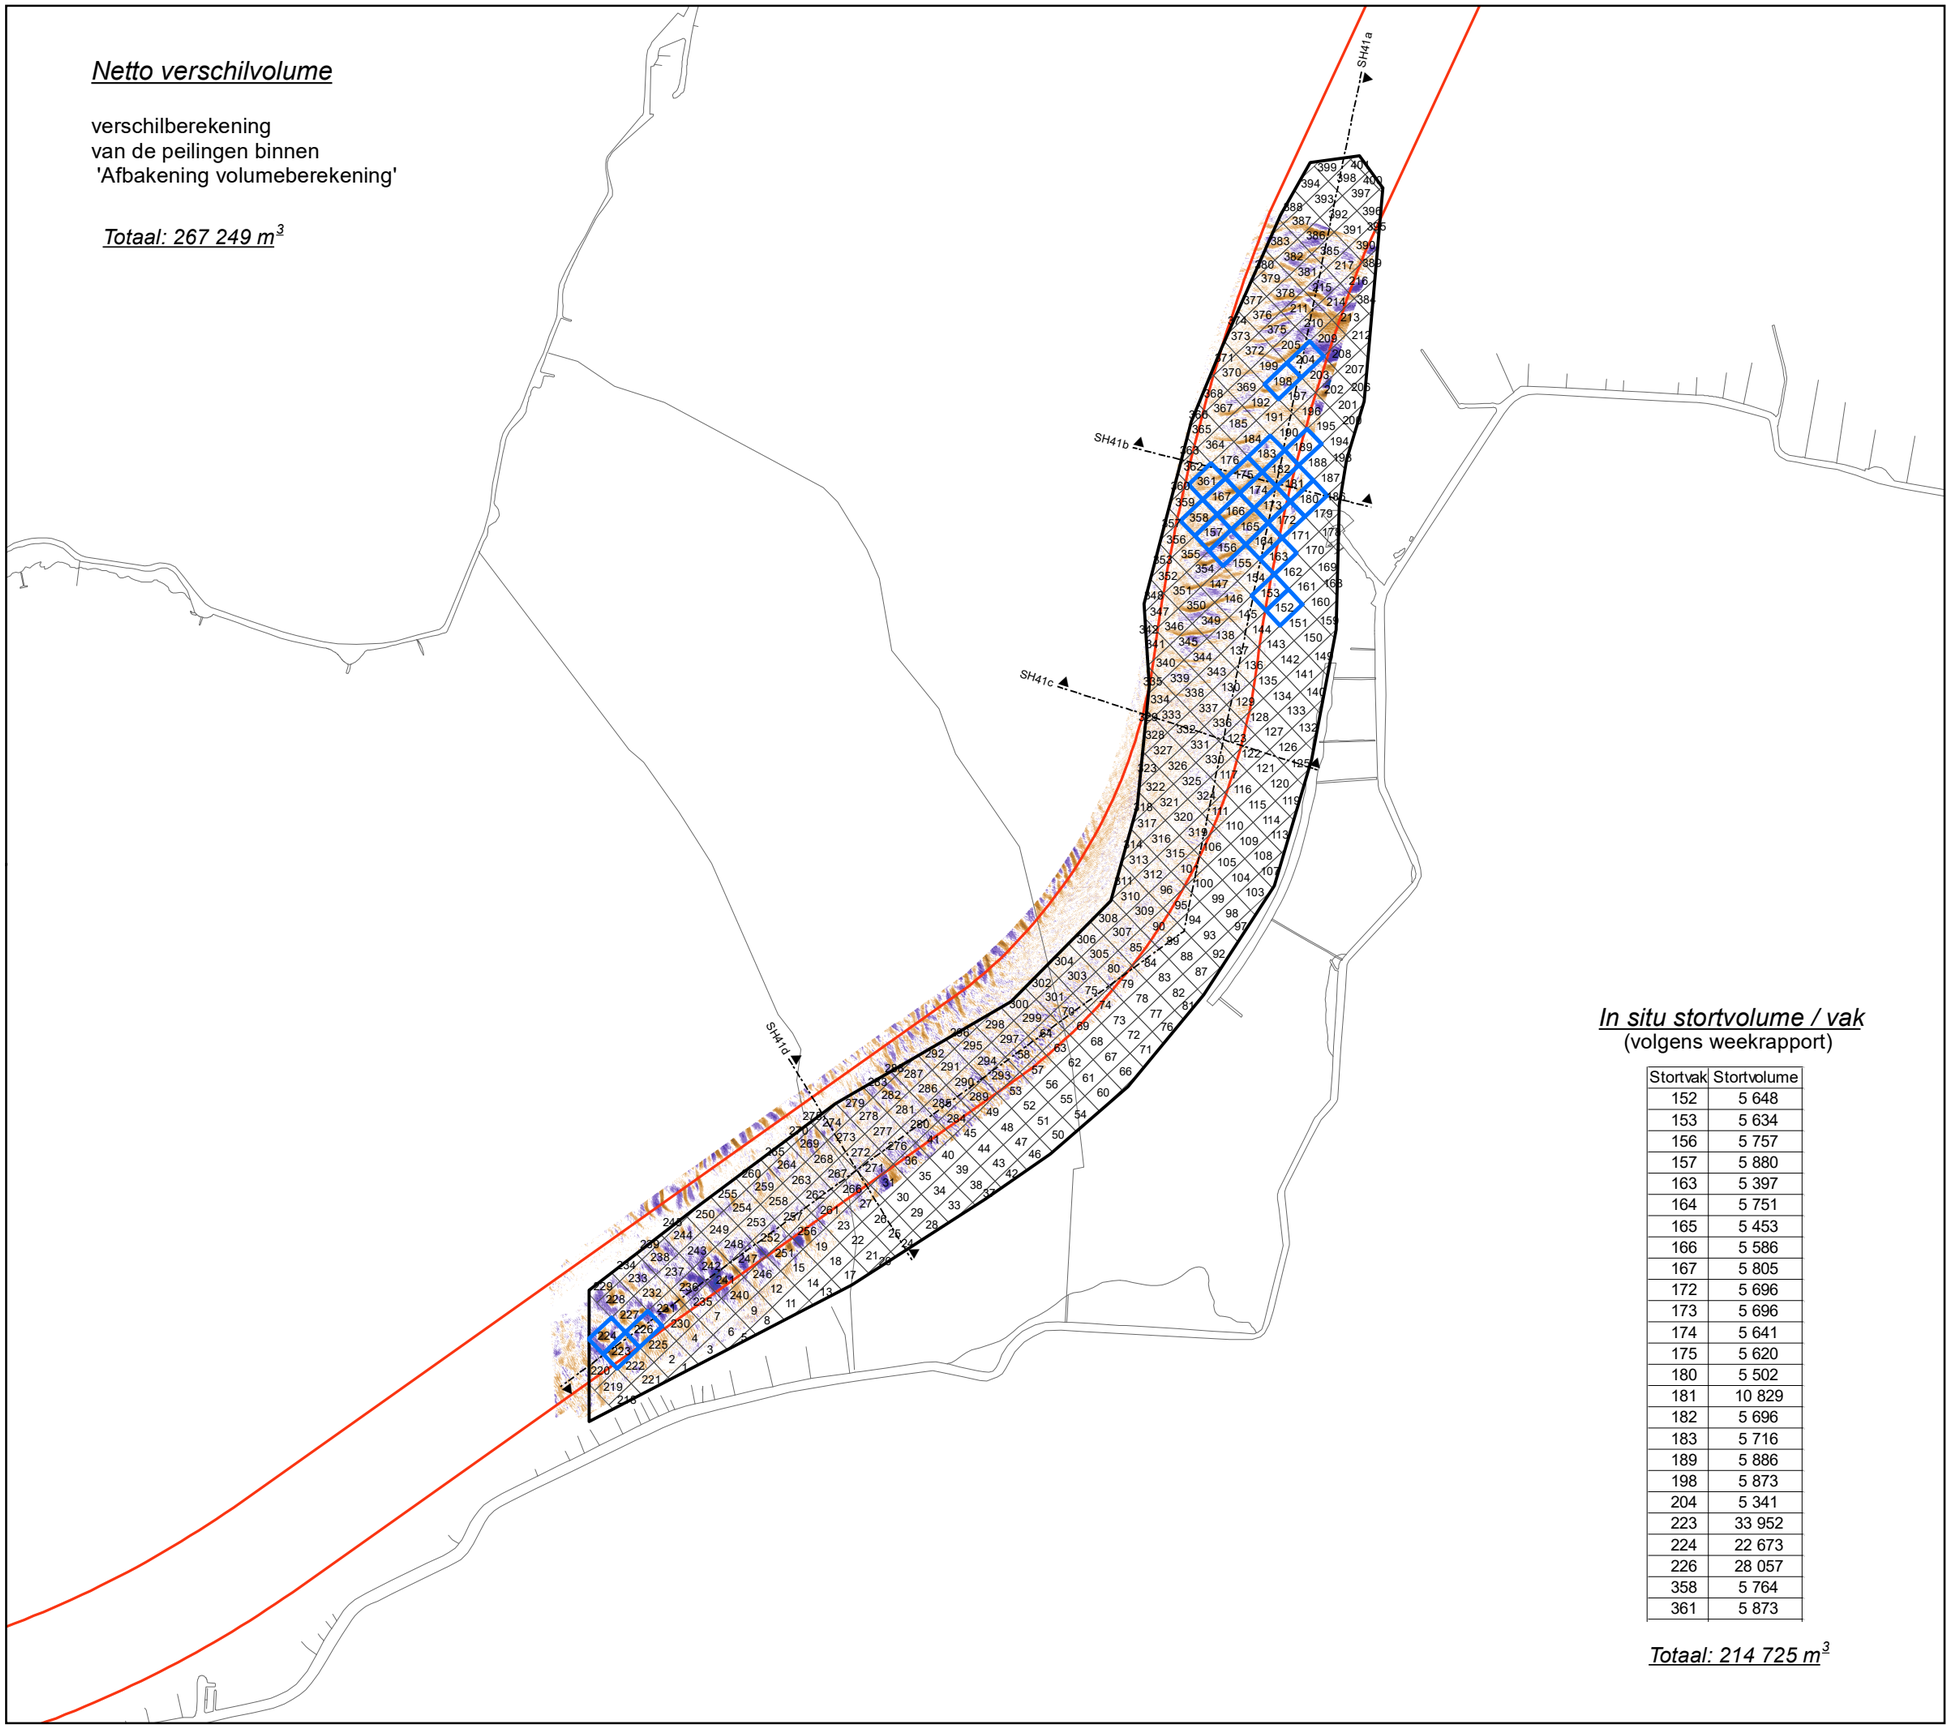

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
152	5 648
153	5 634
156	5 757
157	5 880
163	5 397
164	5 751
165	5 453
166	5 586
167	5 805
172	5 696
173	5 696
174	5 641
175	5 620
180	5 502
181	10 829
182	5 696
183	5 716
189	5 886
198	5 873
204	5 341
223	33 952
224	22 673
226	28 057
358	5 764
361	5 873

Totaal: 214 725 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH41

18/08/2025 (T6) - 17/09/2025 (T7)

11640_SH41_VT7-T6
Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m


verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50

- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N
W E
S

0 500 1000 1500 2000 m

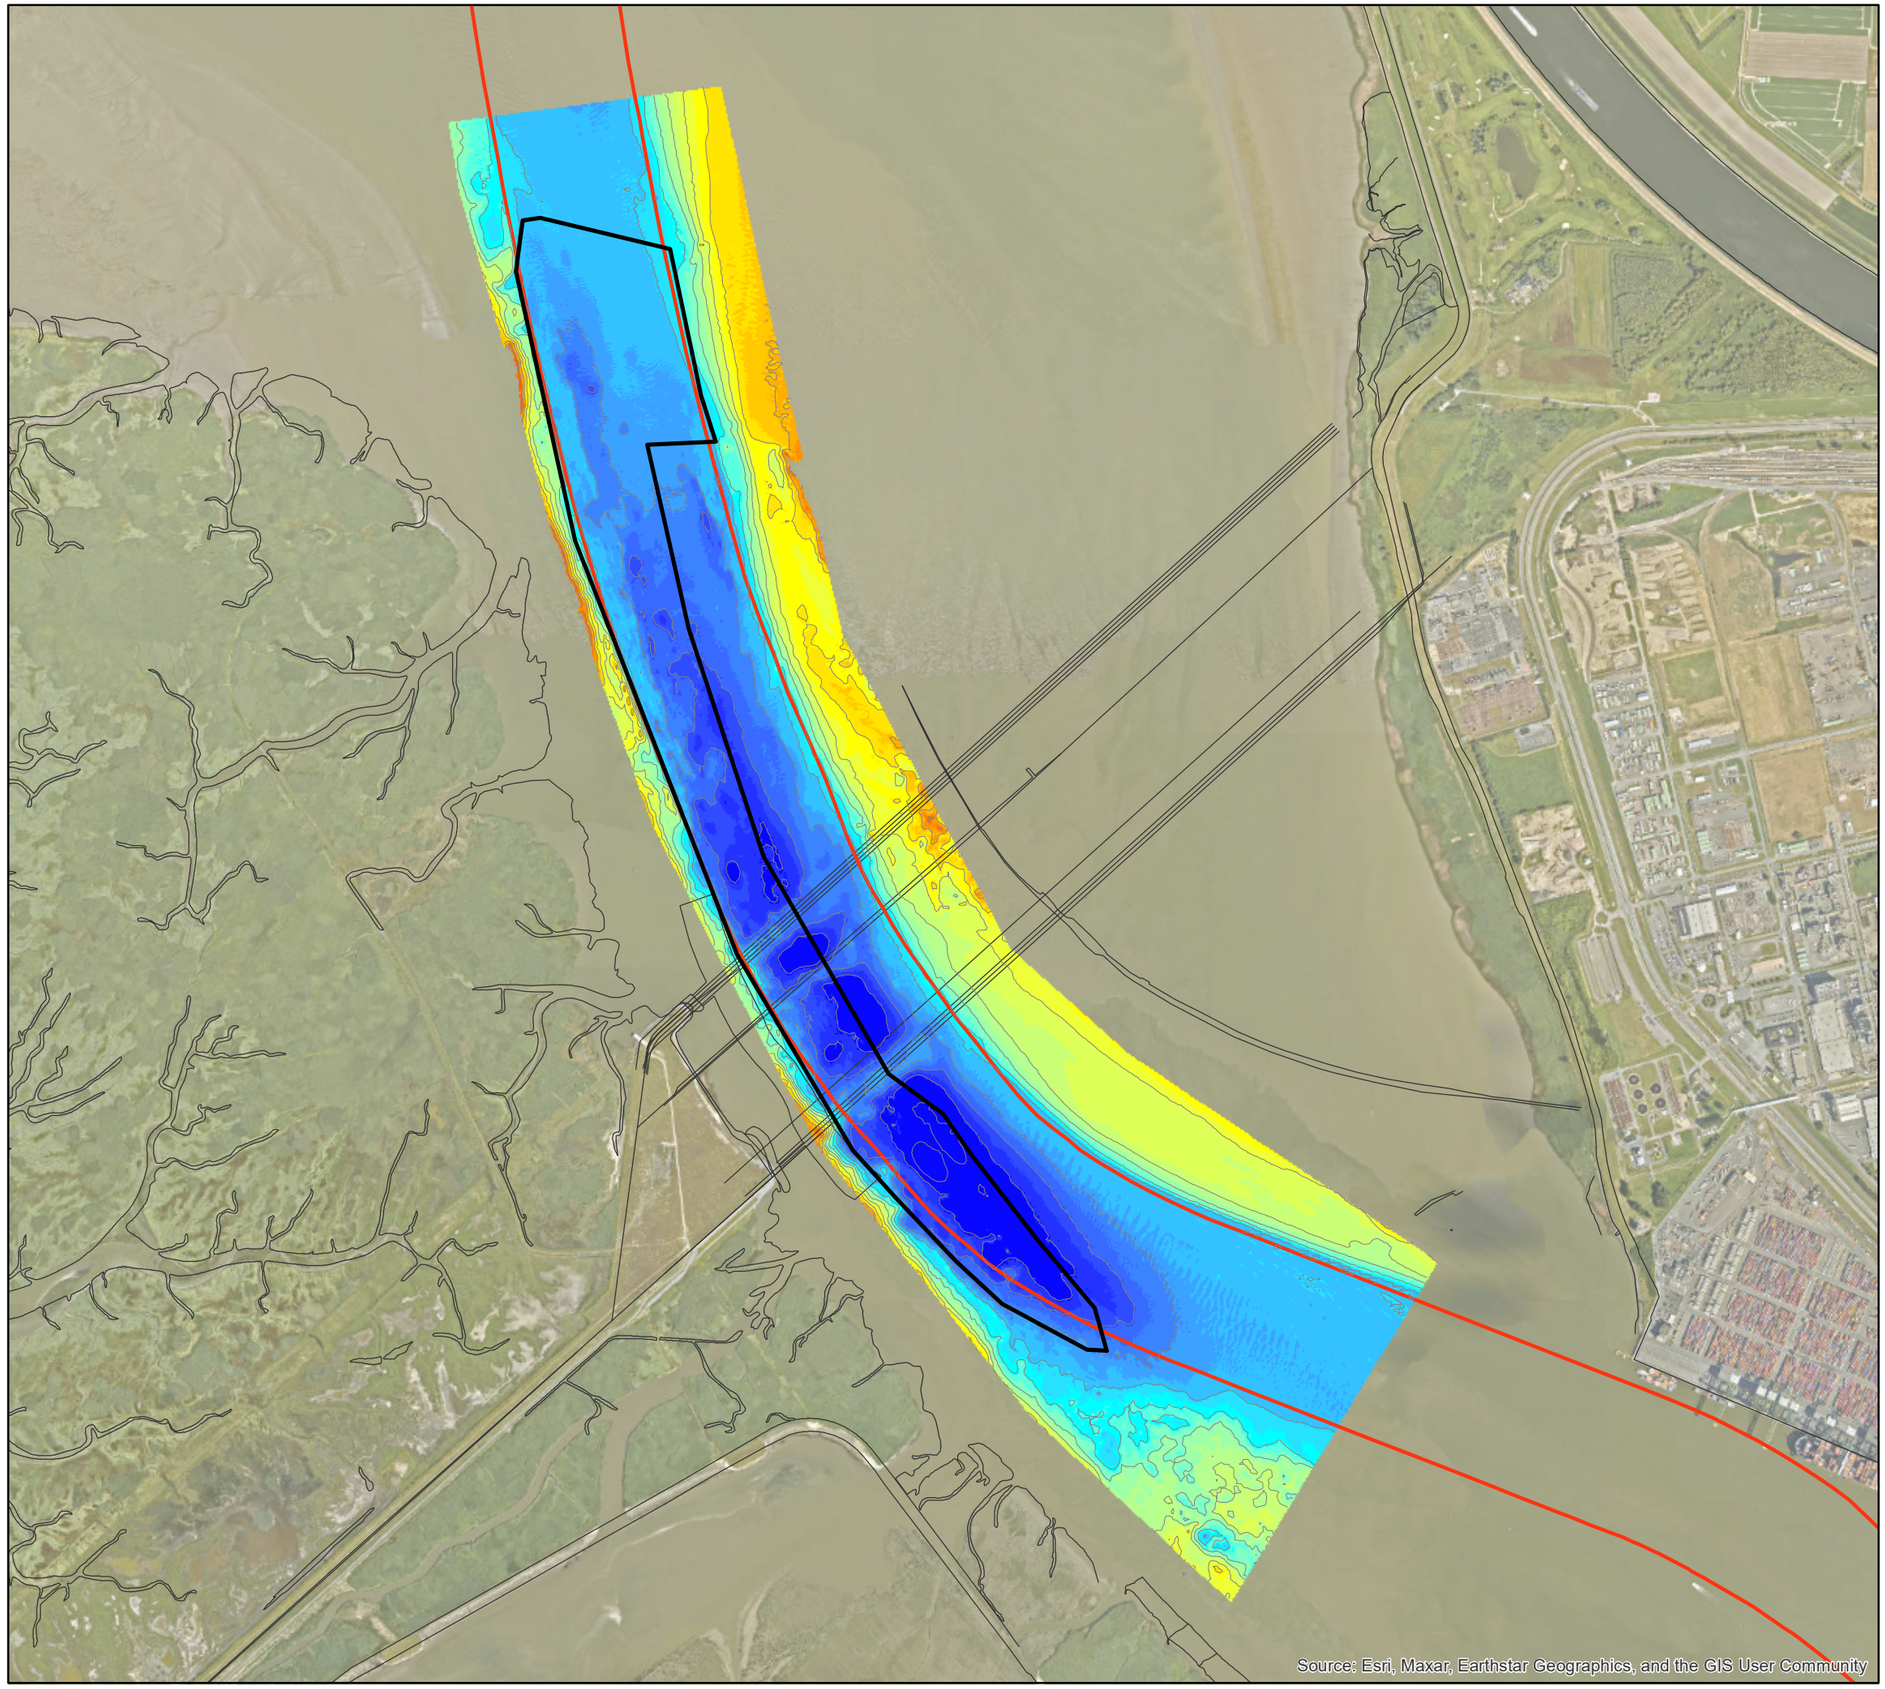

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SH71

23/09/2025 (T43)

11640_SH71_BT43
Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

Diepte in m [NAP]

- 0.09 - 1.00
- 1.01 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00

N
W E
S

0 250 500 750 1000 1250

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
1	55 933
2	35 561
4	82 623
5	6 833
21	22 432
22	304 934
23	49 433
24	20 003
25	310 965
26	56 501
28	340 848
29	259 066
32	49 111
46	2 192
47	45 762
50	4 384
51	43 037
52	2 255
53	66 462
56	16 849
57	7 812
59	15 519
60	7 693
62	5 516
63	13 630
64	7 998
65	2 266
67	9 807
68	13 364
69	7 895
73	9 935
74	11 778
77	2 238
78	7 942
79	2 181

Totaal: 1 900 759 m³

SH71a

SH71b

SH71c

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 62 516 m³

VLAAMSE OVERHEID

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH71

07/01/2021 (T0) - 23/09/2025 (T43)

11640_SH71_VT43-T0
Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N W E S

0 200 400 600 800 1000

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
4	11 377
21	5 720
22	5 812
25	5 913
28	5 696
56	5 655
60	5 495
63	5 913
64	5 846
68	11 177
69	5 703
78	5 785

Totaal: 80 092 m³

SH71a

SH71b

SH71c

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 25 351 m³

VLAAMSE OVERHEID

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH71

03/06/2025 (T42) - 23/09/2025 (T43)

11640_SH71_VT43-T42
Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE

Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken


verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N
W
E
S

0 200 400 600 800 1000

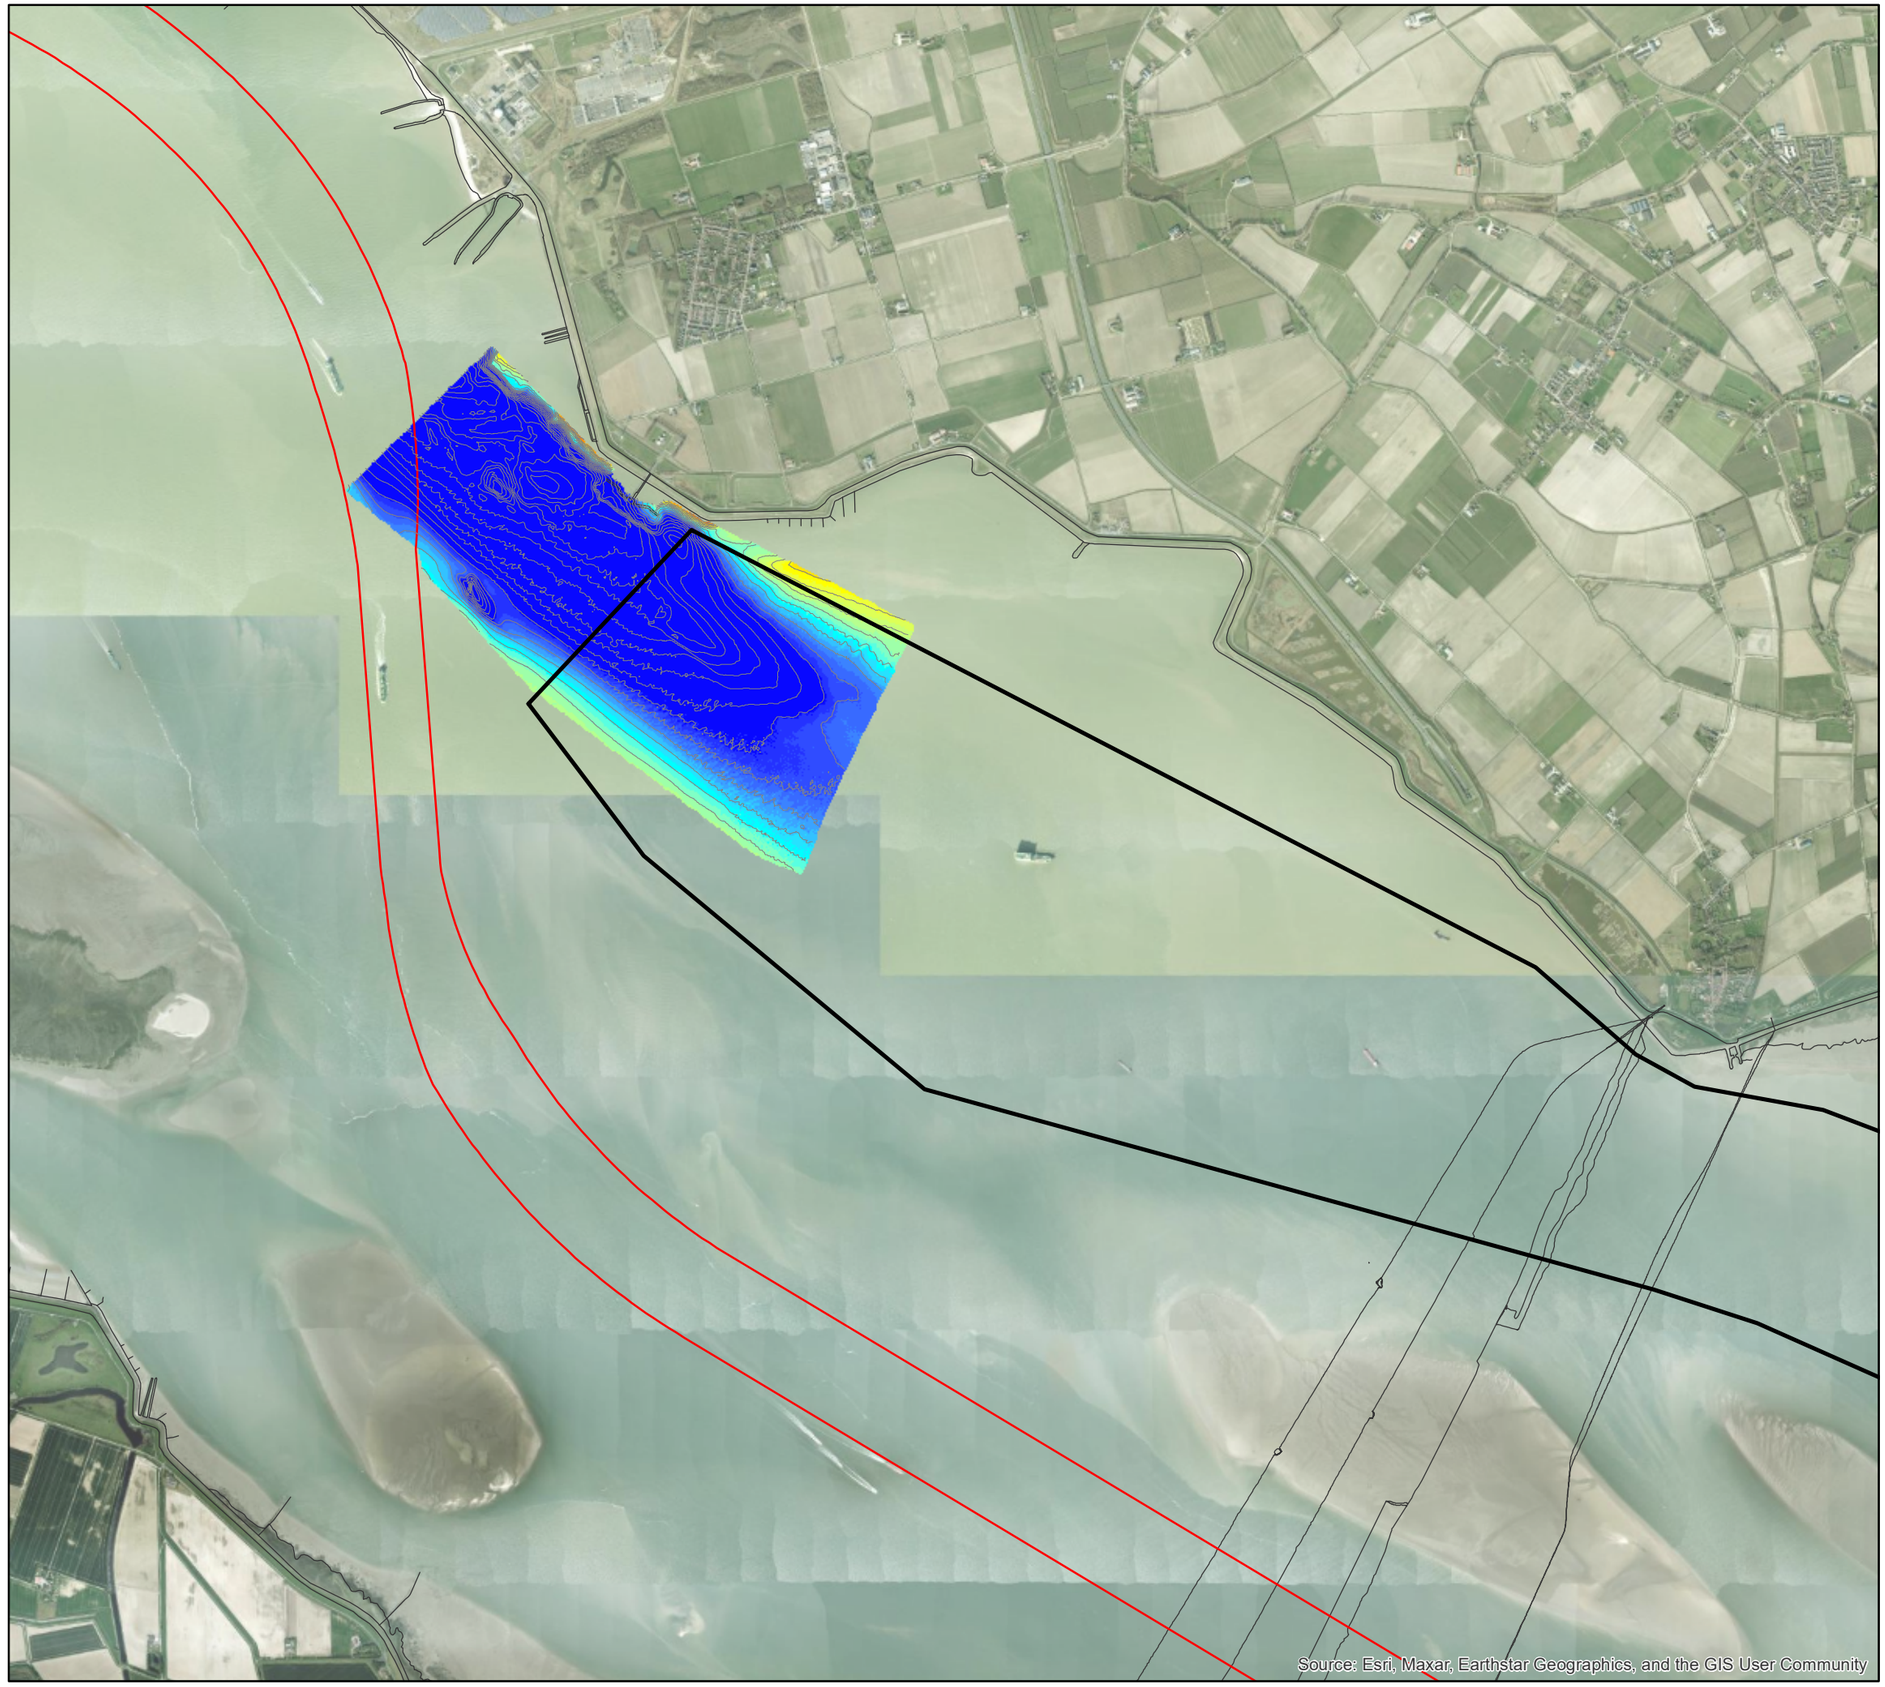

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SN31

05/08/2025

11640_SN31_west_BT5_west
Rapport nr. 25.xxx



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

Diepte in m [NAP]

- 0.09 - 1.00
- 1.01 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00

N
W E
S

0 200 400 600 800 1000 m

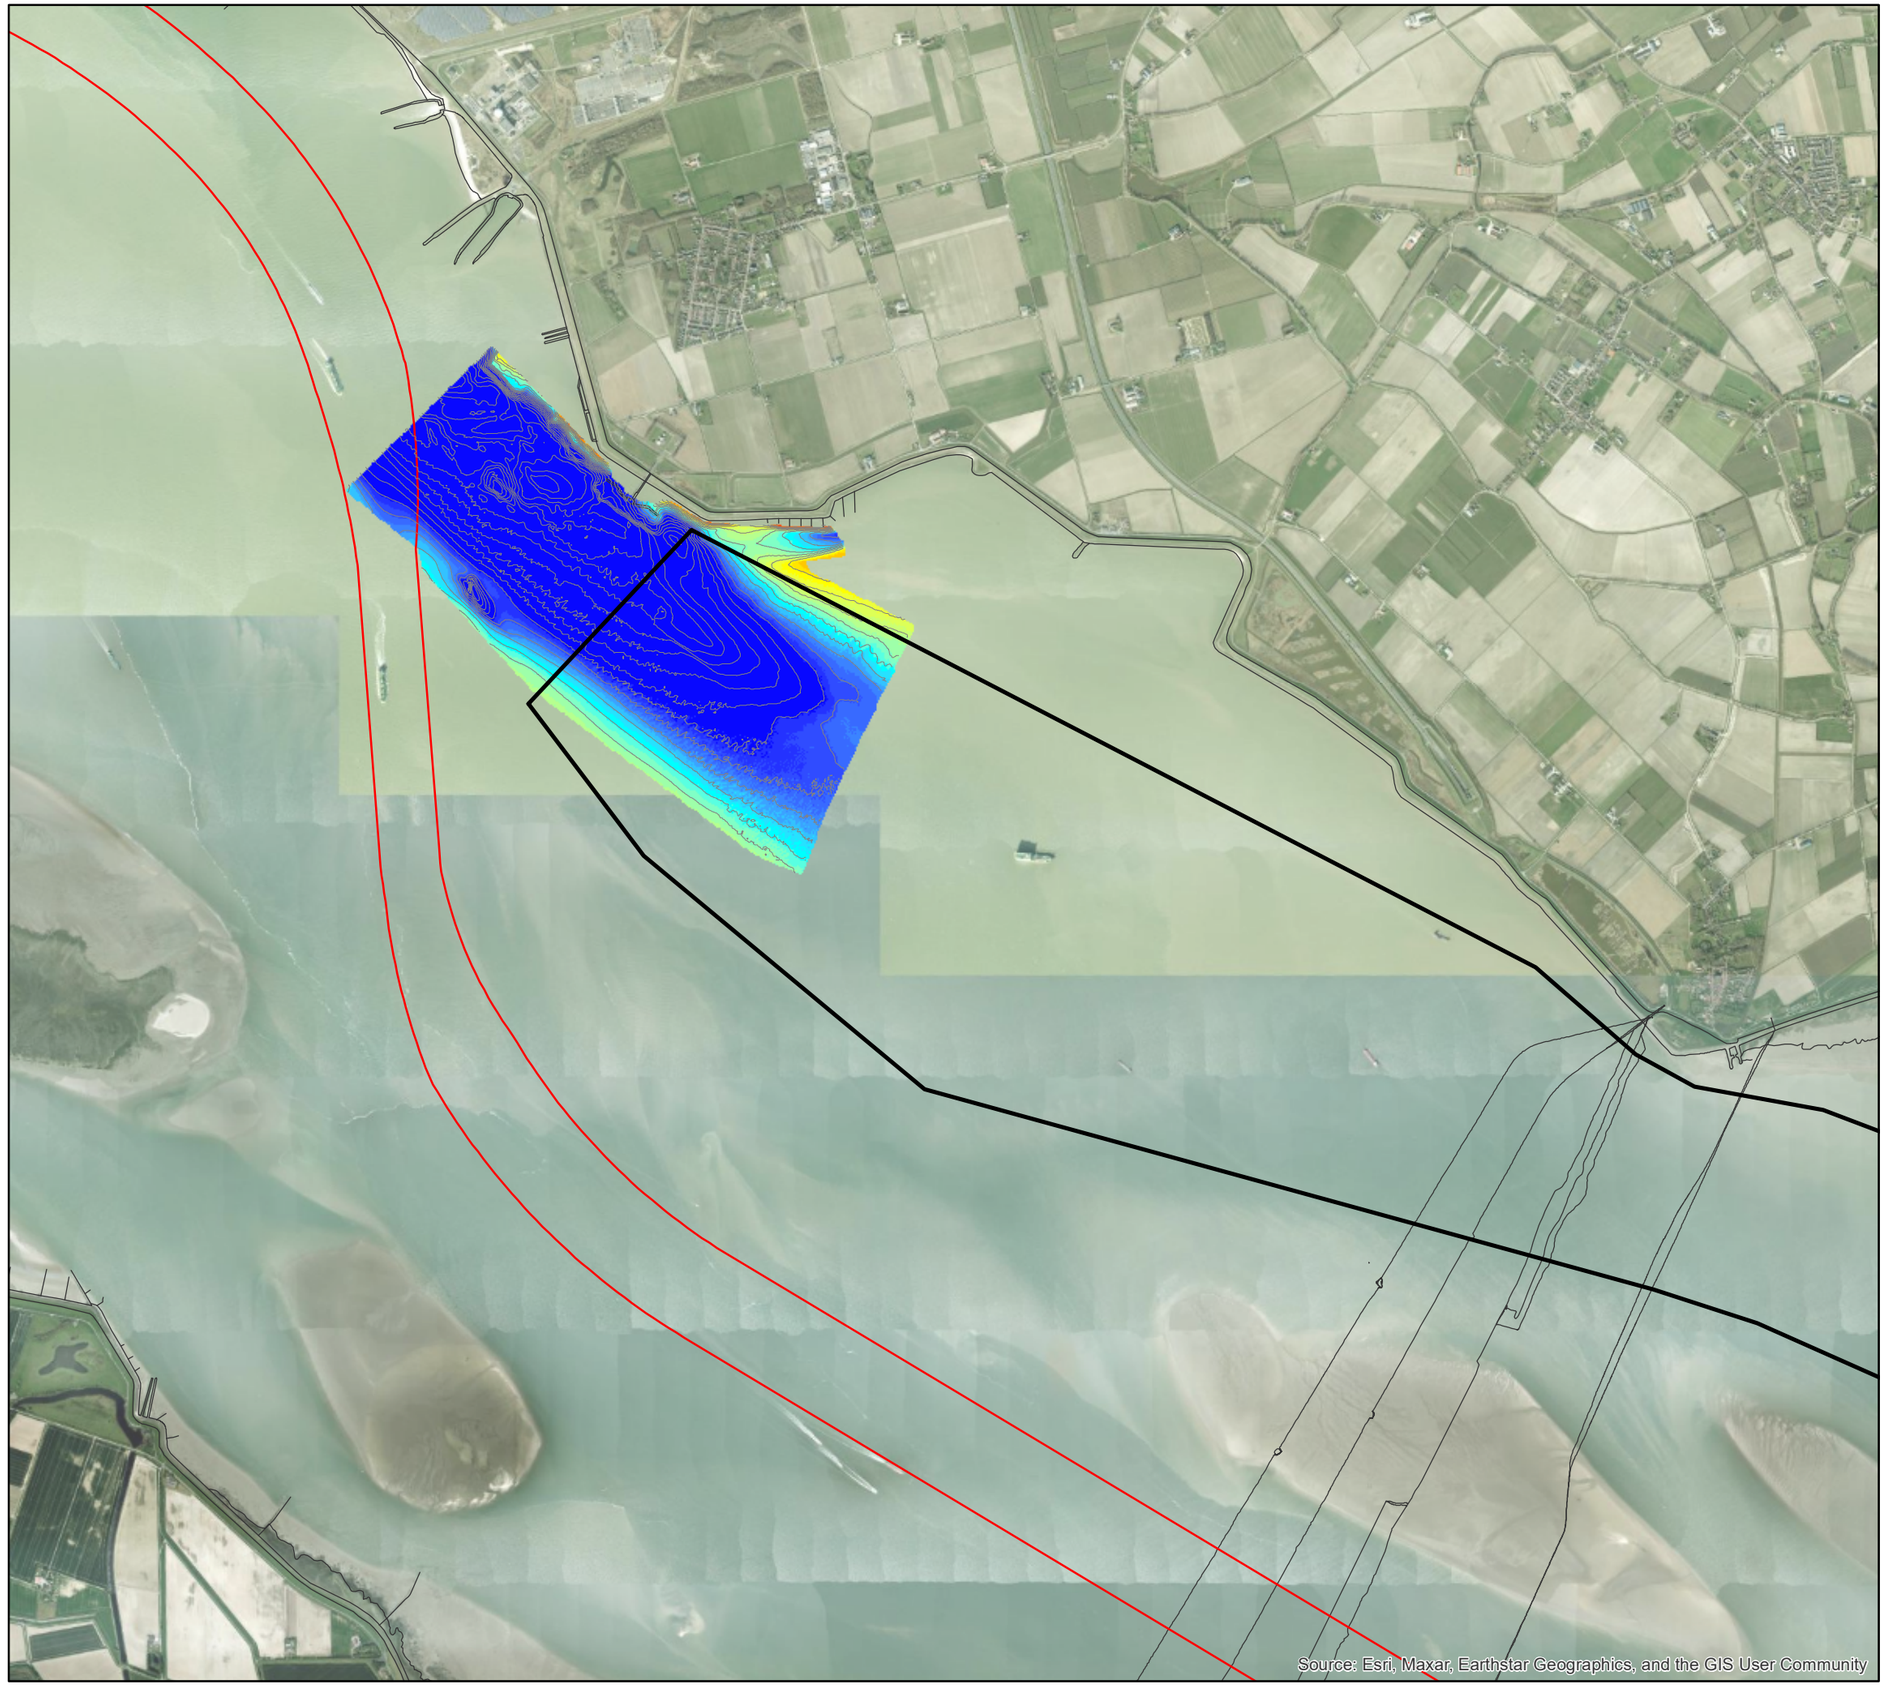

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SN31

04/09/2025 (T6)

11640_SN31_west_BT6_west
Rapport nr. 25.xxx



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

Diepte in m [NAP]

- 0.09 - 1.00
- 1.01 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00

N
W E
S

0 200 400 600 800 1000 m

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SN31

05/08/2025 (T5) - 05/07/2022 (T0)

11640_SN31_V_we_VT5-T0
Rapport nr. 25.xxx



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 291729 m³

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken


verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N W E S

0 500 1000

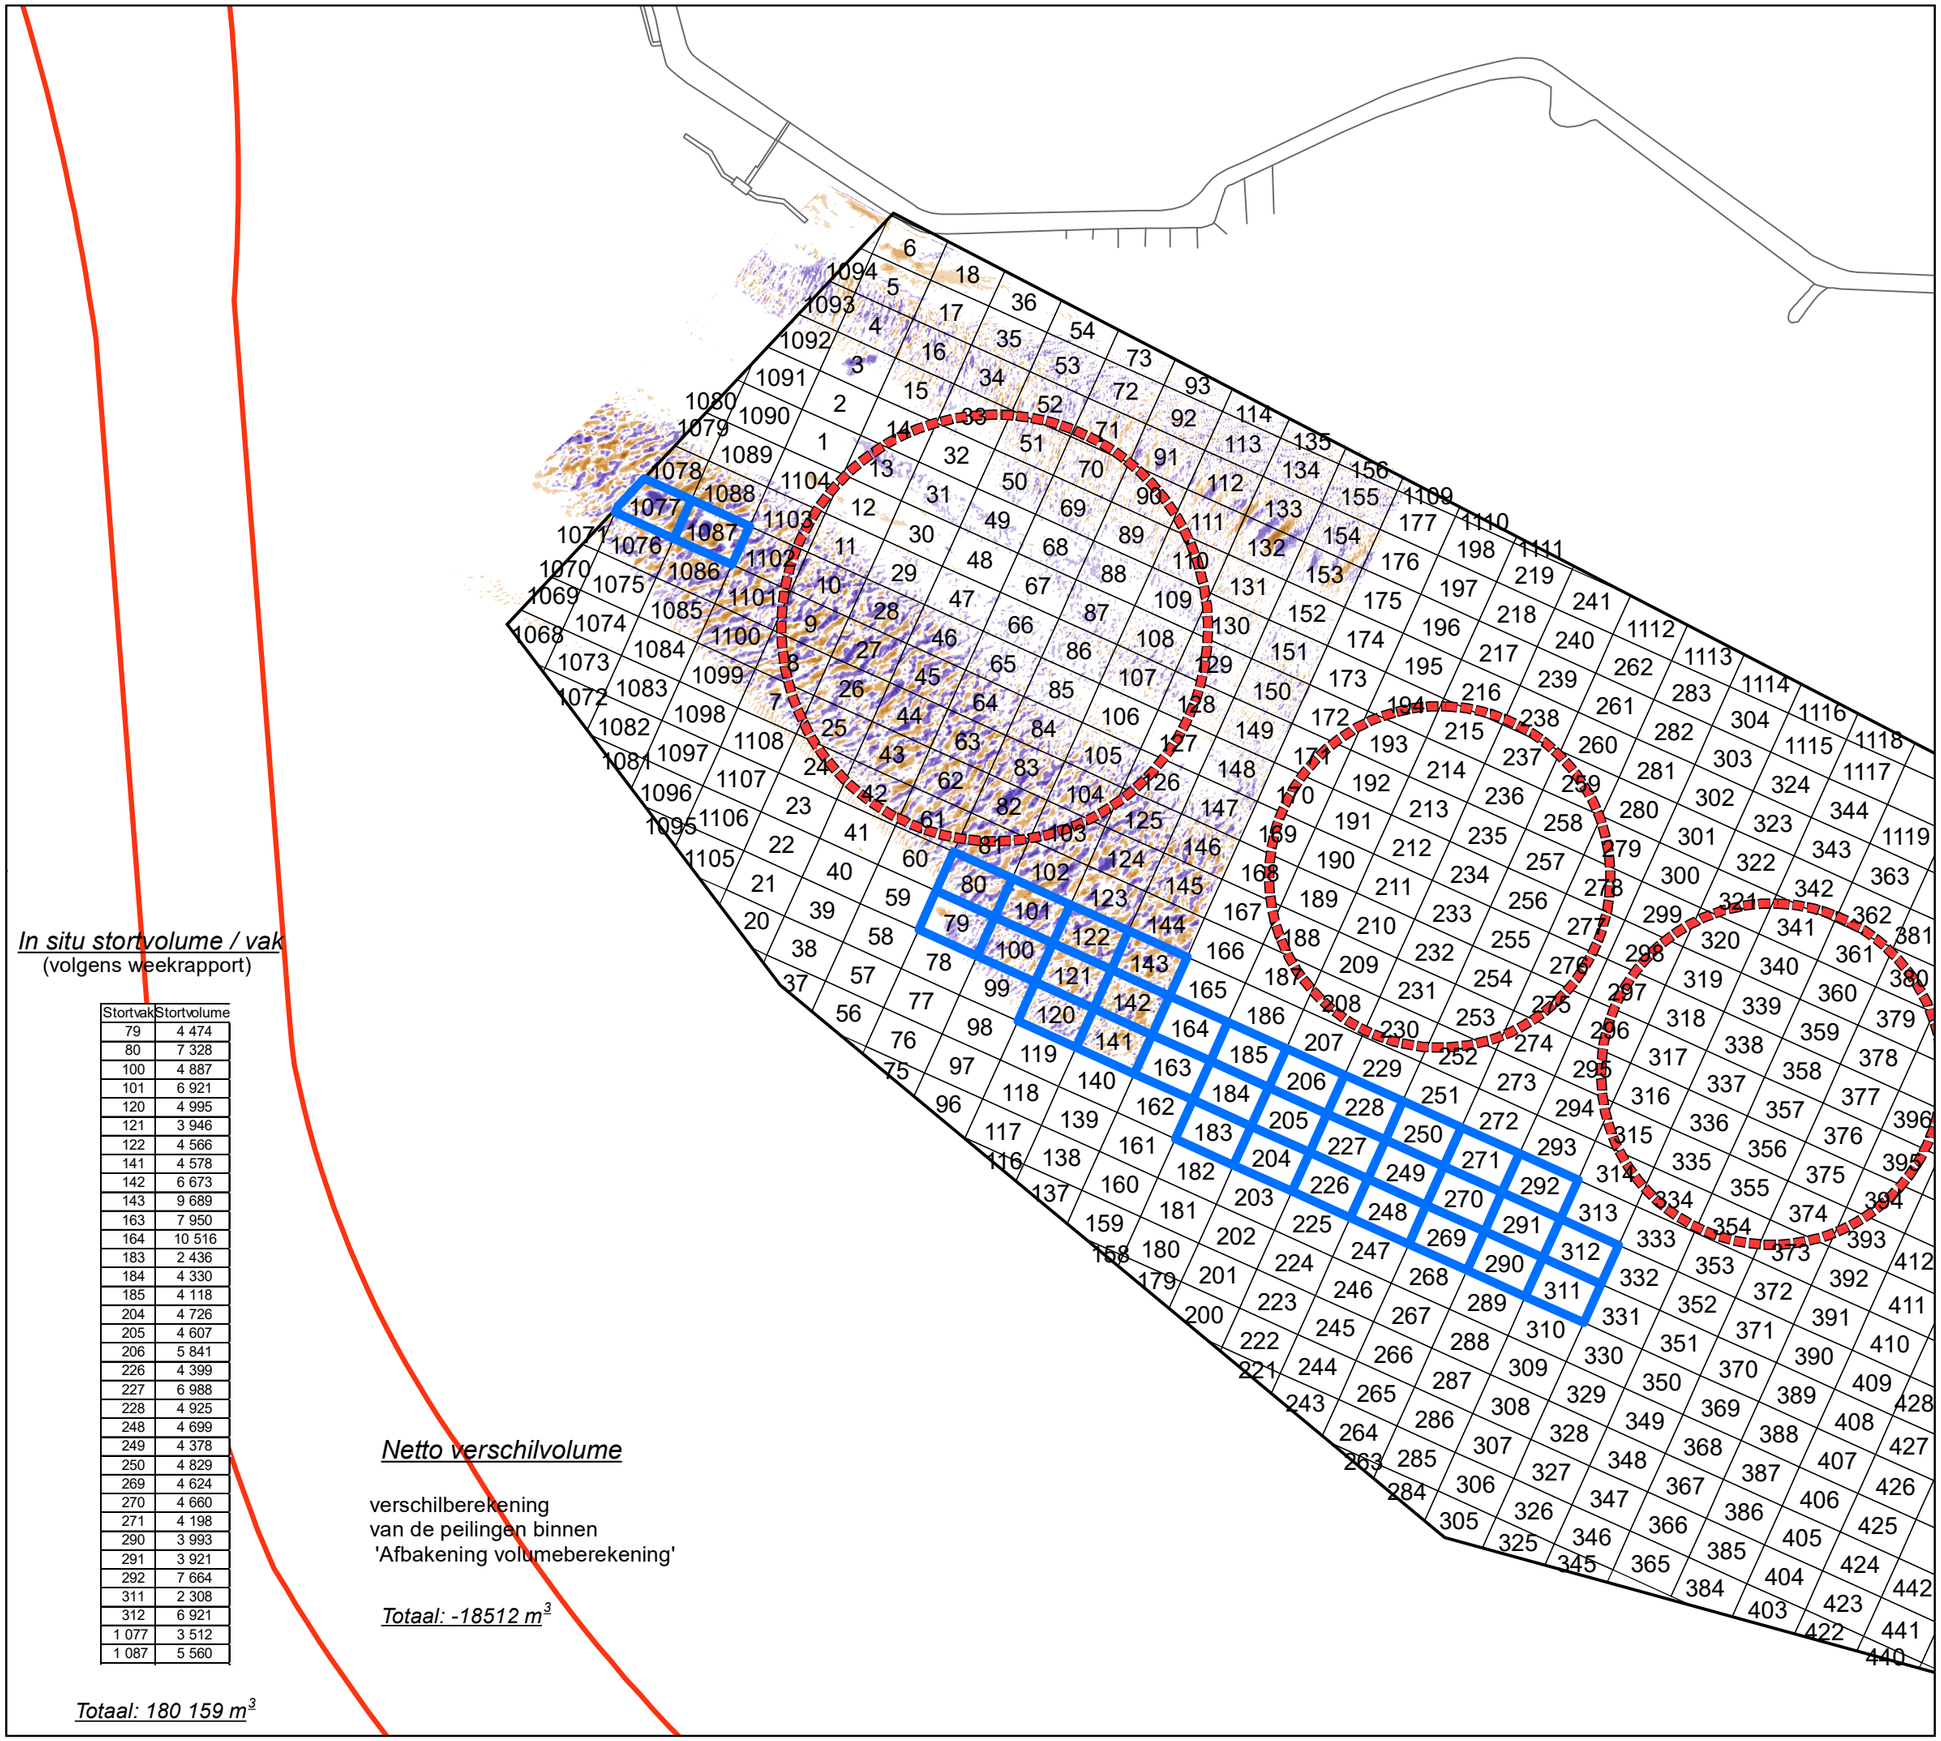

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
79	4 474
80	7 328
100	4 887
101	6 921
120	4 995
121	3 946
122	4 566
141	4 578
142	6 673
143	9 689
163	7 950
164	10 516
183	2 436
184	4 330
185	4 118
204	4 726
205	4 607
206	5 841
226	4 399
227	6 988
228	4 925
248	4 699
249	4 378
250	4 829
269	4 624
270	4 660
271	4 198
290	3 993
291	3 921
292	7 664
311	2 308
312	6 921
1 077	3 512
1 087	5 560

Totaal: 180 159 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -18512 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SN31

05/08/2025 (T5) - 05/05/2025 (T4)

11640_SN31_VT5-T4
Rapport nr. 25.xxx



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende


- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	verdieping
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

0 200 400 600 800 1000 m

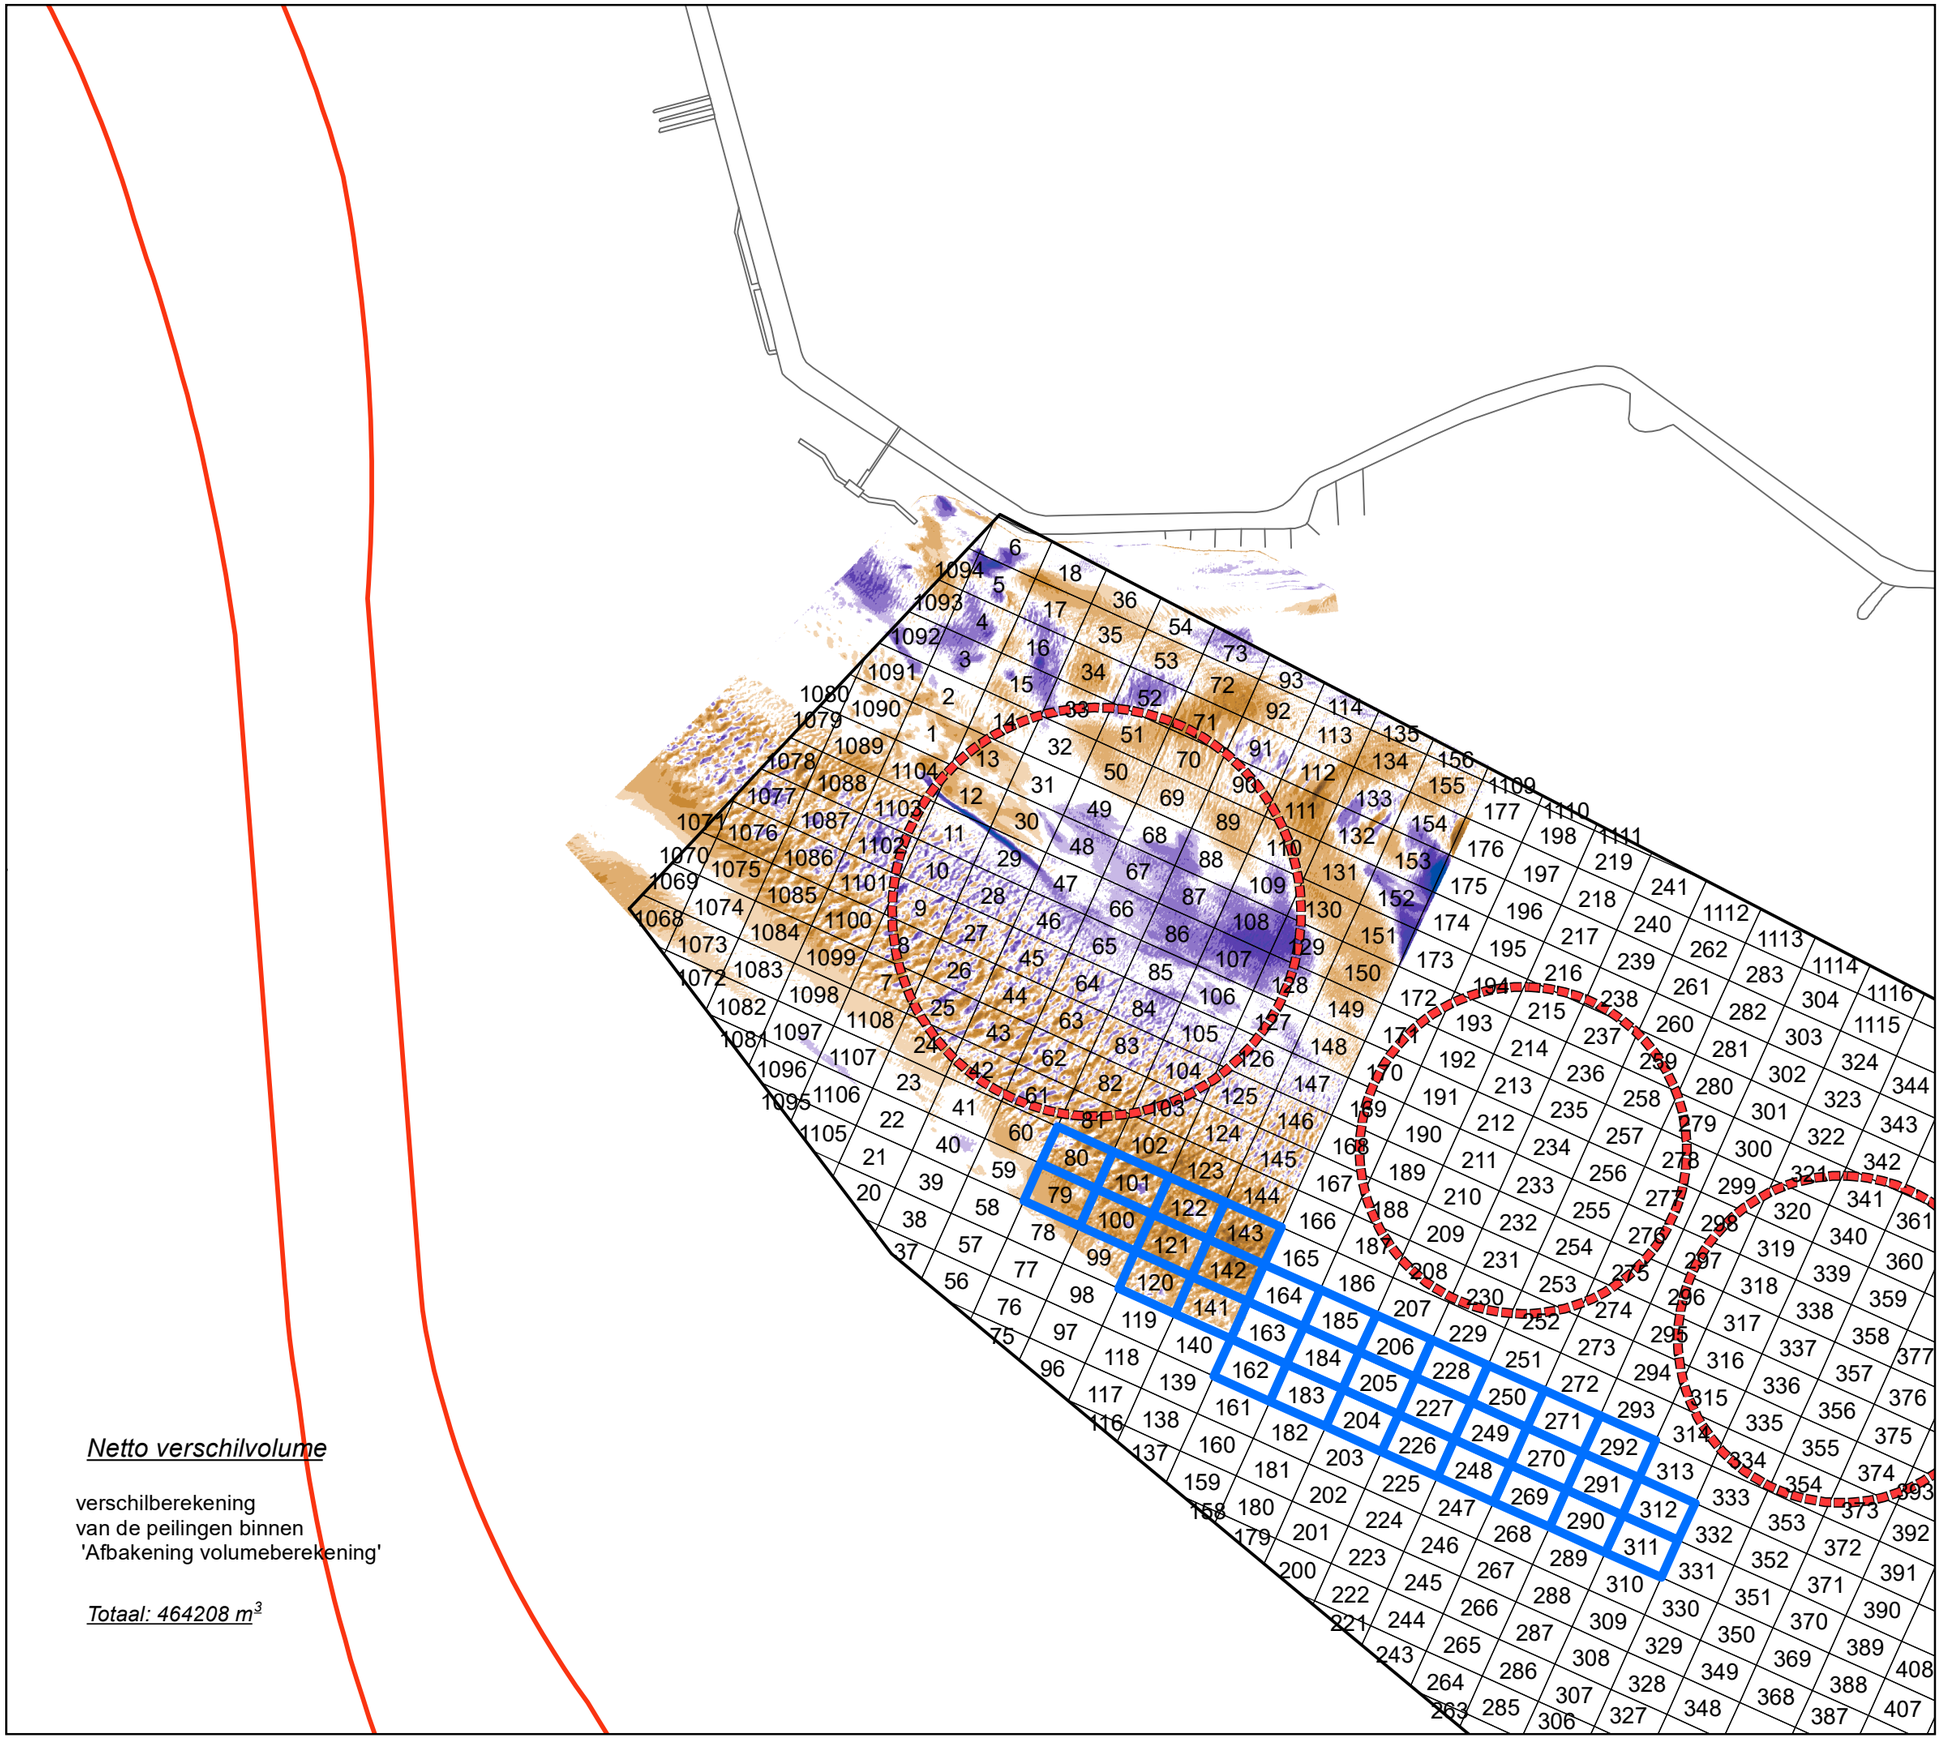

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SN31

04/09/2025 (T6) - 05/07/2022 (T0)

11640_SN31_V_we_VT6-T0
Rapport nr. 25.xxx



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken


verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N W E S

0 500 1000

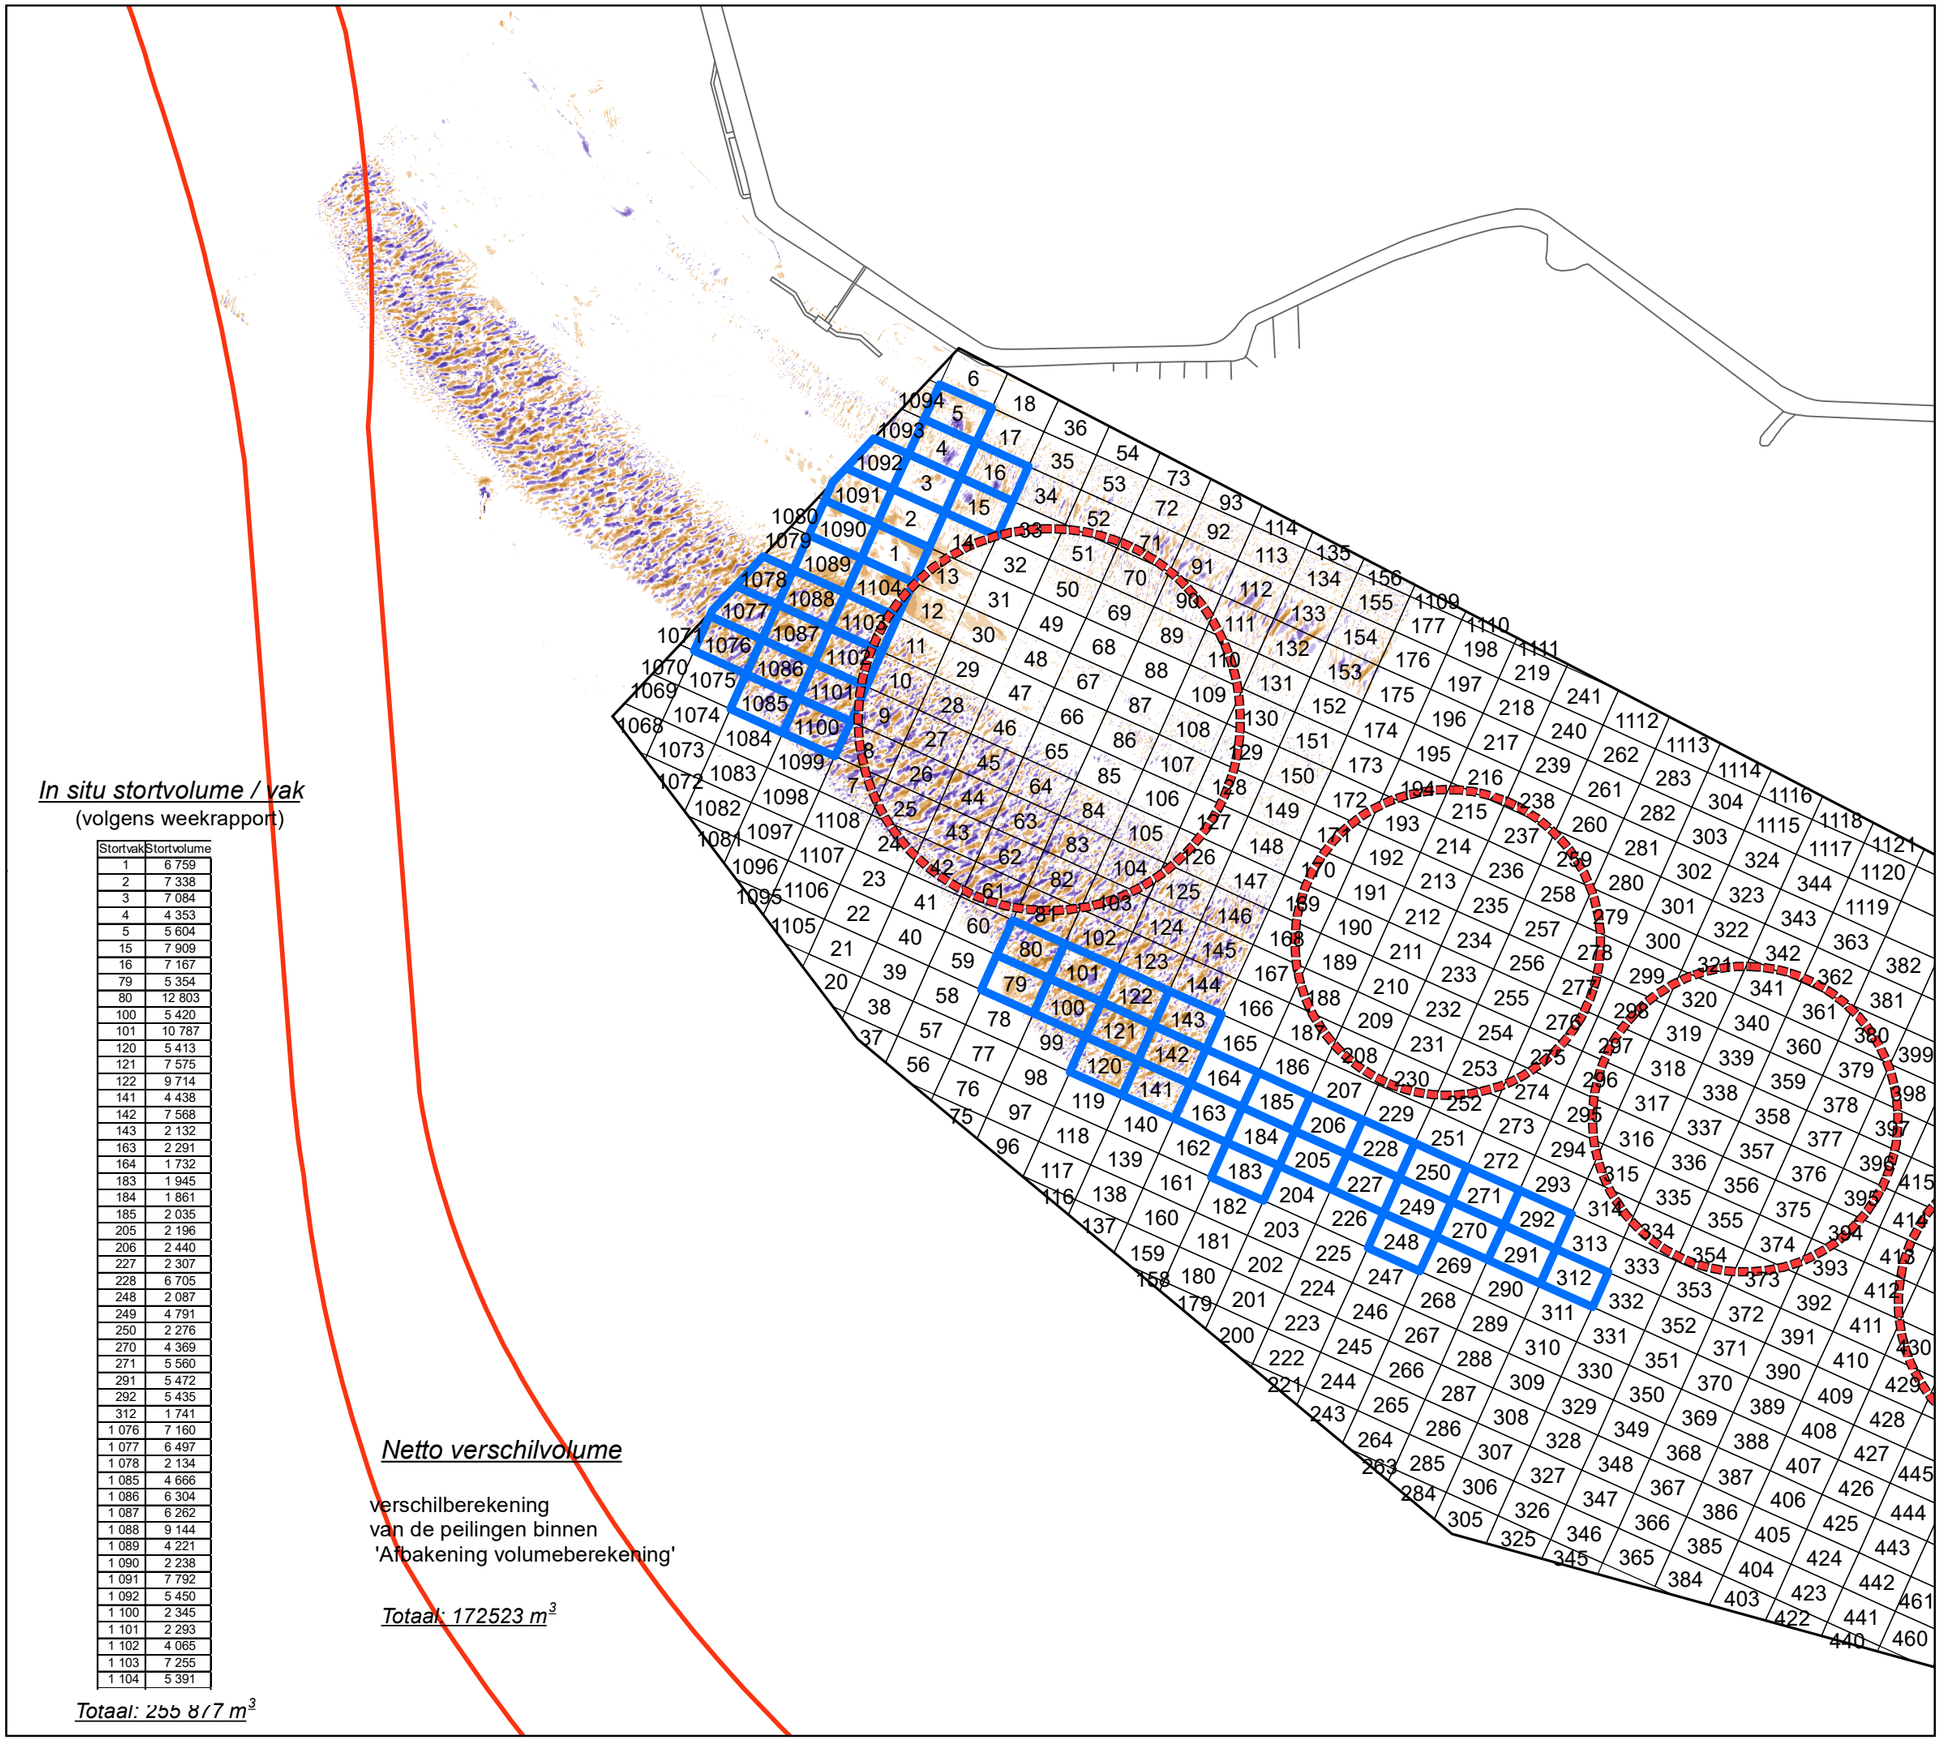

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
1	6 759
2	7 338
3	7 084
4	4 353
5	5 604
15	7 909
16	7 167
79	5 354
80	12 803
100	5 420
101	10 787
120	5 413
121	7 575
122	9 714
141	4 438
142	7 568
143	2 132
163	2 291
164	1 732
183	1 945
184	1 861
185	2 035
205	2 196
206	2 440
227	2 307
228	6 705
248	2 087
249	4 791
250	2 276
270	4 369
271	5 560
291	5 472
292	5 435
312	1 741
1 076	7 160
1 077	6 497
1 078	2 134
1 085	4 666
1 086	6 304
1 087	6 262
1 088	9 144
1 089	4 221
1 090	2 238
1 091	7 792
1 092	5 450
1 100	2 345
1 101	2 293
1 102	4 065
1 103	7 255
1 104	5 391

Totaal: 255 877 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 172523 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SN31

04/09/2025 (T6) - 05/08/2025 (T5)

11640_SN31_VT6-T5
Rapport nr. 25.xxx



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m


verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50

verdieping
- -0.25 - +0.25
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N W E S

0 200 400 600 800 1000 m

A.6 Kaartmateriaal oktober en november 2025

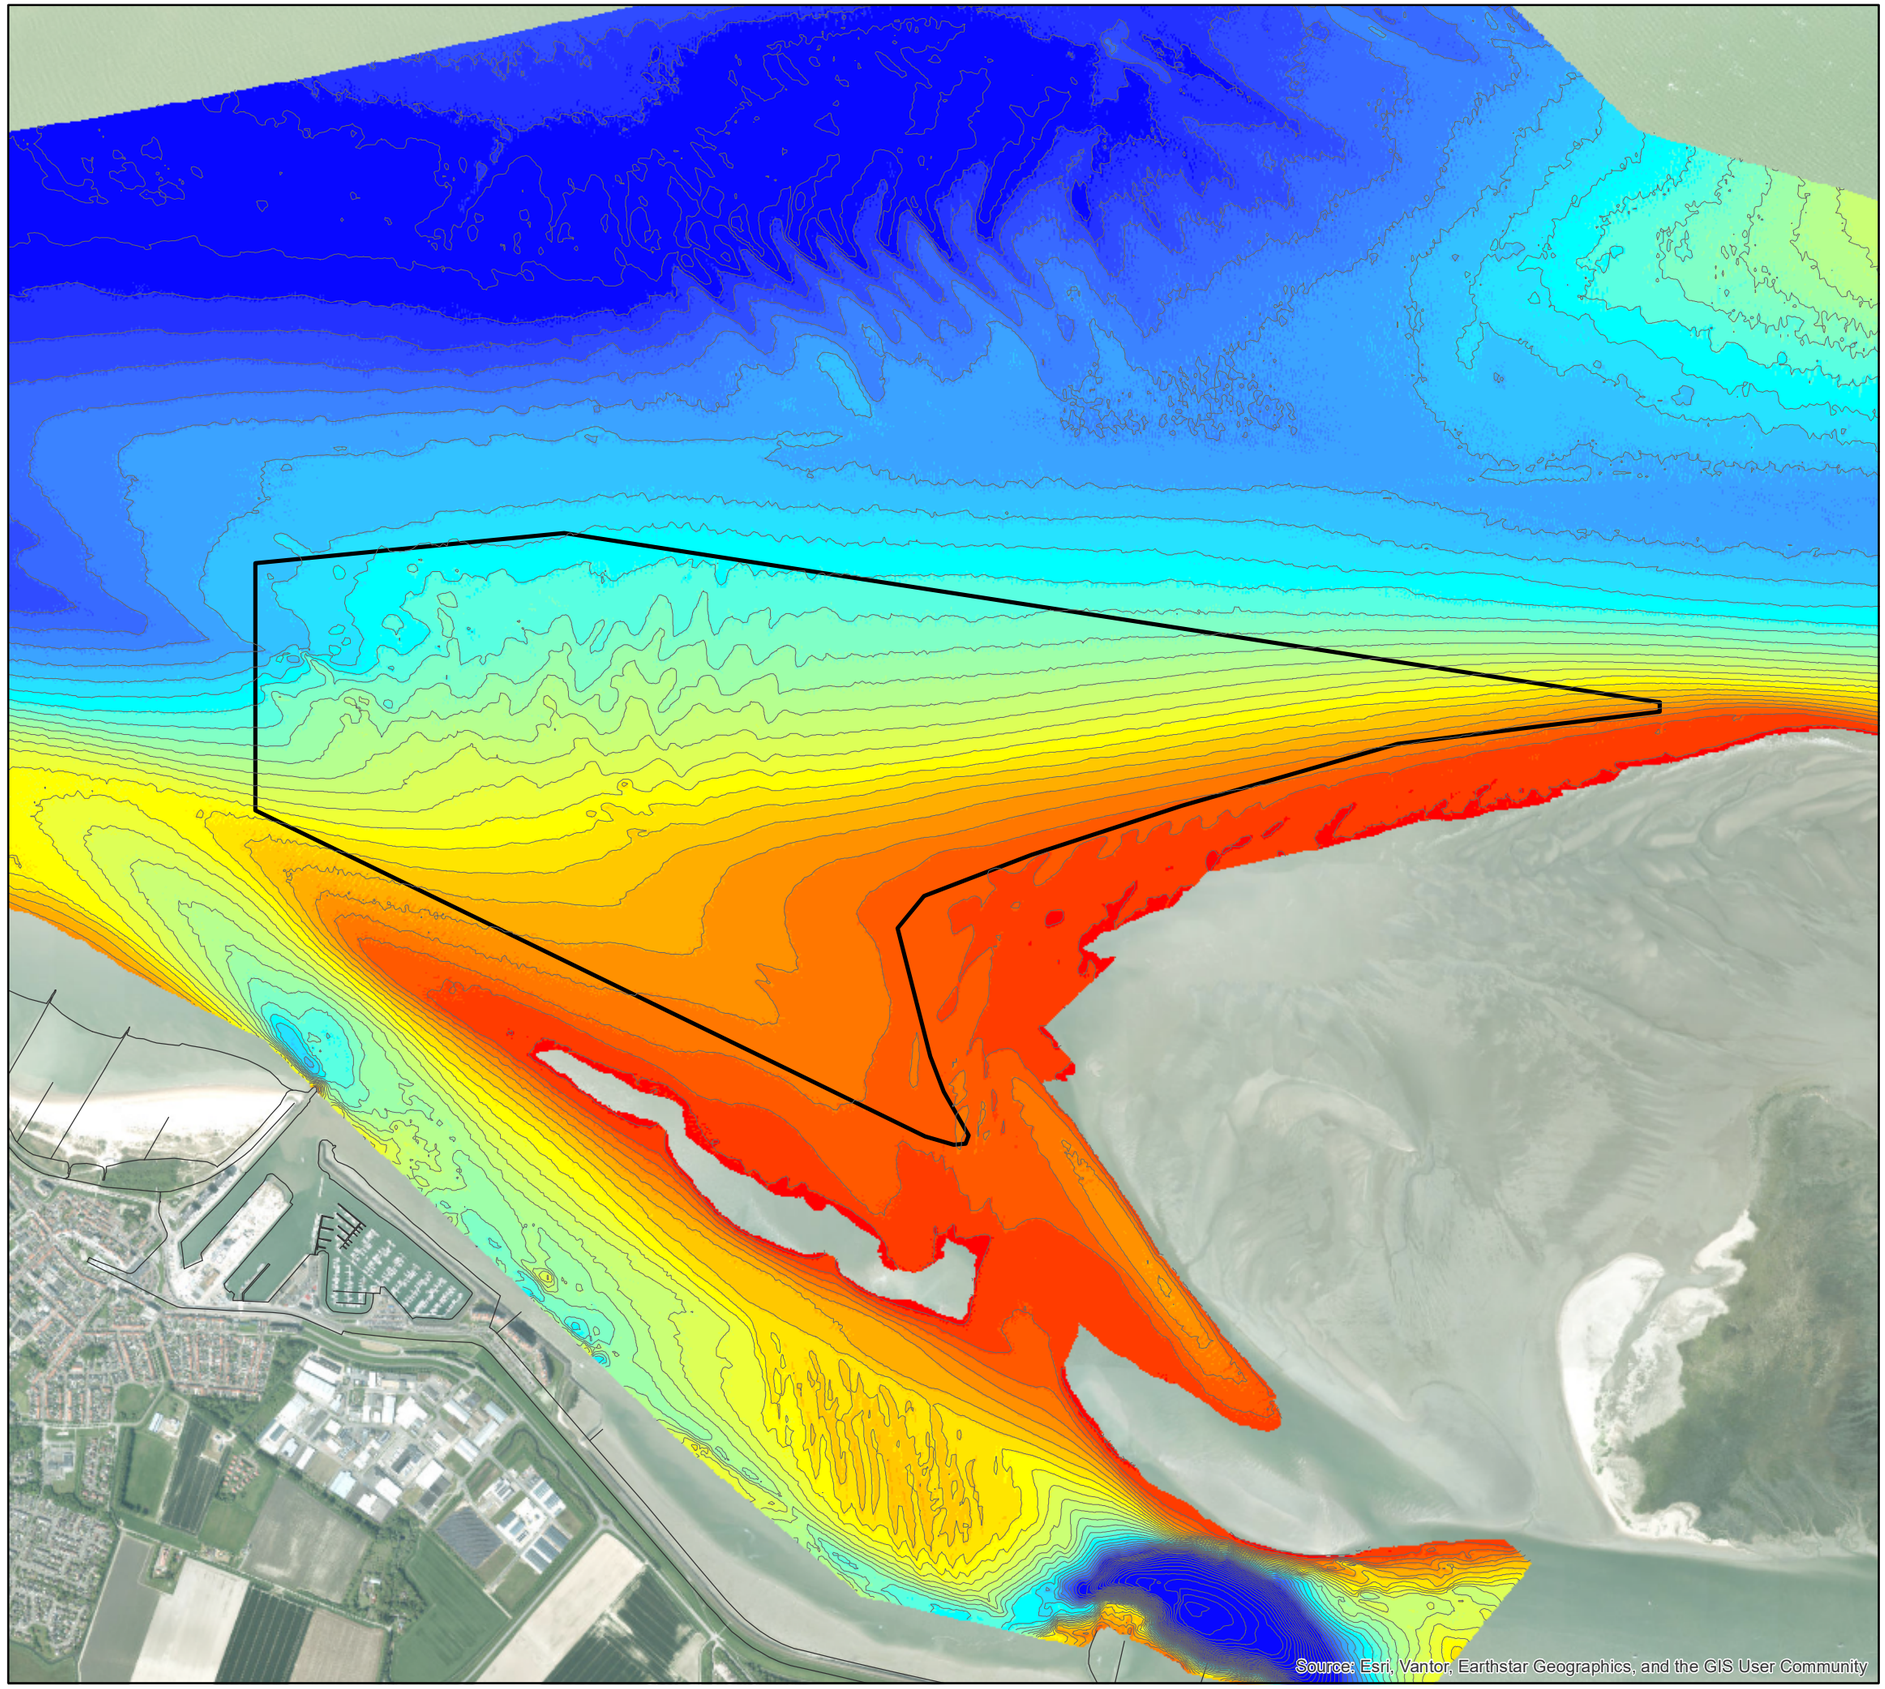

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart Hooge Platen West

14/10/2025 (T166)

11640_HPW_BT166
Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

Diepte in m [NAP]

- 0.09 - 1.00
- 1.01 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00

N
W E
S

0 200 400 600 800 1000 m

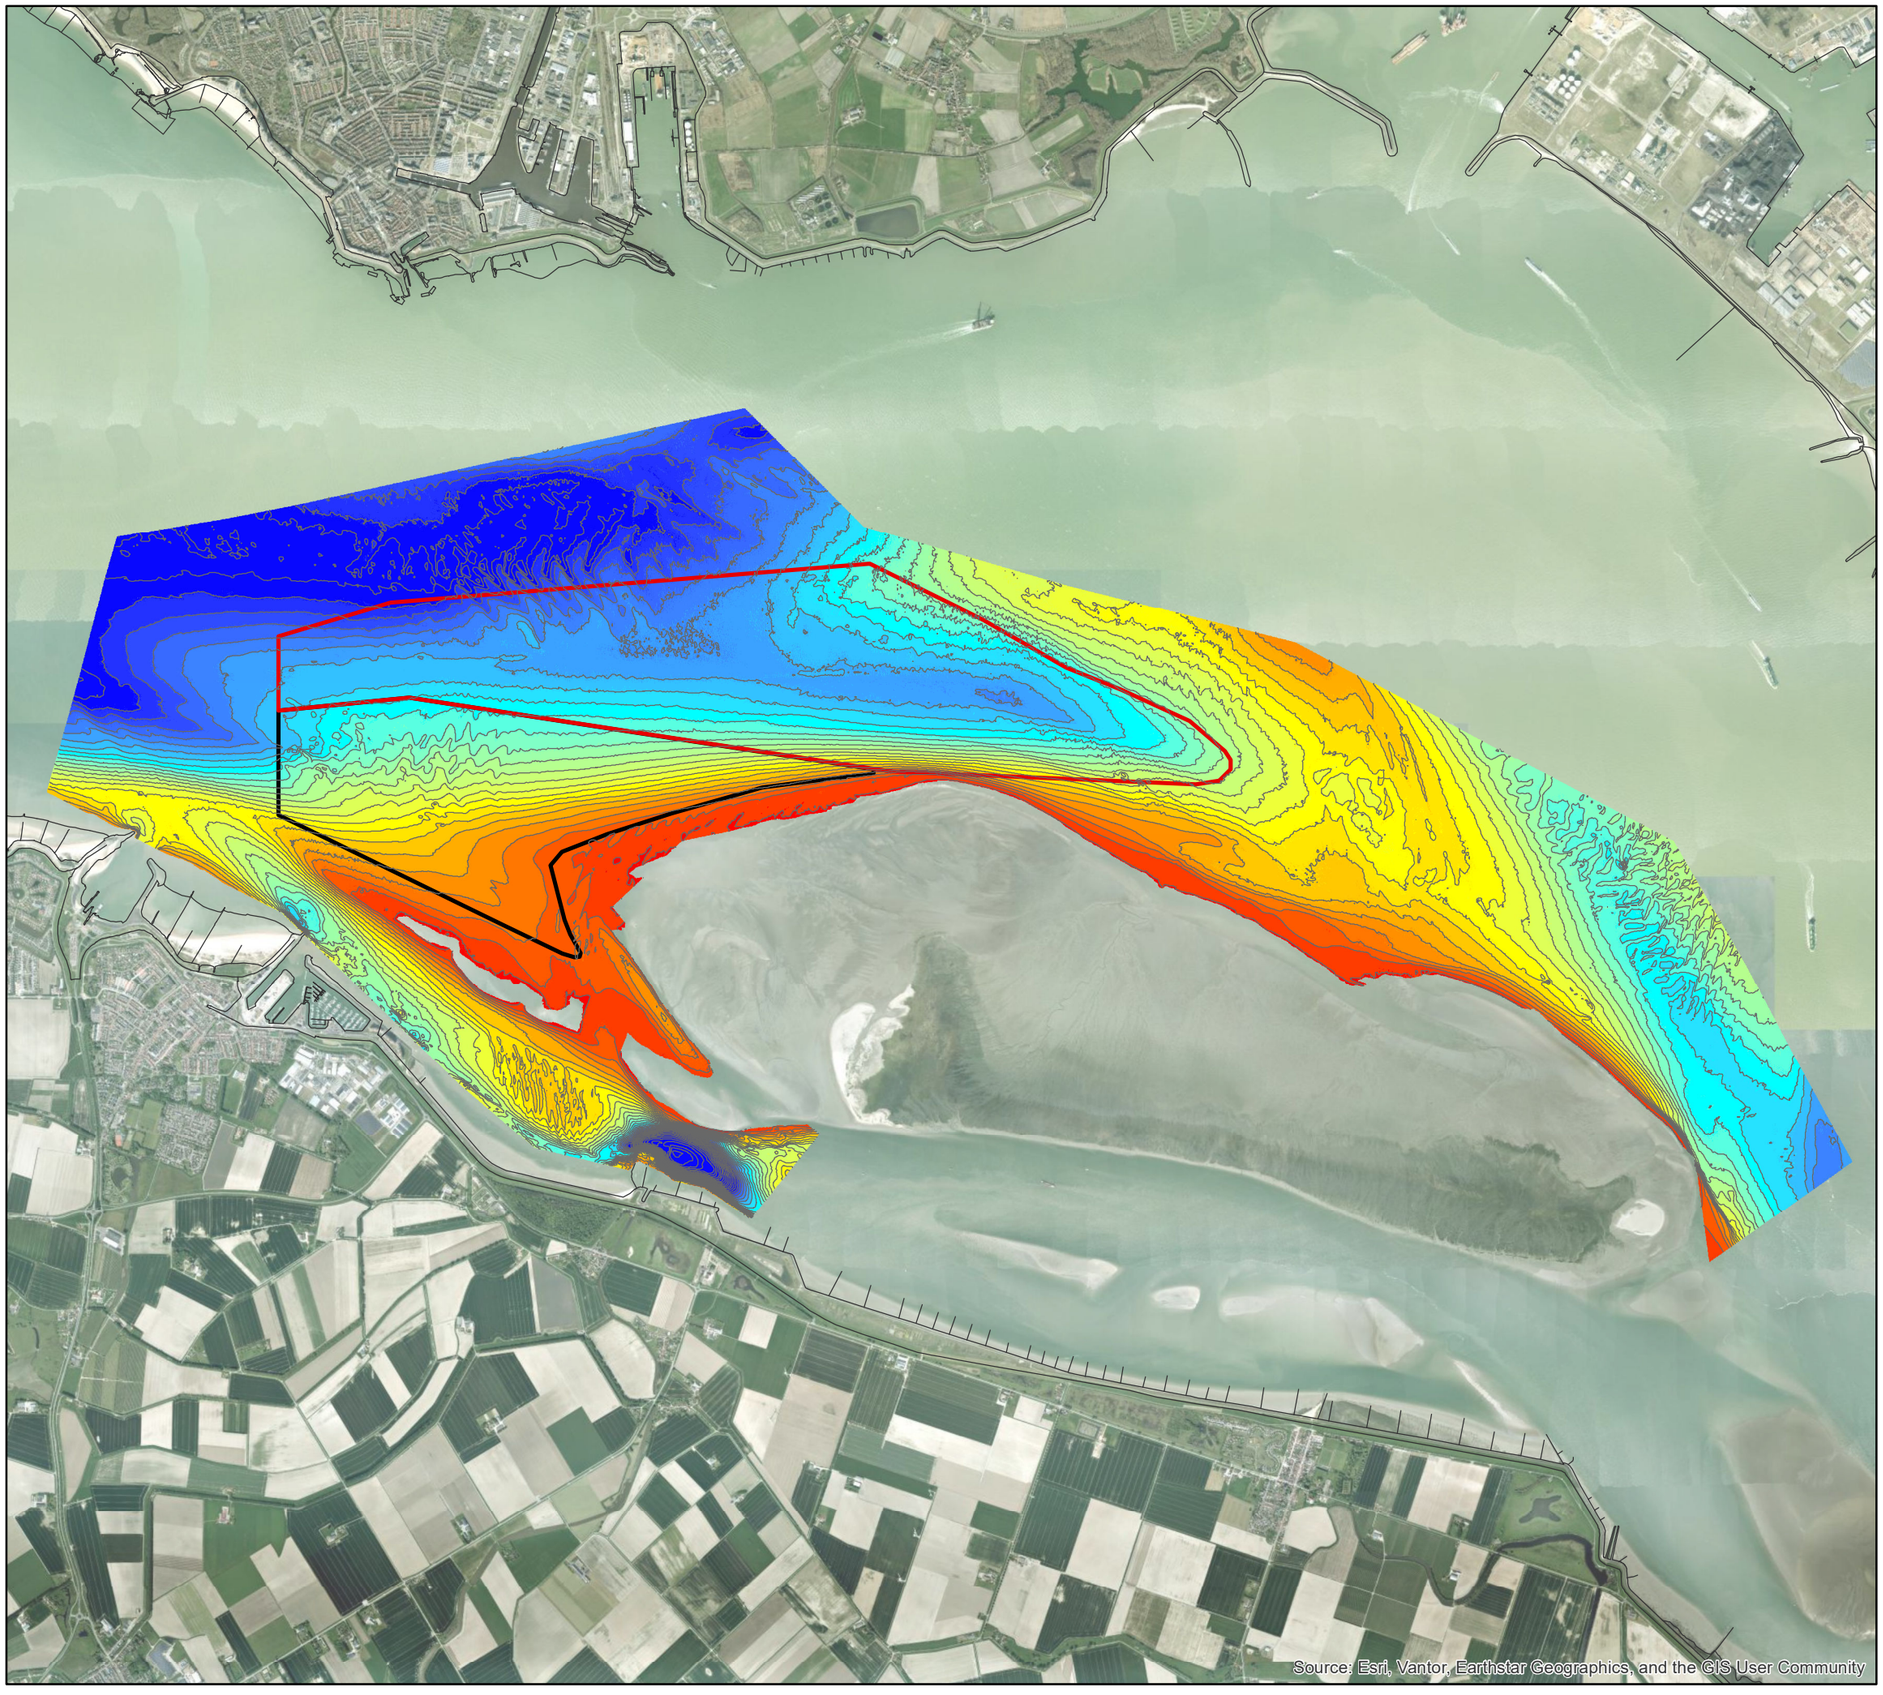

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart Hooge Platen West

14/10/2025 (T166)

11640_HPW_BT166
Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

Diepte in m [NAP]

- 0.09 - 1.00
- 1.01 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00

N
W E
S

0 200400600800 1000 m

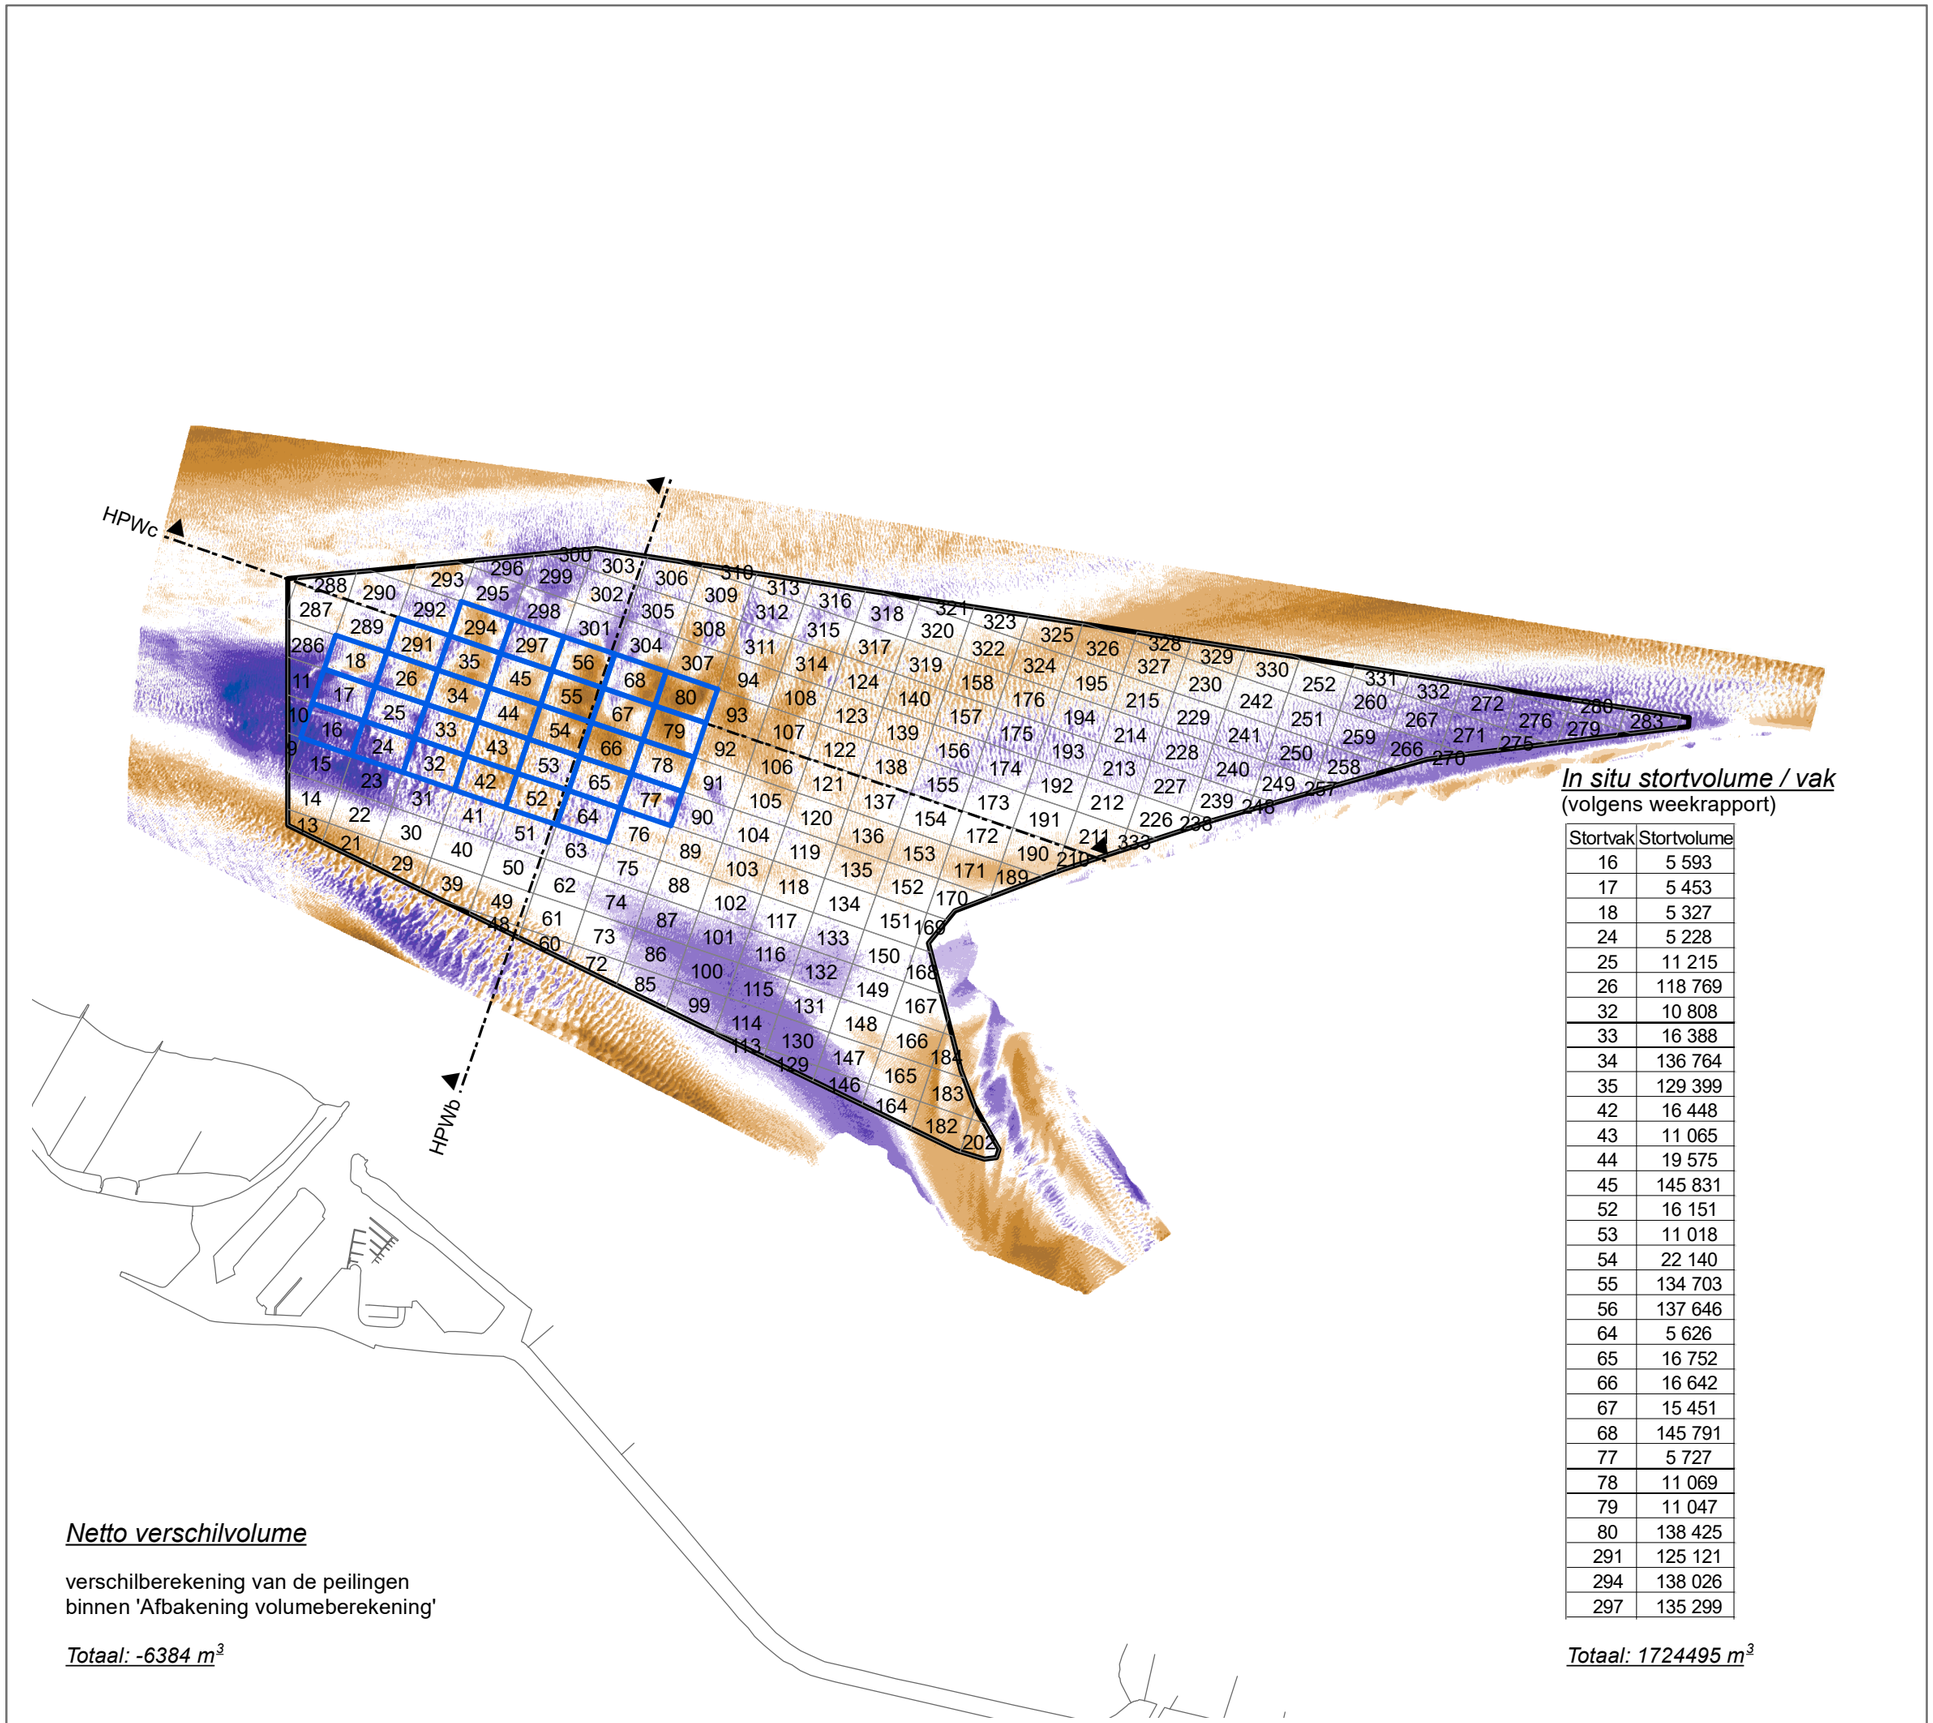

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
16	5 593
17	5 453
18	5 327
24	5 228
25	11 215
26	118 769
32	10 808
33	16 388
34	136 764
35	129 399
42	16 448
43	11 065
44	19 575
45	145 831
52	16 151
53	11 018
54	22 140
55	134 703
56	137 646
64	5 626
65	16 752
66	16 642
67	15 451
68	145 791
77	5 727
78	11 069
79	11 047
80	138 425
291	125 121
294	138 026
297	135 299

Totaal: 1724495 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -6384 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart Hooge Platen West

17/04/2022 (T146) - 14/10/2025 (T166)

11640_HPW_VT166-T146
Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

Afbakening volumeberekening
Stortvakken (weekrapport)
Stortvakken


verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N
W
E
S

0 200 400 600 800 1000 m

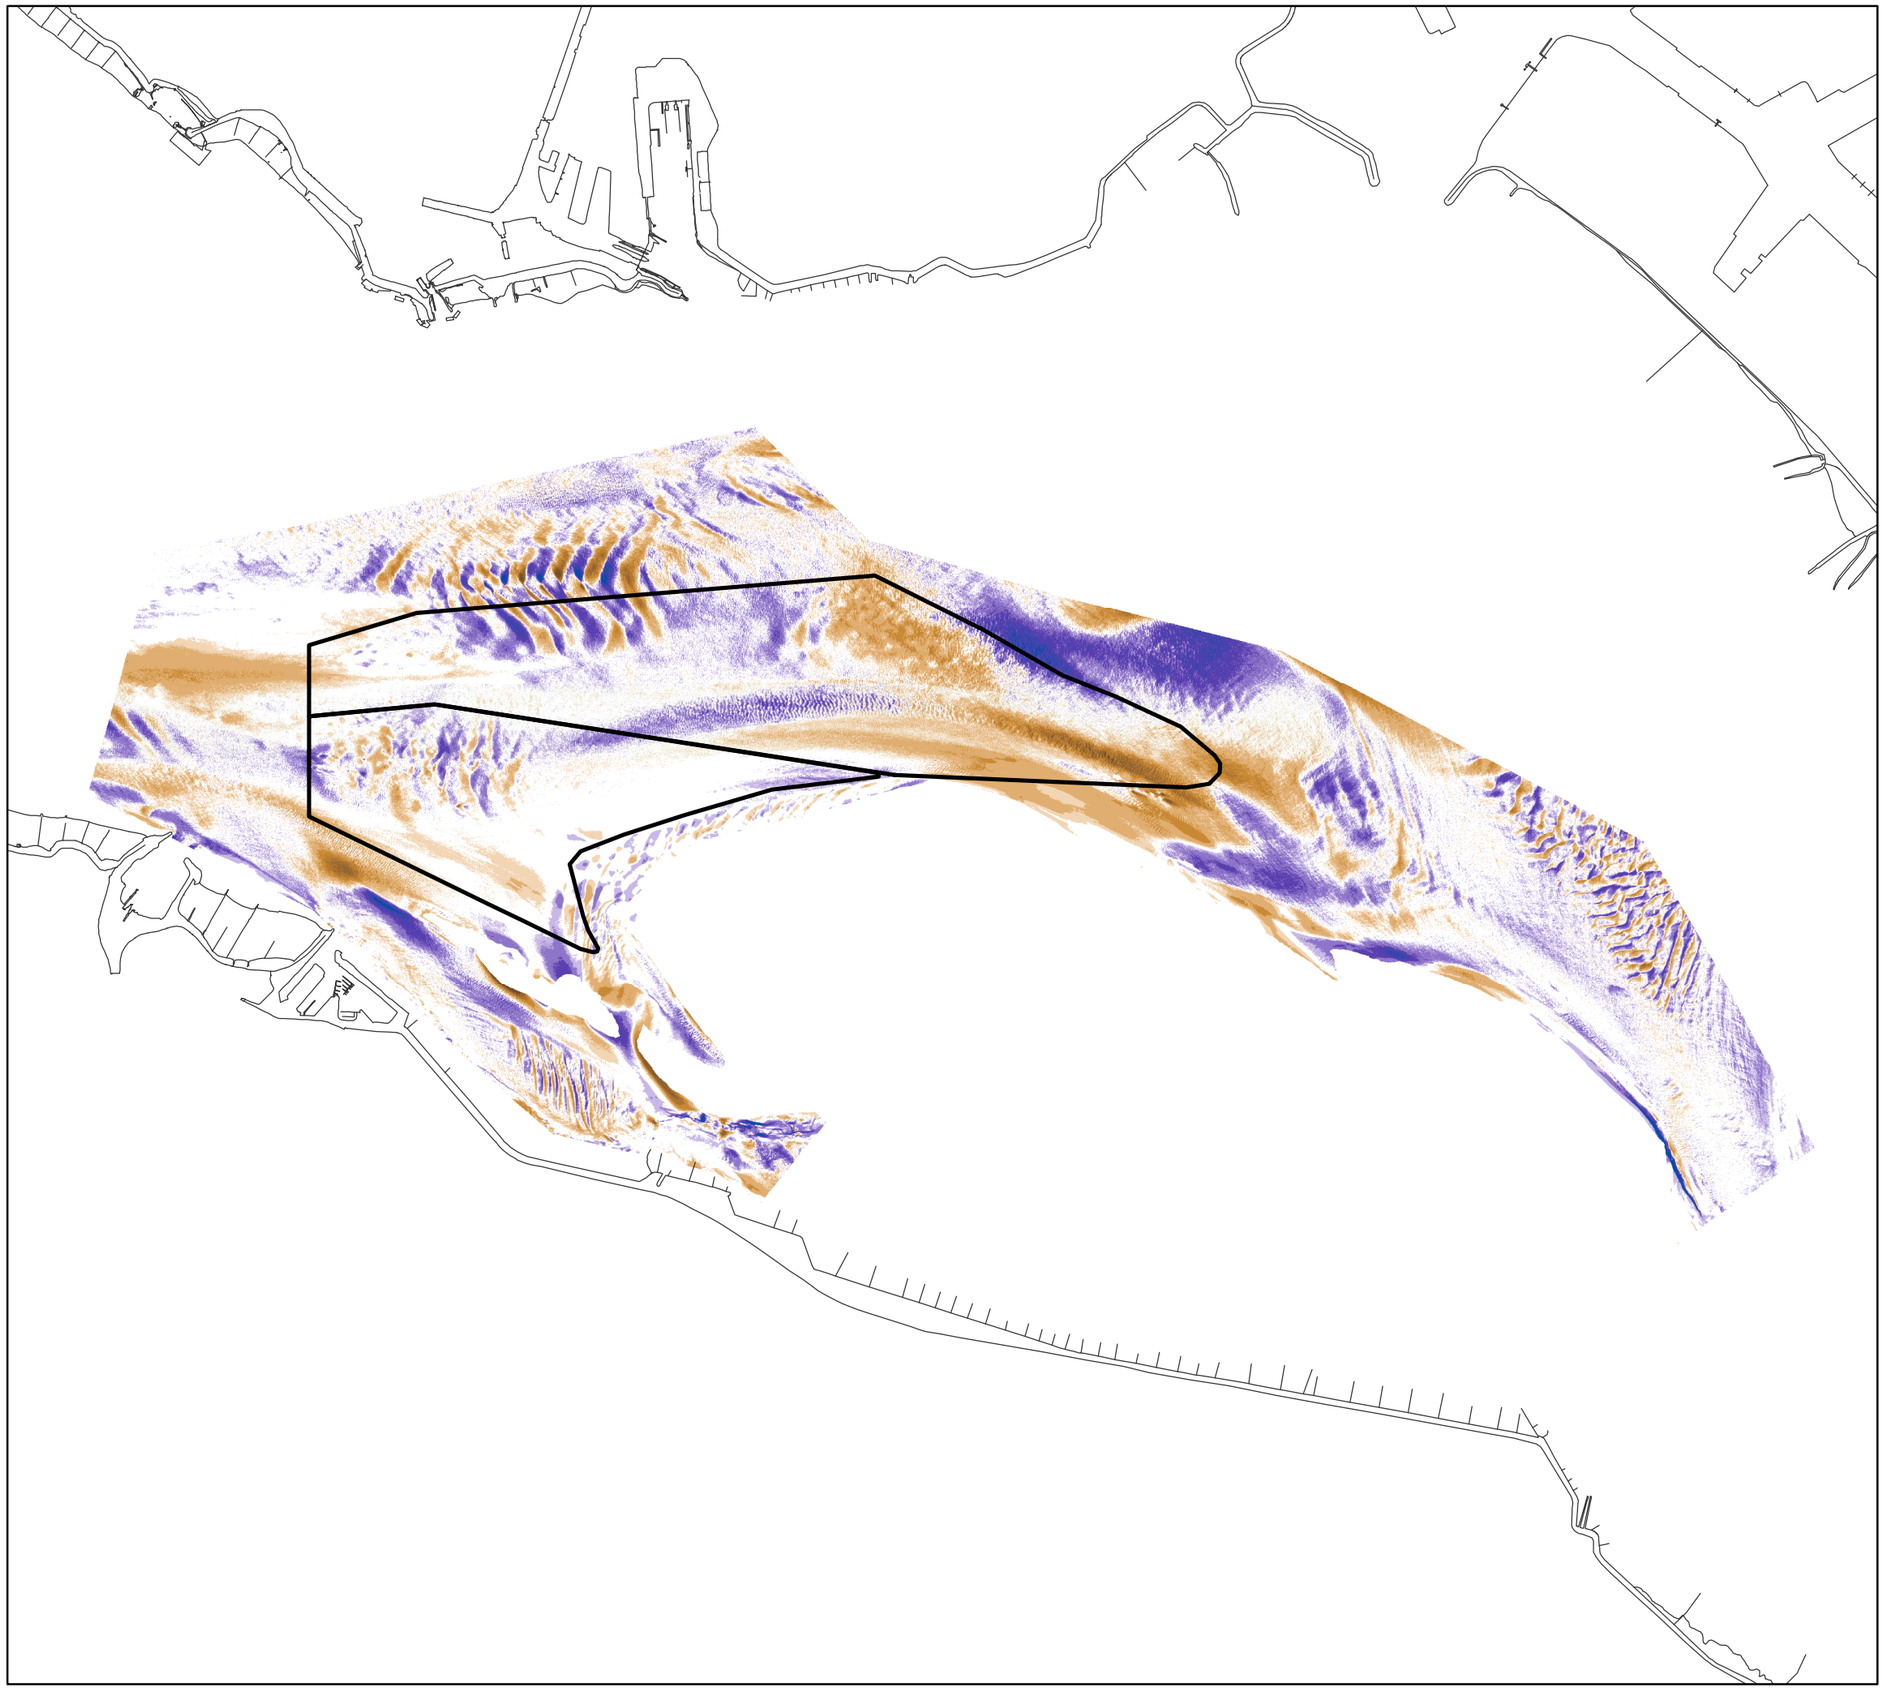

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart Hooge Platen West & SN11

Datum van 17/06/2024 tot 14/10/2025

11640_HPW_VT166-160
Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende


- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	verdieping
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

0 200400600800 1000 m

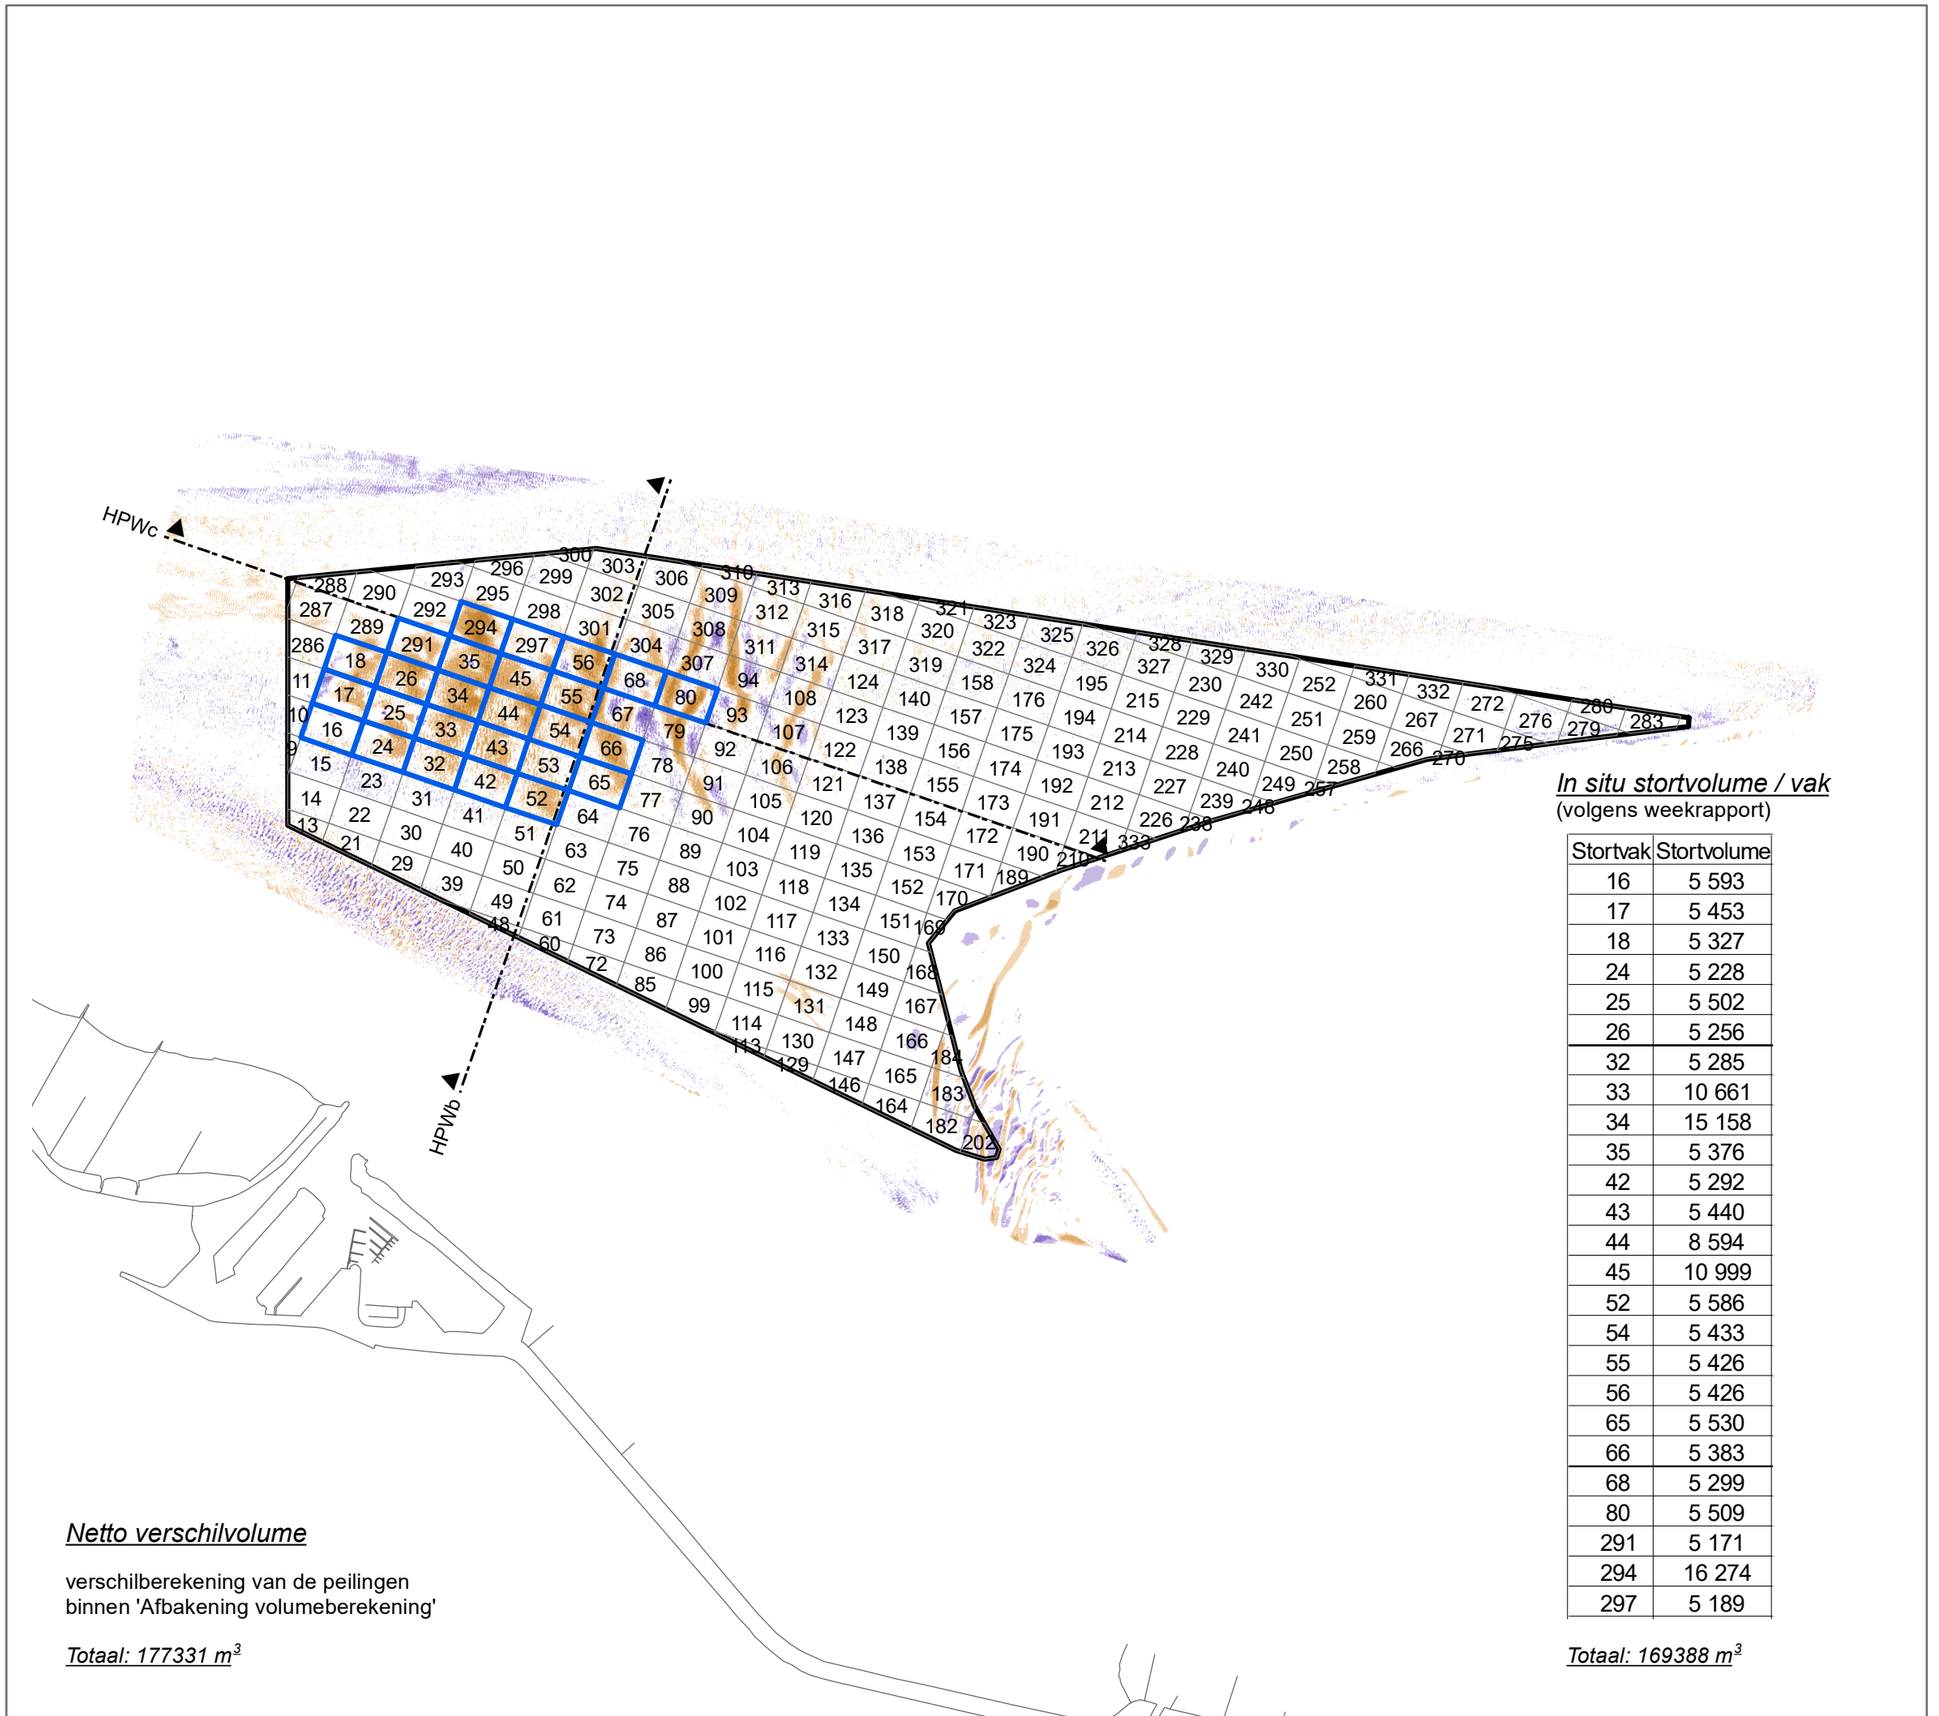

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
16	5 593
17	5 453
18	5 327
24	5 228
25	5 502
26	5 256
32	5 285
33	10 661
34	15 158
35	5 376
42	5 292
43	5 440
44	8 594
45	10 999
52	5 586
54	5 433
55	5 426
56	5 426
65	5 530
66	5 383
68	5 299
80	5 509
291	5 171
294	16 274
297	5 189

Totaal: 169388 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 177331 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart Hooge Platen West

01/07/2025 (T165) - 14/10/2025 (T166)

11640_HPW_VT166-T165
Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken


verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N
W E
S

0 200 400 600 800 1000 m

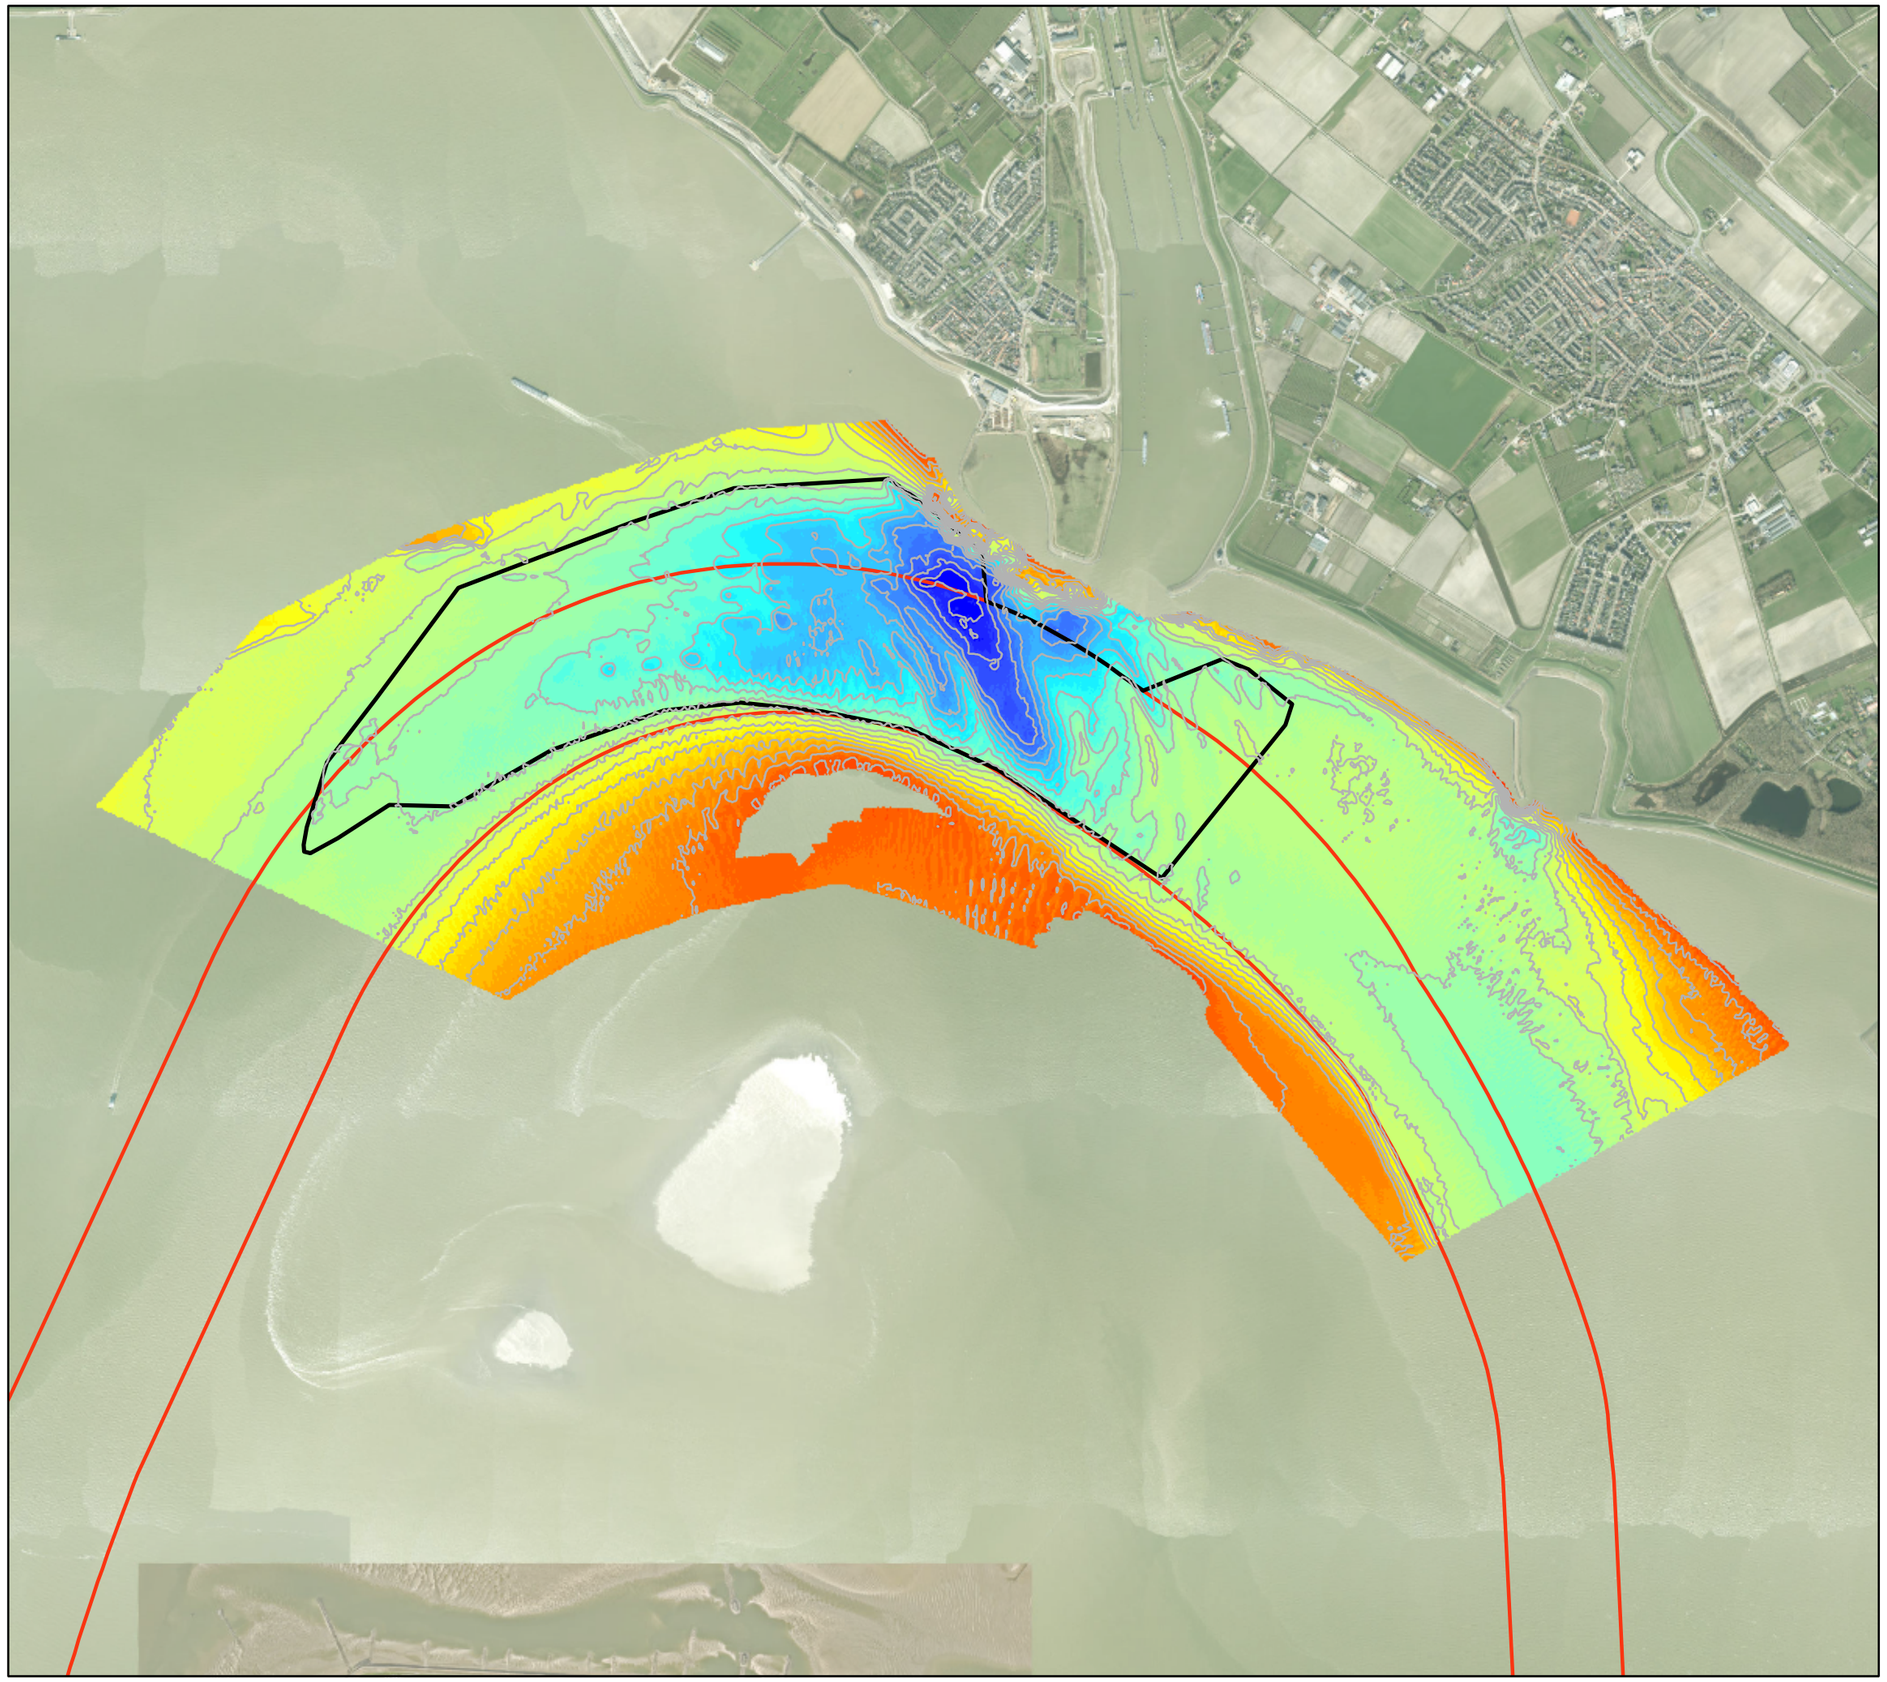

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang


Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025
Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart Put van Hansweert

17/11/2025 (T93)

11640_PVH_BT93
Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

Diepte in m [NAP]

1.61 - 2.00	19.01 - 20.00
2.01 - 3.00	20.01 - 21.00
3.01 - 4.00	21.01 - 22.00
4.01 - 5.00	22.01 - 23.00
5.01 - 6.00	23.01 - 24.00
6.01 - 7.00	24.01 - 25.00
7.01 - 8.00	25.01 - 26.00
8.01 - 9.00	26.01 - 27.00
9.01 - 10.00	27.01 - 28.00
10.01 - 11.00	28.01 - 29.00
11.01 - 12.00	29.01 - 30.00
12.01 - 13.00	30.01 - 31.00
13.01 - 14.00	31.01 - 32.00
14.01 - 15.00	32.01 - 33.00
15.01 - 16.00	33.01 - 34.00
16.01 - 17.00	34.01 - 35.00
17.01 - 18.00	35.01 - 36.00
18.01 - 19.00	36.01 - 37.00

N
W E
S

0 200 400 600 800 1000 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)


Stortvak	Stortvolume
93	44 653
94	22 677
125	90 784
126	100 262
127	96 998
128	96 941
129	60 993
159	105 205
160	95 430
161	102 849
162	165 026
163	147 192
193	91 701
194	85 611
195	71 657
196	155 410
197	143 705
221	16 768
229	114 619
230	184 568
231	151 781
232	136 513
254	33 594
255	169 606
287	5 742
288	188 220
289	152 000
321	67 578
322	158 707
323	157 089
356	134 935
464	22 021
468	5 713
469	5 560
475	85 281
476	89 116
478	9 304
483	101 646
484	100 162
485	5 689
486	10 948
490	130 582
491	75 636
492	104 487
493	15 086
494	14 943
498	111 570
499	18 399
500	23 140
513	39 713
514	56 533
516	44 859
517	44 770
518	45 051
519	54 454
520	68 154
523	49 461
524	56 043
525	11 331

Totaal: 4748465 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 2388710 m³

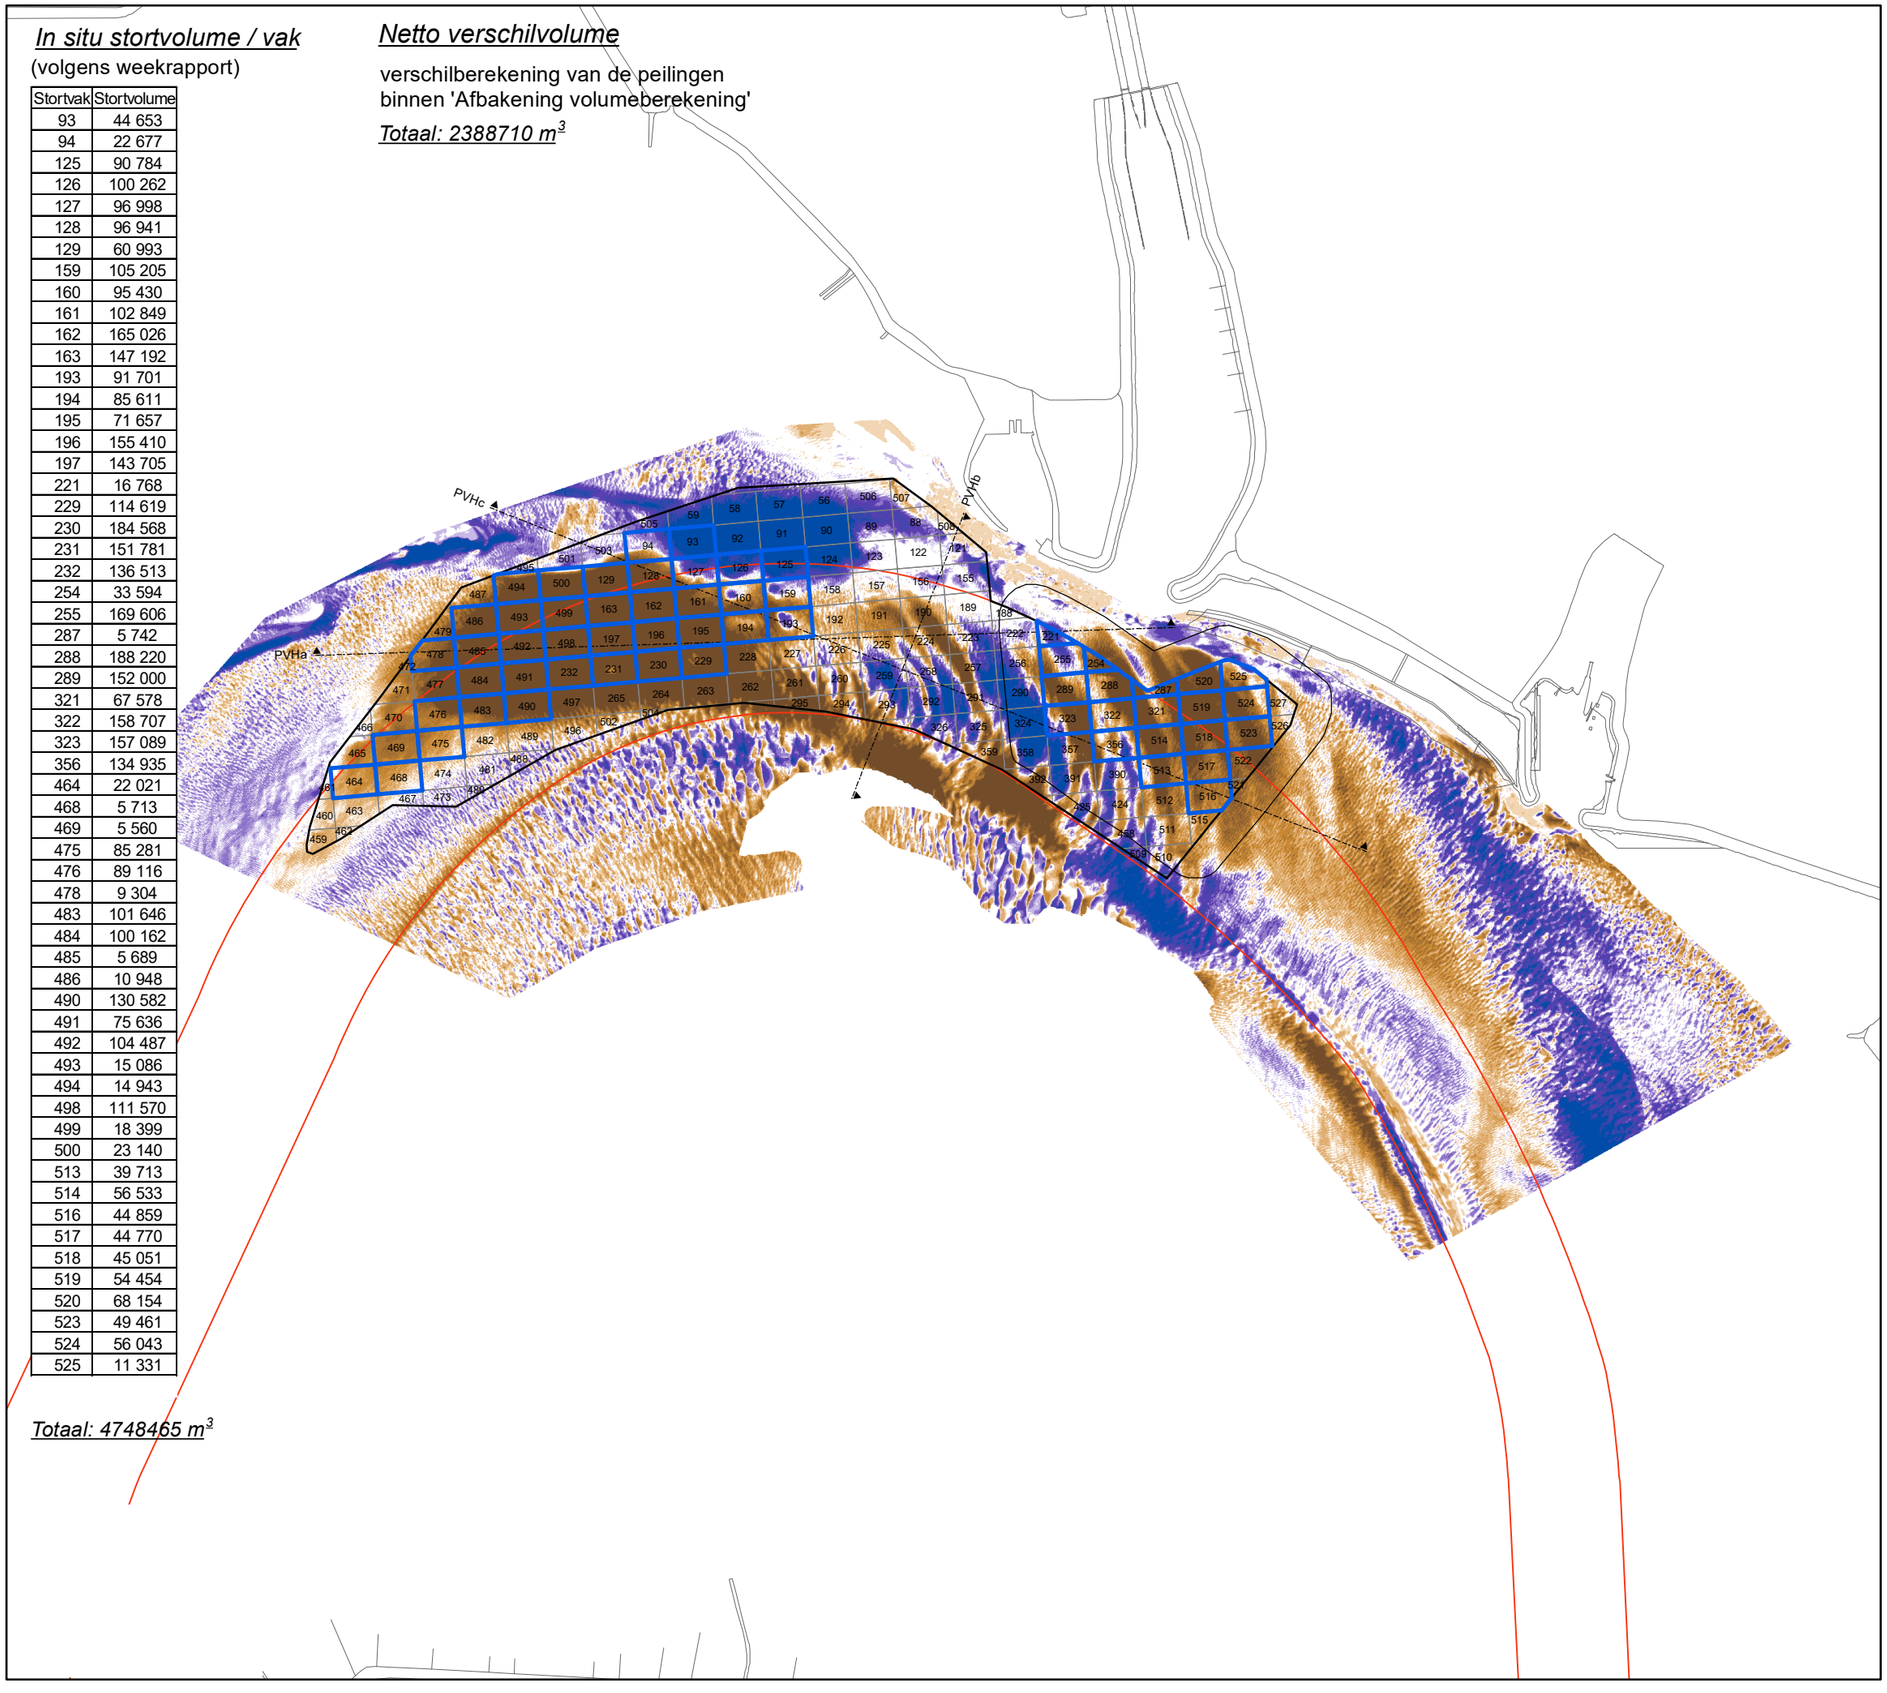

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nrMT/02323_C1_04

Verschilkaart Put van Hansweert

02/05/2022 (T65) - 17/11/2025 (T93)

11640_PVH_VT93-T65

Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

verondieping

- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping

- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N
W E
S

0 200 400 600 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)


Stortvak	Stortvolume
93	44 653
94	22 677
125	90 784
126	100 262
127	96 998
128	96 941
129	60 993
159	105 205
160	95 430
161	102 849
162	165 026
163	147 192
193	91 701
194	85 611
195	71 657
196	155 410
197	143 705
221	16 768
229	114 619
230	184 568
231	151 781
232	136 513
254	33 594
255	169 606
287	5 742
288	188 220
289	152 000
321	67 578
322	158 707
323	157 089
356	134 935
464	22 021
468	5 713
469	5 560
475	85 281
476	89 116
478	9 304
483	101 646
484	100 162
485	5 689
486	10 948
490	130 582
491	75 636
492	104 487
493	15 086
494	14 943
498	111 570
499	18 399
500	23 140
513	39 713
514	56 533
516	44 859
517	44 770
518	45 051
519	54 454
520	68 154
523	49 461
524	56 043
525	11 331

Totaal: 4748465 m^3

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 2853078 m^3

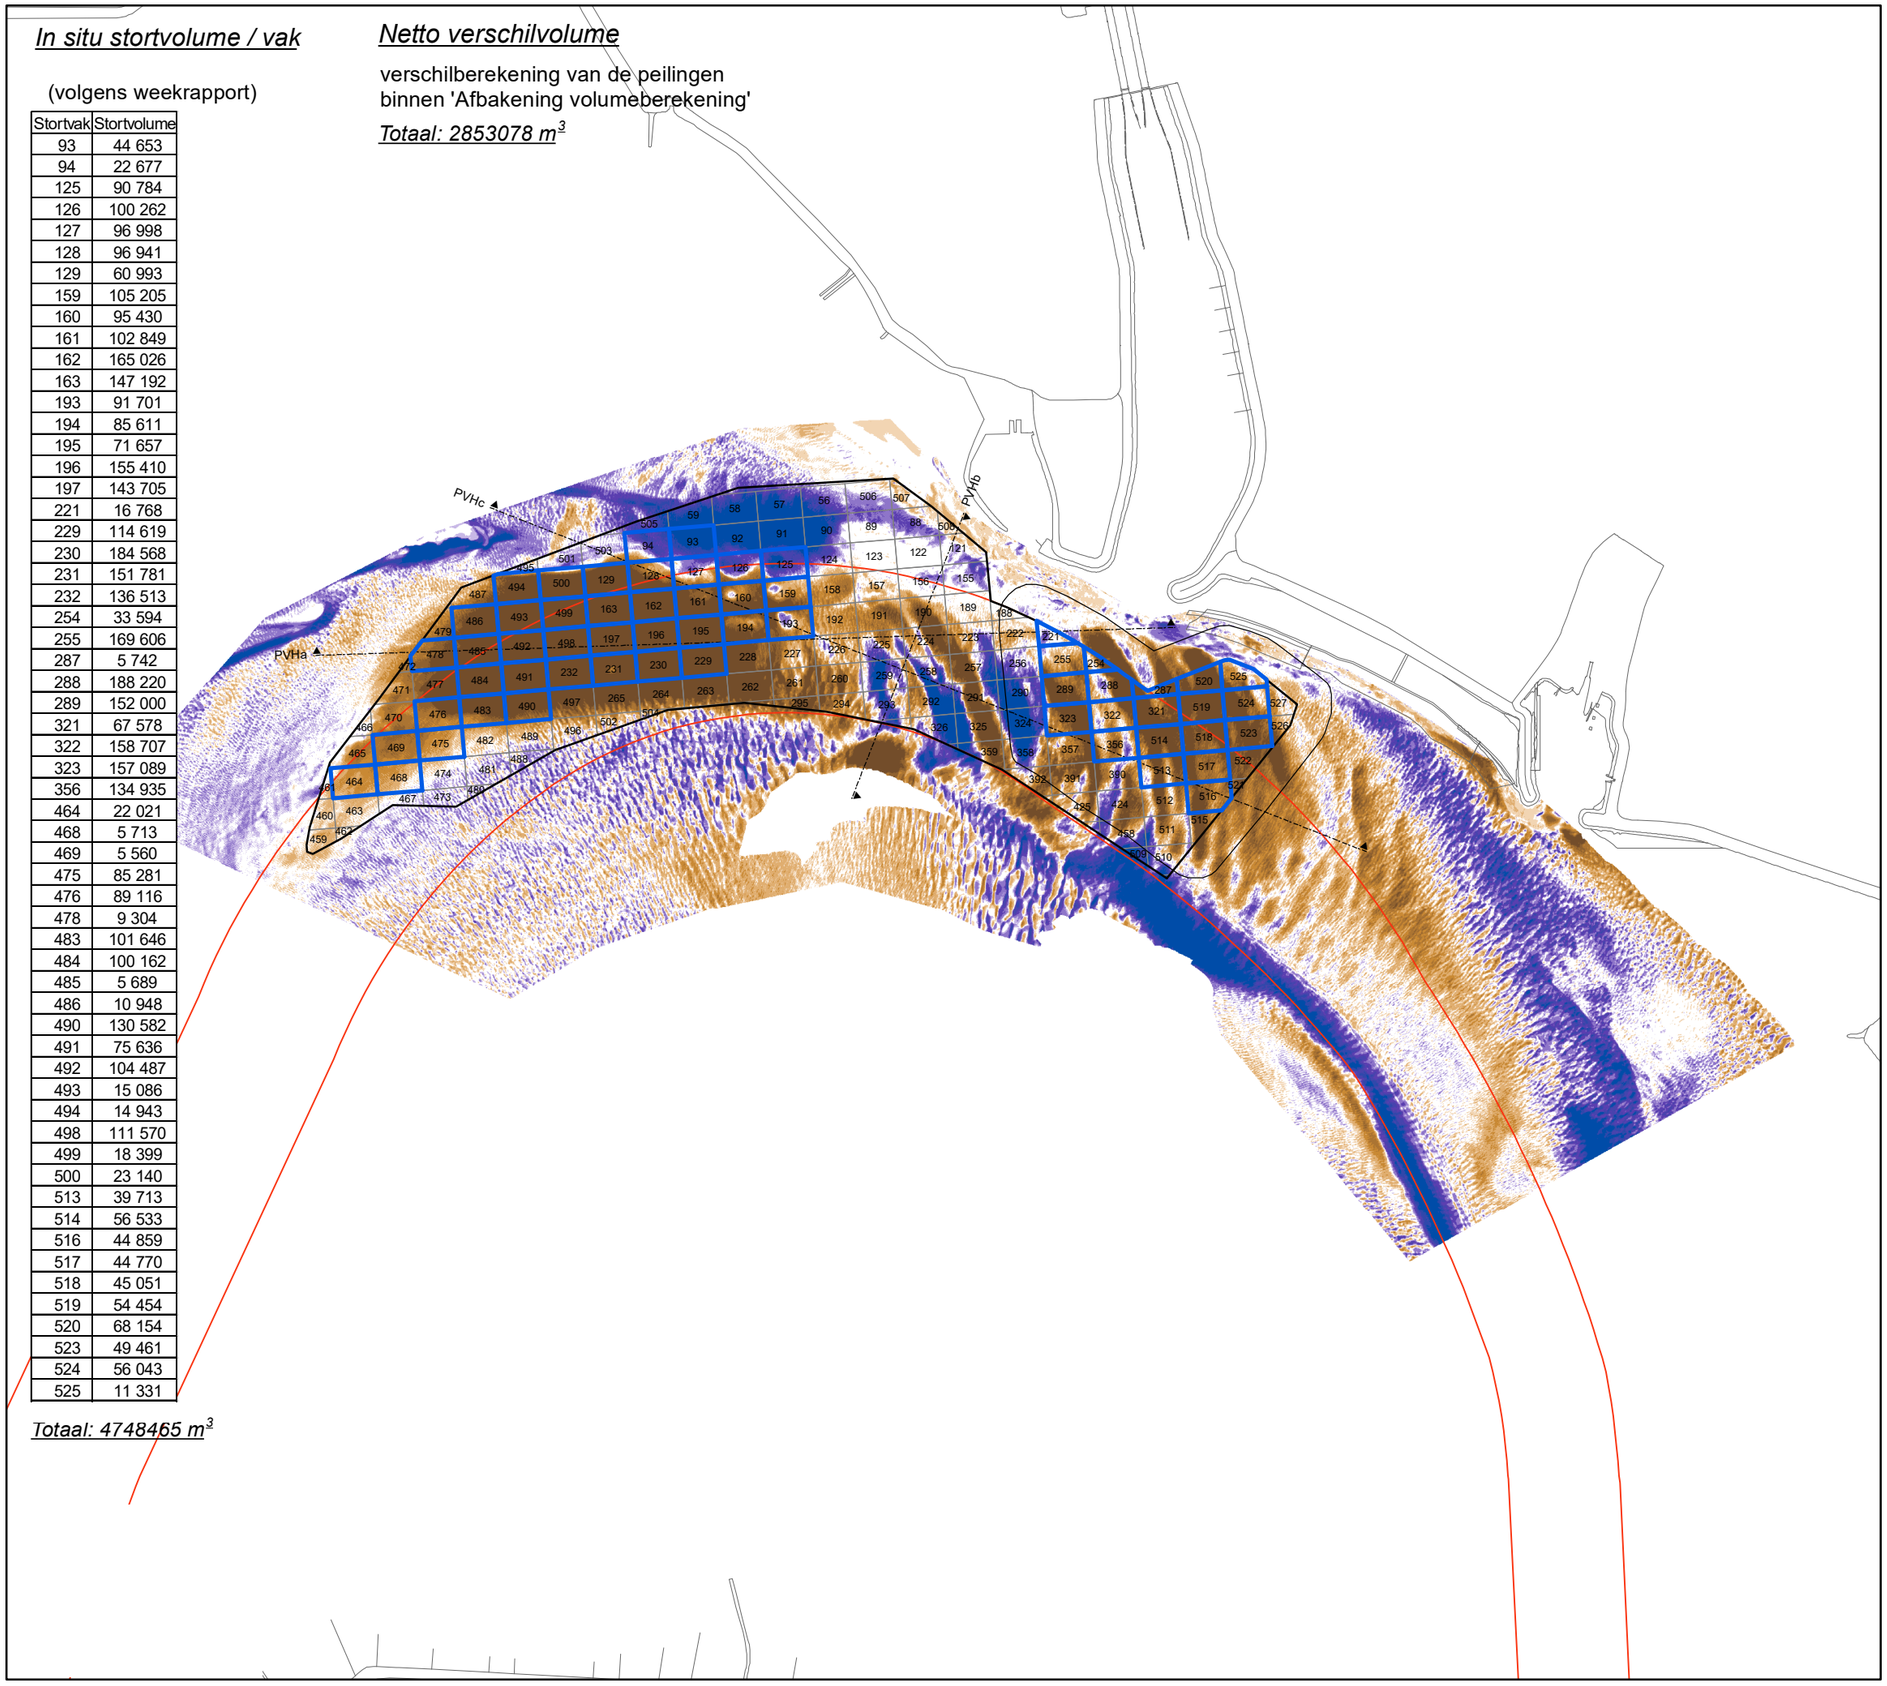

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nrMT/02323_C1_04

Verschilkaart Put van Hansweert

20/09/2022 (T68) - 17/11/2025 (T93)

11640_PVH_VT93-T68

Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50

verondieping

- -0.25 - +0.25
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

verdieping

N
W
E
S

0 200 400 600 m

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)


Stortvak	Stortvolume
125	49 163
126	44 157
127	38 546
128	21 761
129	5 589
159	44 321
160	39 064
161	44 523
162	21 850
163	5 648
193	44 639
194	43 870
195	27 945
196	21 969
197	10 988
229	50 171
230	44 258
231	27 660
232	16 393
483	5 509
484	5 626
490	5 575

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 61207 m³

Totaal: 619222 m³

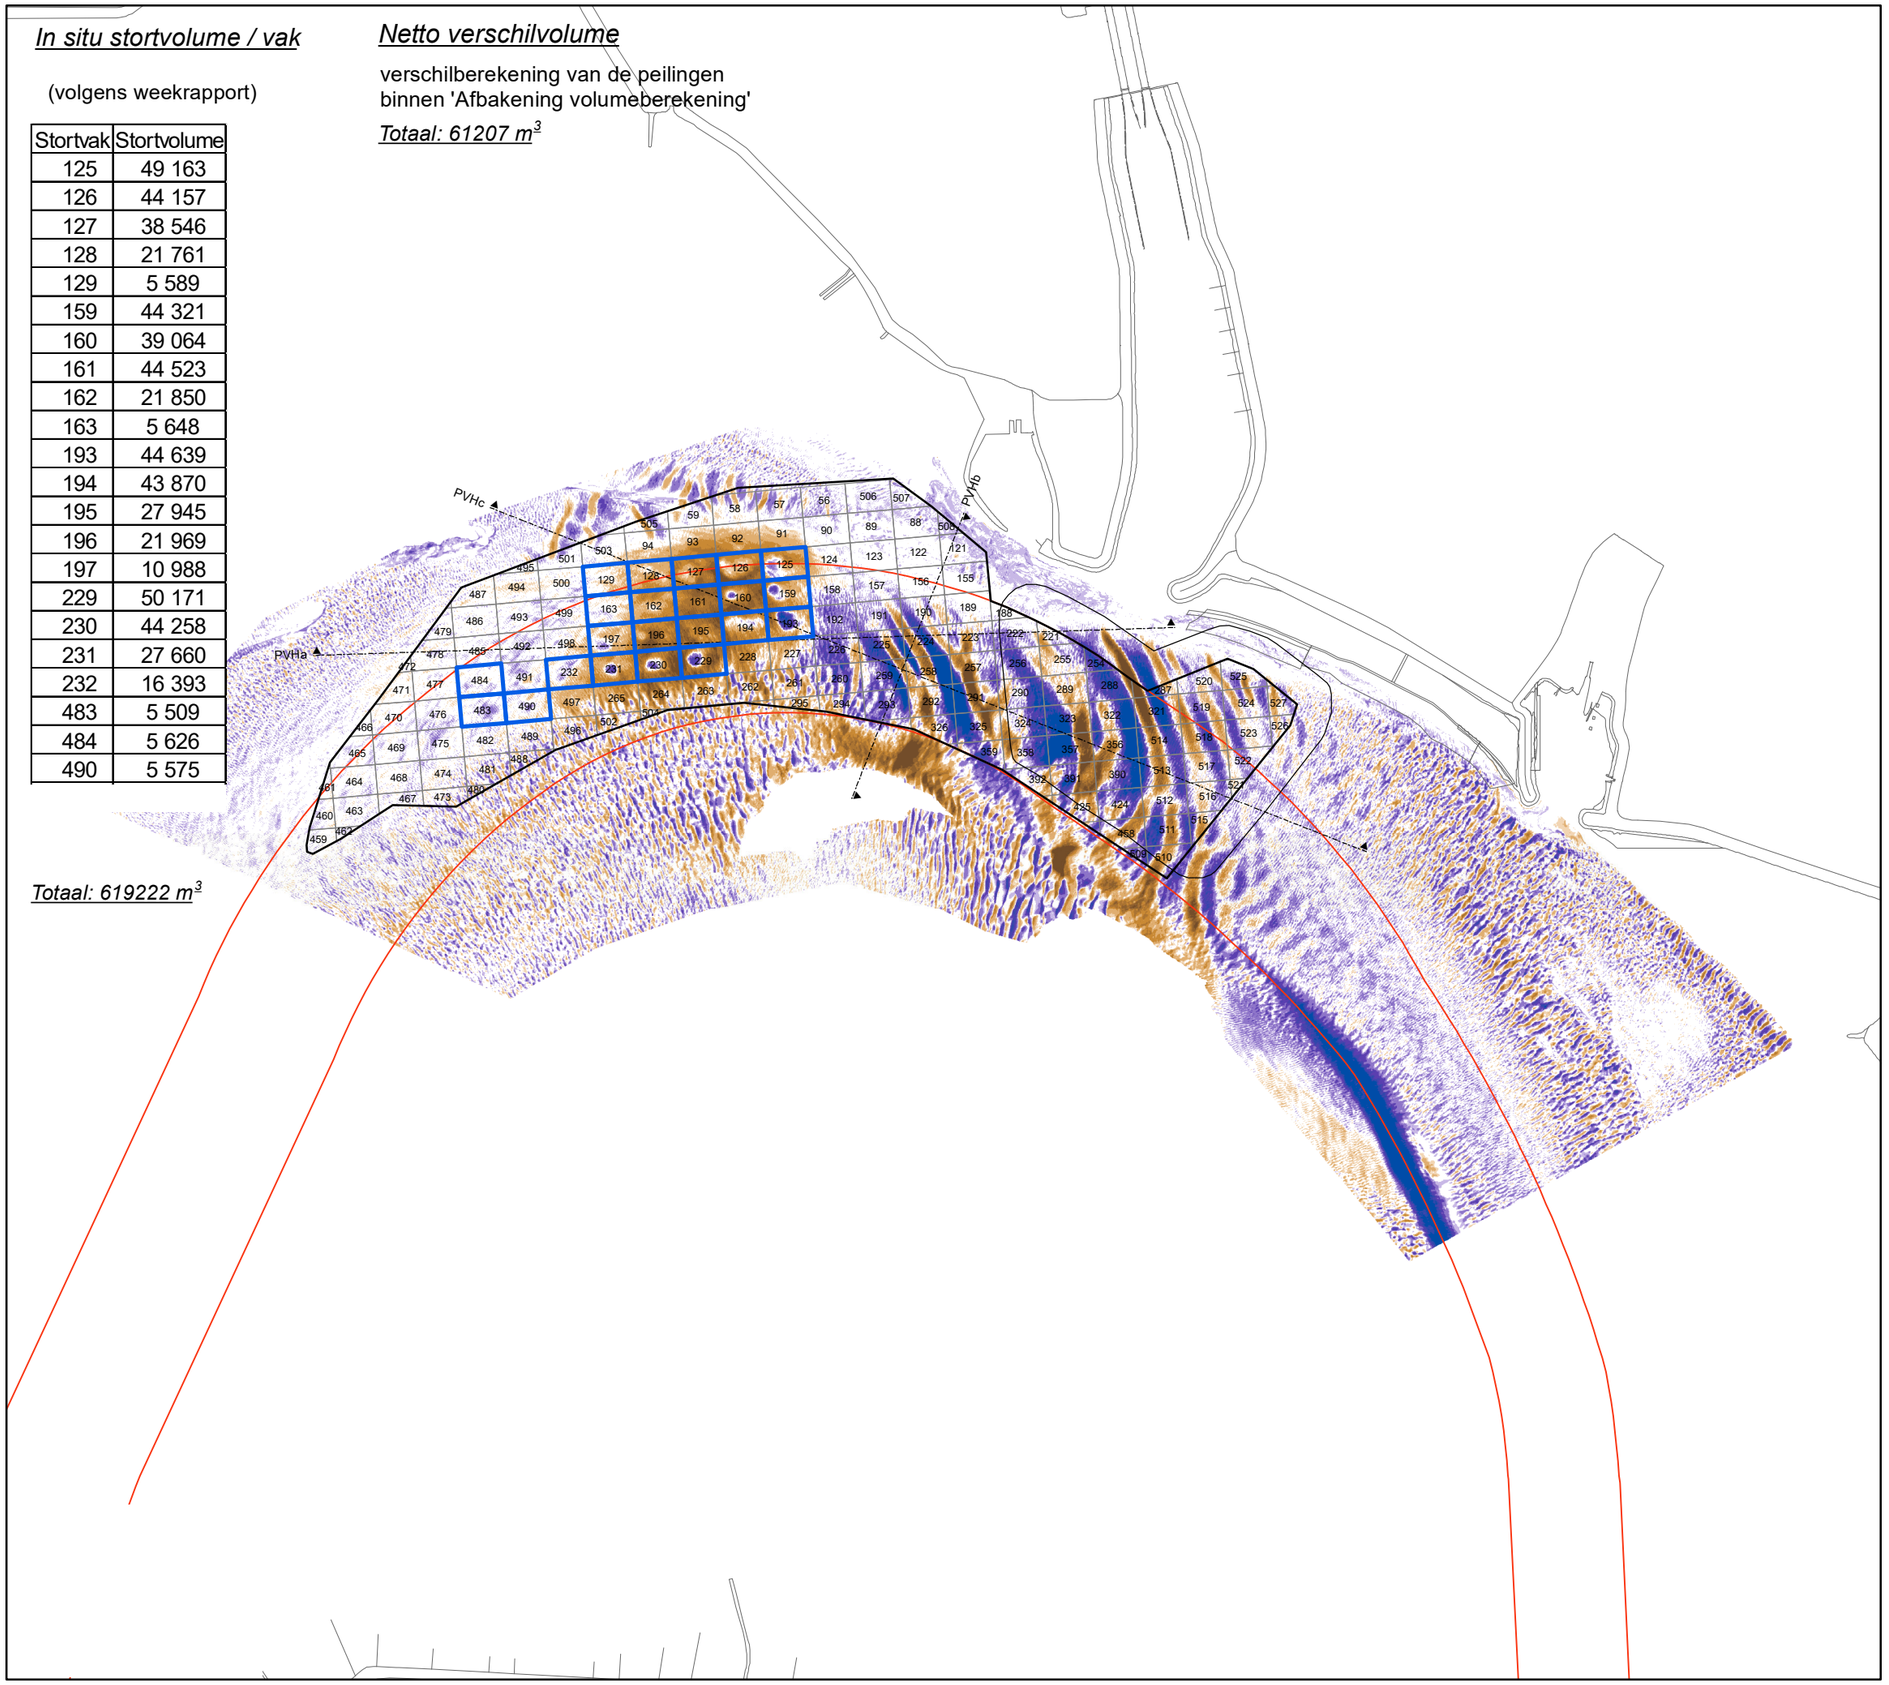

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nrMT/02323_C1_04

Verschilkaart Put van Hansweert

21/09/2025 (T92) - 17/11/2025 (T93)

11640_PVH_VT93-T92

Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende


- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	verdieping
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

0 200 400 600 m

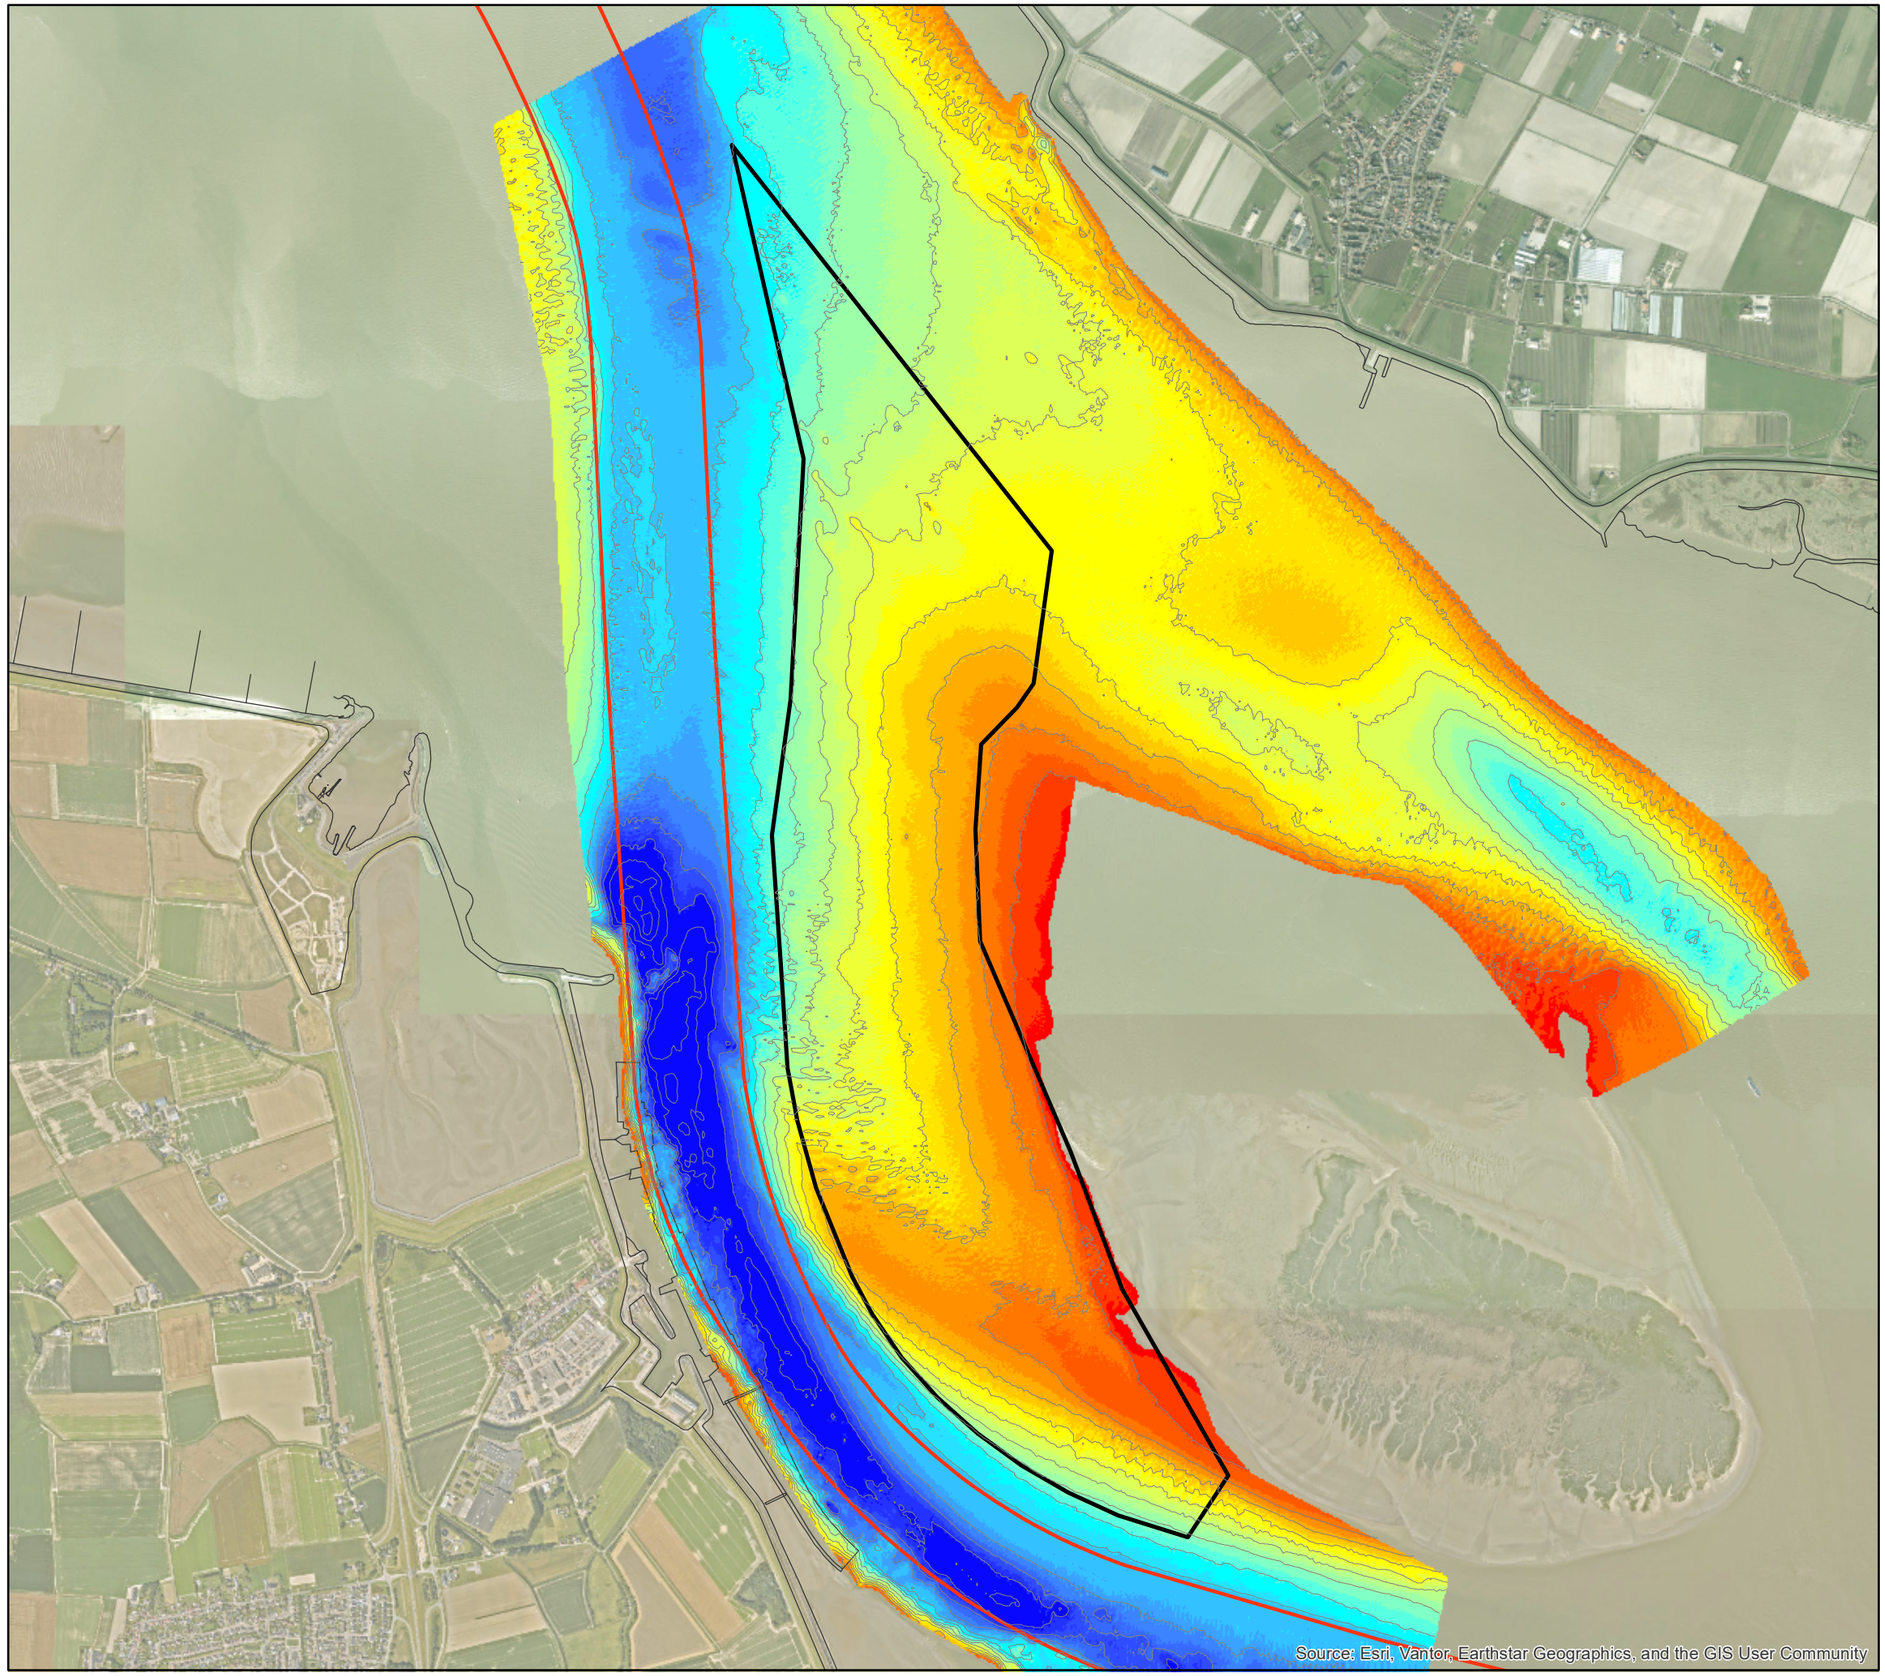

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart Plaat van Walsoorden

30/09/2025 (T173)

11640_PWA_BT173
Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

Diepte in m [NAP]

- 0.09 - 1.00
- 1.01 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00

N
W E
S

0 300 600 900 1200 1500 m

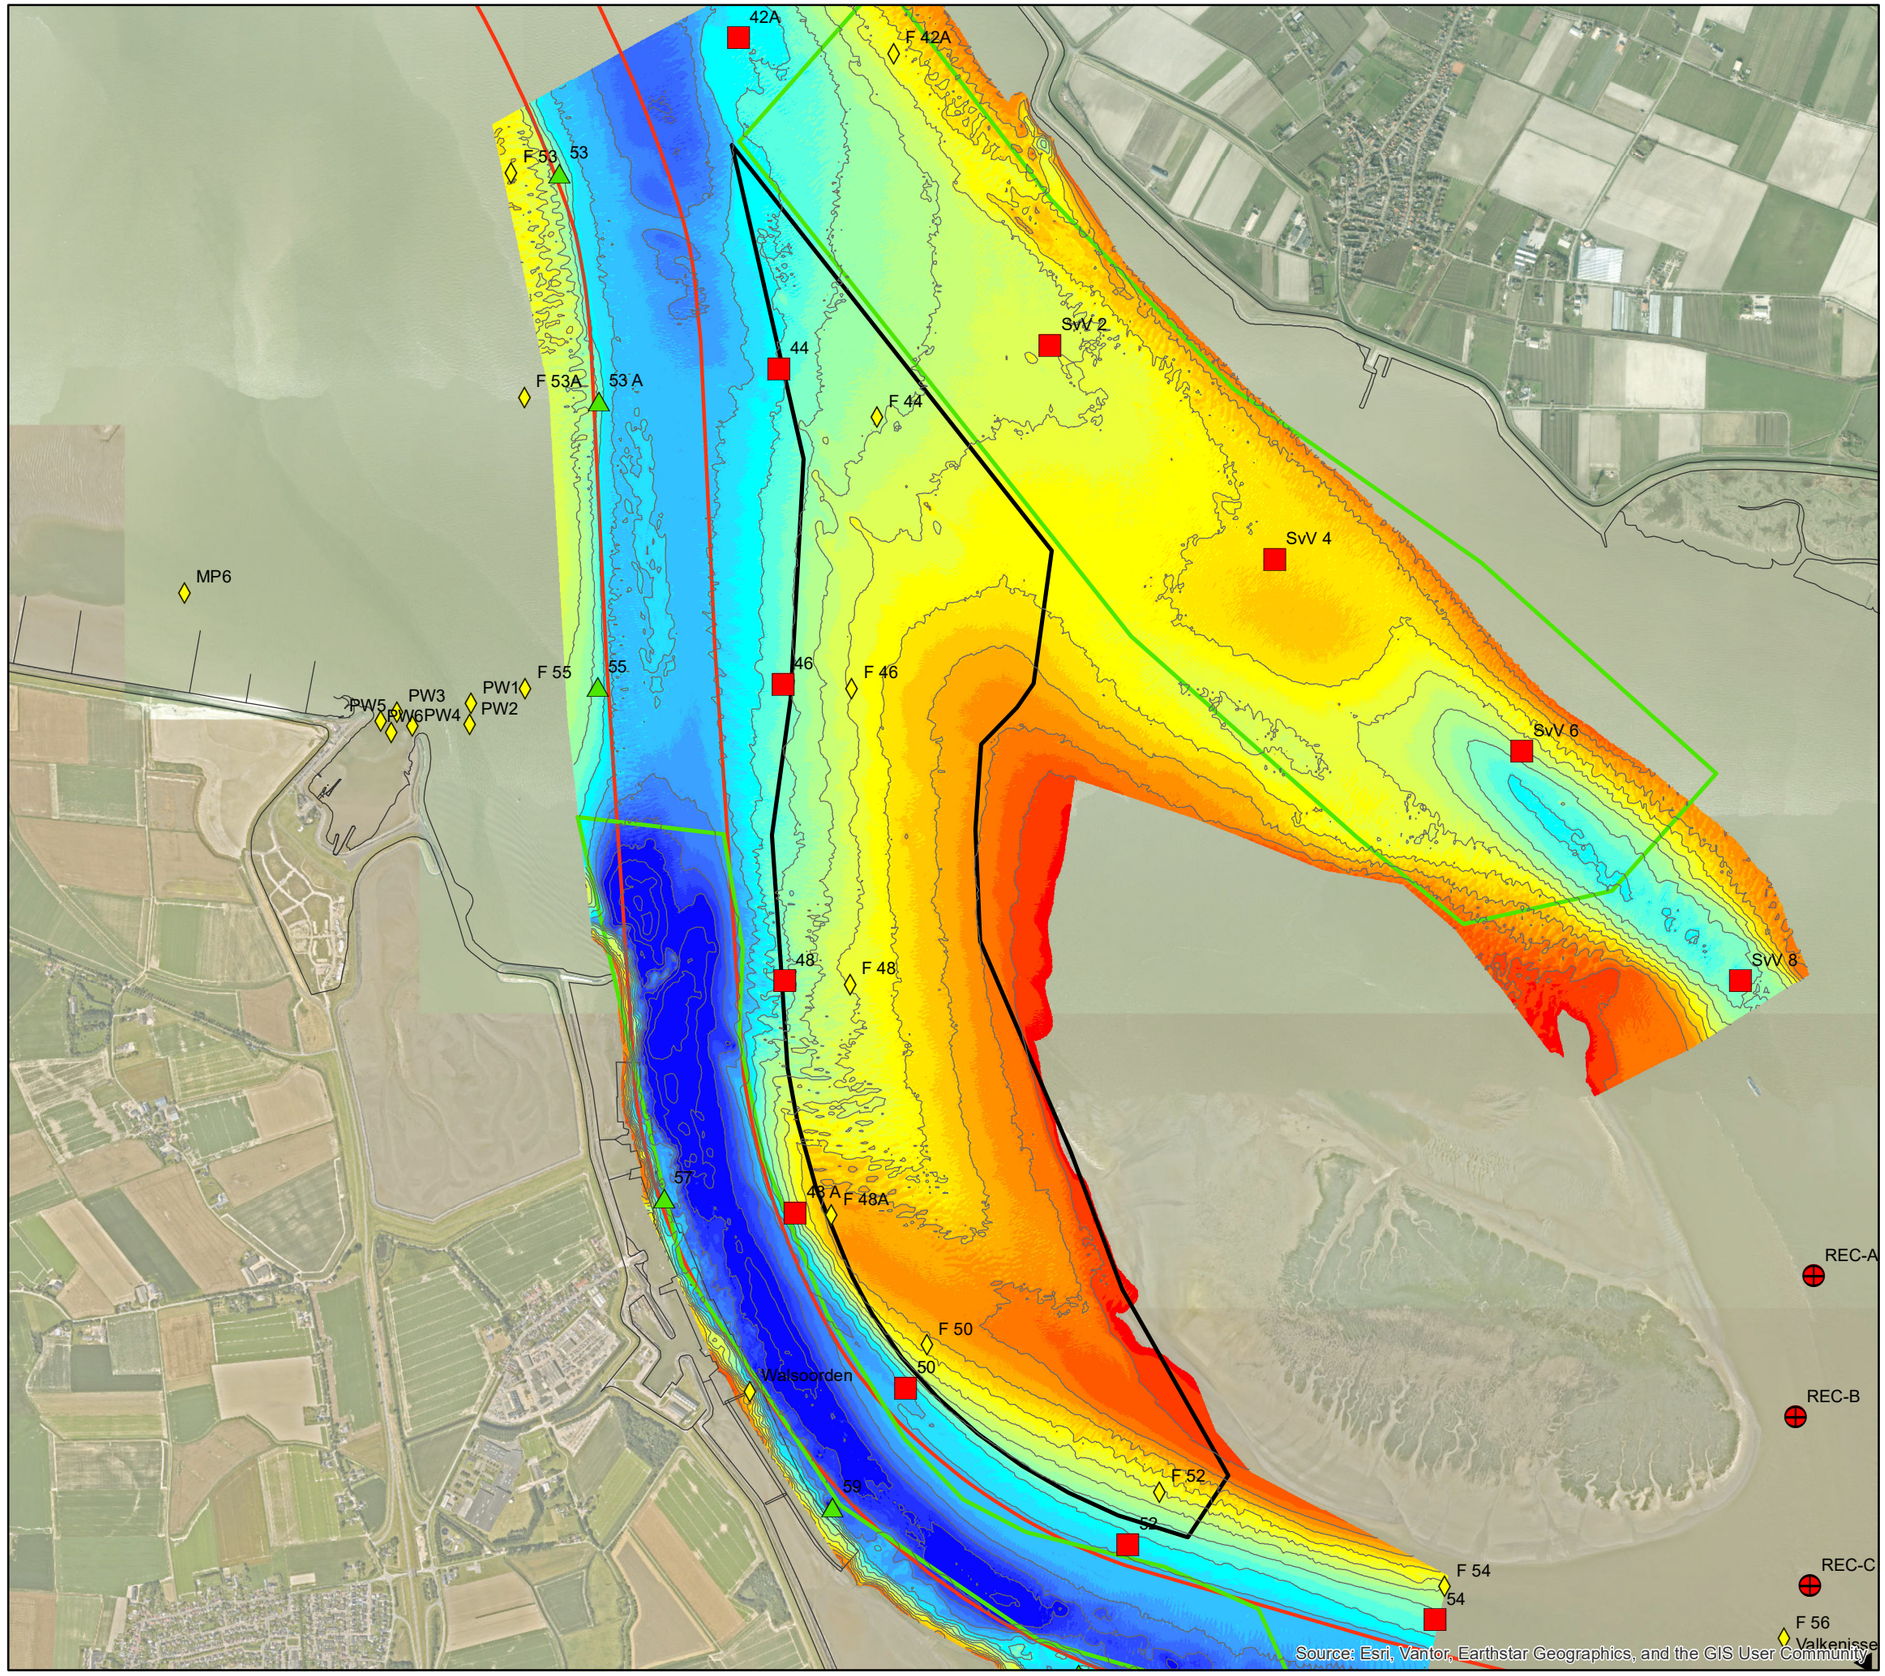

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart Plaat van Walsoorden

30/09/2025 (T173)

1640_PWA_BT173
Rapport nr. 25.212



IMDC
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

Diepte in m [NAP]

- 0.09 - 1.00
- 1.01 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00

N
W E
S

0 300 600 900 1200 1500 m

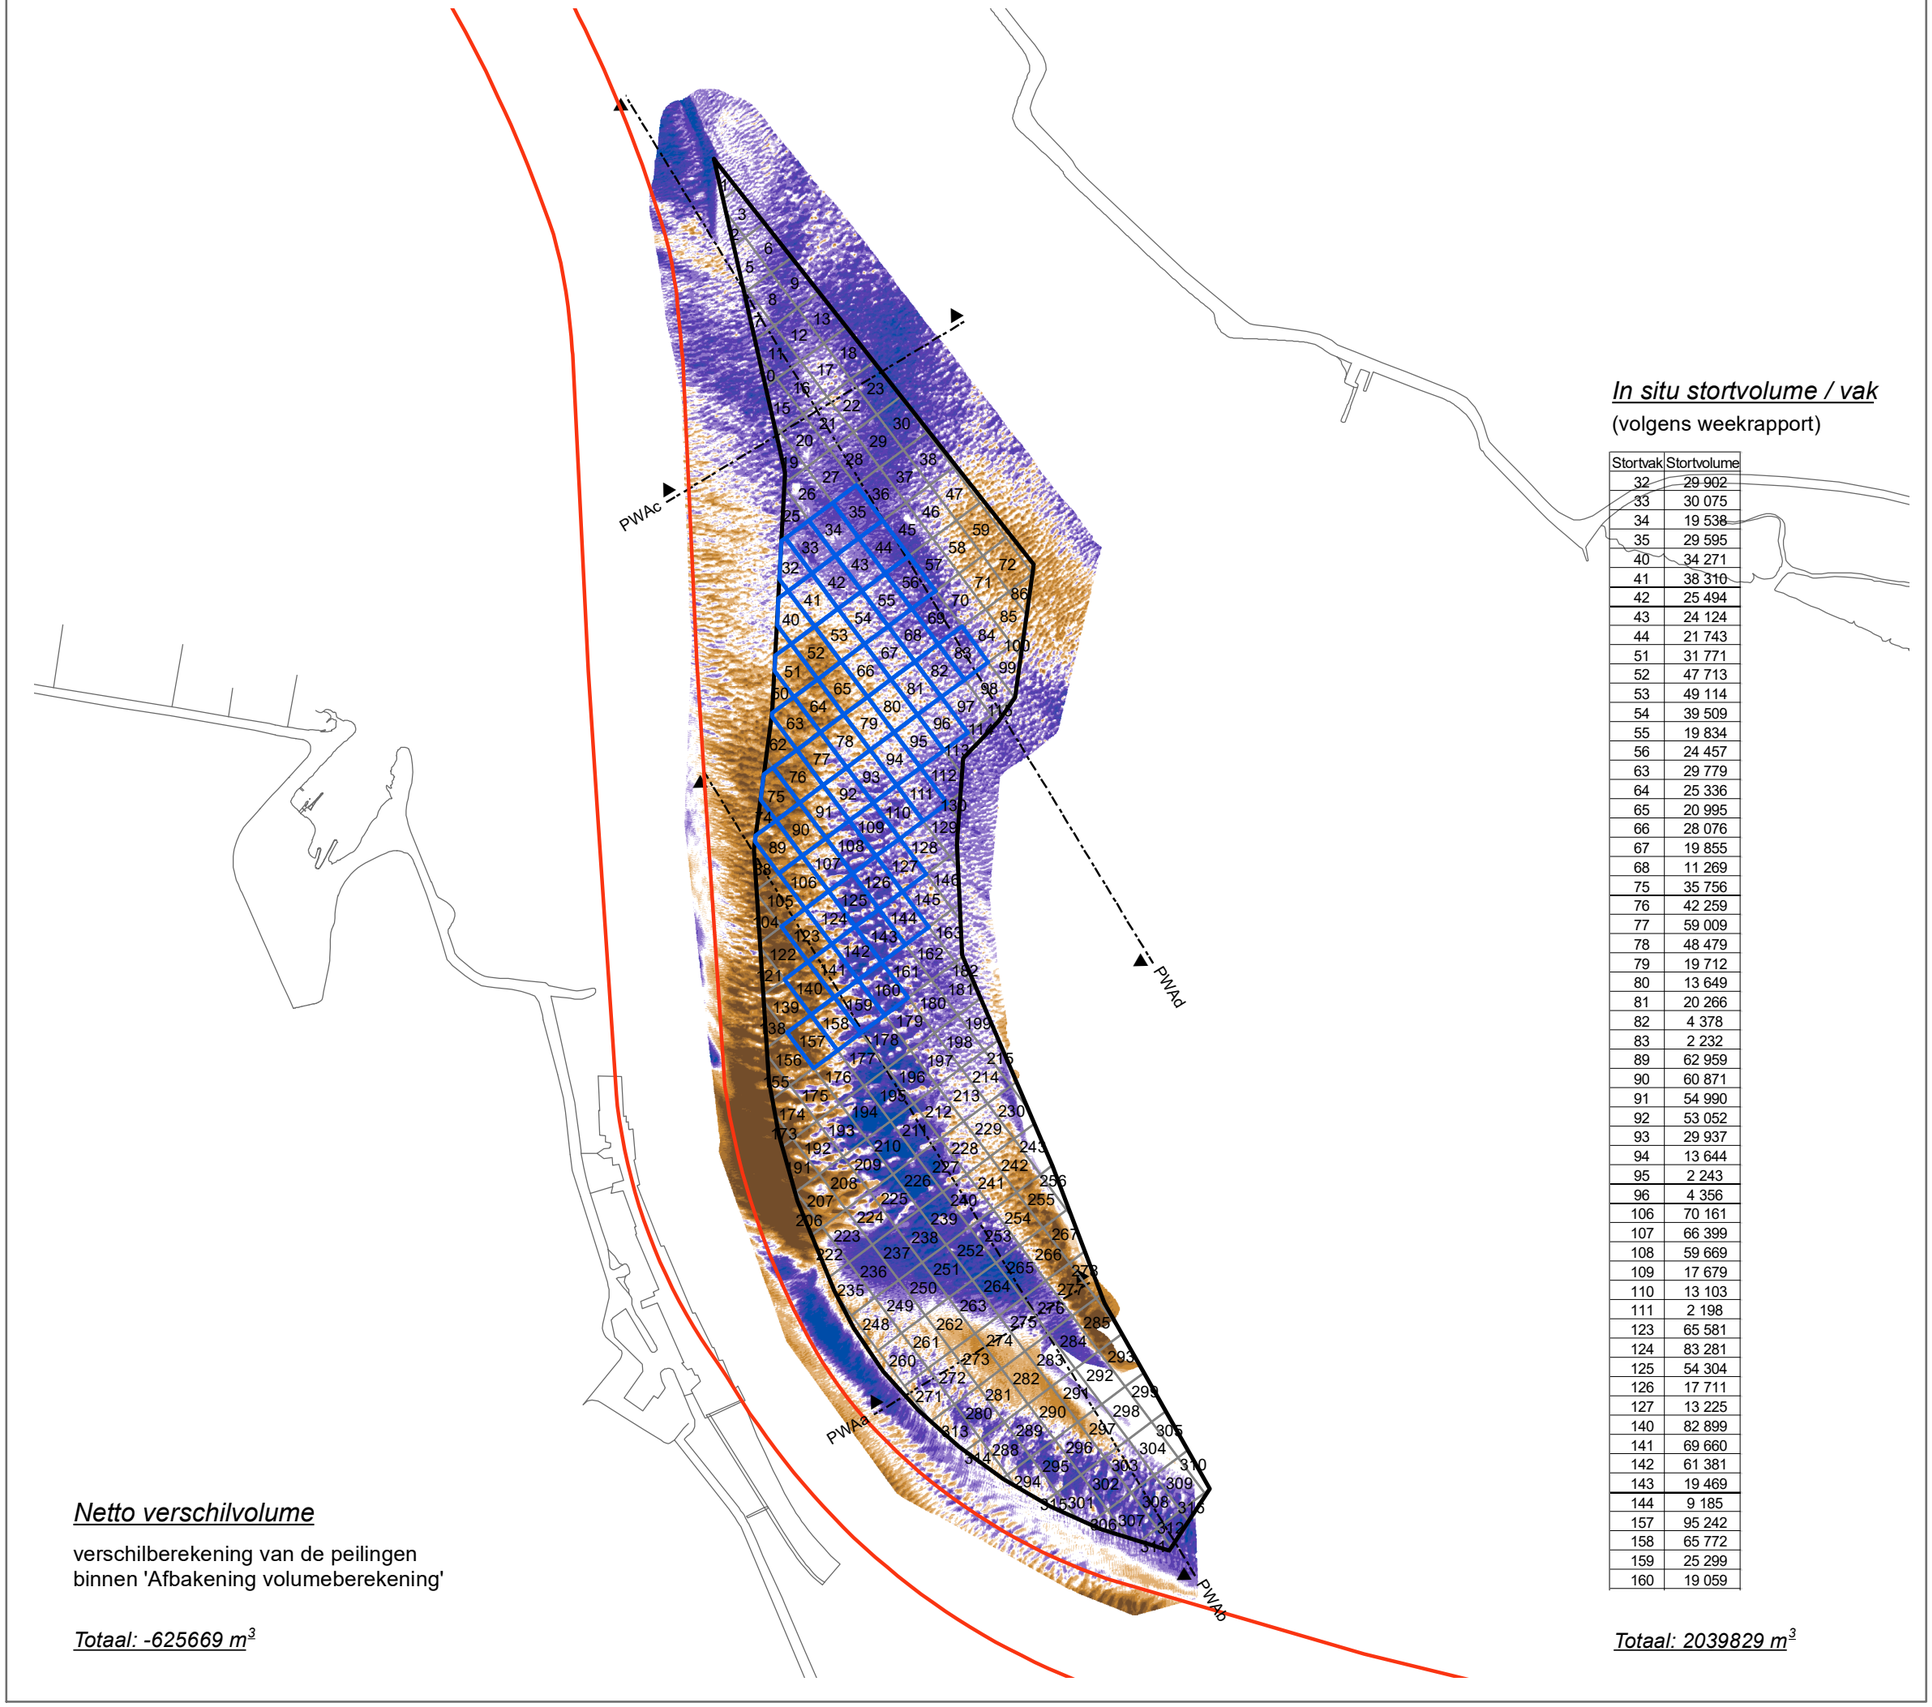

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
32	29 902
33	30 075
34	19 538
35	29 595
40	34 271
41	38 310
42	25 494
43	24 124
44	21 743
51	31 771
52	47 713
53	49 114
54	39 509
55	19 834
56	24 457
63	29 779
64	25 336
65	20 995
66	28 076
67	19 855
68	11 269
75	35 756
76	42 259
77	59 009
78	48 479
79	19 712
80	13 649
81	20 266
82	4 378
83	2 232
89	62 959
90	60 871
91	54 990
92	53 052
93	29 937
94	13 644
95	2 243
96	4 356
106	70 161
107	66 399
108	59 669
109	17 679
110	13 103
111	2 198
123	65 581
124	83 281
125	54 304
126	17 711
127	13 225
140	82 899
141	69 660
142	61 381
143	19 469
144	9 185
157	95 242
158	65 772
159	25 299
160	19 059

Totaal: 2039829 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -625669 m³

VLAAMSE OVERHEID

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart Plaat van Walsoorden

12/04/2022 (T155) - 30/09/2025 (T173)

11640_PWA_VT173-T155
Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken


verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N W E S

0 300 600 900 1200 1500 m

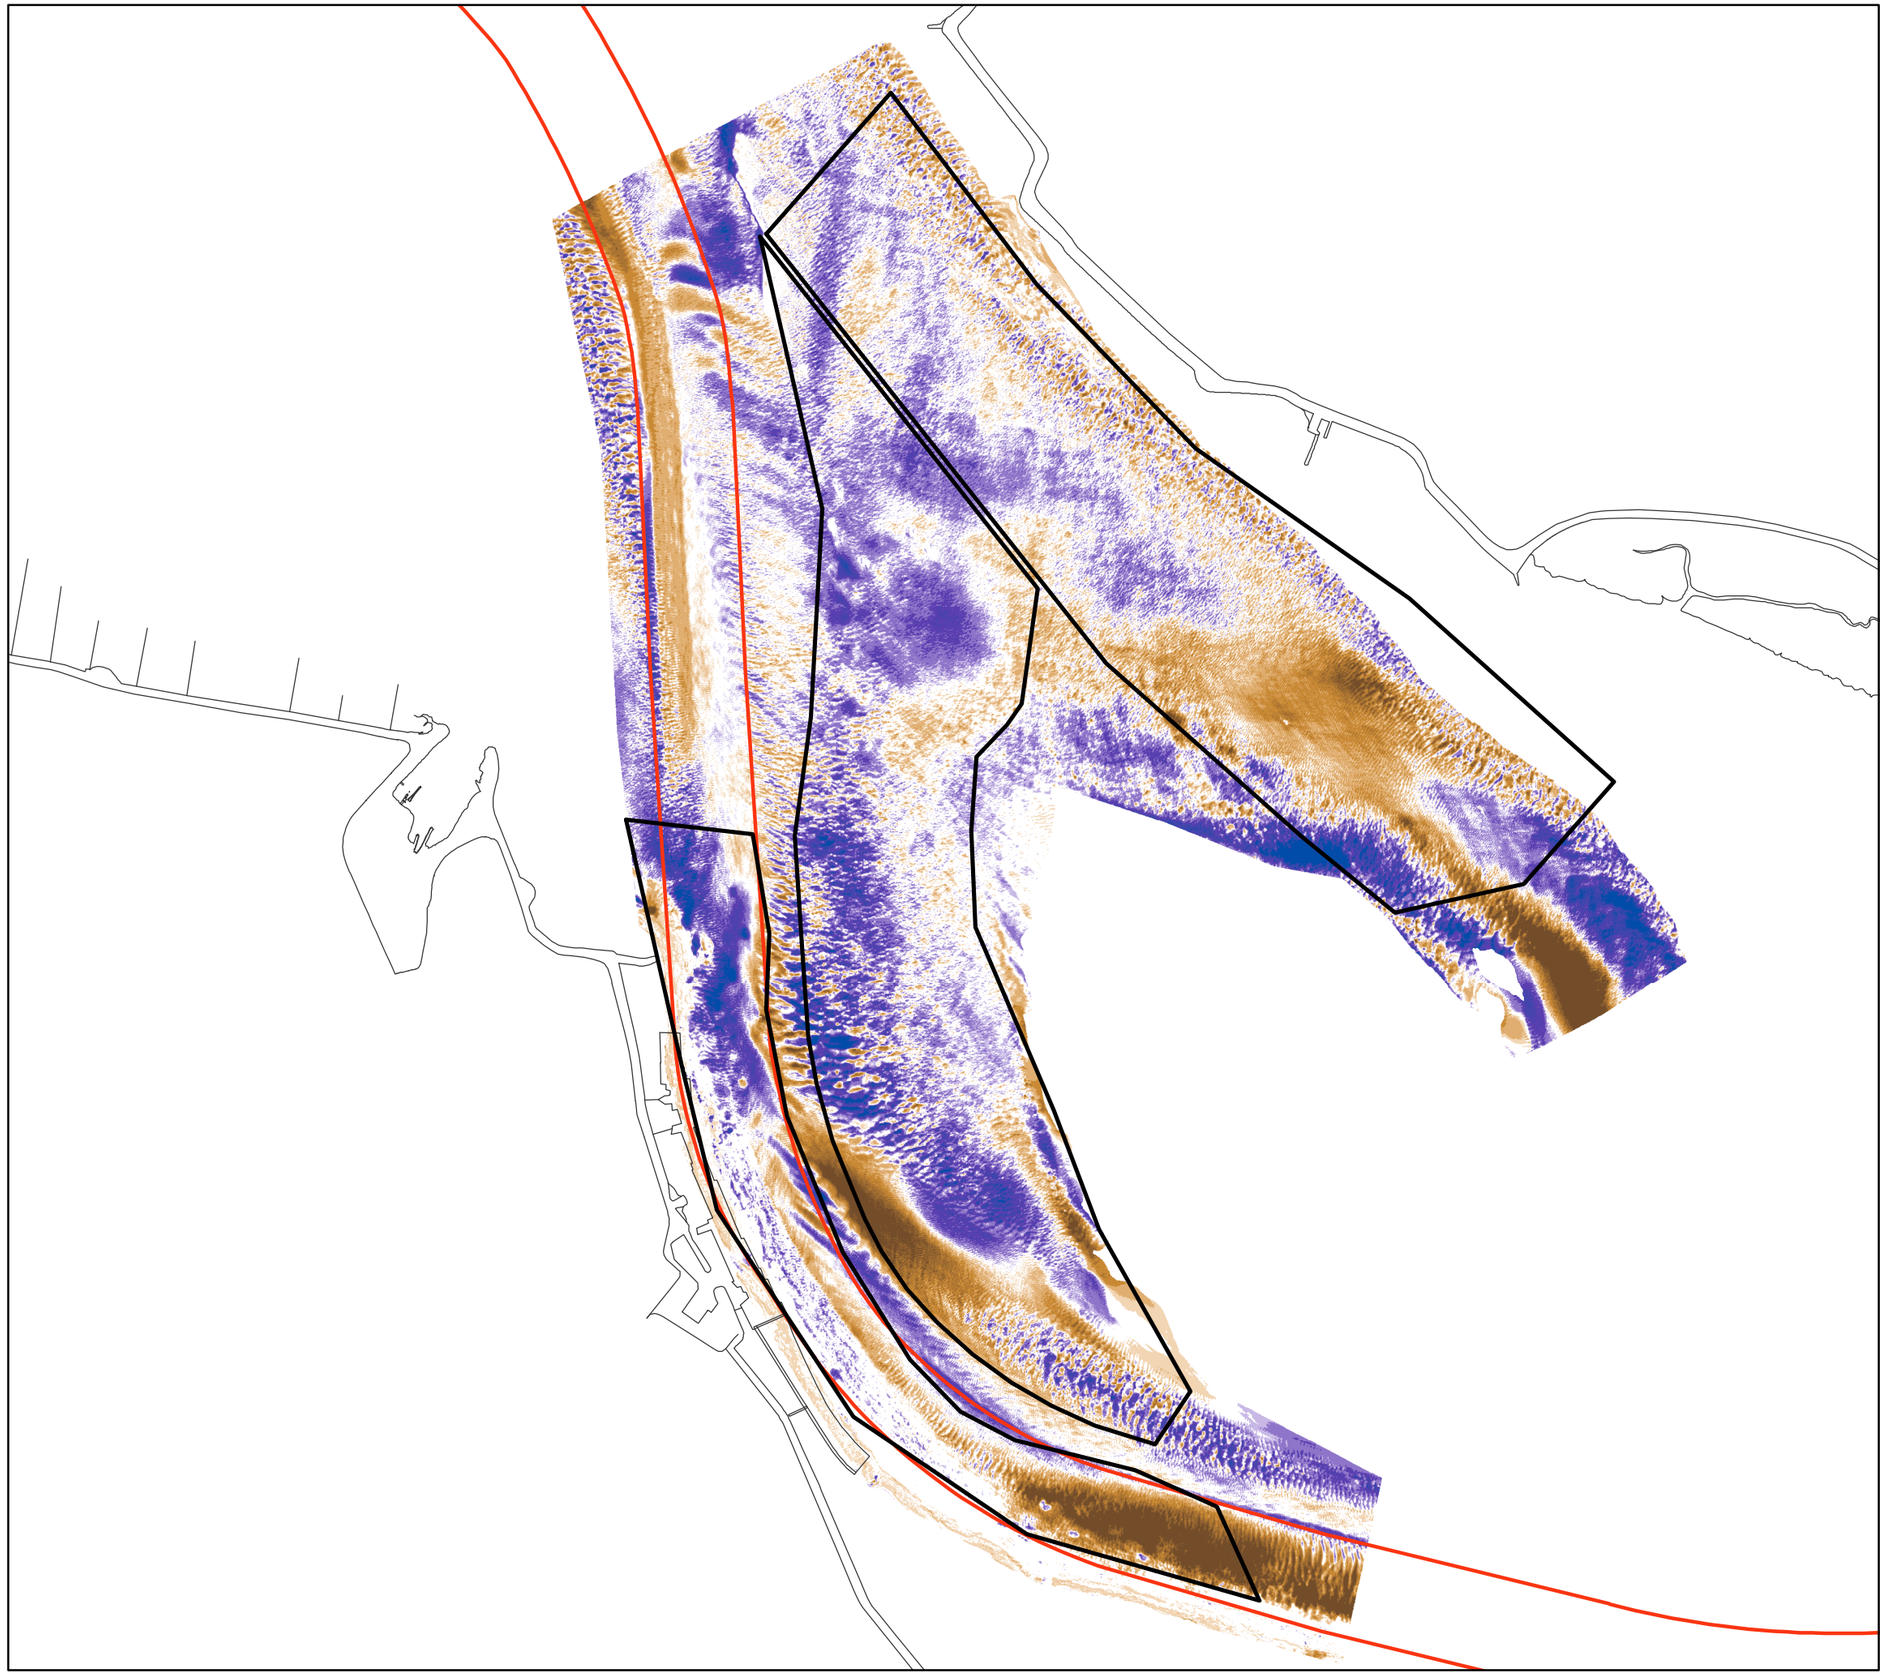

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart
Plaat van Walsoorden, SH51, SN51

T173-168 (30/09/2025 - 03/06/2024)

1640_PWA_VT173-168_G
Rapport nr. 25.212



IMDC
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

Diepte in m [NAP]

- 0.09 - 1.00
- 1.01 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00

N
W E
S

0 300 600 900 1200 1500 m

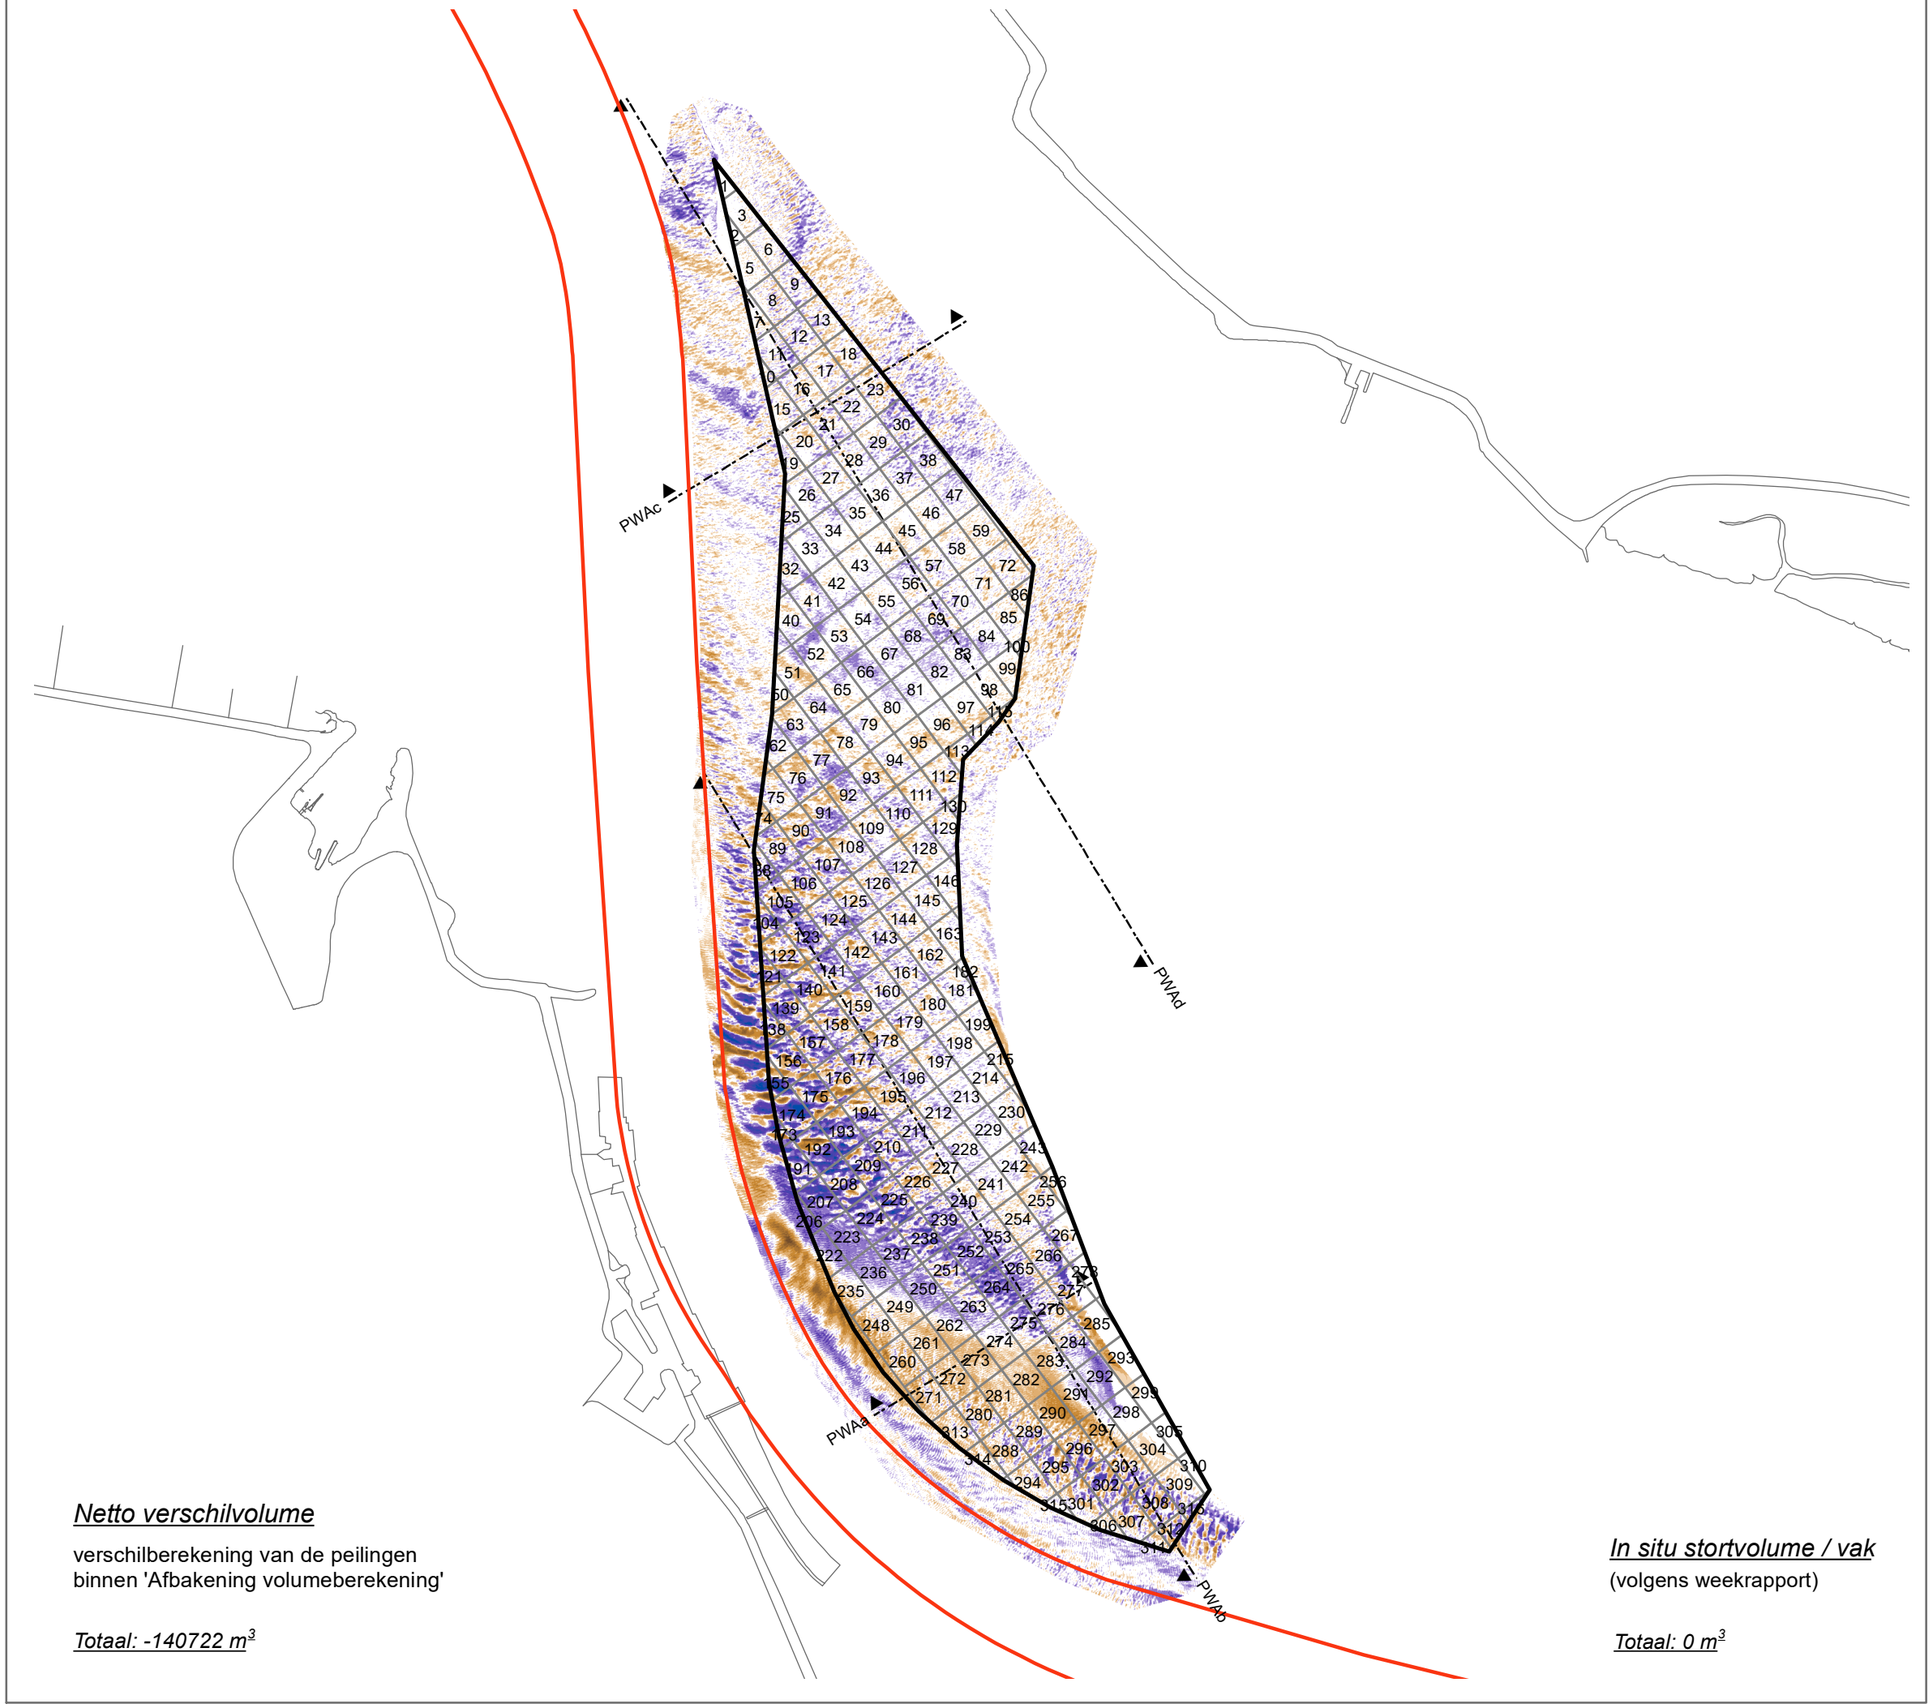

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -140722 m³

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Totaal: 0 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart Plaat van Walsoorden

04/06/2025 (T172) - 30/09/2025 (T173)

11640_PWA_VT173-T172
Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken


verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N
W E
S

0 300 600 900 1200 1500 m

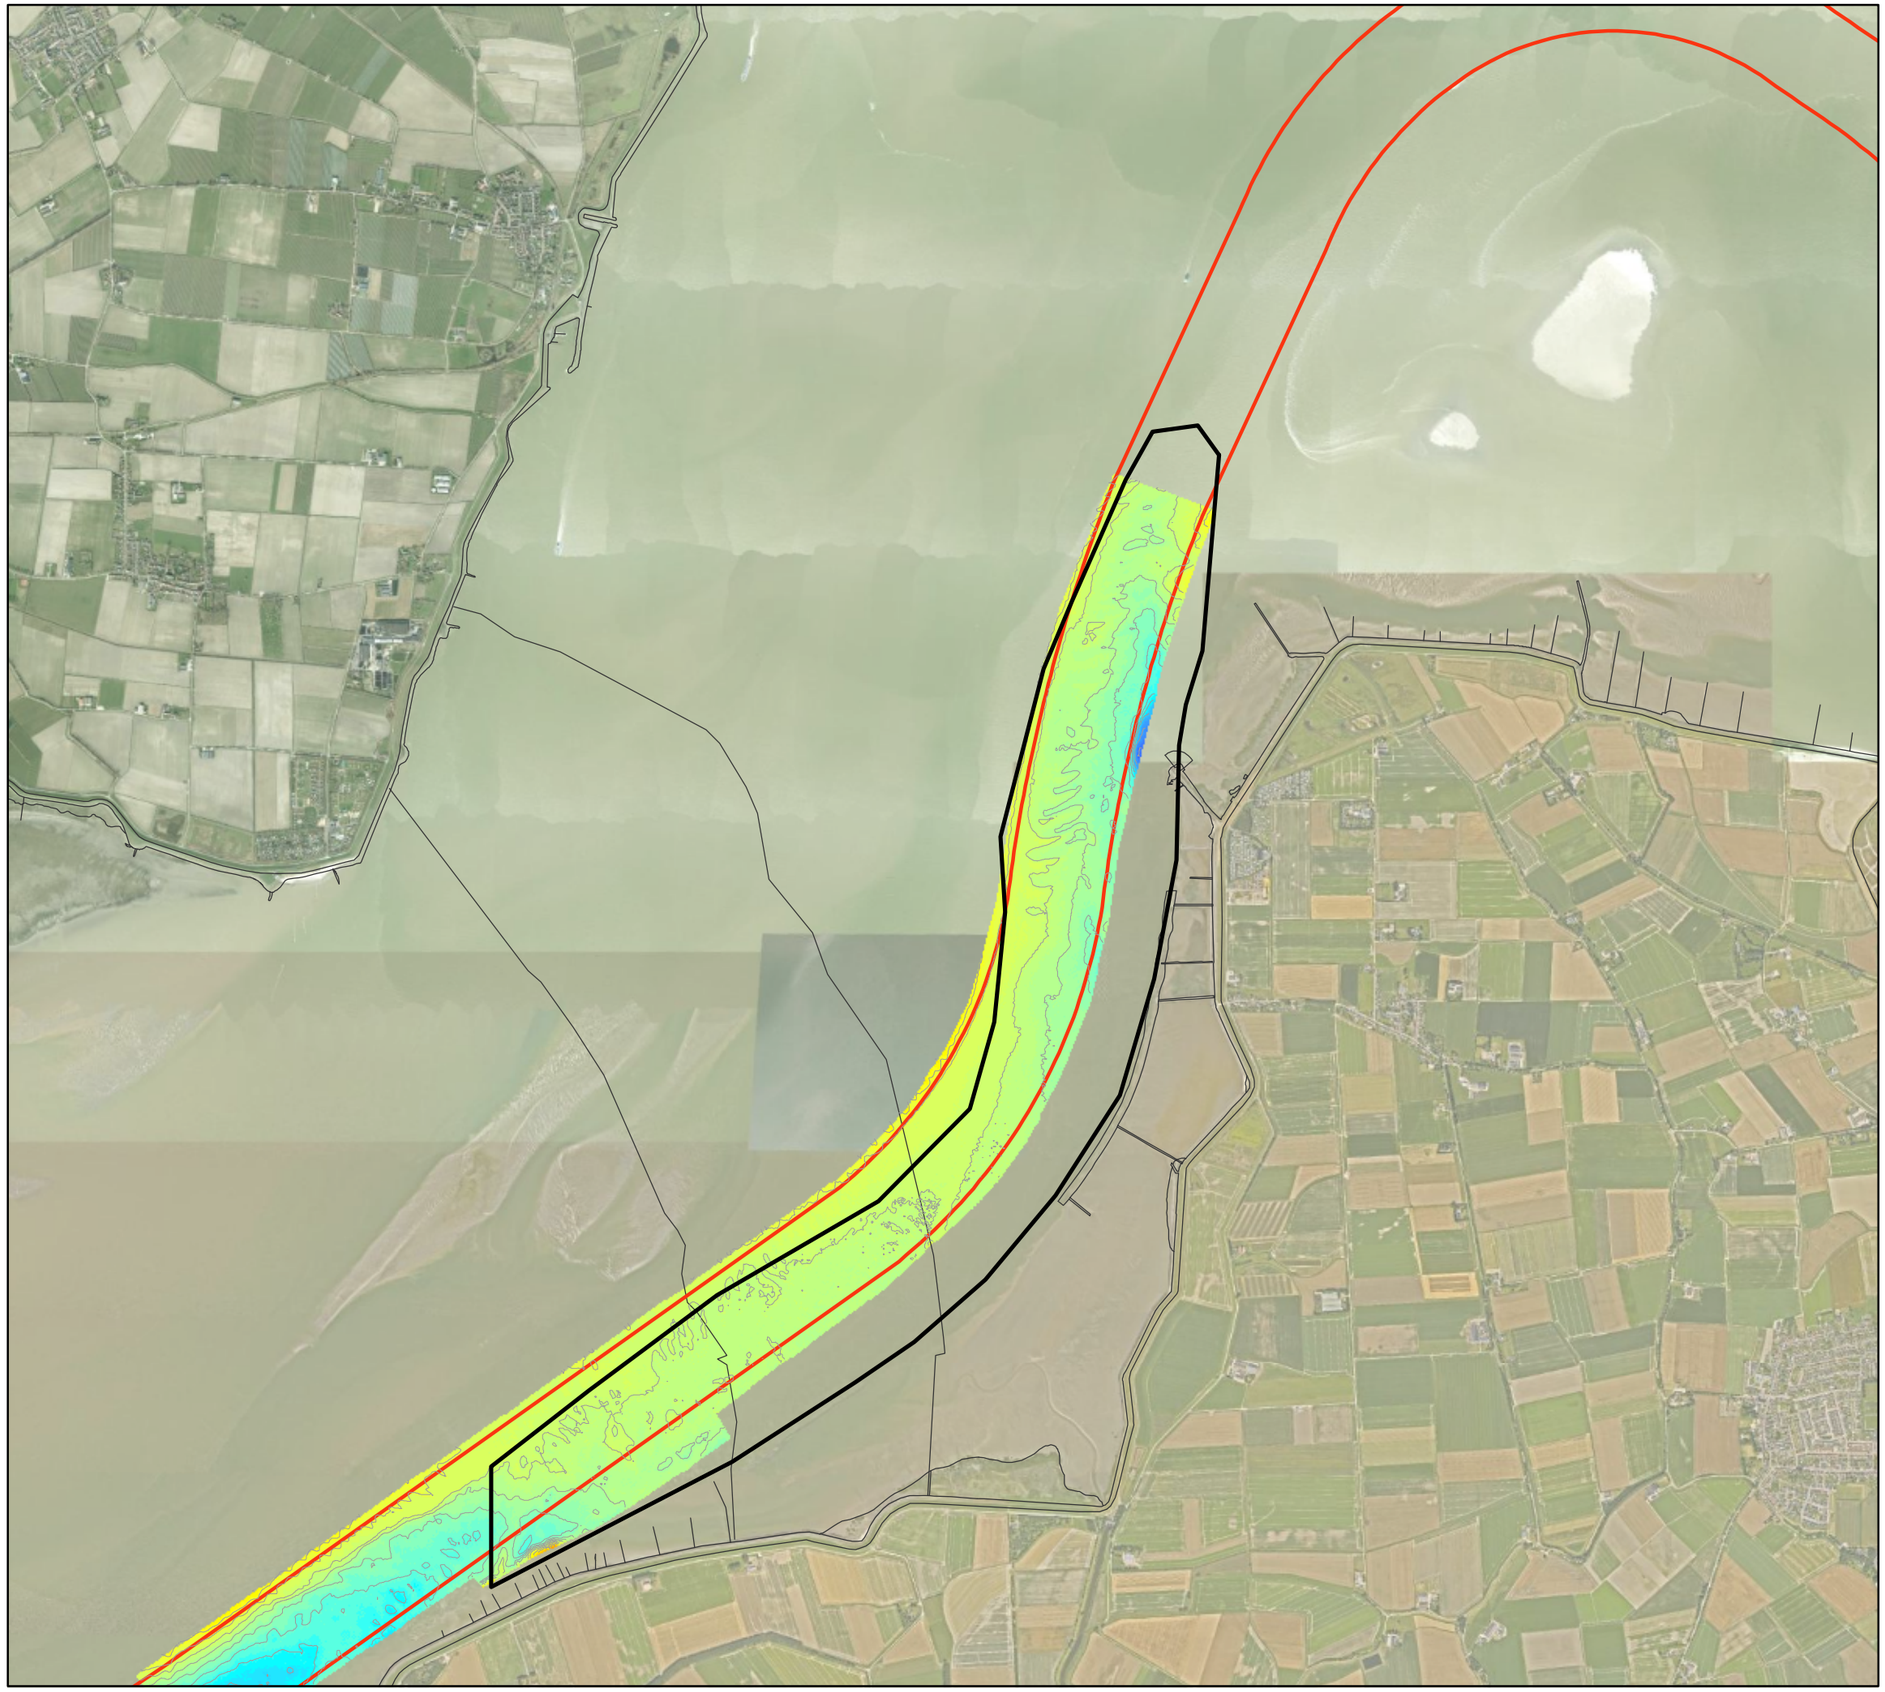

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SH41

13/11/2025 (T8)

11640_SH41_BT8
Rapport nr. 26.015



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

Diepte in m [NAP]

1.88 - 2.00	22.01 - 23.00
2.01 - 3.00	23.01 - 24.00
3.01 - 4.00	24.01 - 25.00
4.01 - 5.00	25.01 - 26.00
5.01 - 6.00	26.01 - 27.00
6.01 - 7.00	27.01 - 28.00
7.01 - 8.00	28.01 - 29.00
8.01 - 9.00	29.01 - 30.00
9.01 - 10.00	30.01 - 31.00
10.01 - 11.00	31.01 - 32.00
11.01 - 12.00	32.01 - 33.00
12.01 - 13.00	33.01 - 34.00
13.01 - 14.00	34.01 - 35.00
14.01 - 15.00	35.01 - 36.00
15.01 - 16.00	36.01 - 37.00
16.01 - 17.00	37.01 - 38.00
17.01 - 18.00	38.01 - 39.00
18.01 - 19.00	39.01 - 40.00
19.01 - 20.00	40.01 - 41.00
20.01 - 21.00	41.01 - 42.00
21.01 - 22.00	


N
W E
S

0 250 500 750 1000 m

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 790528 m³

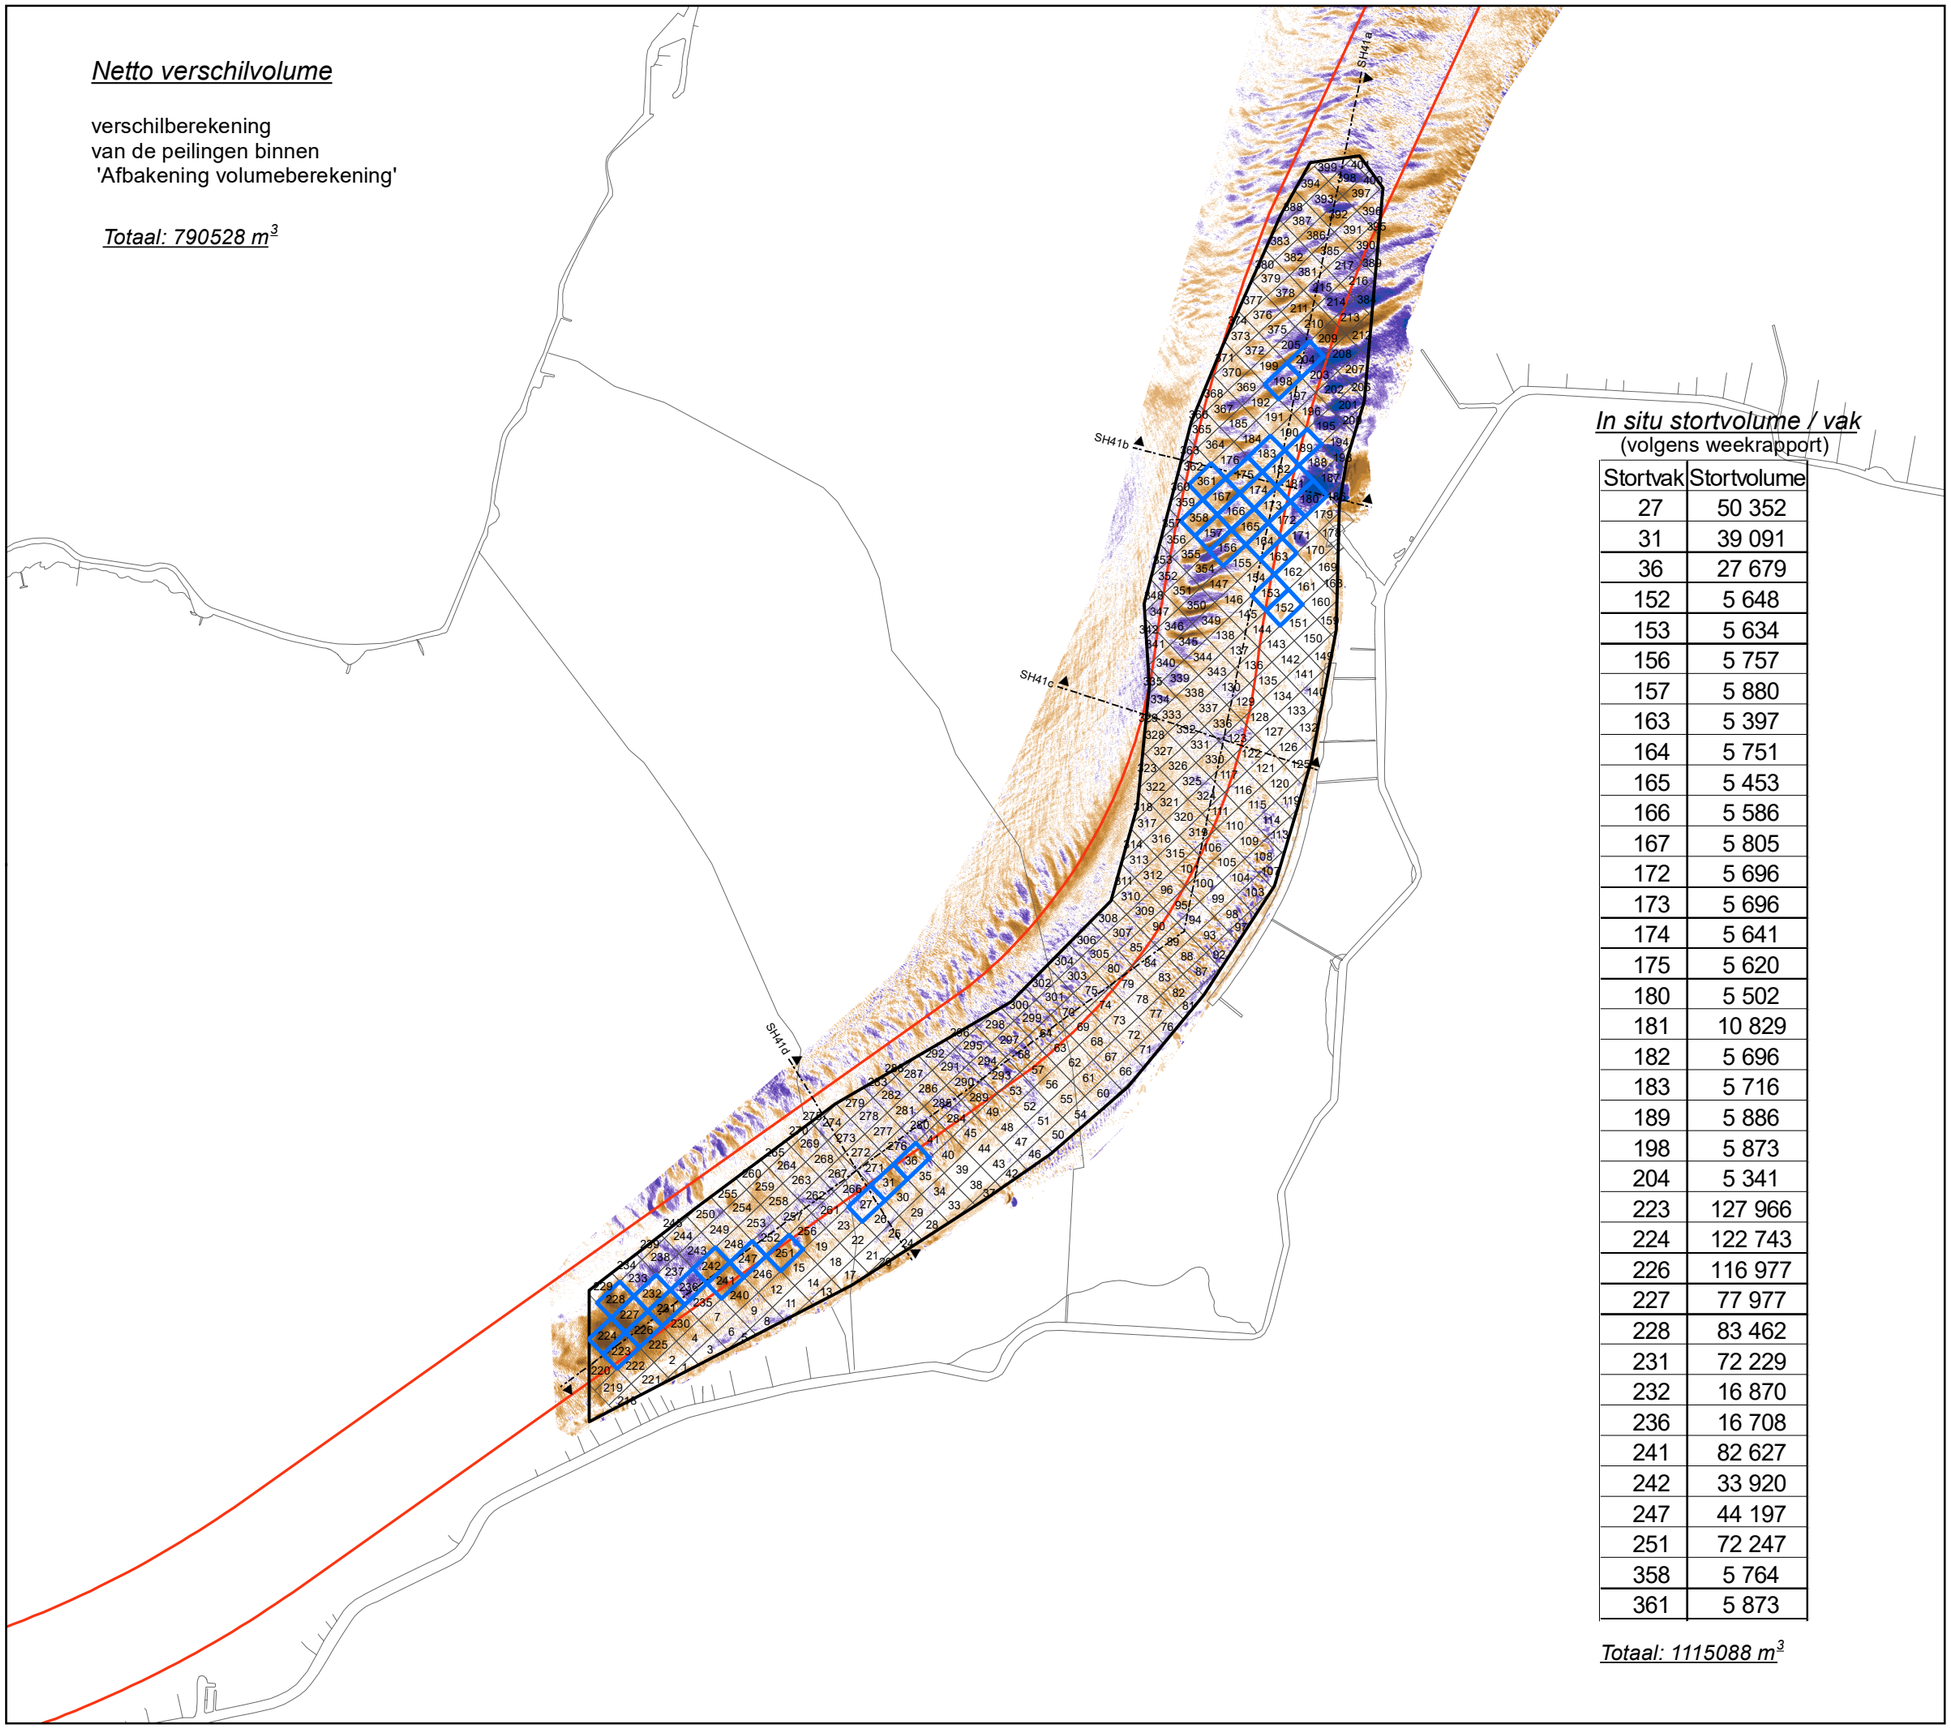

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
27	50 352
31	39 091
36	27 679
152	5 648
153	5 634
156	5 757
157	5 880
163	5 397
164	5 751
165	5 453
166	5 586
167	5 805
172	5 696
173	5 696
174	5 641
175	5 620
180	5 502
181	10 829
182	5 696
183	5 716
189	5 886
198	5 873
204	5 341
223	127 966
224	122 743
226	116 977
227	77 977
228	83 462
231	72 229
232	16 870
236	16 708
241	82 627
242	33 920
247	44 197
251	72 247
358	5 764
361	5 873

Totaal: 1115088 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH41

13/05/2025 (T4) - 17/09/2025 (T7)

11640_SH41_VT7-T4
Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50


N W E S

0 500 1000 1500 2000 m

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 764766 m³

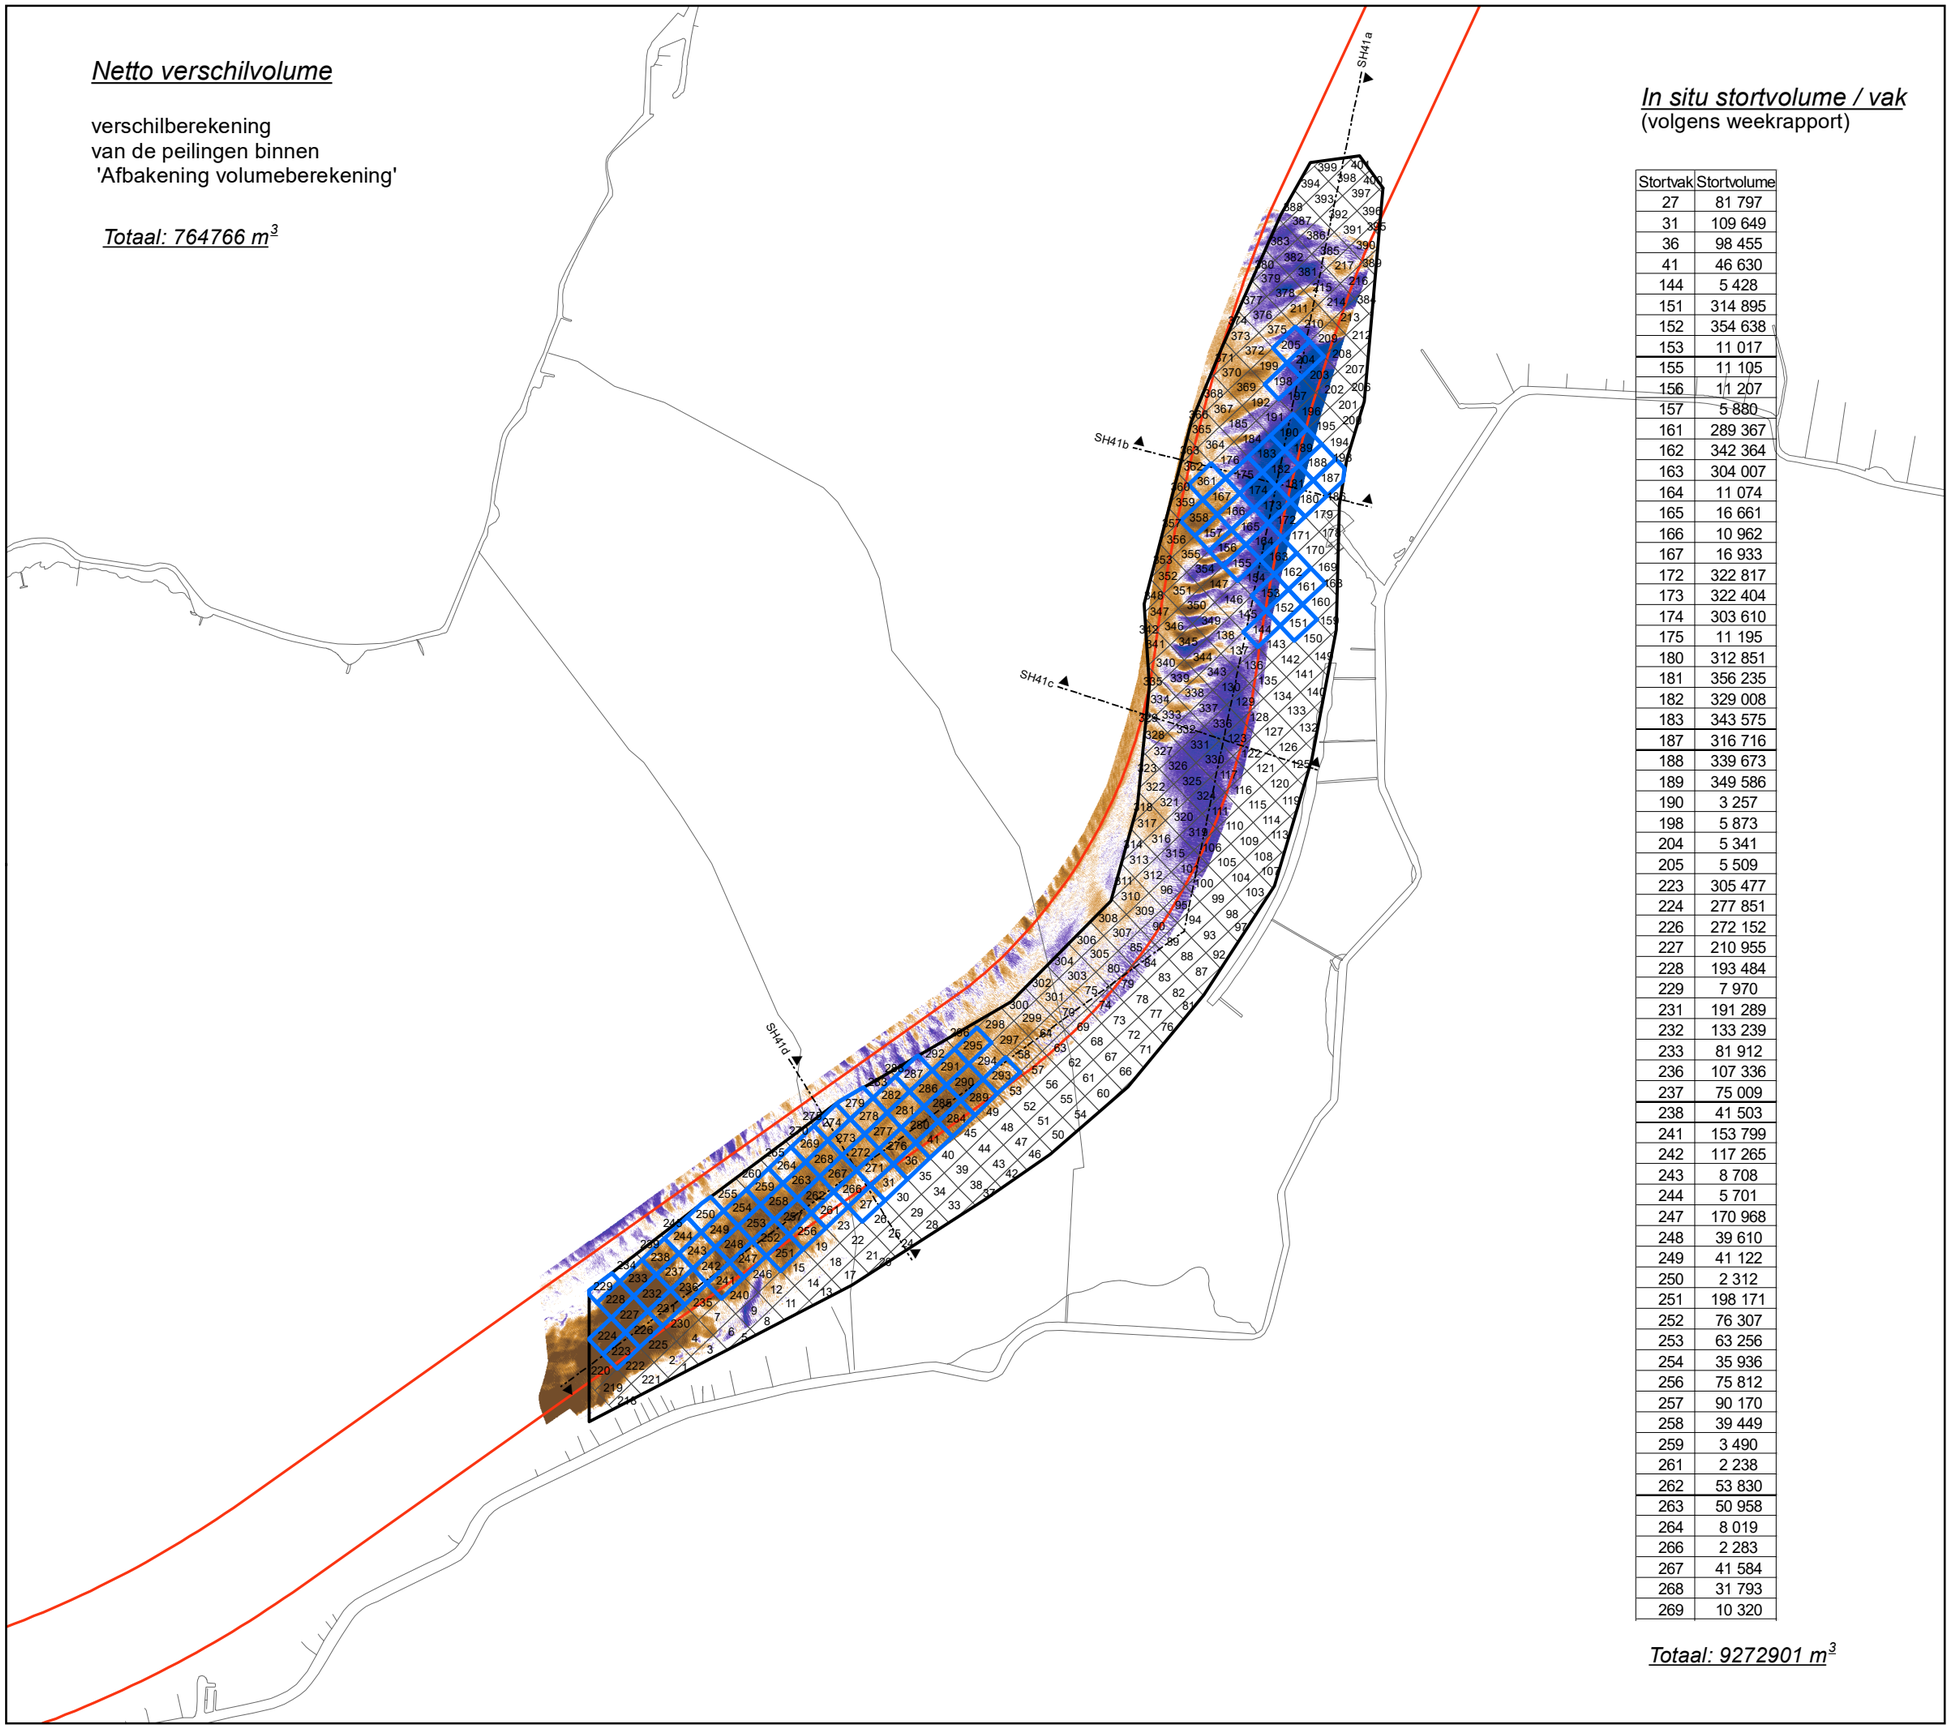

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
27	81 797
31	109 649
36	98 455
41	46 630
144	5 428
151	314 895
152	354 638
153	11 017
155	11 105
156	11 207
157	5 880
161	289 367
162	342 364
163	304 007
164	11 074
165	16 661
166	10 962
167	16 933
172	322 817
173	322 404
174	303 610
175	11 195
180	312 851
181	356 235
182	329 008
183	343 575
187	316 716
188	339 673
189	349 586
190	3 257
198	5 873
204	5 341
205	5 509
223	305 477
224	277 851
226	272 152
227	210 955
228	193 484
229	7 970
231	191 289
232	133 239
233	81 912
236	107 336
237	75 009
238	41 503
241	153 799
242	117 265
243	8 708
244	5 701
247	170 968
248	39 610
249	41 122
250	2 312
251	198 171
252	76 307
253	63 256
254	35 936
256	75 812
257	90 170
258	39 449
259	3 490
261	2 238
262	53 830
263	50 958
264	8 019
266	2 283
267	41 584
268	31 793
269	10 320

Totaal: 9272901 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH41

18/07/2022 (T0) - 13/11/2025 (T8)

11640_SH41_VT8-T0
Rapport nr. 26.015



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50


N
W E
S

0 500 1000 1500 2000 m

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -504915 m³

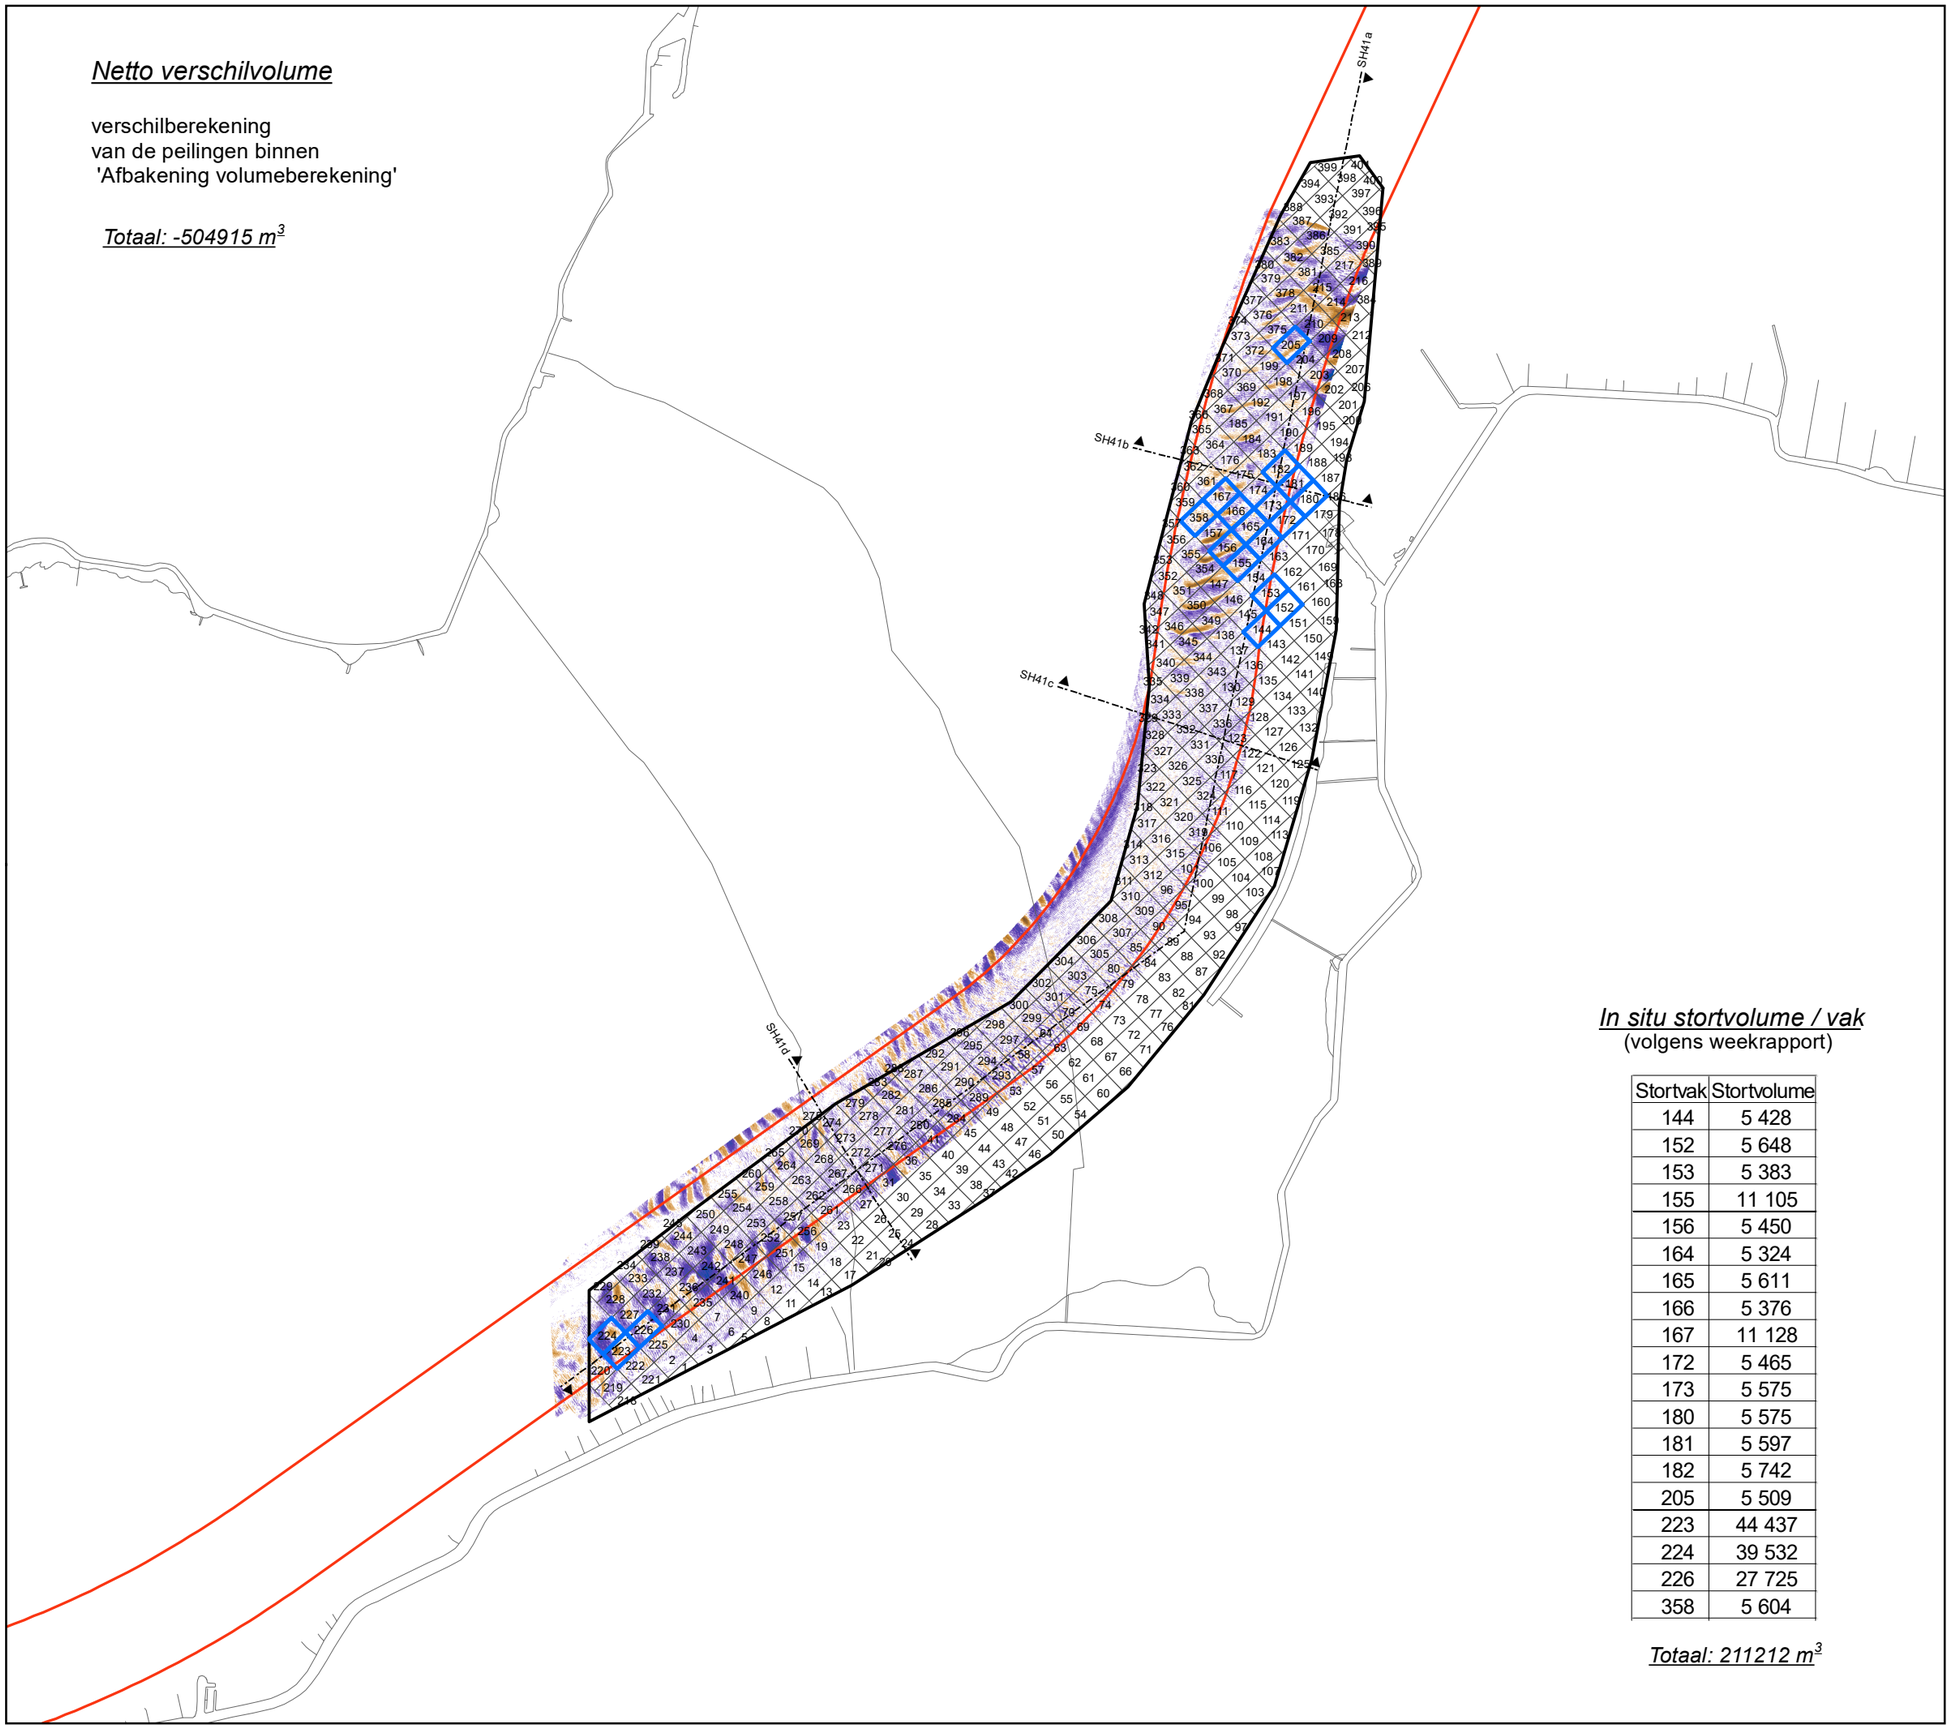

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
144	5 428
152	5 648
153	5 383
155	11 105
156	5 450
164	5 324
165	5 611
166	5 376
167	11 128
172	5 465
173	5 575
180	5 575
181	5 597
182	5 742
205	5 509
223	44 437
224	39 532
226	27 725
358	5 604

Totaal: 211212 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH41

17/09/2025 (T7) - 13/11/2025 (T8)

11640_SH41_VT8-T7
Rapport nr. 26.015



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken


verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N
W E
S

0 500 1000 1500 2000 m

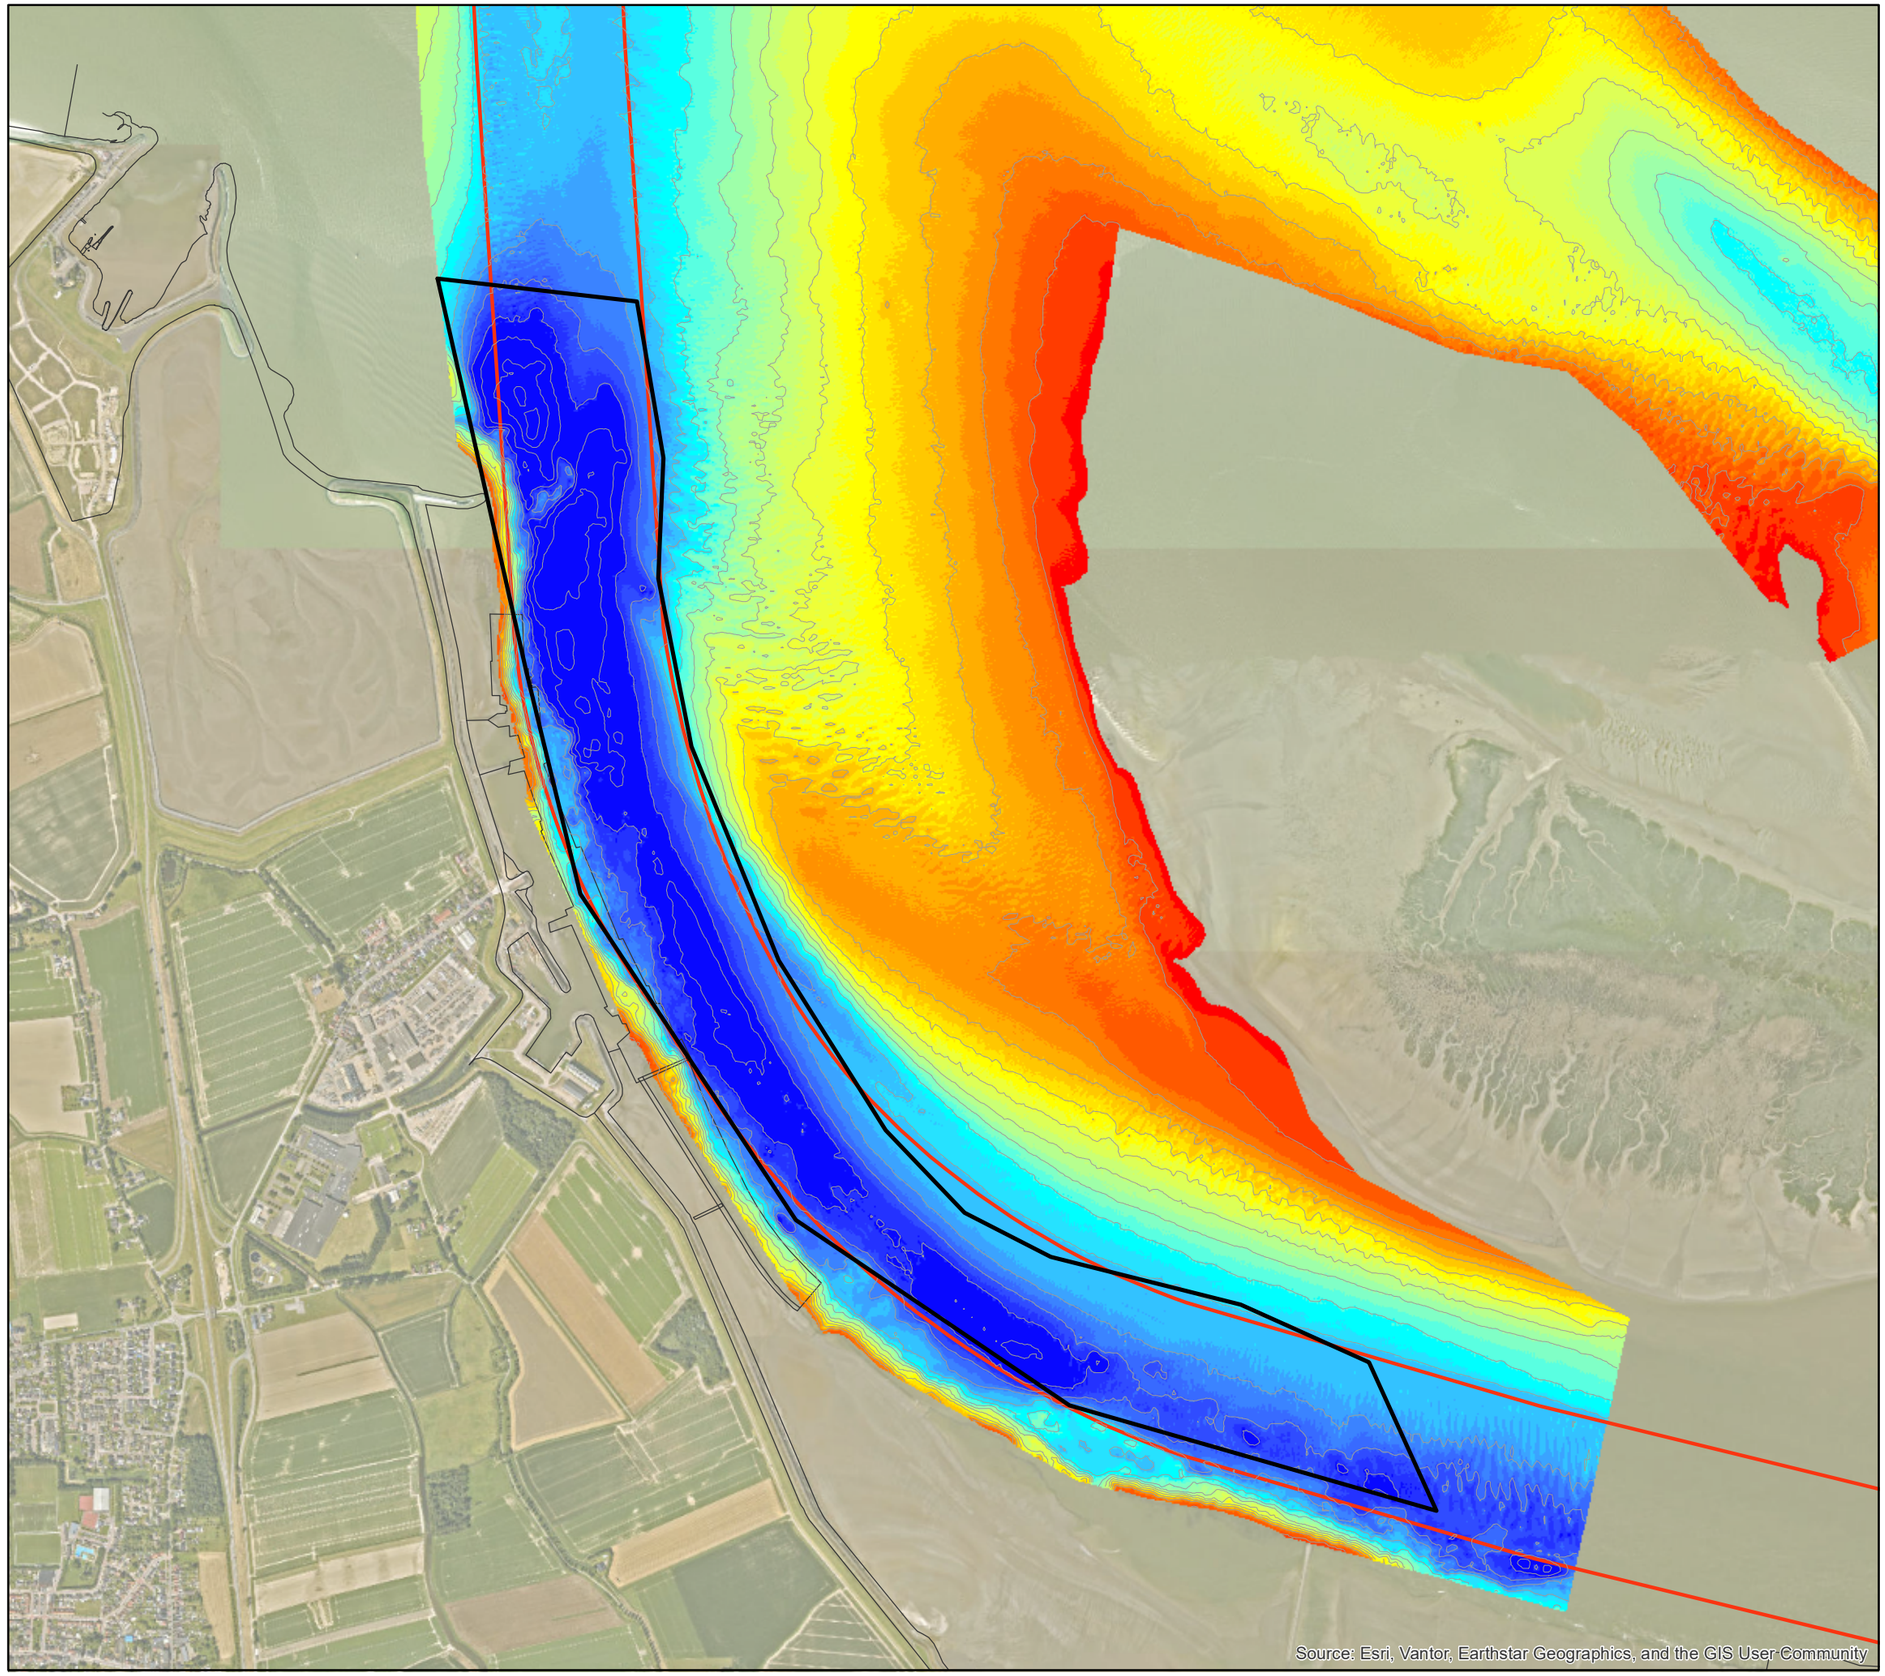

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SH51


30/09/2025 (T6)


11640_SH51_BT6
Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

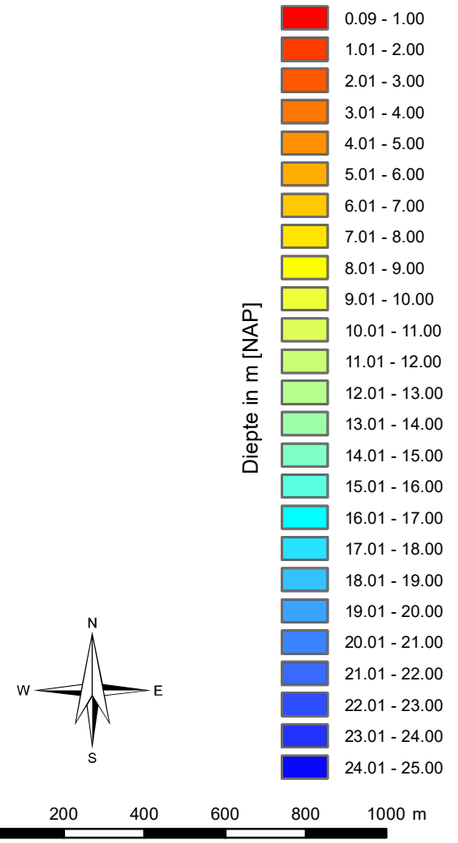

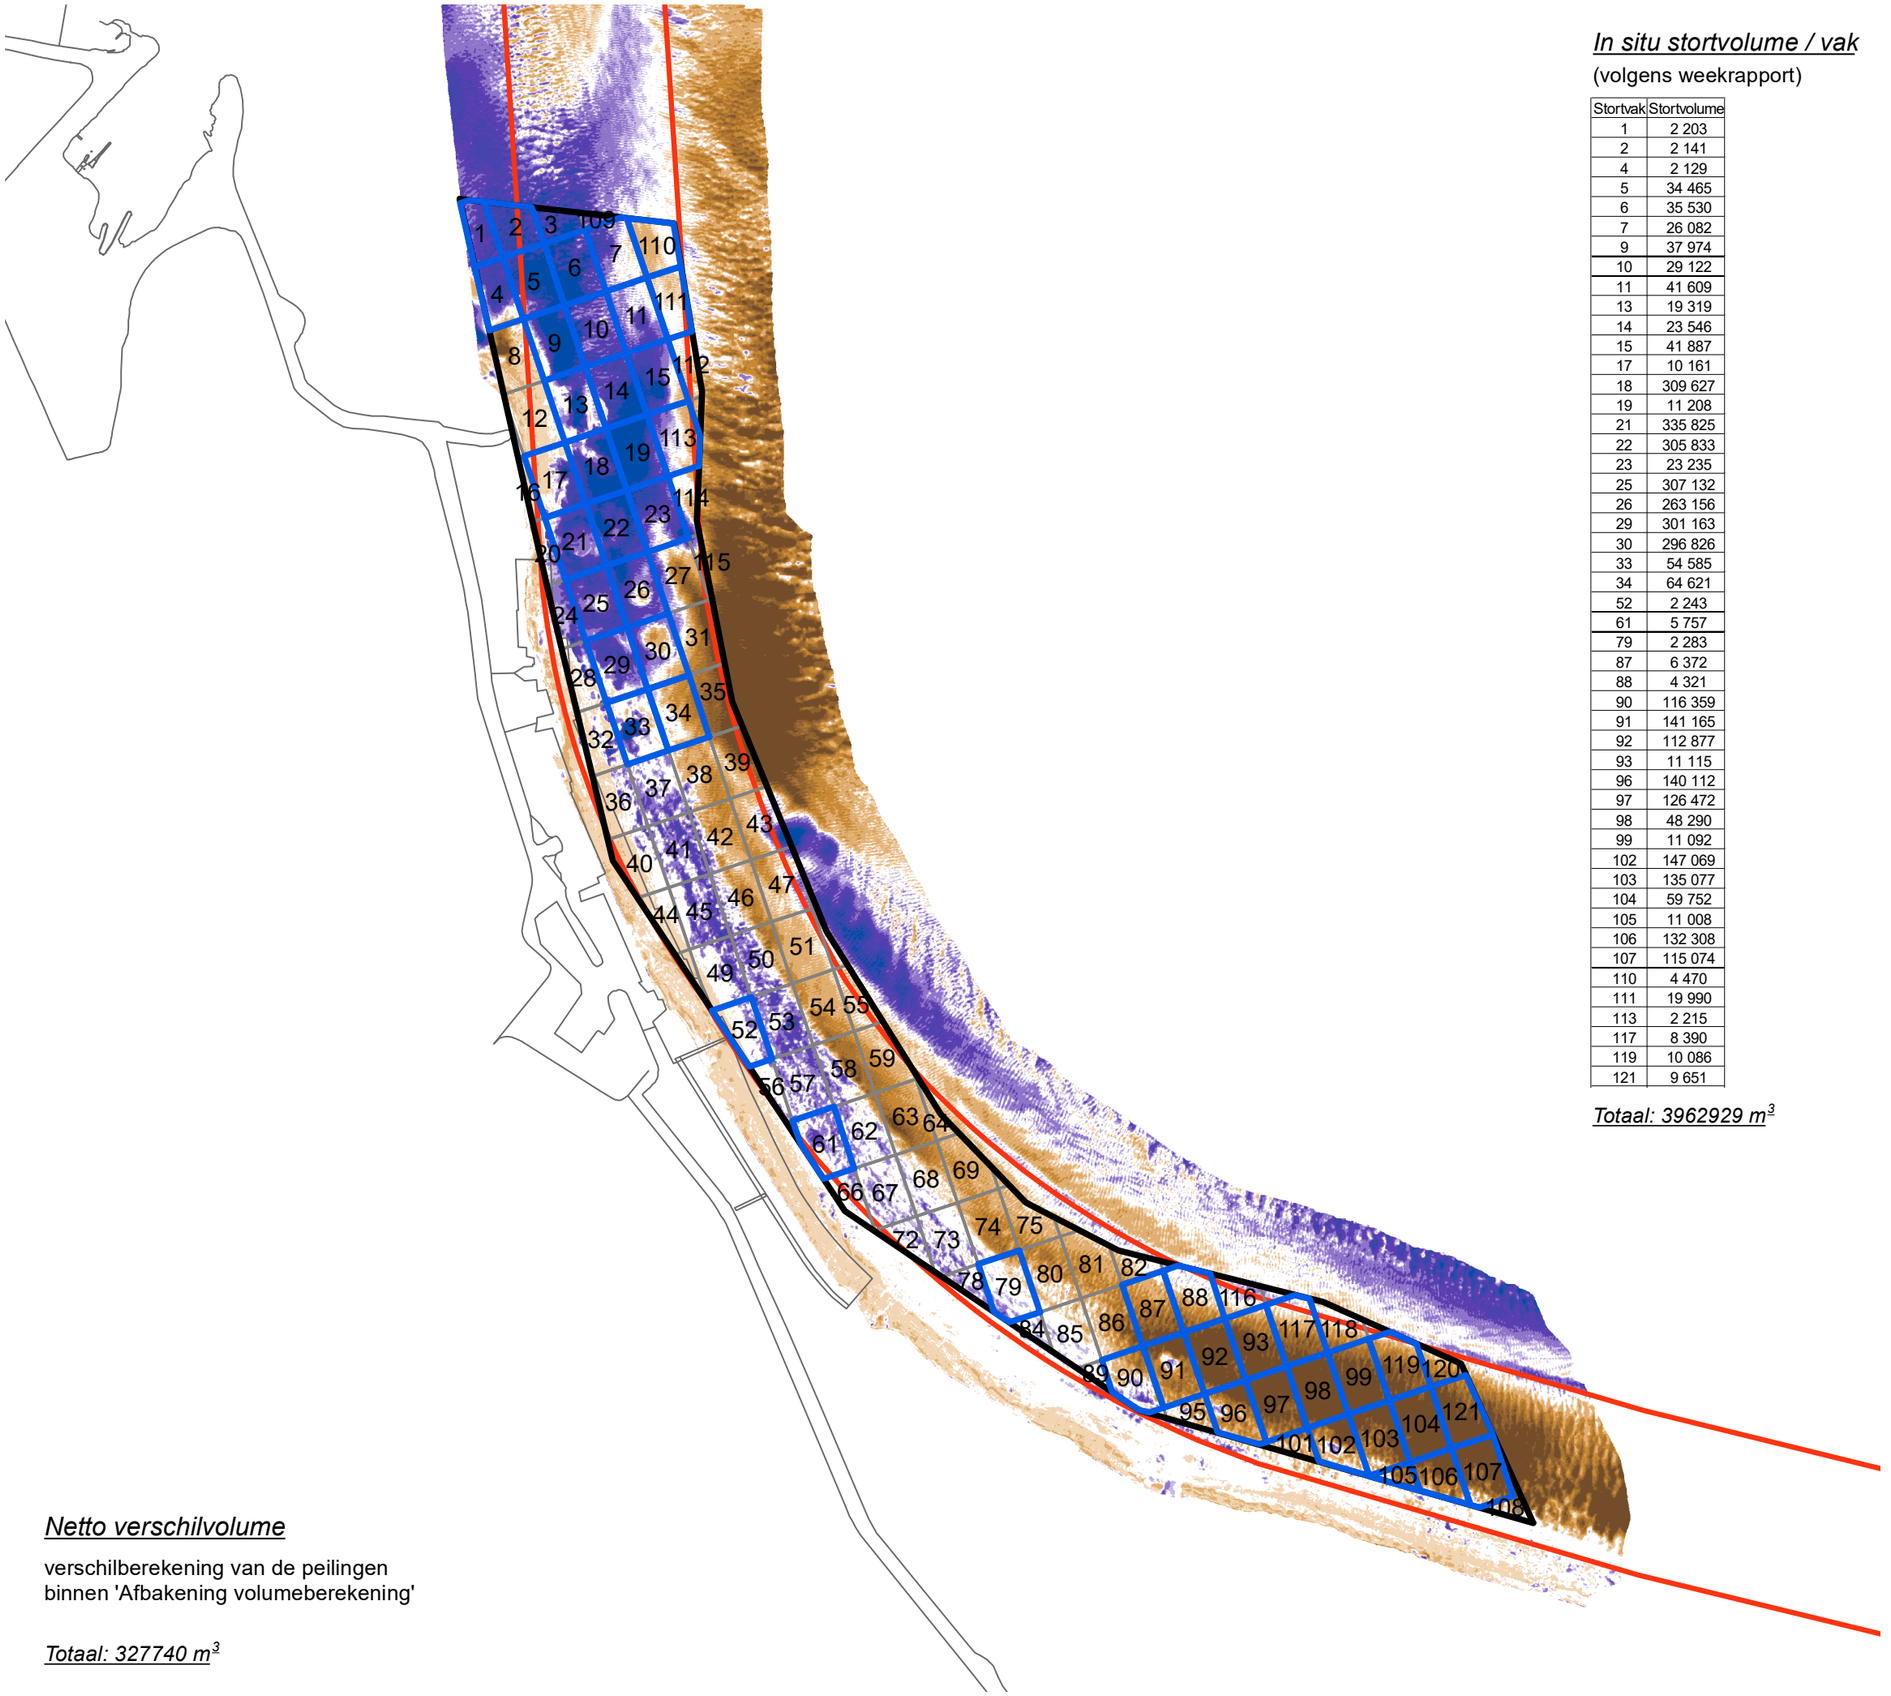

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
1	2 203
2	2 141
4	2 129
5	34 465
6	35 530
7	26 082
9	37 974
10	29 122
11	41 609
13	19 319
14	23 546
15	41 887
17	10 161
18	309 627
19	11 208
21	335 825
22	305 833
23	23 235
25	307 132
26	263 156
29	301 163
30	296 826
33	54 585
34	64 621
52	2 243
61	5 757
79	2 283
87	6 372
88	4 321
90	116 359
91	141 165
92	112 877
93	11 115
96	140 112
97	126 472
98	48 290
99	11 092
102	147 069
103	135 077
104	59 752
105	11 008
106	132 308
107	115 074
110	4 470
111	19 990
113	2 215
117	8 390
119	10 086
121	9 651

Totaal: 3962929 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 327740 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH51

22/07/2022 (T0) - 30/09/2025 (T6)

11640_SH51_VT6-T0
Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken


verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N W E S

0 300 600 900 1200

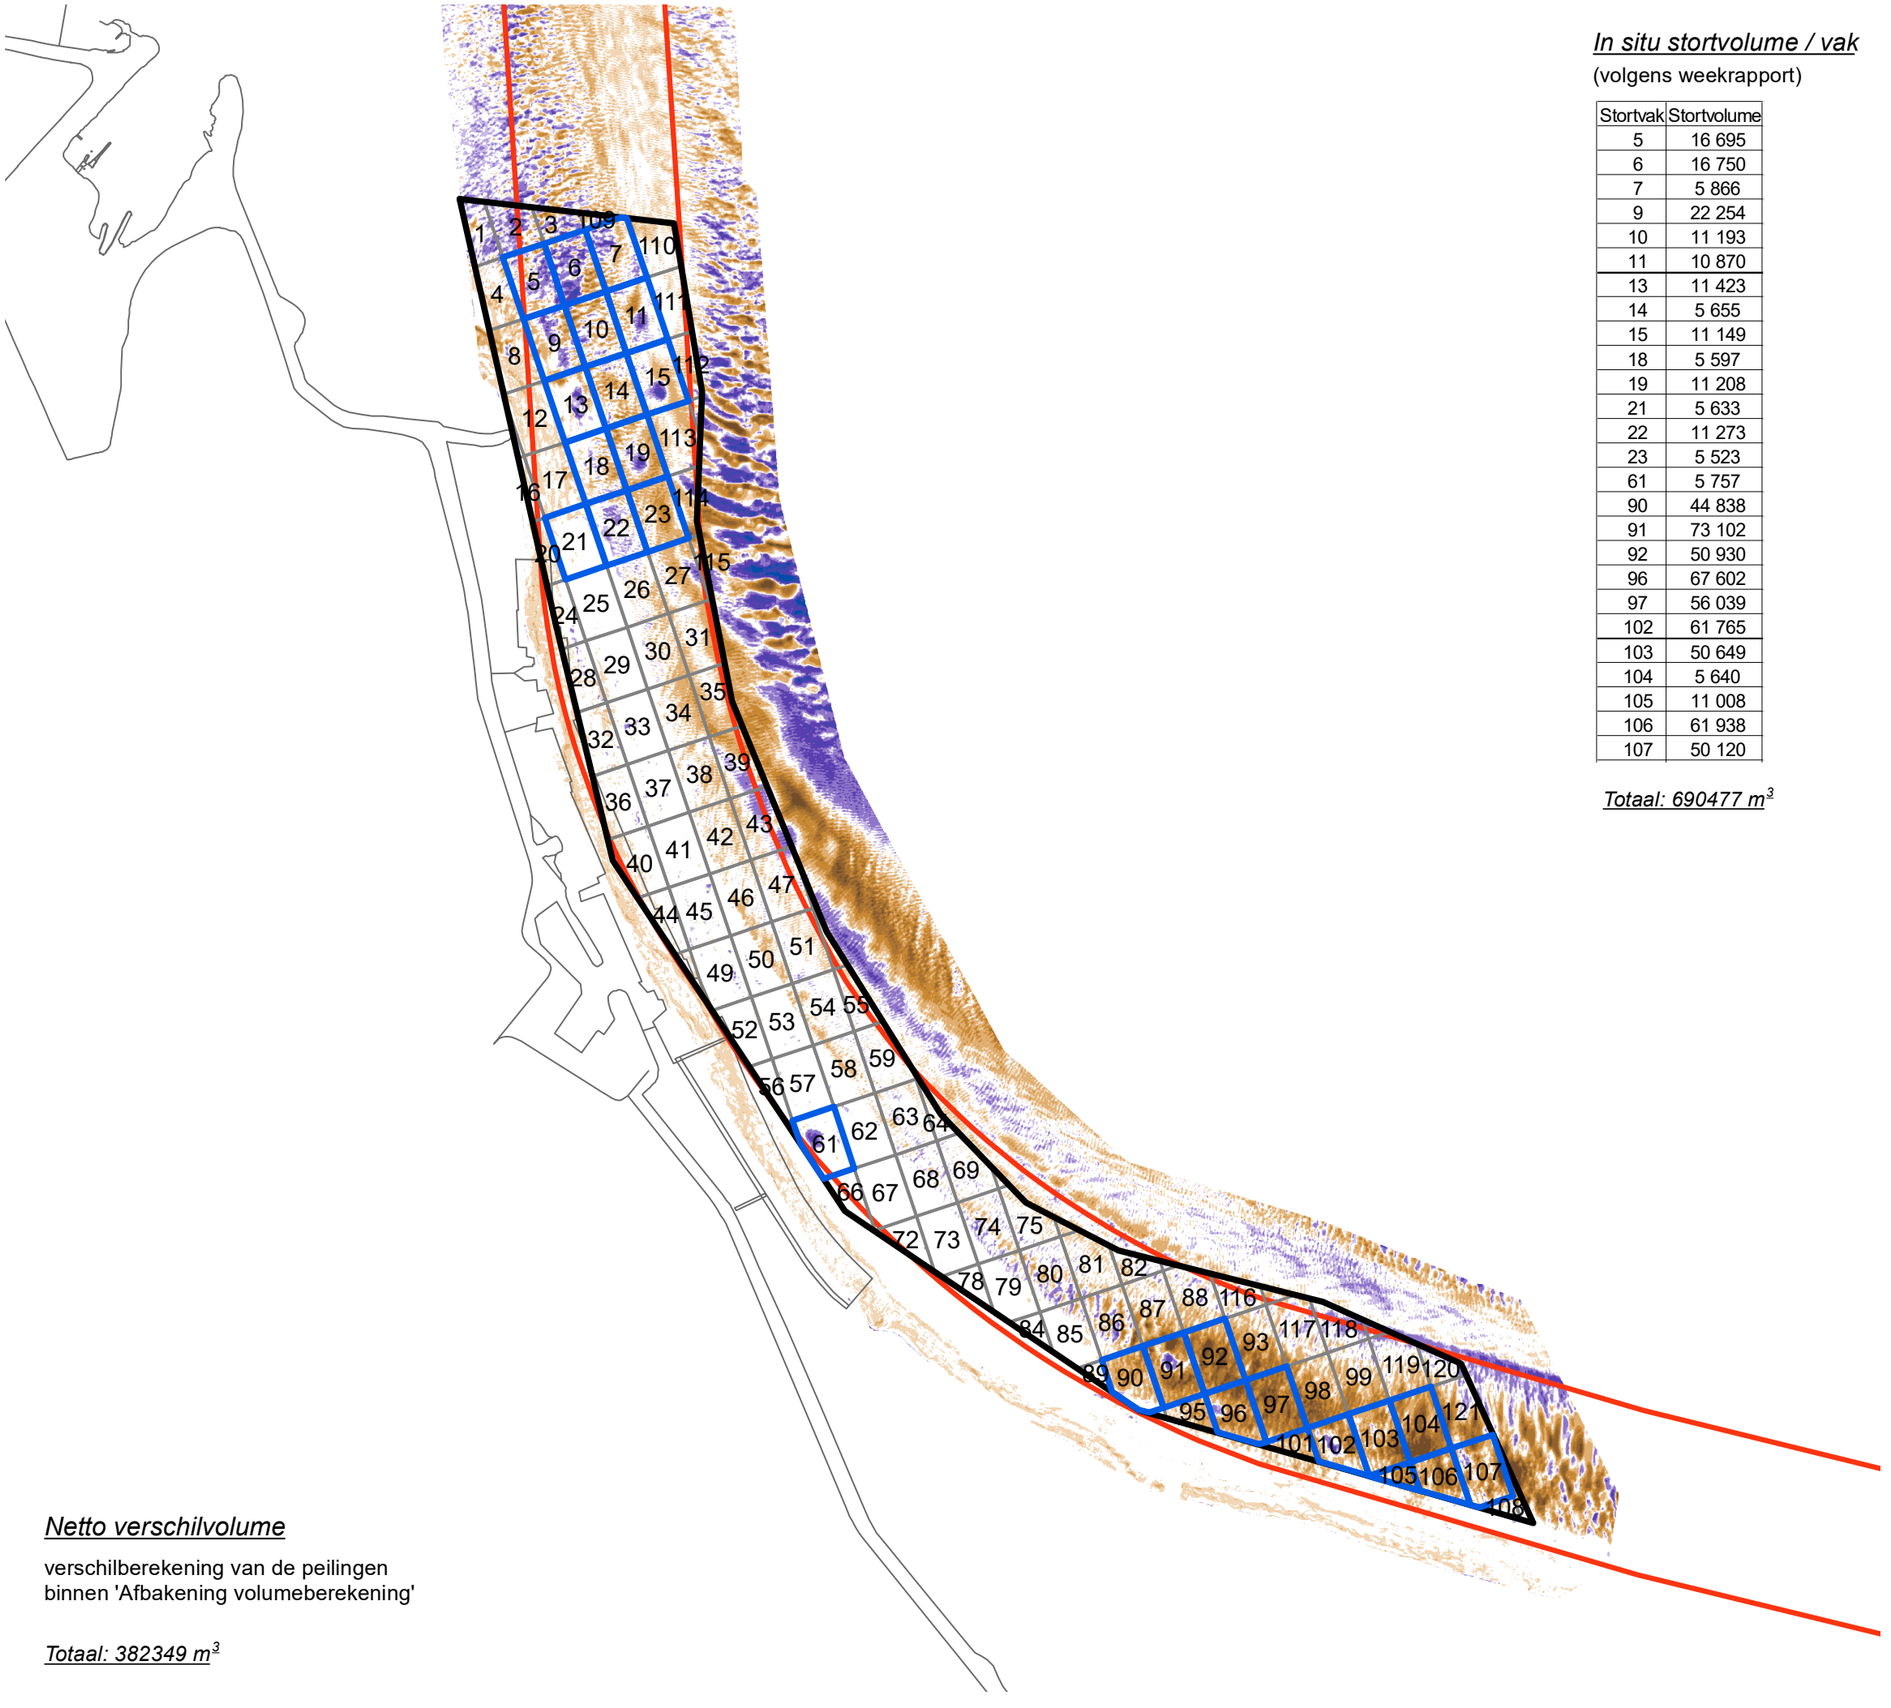

In situ stortvolume / vak

(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
5	16 695
6	16 750
7	5 866
9	22 254
10	11 193
11	10 870
13	11 423
14	5 655
15	11 149
18	5 597
19	11 208
21	5 633
22	11 273
23	5 523
61	5 757
90	44 838
91	73 102
92	50 930
96	67 602
97	56 039
102	61 765
103	50 649
104	5 640
105	11 008
106	61 938
107	50 120

Totaal: 690477 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening van de peilingen
binnen 'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 382349 m³

VLAAMSE OVERHEID

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH51

23/05/2025 (T5) - 30/09/2025 (T6)

11640_SH51_VT6-T5
Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50

verondieping


- -0.25 - +0.25

- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

verdieping

N
W E
S

0 300 600 900 1200

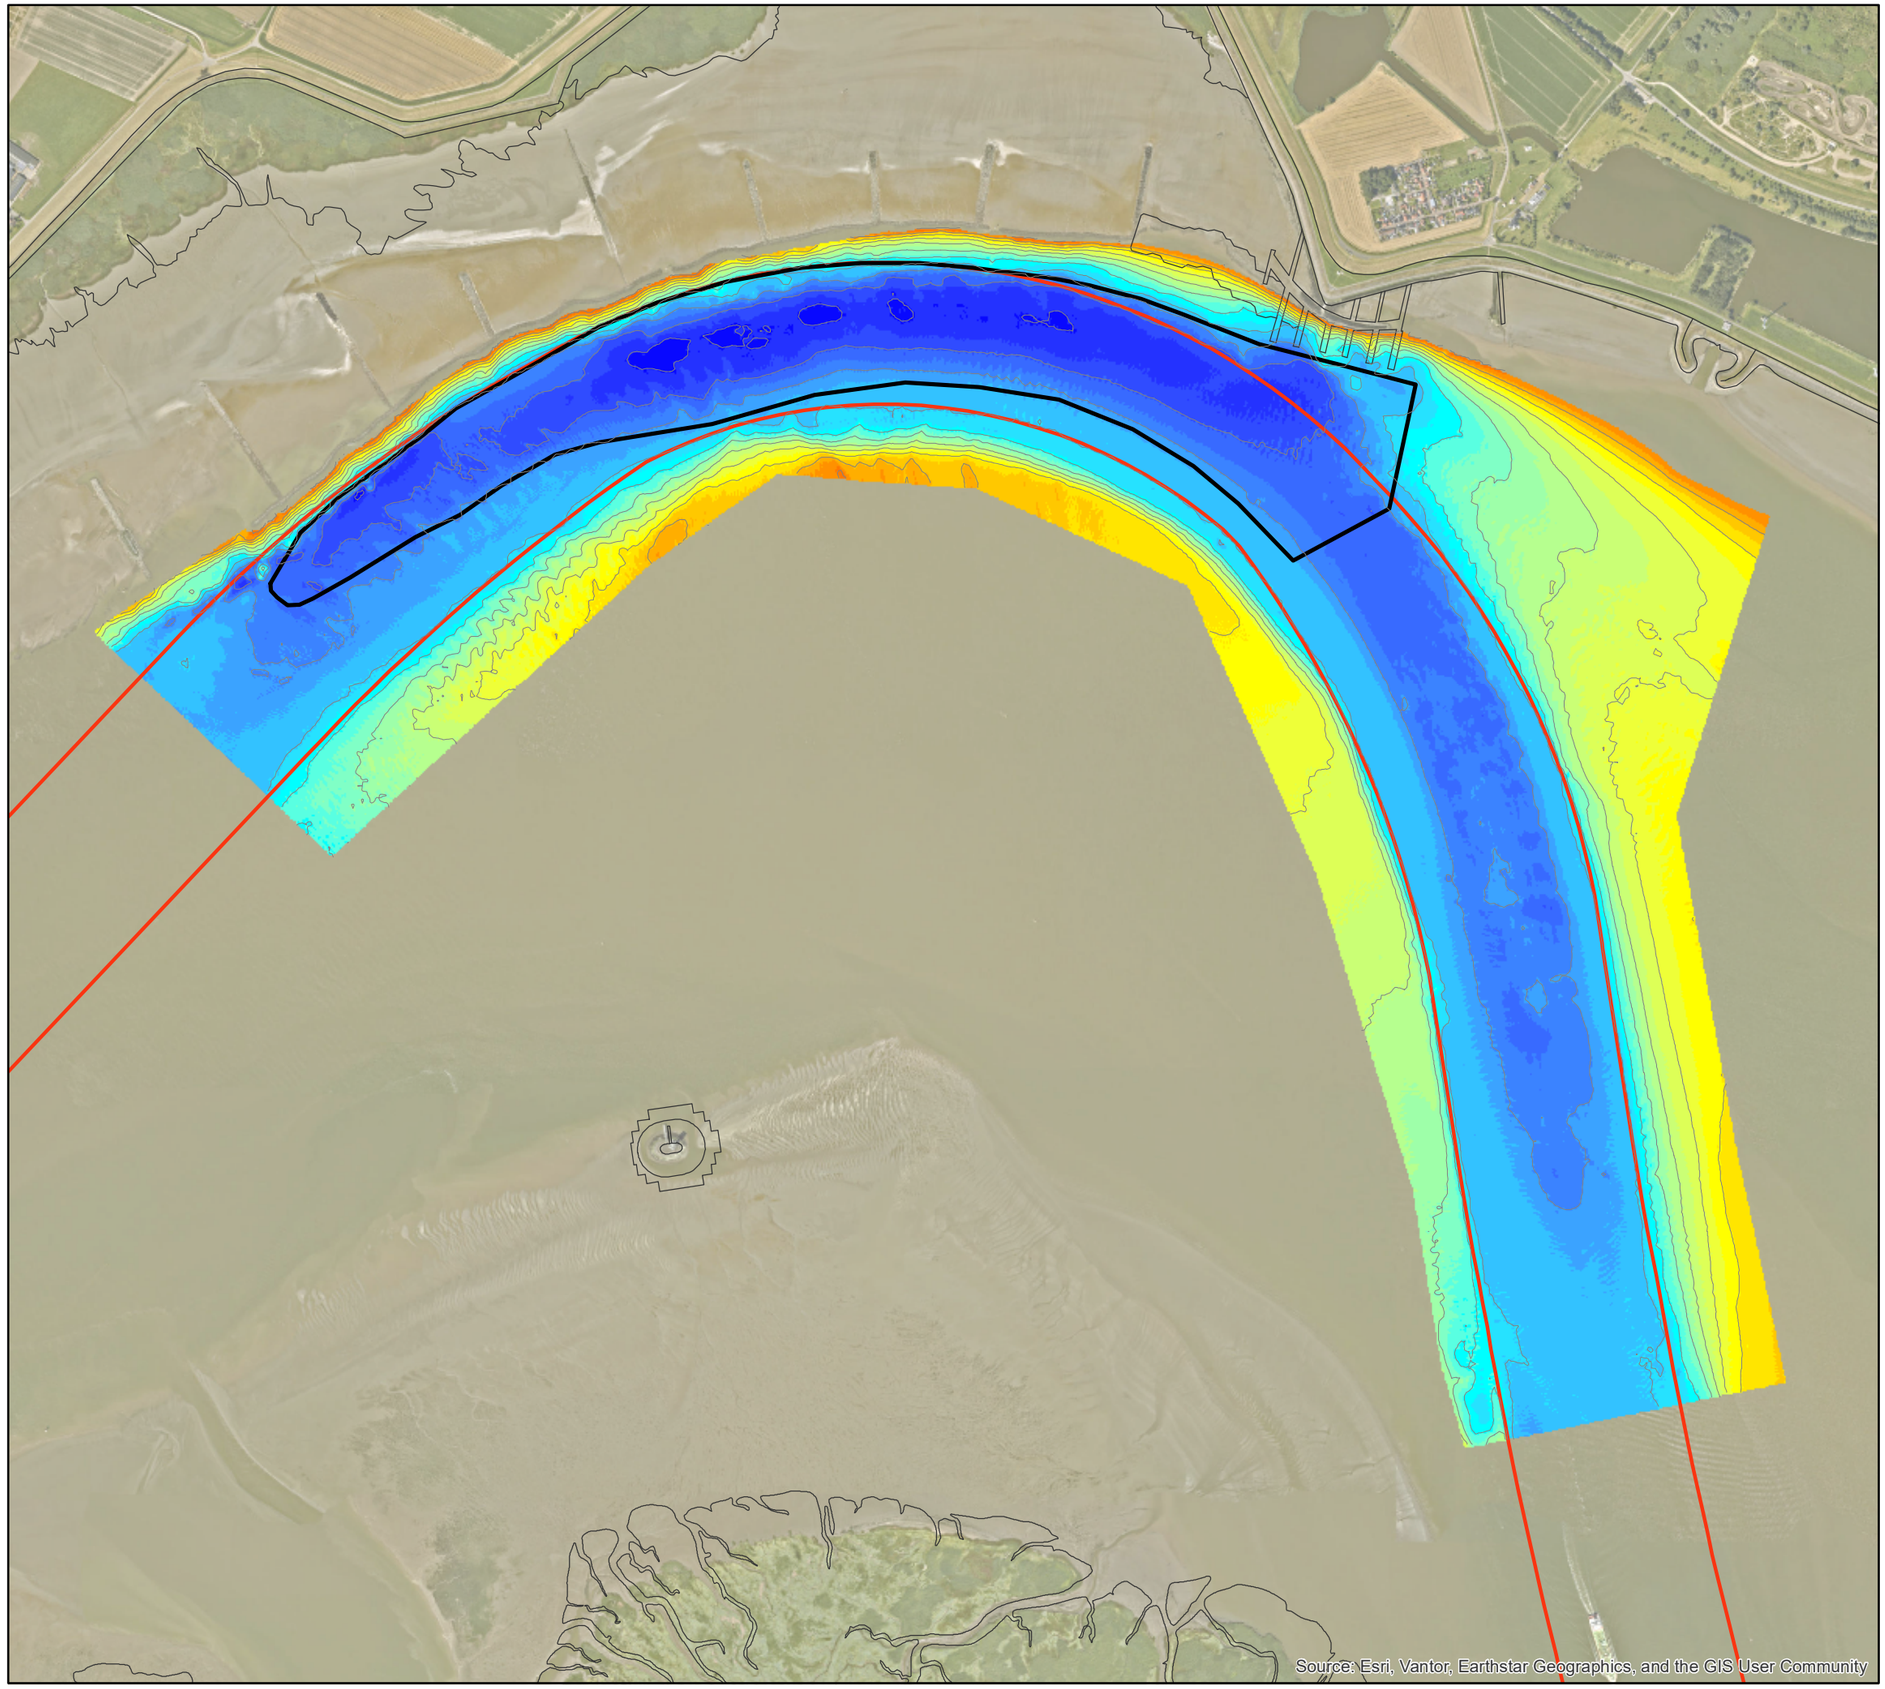

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SH61

24/09/2025 (T23)

11640_SH61_BT23
Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

Diepte in m [NAP]

- 0.09 - 1.00
- 1.01 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00

N
W E
S

0 150 300 450 600

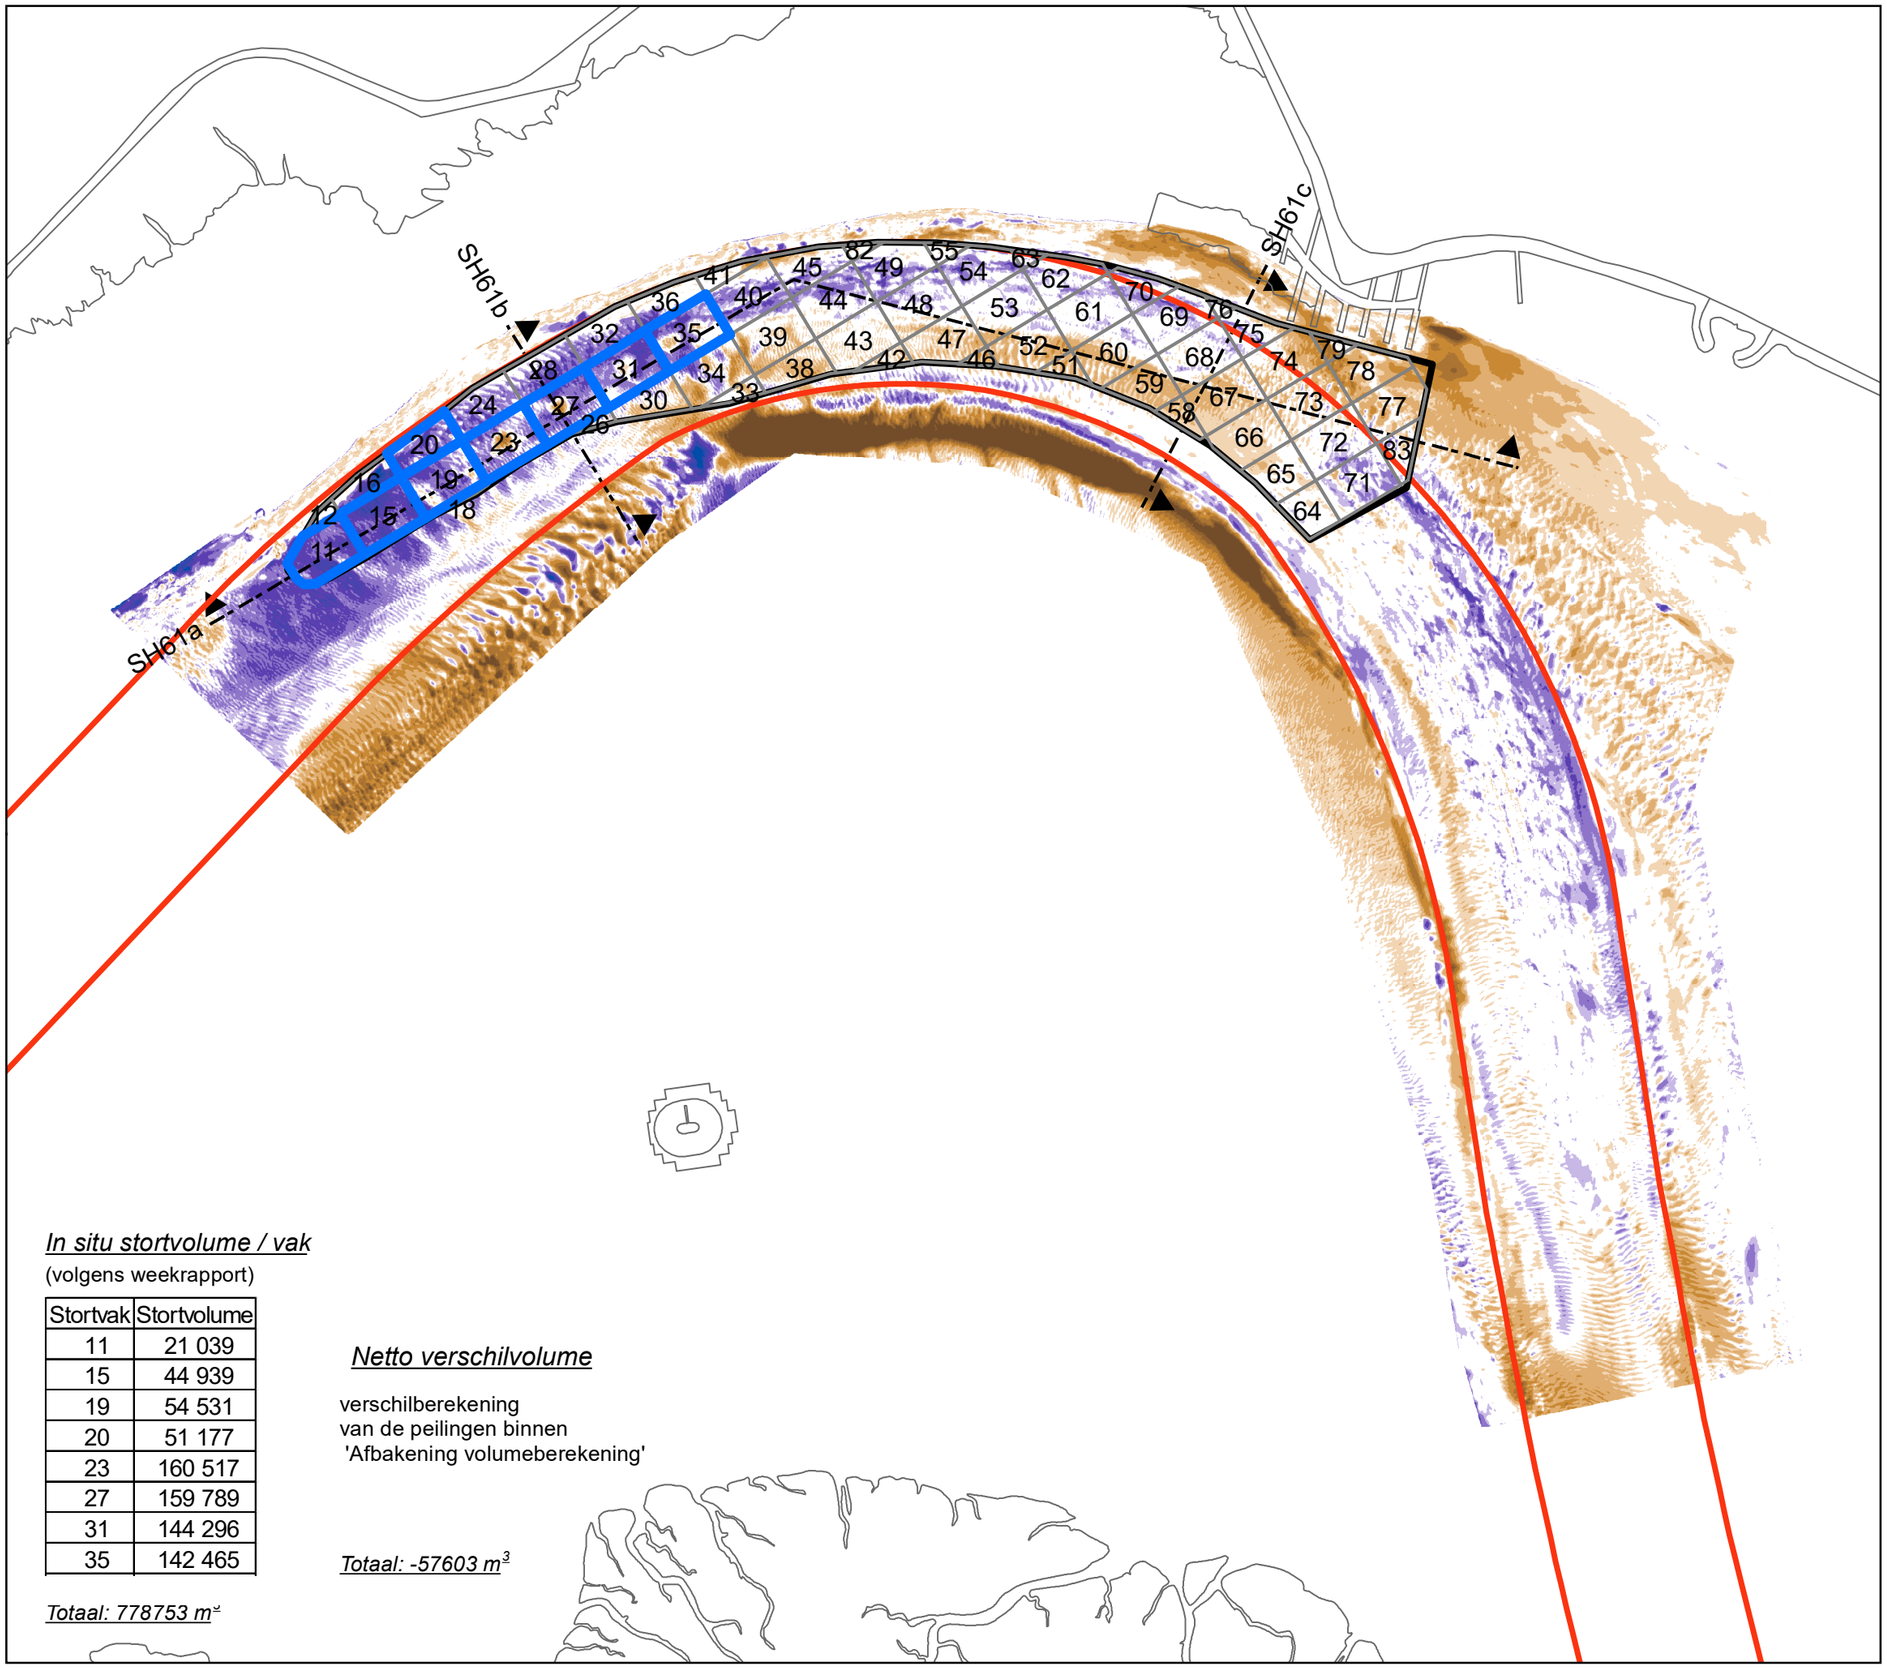

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
11	21 039
15	44 939
19	54 531
20	51 177
23	160 517
27	159 789
31	144 296
35	142 465

Totaal: 778753 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -57603 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH61

08/03/2021 (T0) - 24/09/2025 (T23)

11640_SH61_VT23-T0
Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	verdieping
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W
E
S

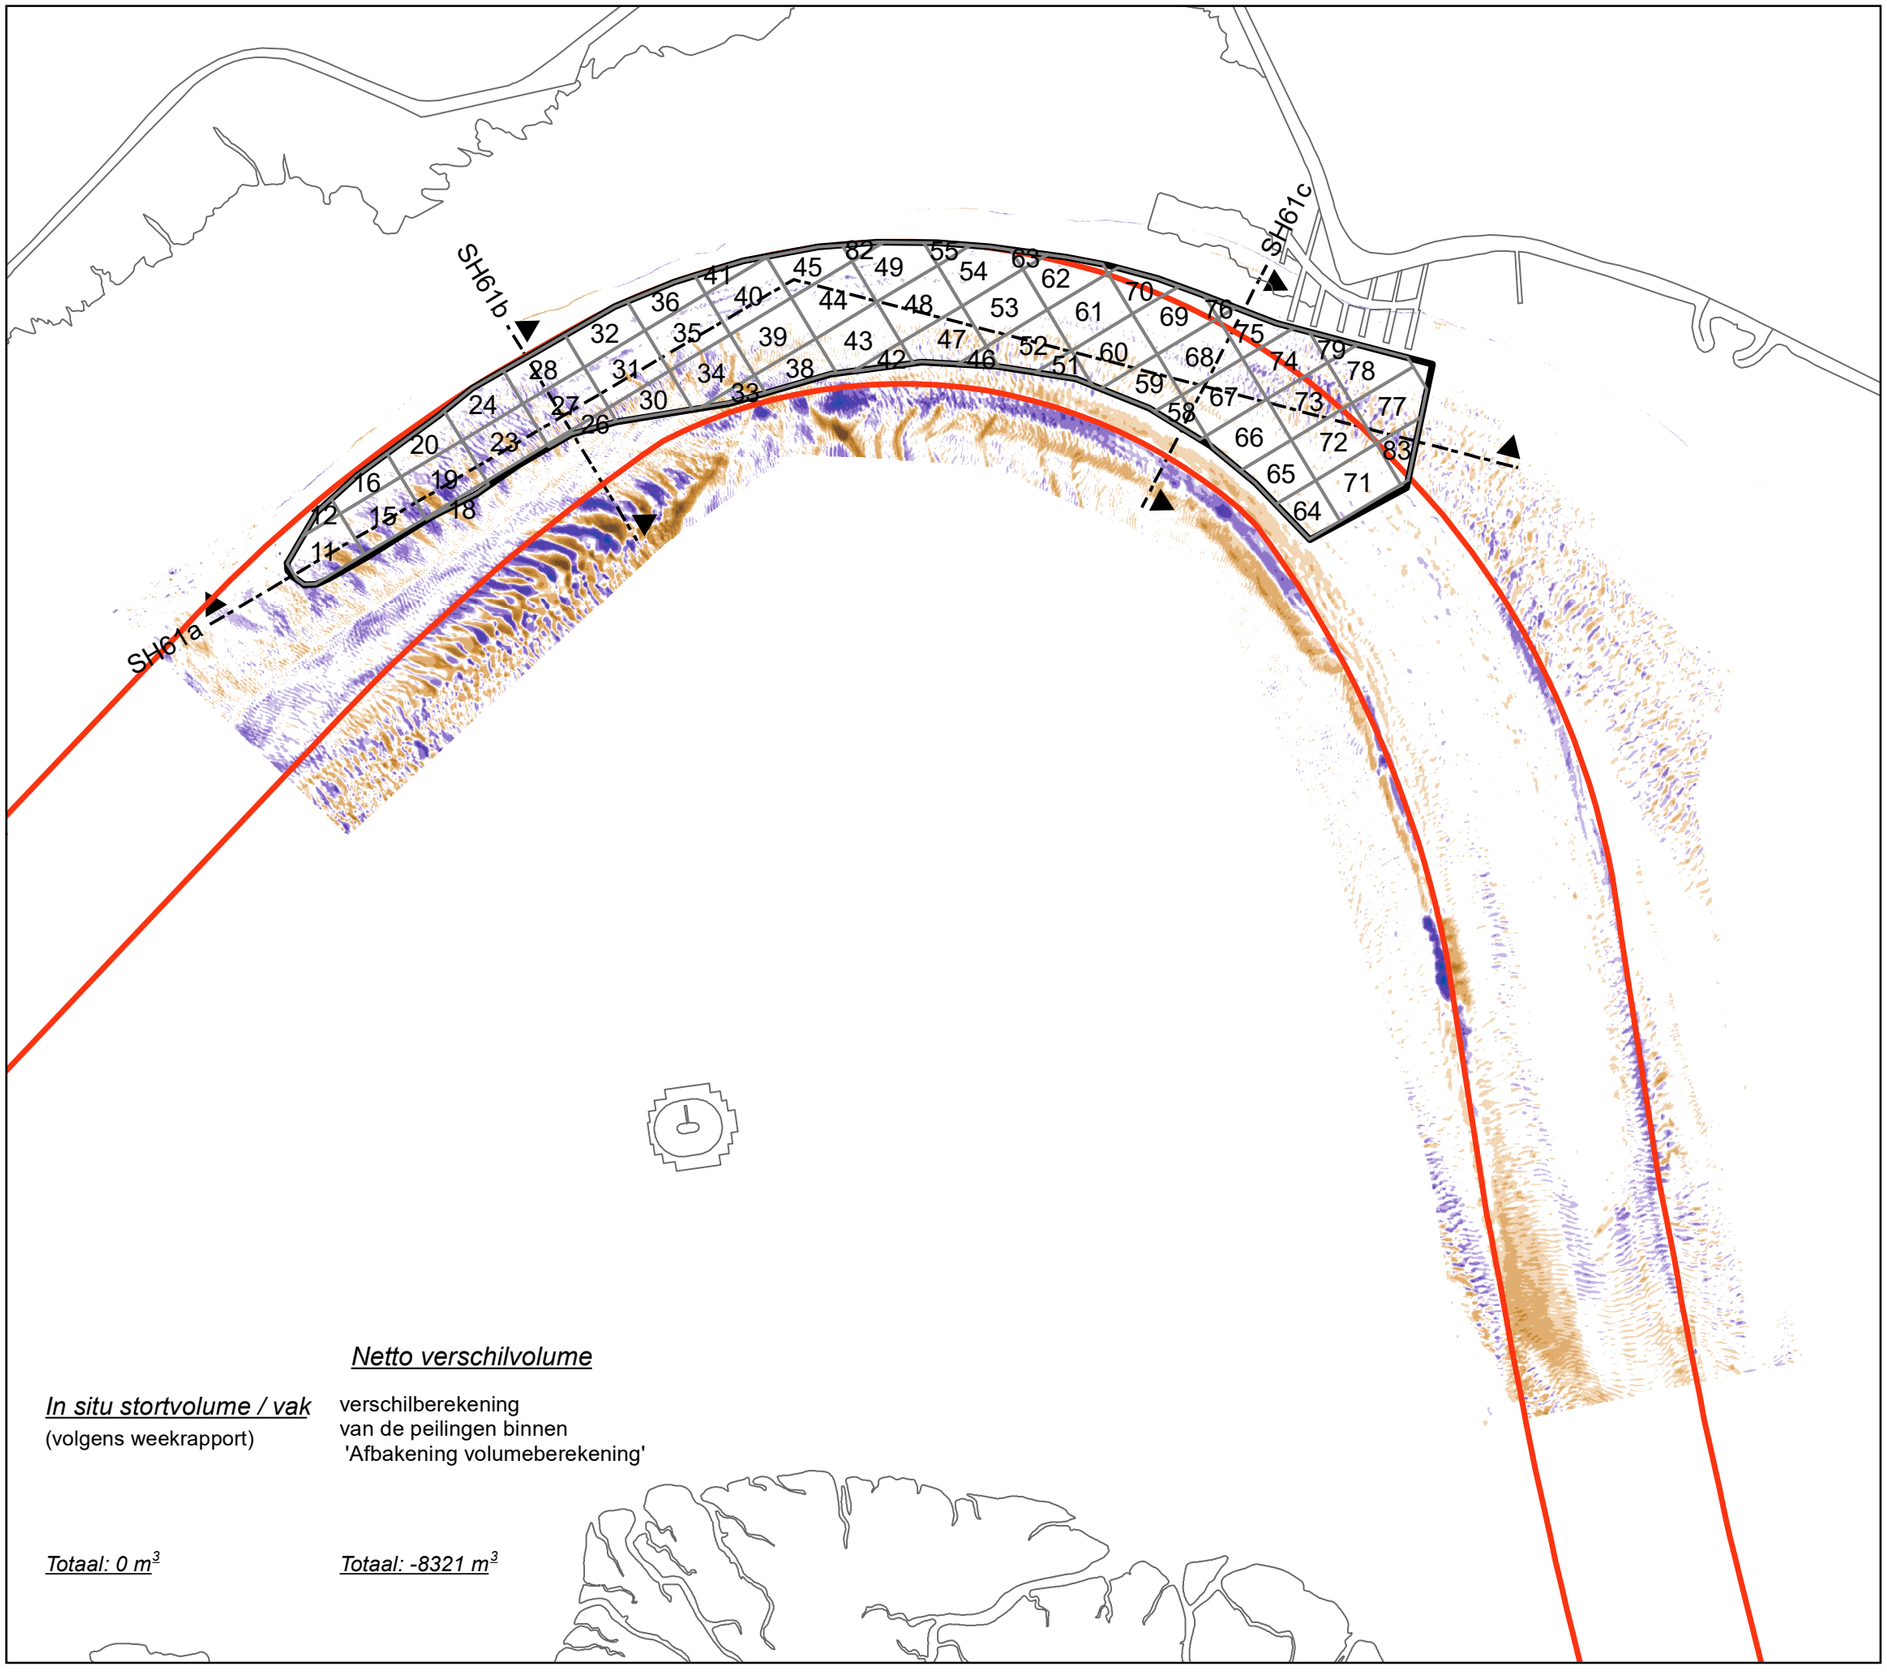

Netto verschilvolume

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 0 m³

Totaal: -8321 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH61

02/06/2025 (T22) - 24/09/2025 (T23)

11640_SH61_VT23-T22
Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	verdieping
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W
E
S

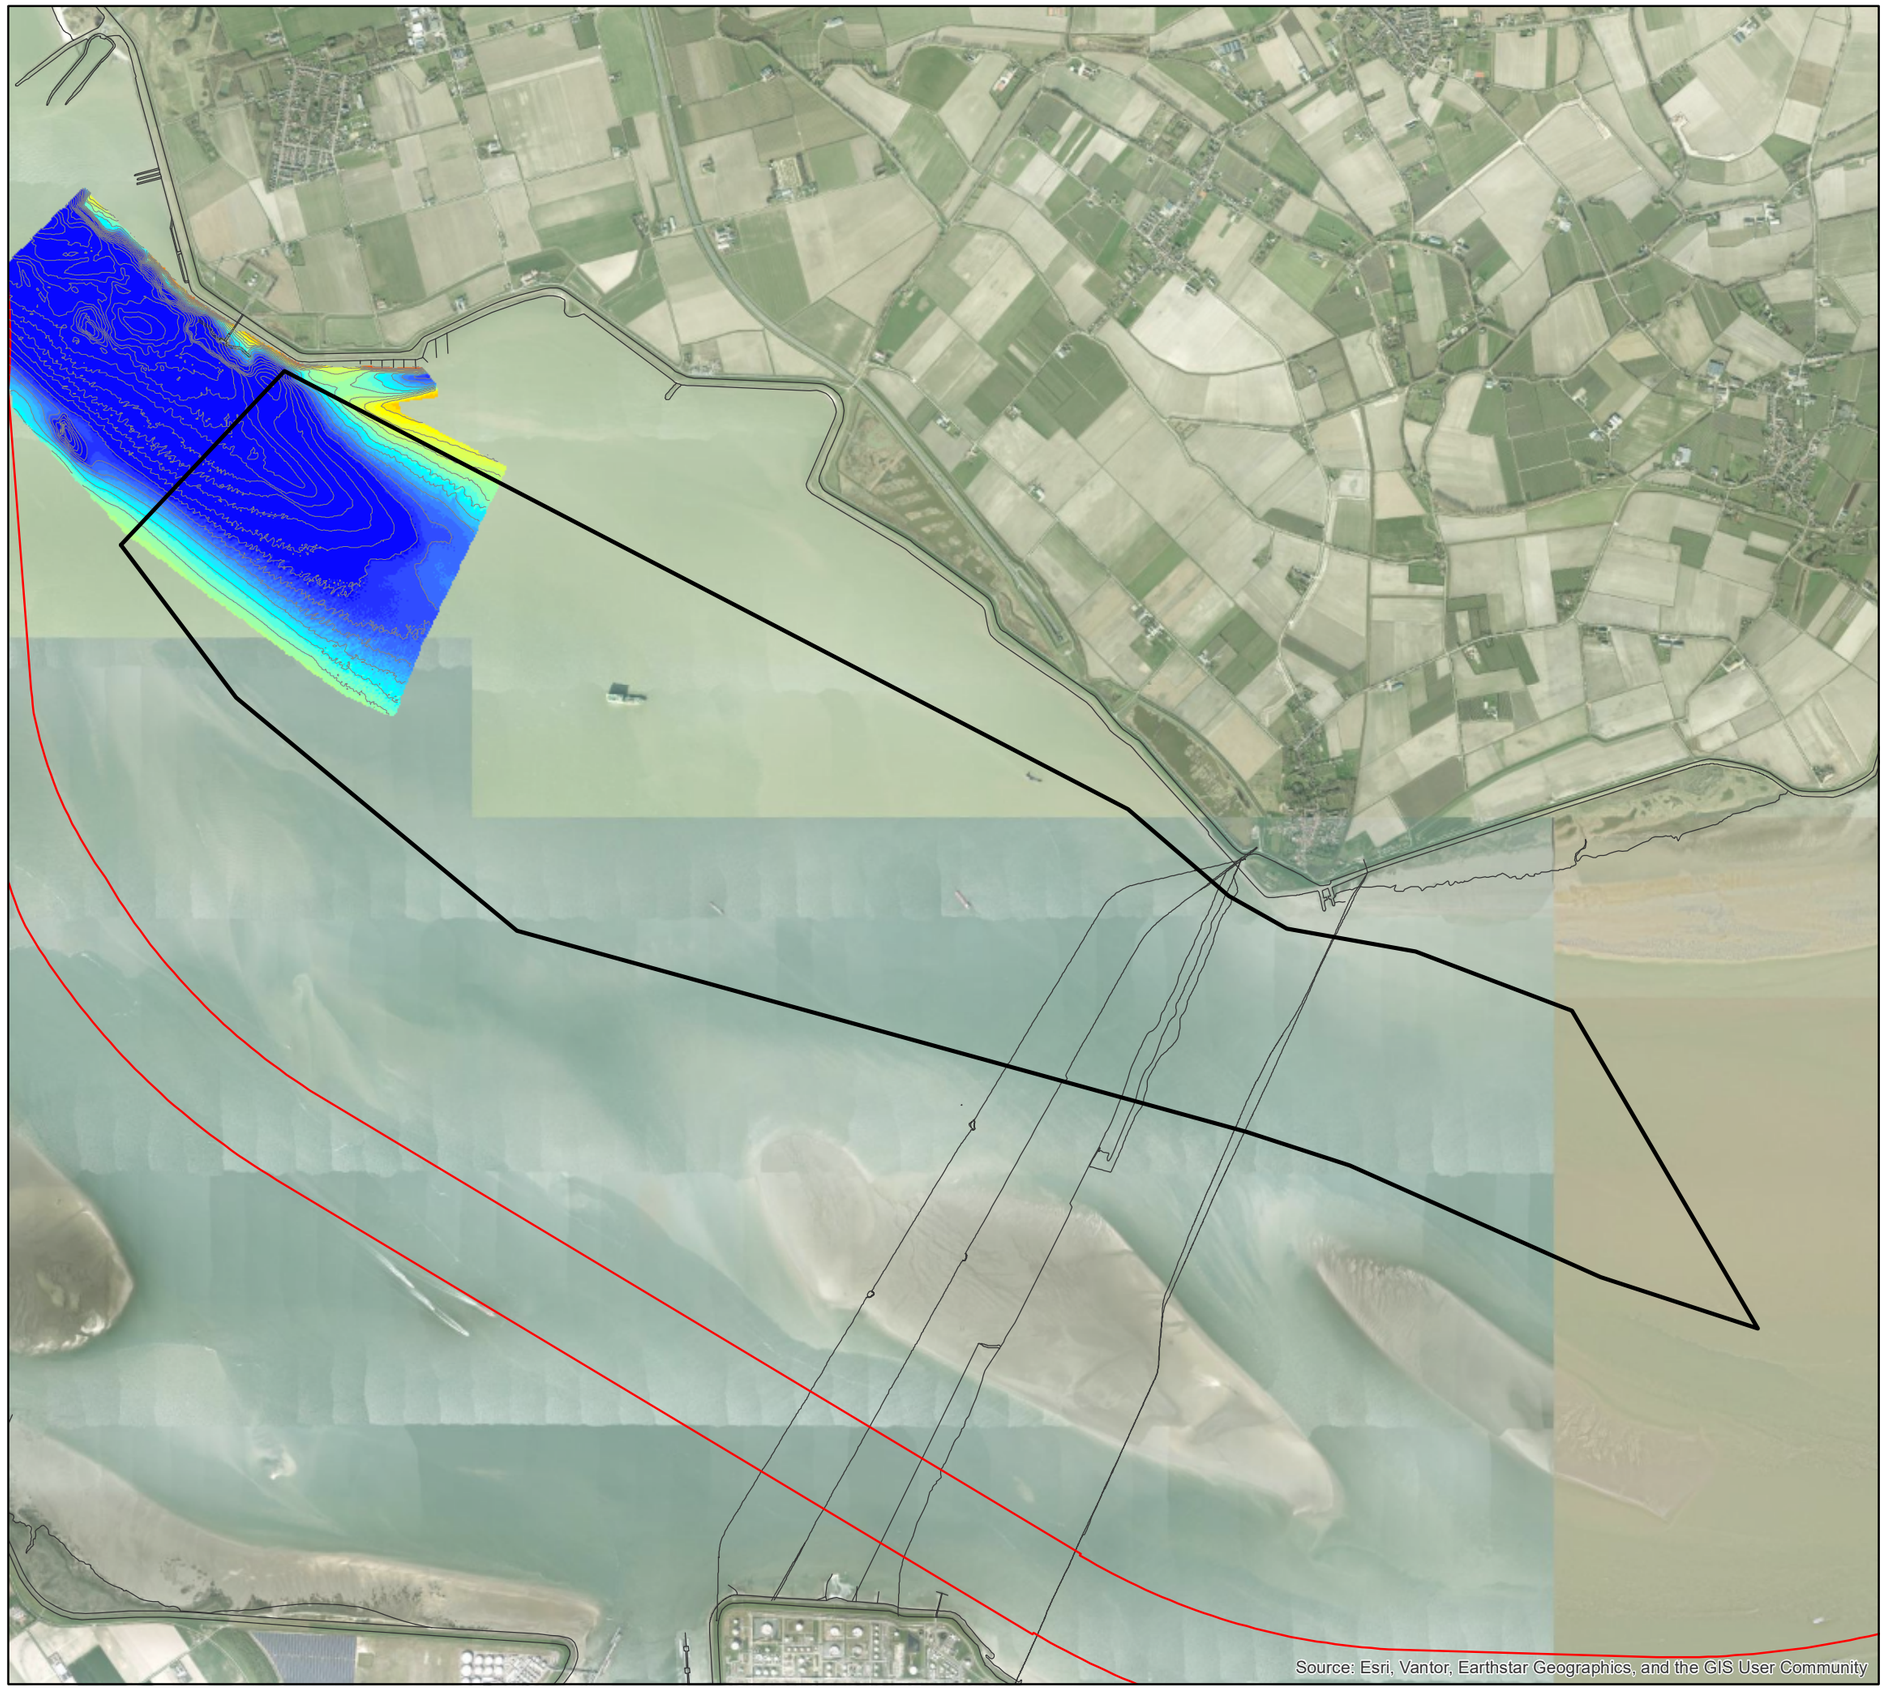

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SN31

07/10/2025 (T7)

11640_SN31_BT7
Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

Diepte in m [NAP]

- 0.09 - 1.00
- 1.01 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00

N
W E
S

0 200 400 600 800 1000 m

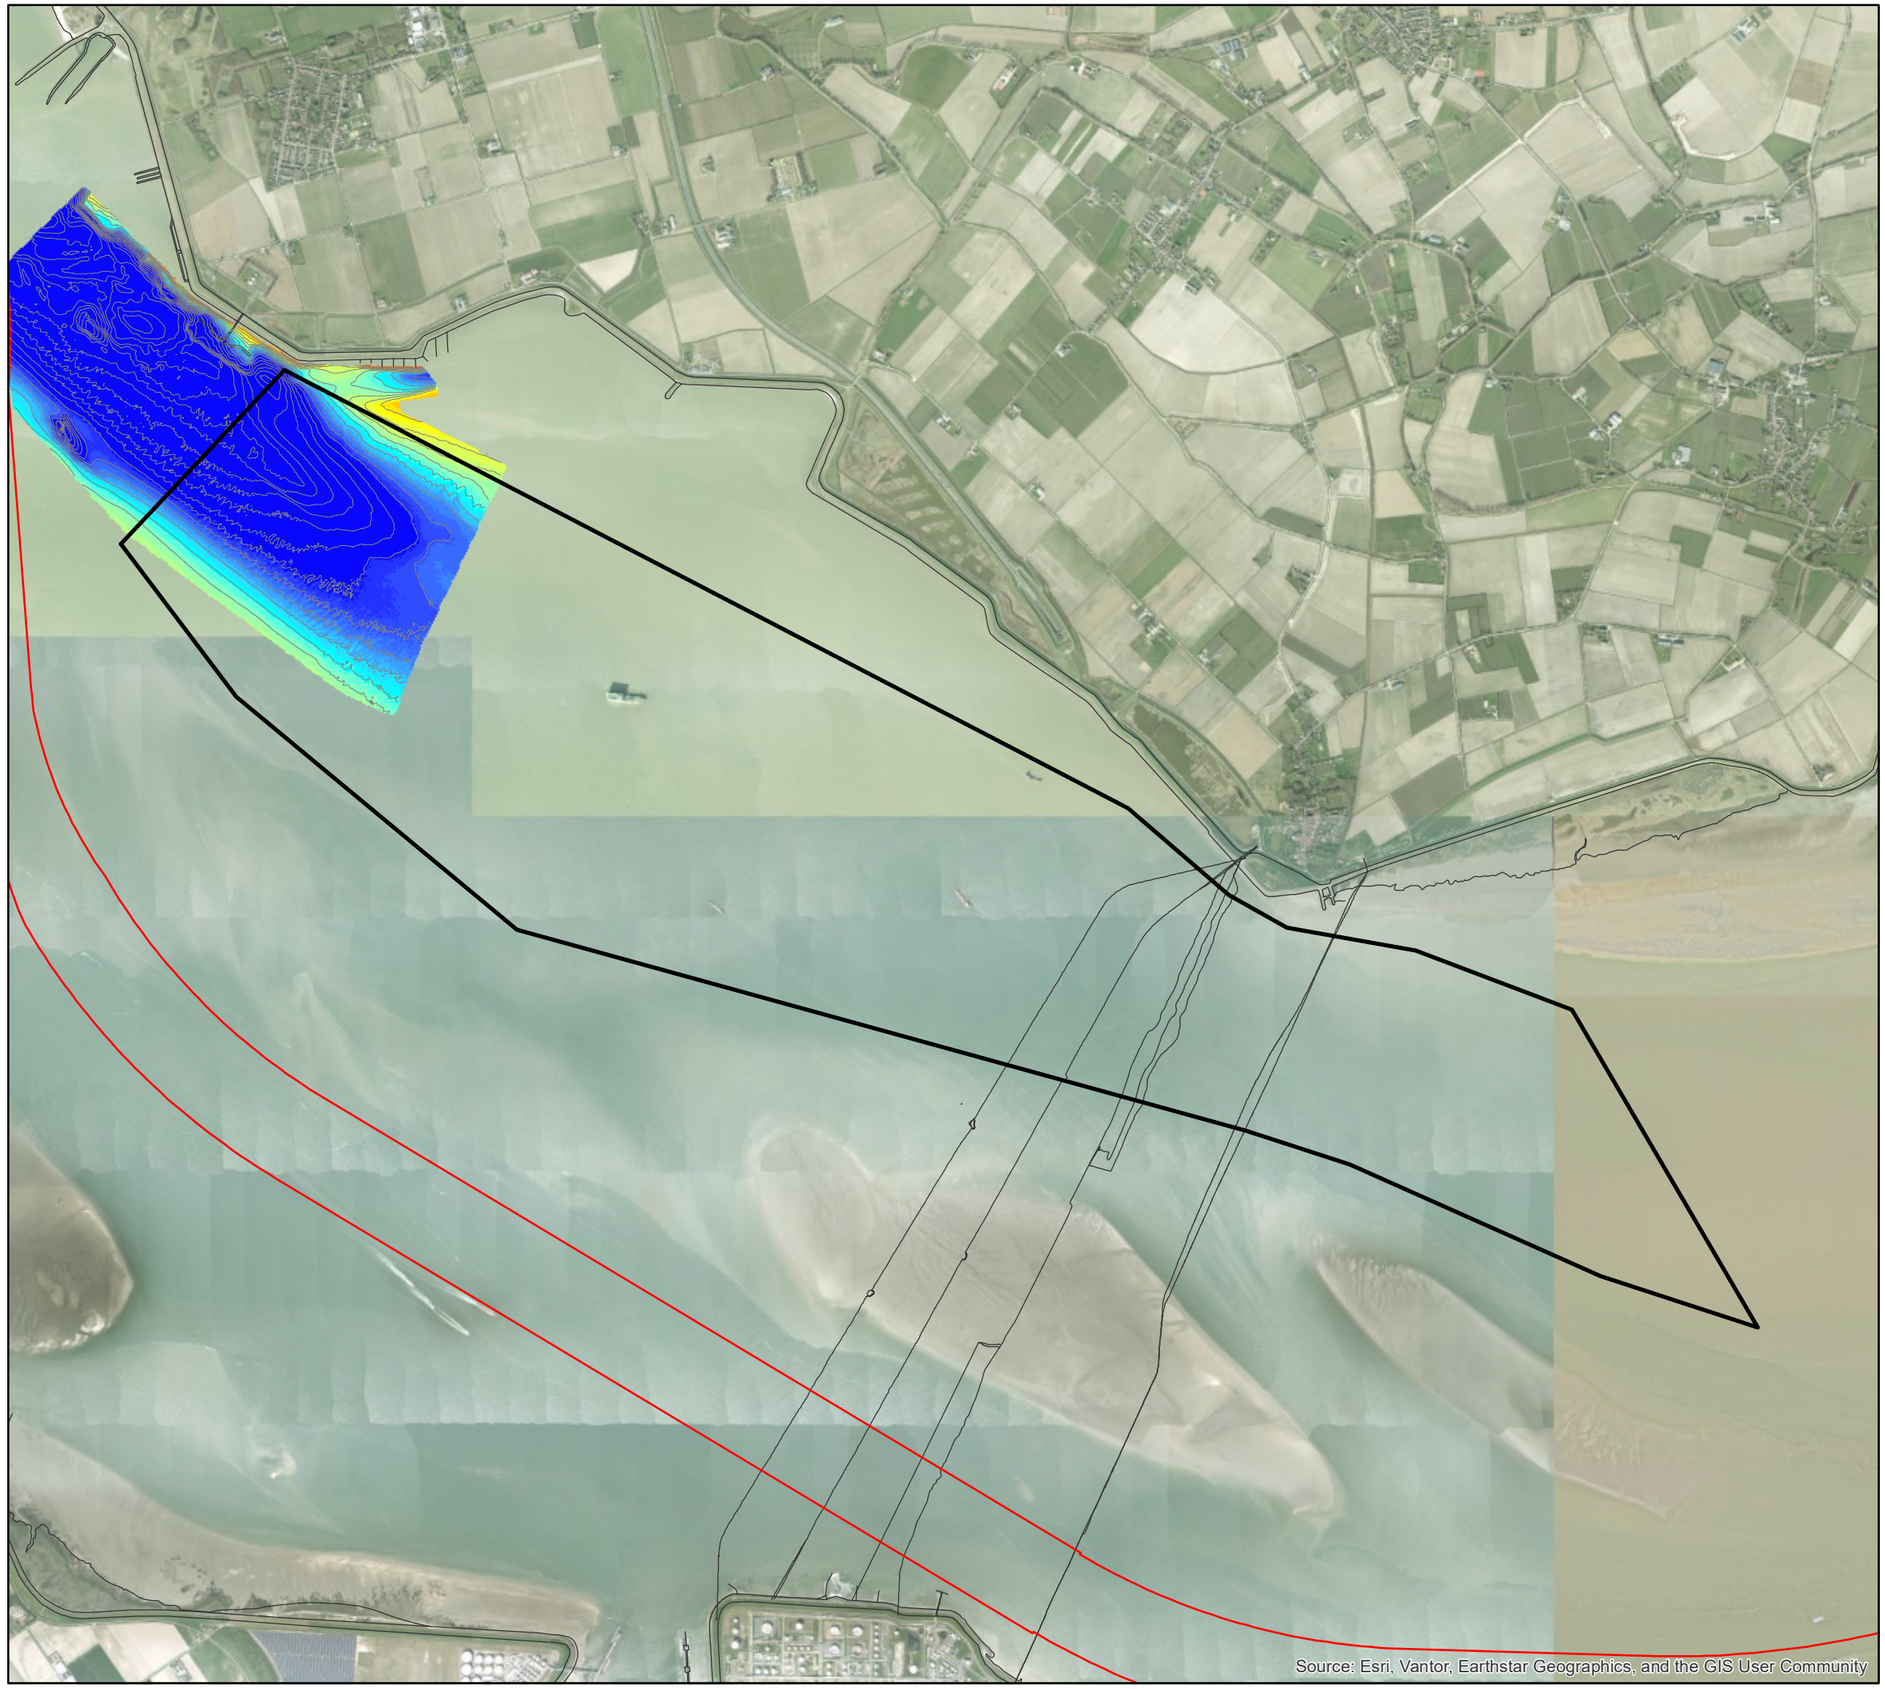

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SN31

05/11/2025 (T8)

11640_SN31_BT8
Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be


Legende

Diepte in m [NAP]

- 0.09 - 1.00
- 1.01 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00

N
W E
S

0 200 400 600 800 1000 m

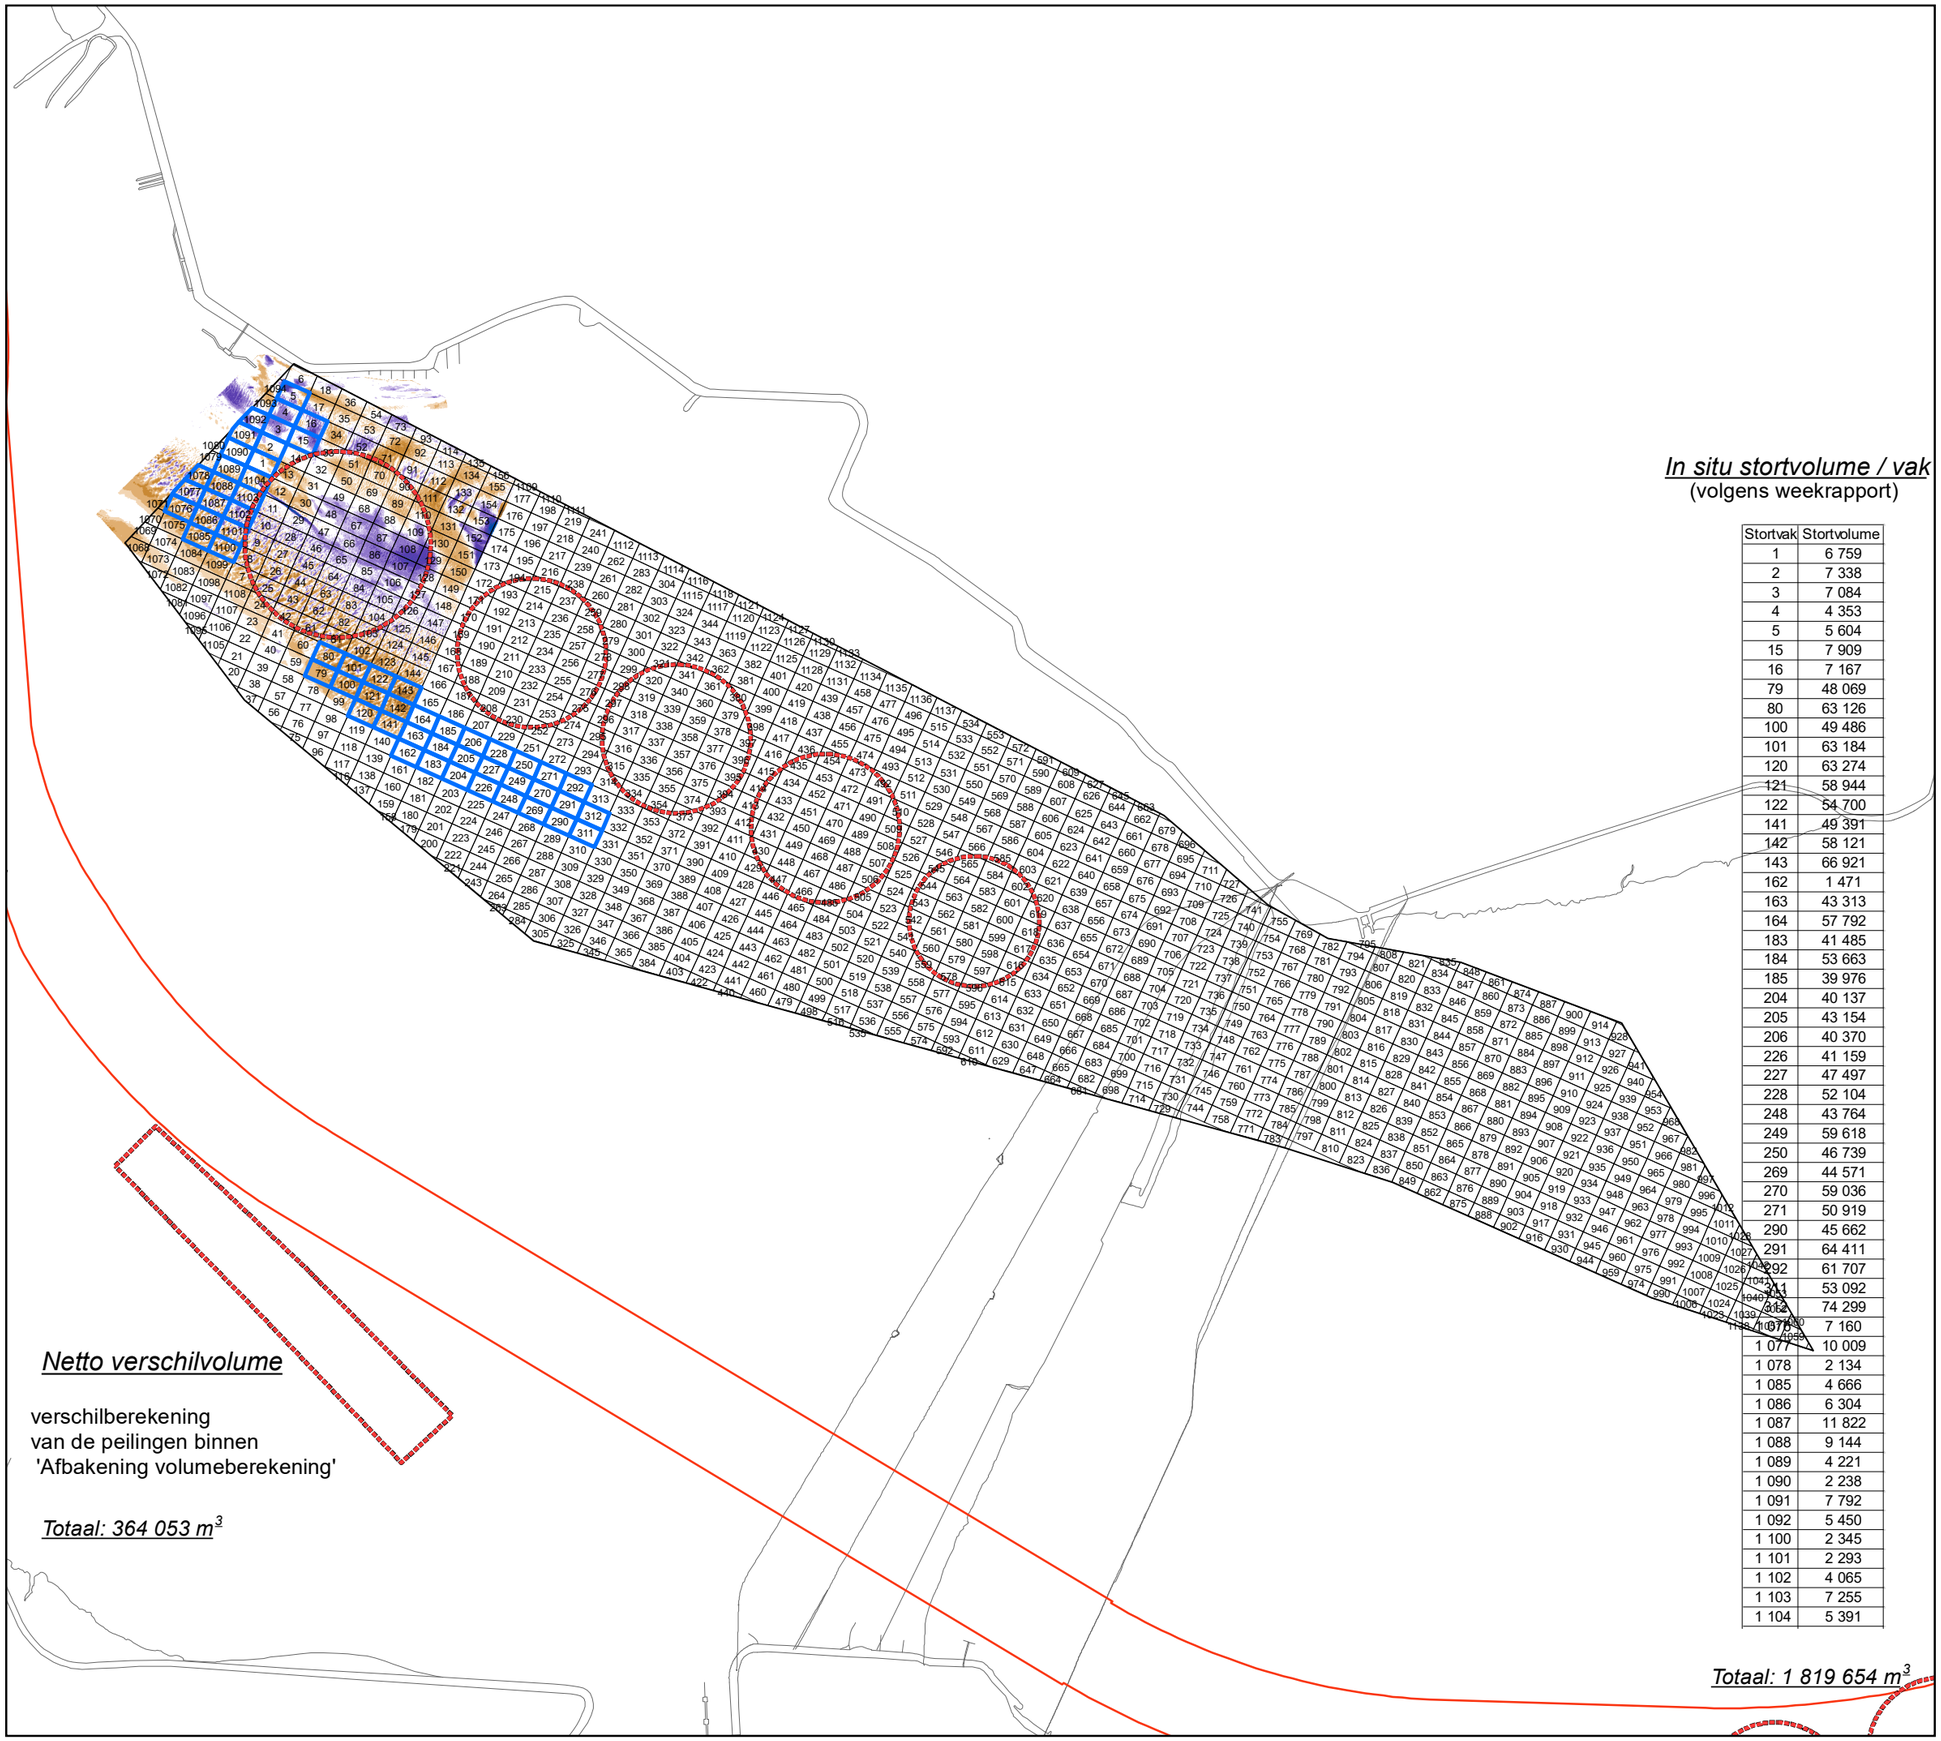

Stortvak	Stortvolume
1	6 759
2	7 338
3	7 084
4	4 353
5	5 604
15	7 909
16	7 167
79	48 069
80	63 126
100	49 486
101	63 184
120	63 274
121	58 944
122	54 700
141	49 391
142	58 121
143	66 921
162	1 471
163	43 313
164	57 792
183	41 485
184	53 663
185	39 976
204	40 137
205	43 154
206	40 370
226	41 159
227	47 497
228	52 104
248	43 764
249	59 618
250	46 739
269	44 571
270	59 036
271	50 919
290	45 662
291	64 411
292	61 707
311	53 092
312	74 299
1 076	7 160
1 077	10 009
1 078	2 134
1 085	4 666
1 086	6 304
1 087	11 822
1 088	9 144
1 089	4 221
1 090	2 238
1 091	7 792
1 092	5 450
1 100	2 345
1 101	2 293
1 102	4 065
1 103	7 255
1 104	5 391

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SN31

05/07/2022 (T0) - 07/10/2025 (T7)

11640_SN31_VT7-T0
Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50

verdieping
- -0.25 - +0.25
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N W E S

0 500 1000 1500 2000 2500 m



VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SN31

04/09/2025 (T6) - 07/10/2025 (T7)

11640_SN31_VT7-T6
Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	verdieping
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

0 500 1000 1500 2000 2500 m

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SN31

04/09/2025 (T6) - 07/10/2025 (T7)

11640_SN31_VT7-T6
Rapport nr. 25.181



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Totaal: 0 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -100 081 m³

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50

-0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N W E S

0 500 1000



In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
1	6 759
2	7 338
3	7 084
4	4 353
5	5 604
15	7 909
16	7 167
79	48 069
80	63 126
100	49 486
101	63 184
120	63 274
121	58 944
122	54 700
141	49 391
142	58 121
143	66 921
162	1 471
163	43 313
164	57 792
183	41 485
184	53 663
185	39 976
204	40 137
205	43 154
206	40 370
226	41 159
227	47 497
228	52 104
248	43 764
249	59 618
250	46 739
269	44 571
270	59 036
271	50 919
290	45 662
291	64 411
292	42 707
311	53 092
312	47 299
1 076	7 605
1 077	10 009
1 078	2 134
1 085	4 666
1 086	6 304
1 087	11 822
1 088	9 144
1 089	4 221
1 090	2 238
1 091	7 792
1 092	5 450
1 100	2 345
1 101	2 293
1 102	4 065
1 103	7 255
1 104	5 391

Totaal: 1819654 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 334415 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SN31

05/07/2022 (T0) - 05/11/2025 (T8)

11640_SN31_VT8-T0
Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50
- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N
W E
S

0 500 1000 1500 2000 2500 m



VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SN31

07/10/2025 (T7) - 05/11/2025 (T8)

11640_SN31_VT8-T7
Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m


verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50

- -0.25 - +0.25

verdieping
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N
W E
S

0 500 1000 1500 2000 2500 m

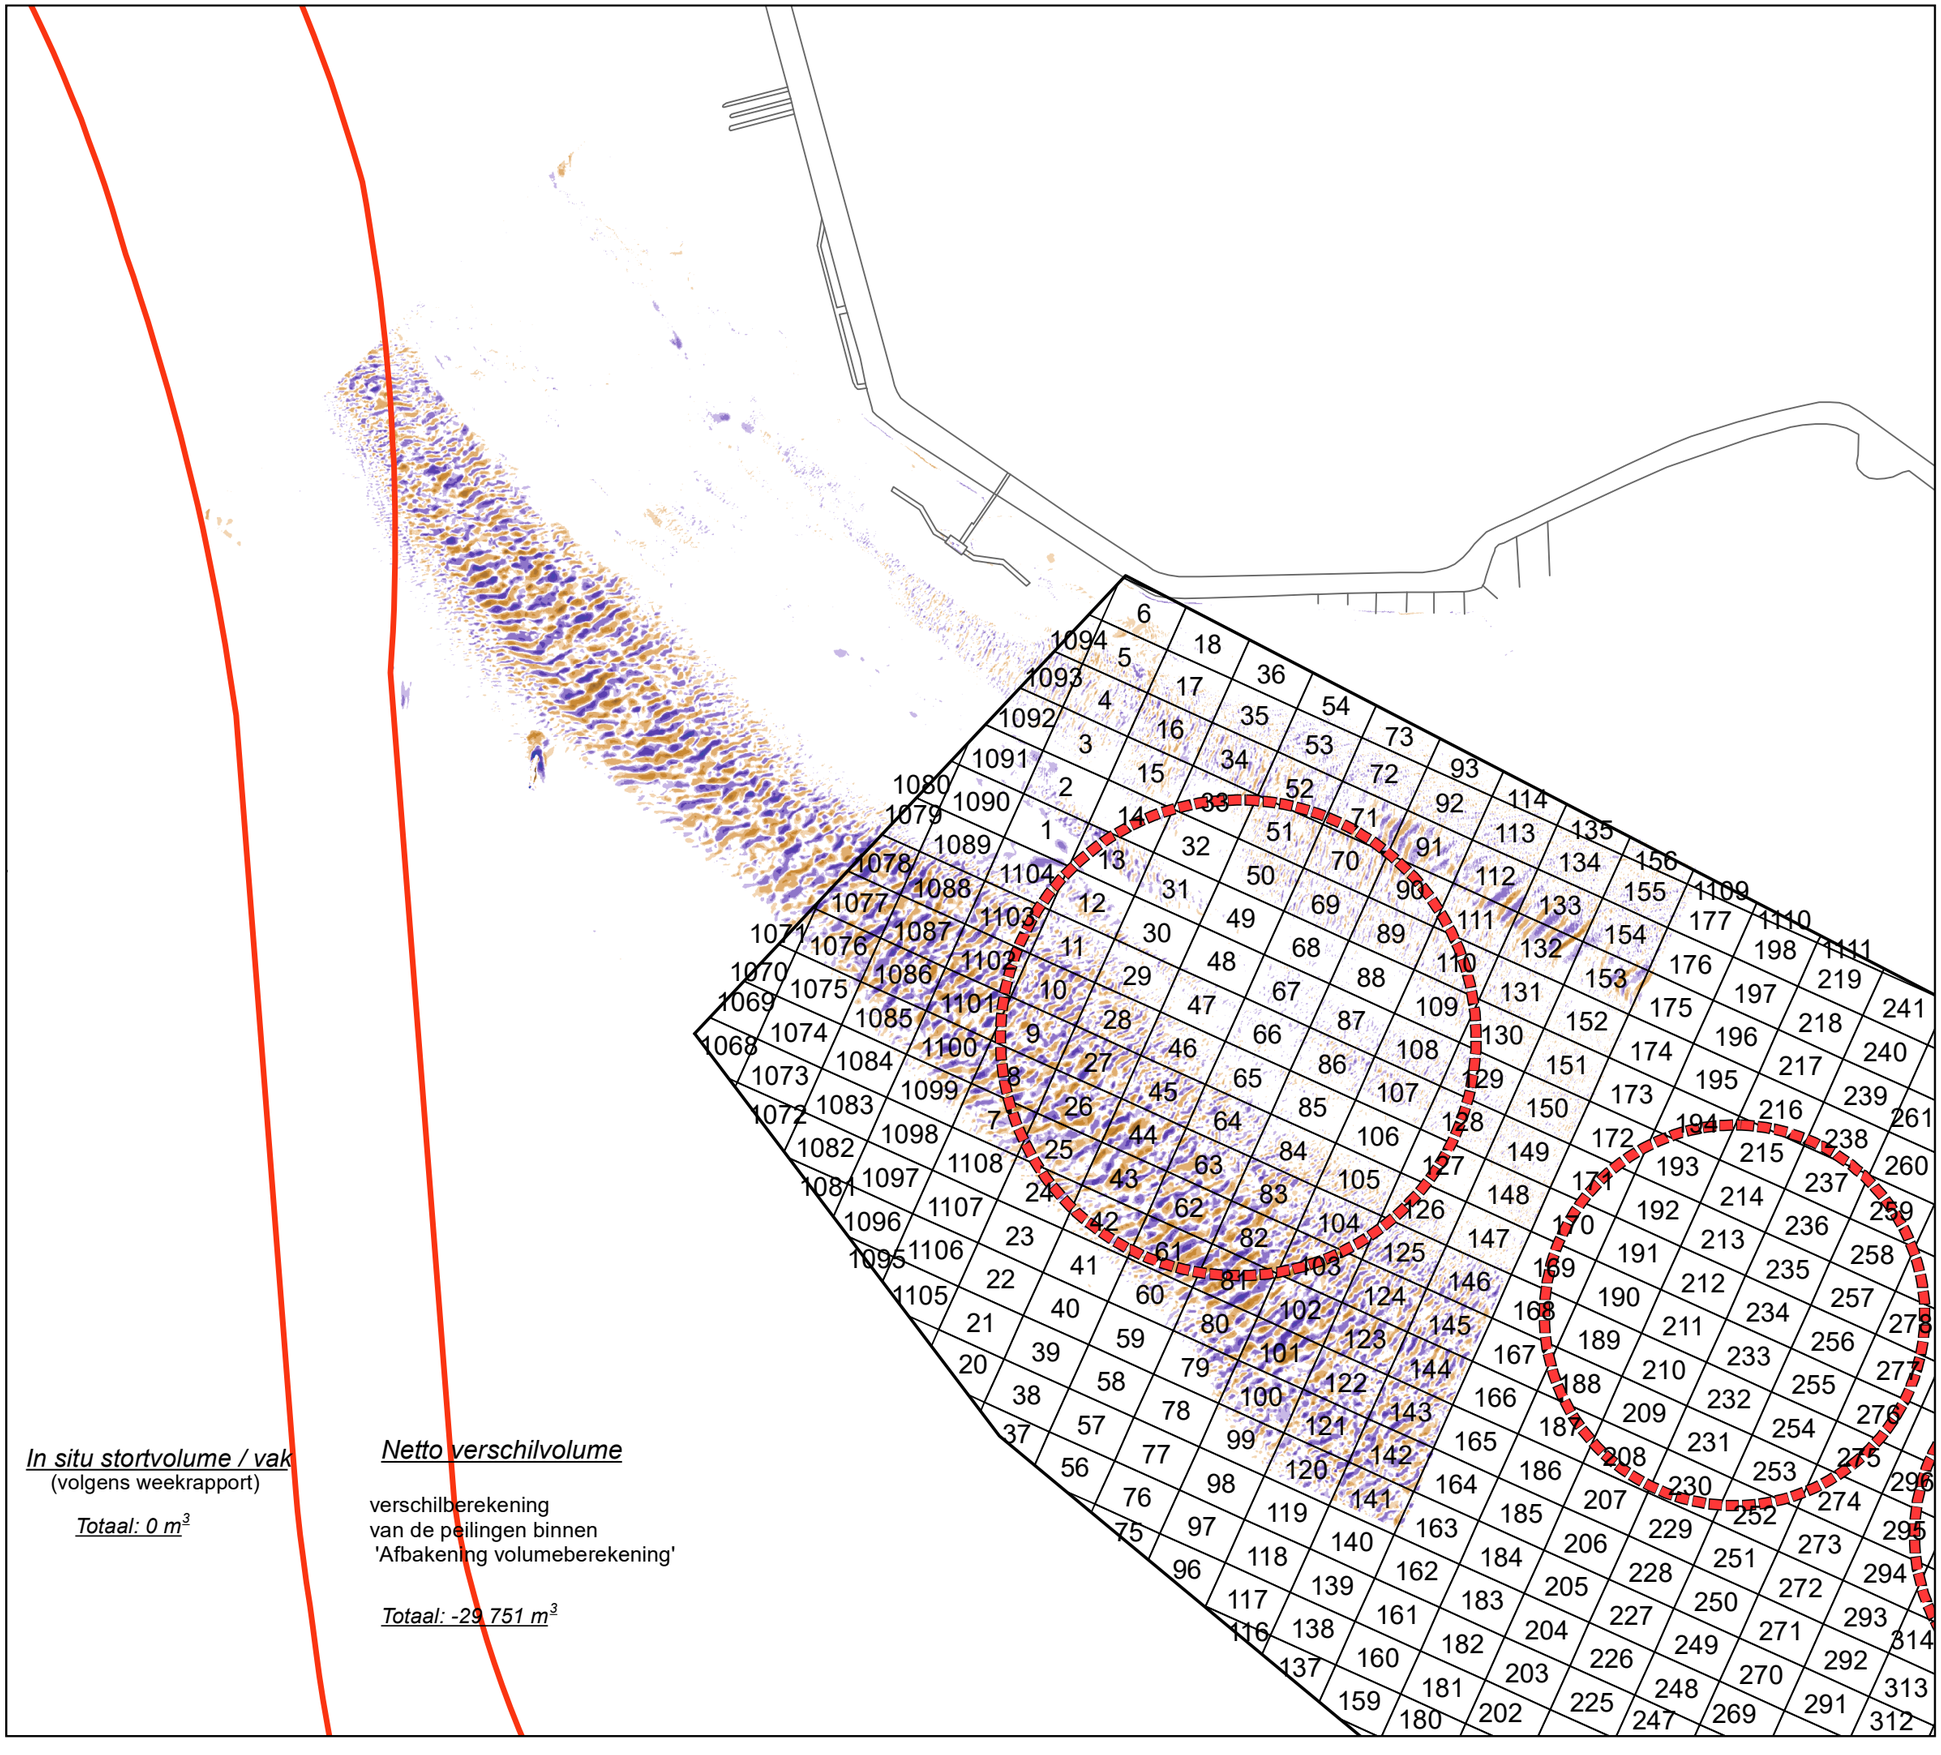

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Totaal: 0 m³

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: -29 751 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde


Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SN31

07/10/2025 (T7) - 05/11/2025 (T8)

11640_SN31_VT8-T7
Rapport nr. 25.212



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m


verondieping
- > +2.51
- +2.01 - +2.50
- +1.51 - +2.00
- +1.01 - +1.50
- +0.51 - +1.00
- +0.25 - +0.50

verdieping
- -0.25 - +0.25
- -0.49 - -0.25
- -0.99 - -0.50
- -1.49 - -1.00
- -1.99 - -1.50
- -2.49 - -2.00
- < -2.50

N
W
E
S

0 500 1000 m

A.7 Kaartmateriaal december 2025

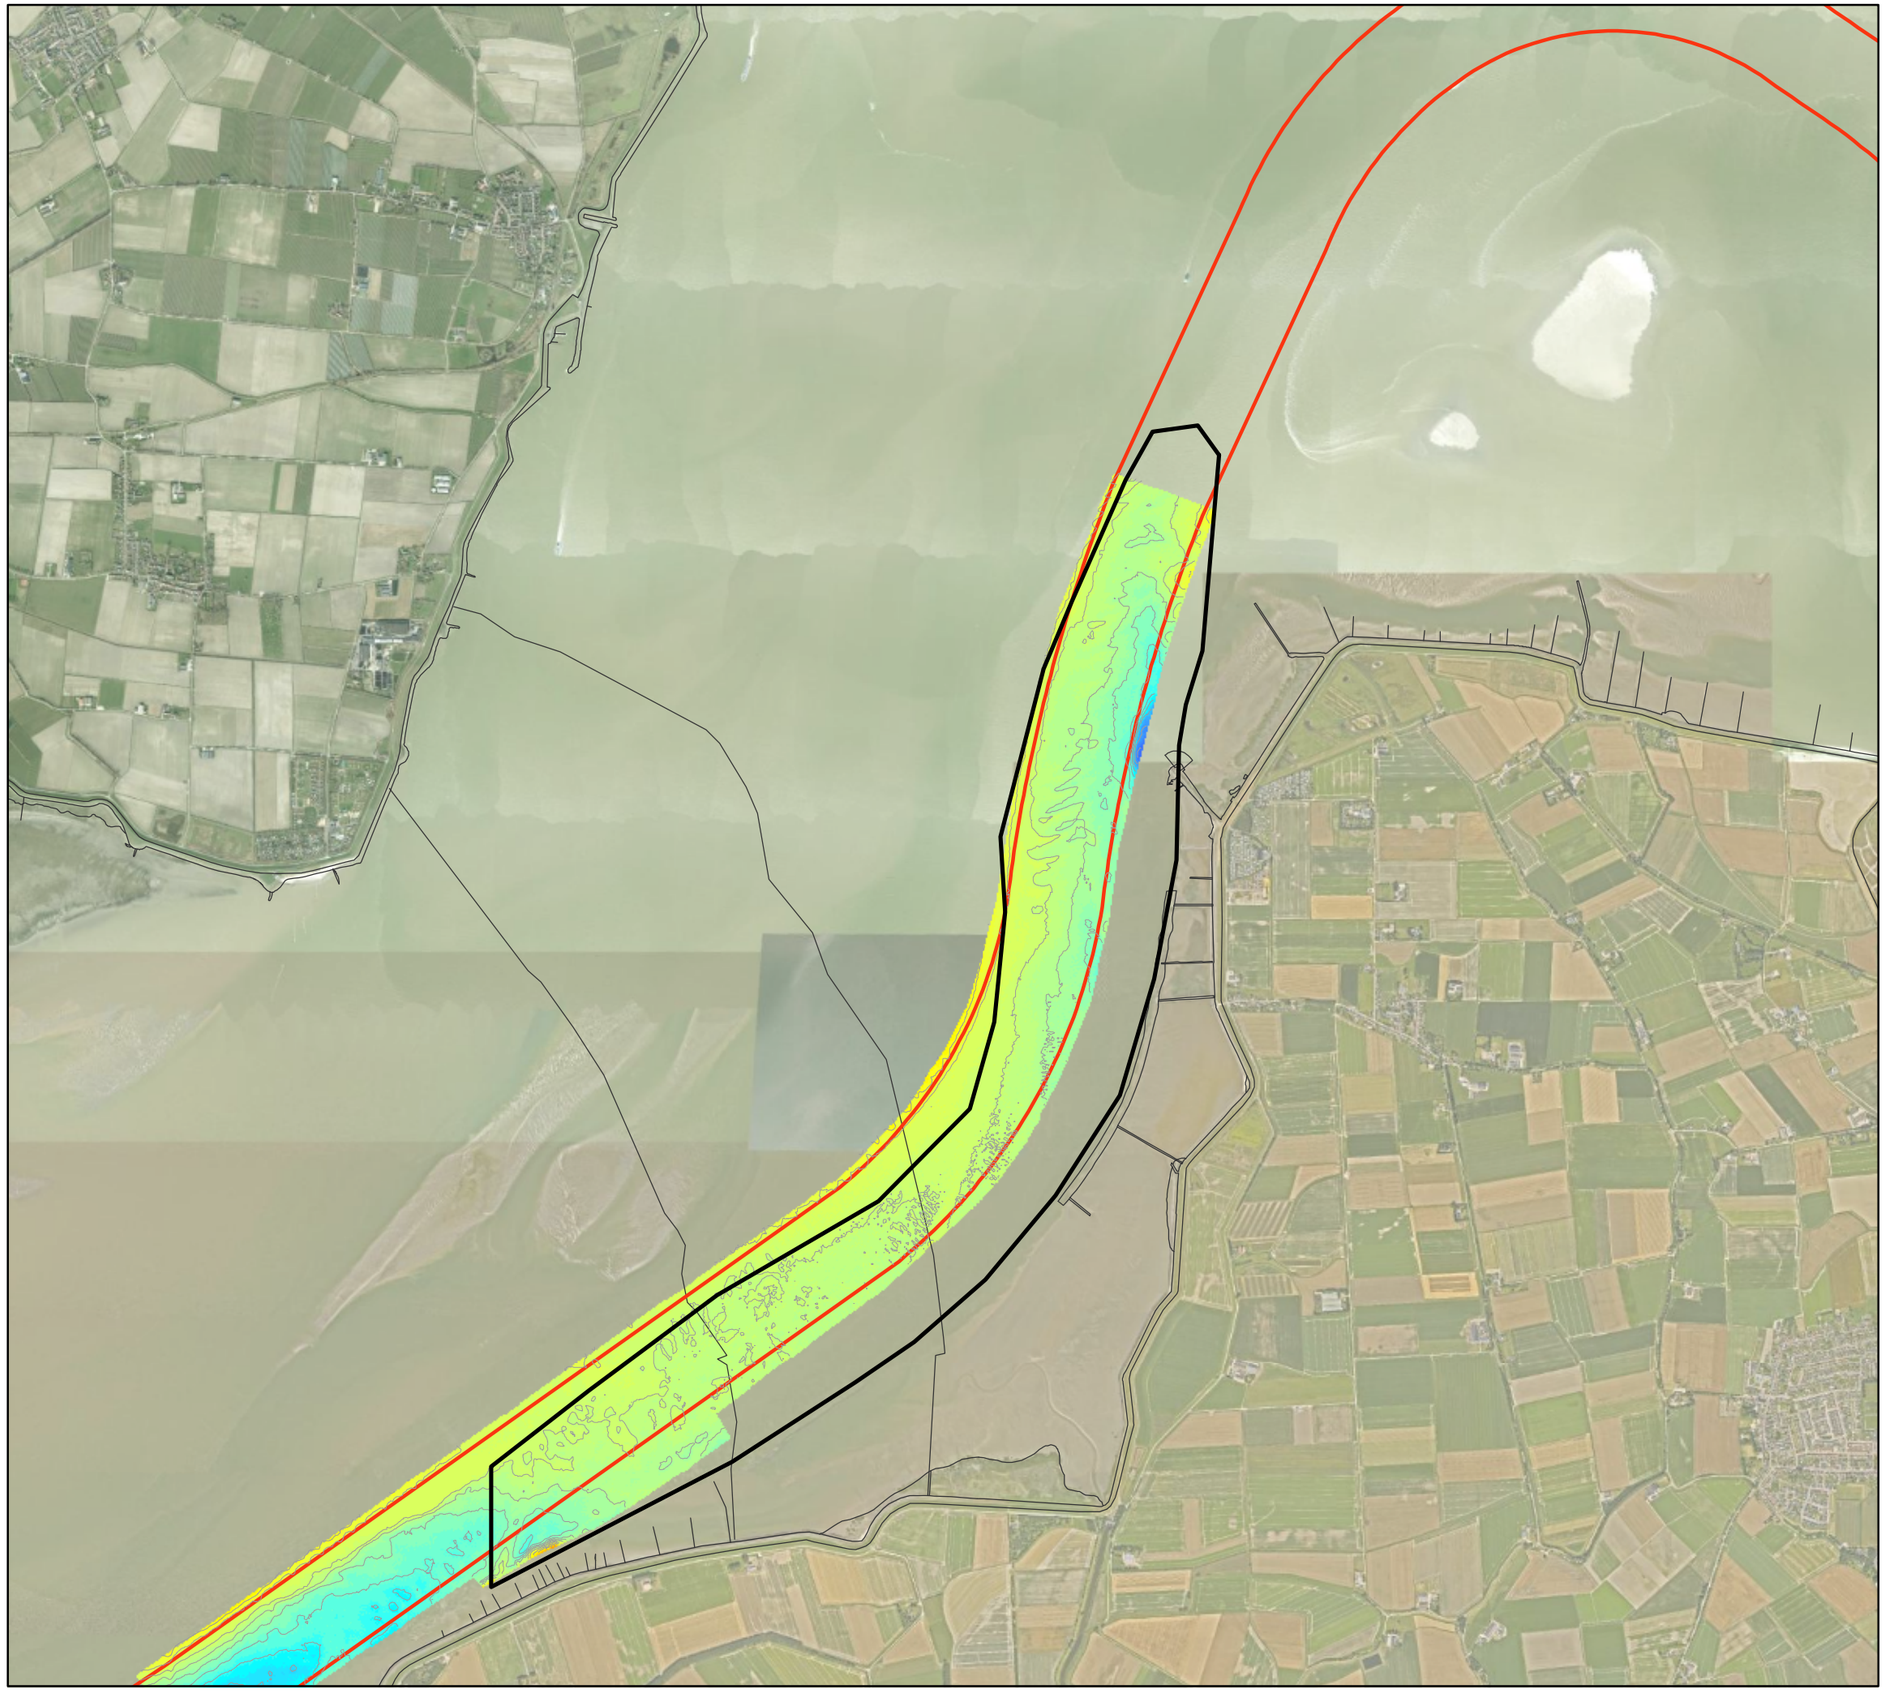

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Dieptekaart SH41

08/12/2025 (T9)

11640_SH41_BT9
Rapport nr. 26.015



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

Diepte in m [NAP]

- 1.88 - 2.00
- 2.01 - 3.00
- 3.01 - 4.00
- 4.01 - 5.00
- 5.01 - 6.00
- 6.01 - 7.00
- 7.01 - 8.00
- 8.01 - 9.00
- 9.01 - 10.00
- 10.01 - 11.00
- 11.01 - 12.00
- 12.01 - 13.00
- 13.01 - 14.00
- 14.01 - 15.00
- 15.01 - 16.00
- 16.01 - 17.00
- 17.01 - 18.00
- 18.01 - 19.00
- 19.01 - 20.00
- 20.01 - 21.00
- 21.01 - 22.00
- 22.01 - 23.00
- 23.01 - 24.00
- 24.01 - 25.00
- 25.01 - 26.00
- 26.01 - 27.00
- 27.01 - 28.00
- 28.01 - 29.00
- 29.01 - 30.00
- 30.01 - 31.00
- 31.01 - 32.00
- 32.01 - 33.00
- 33.01 - 34.00
- 34.01 - 35.00
- 35.01 - 36.00
- 36.01 - 37.00
- 37.01 - 38.00
- 38.01 - 39.00
- 39.01 - 40.00
- 40.01 - 41.00
- 41.01 - 42.00


N
W E
S

0 250 500 750 1000 m

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 905517 m³

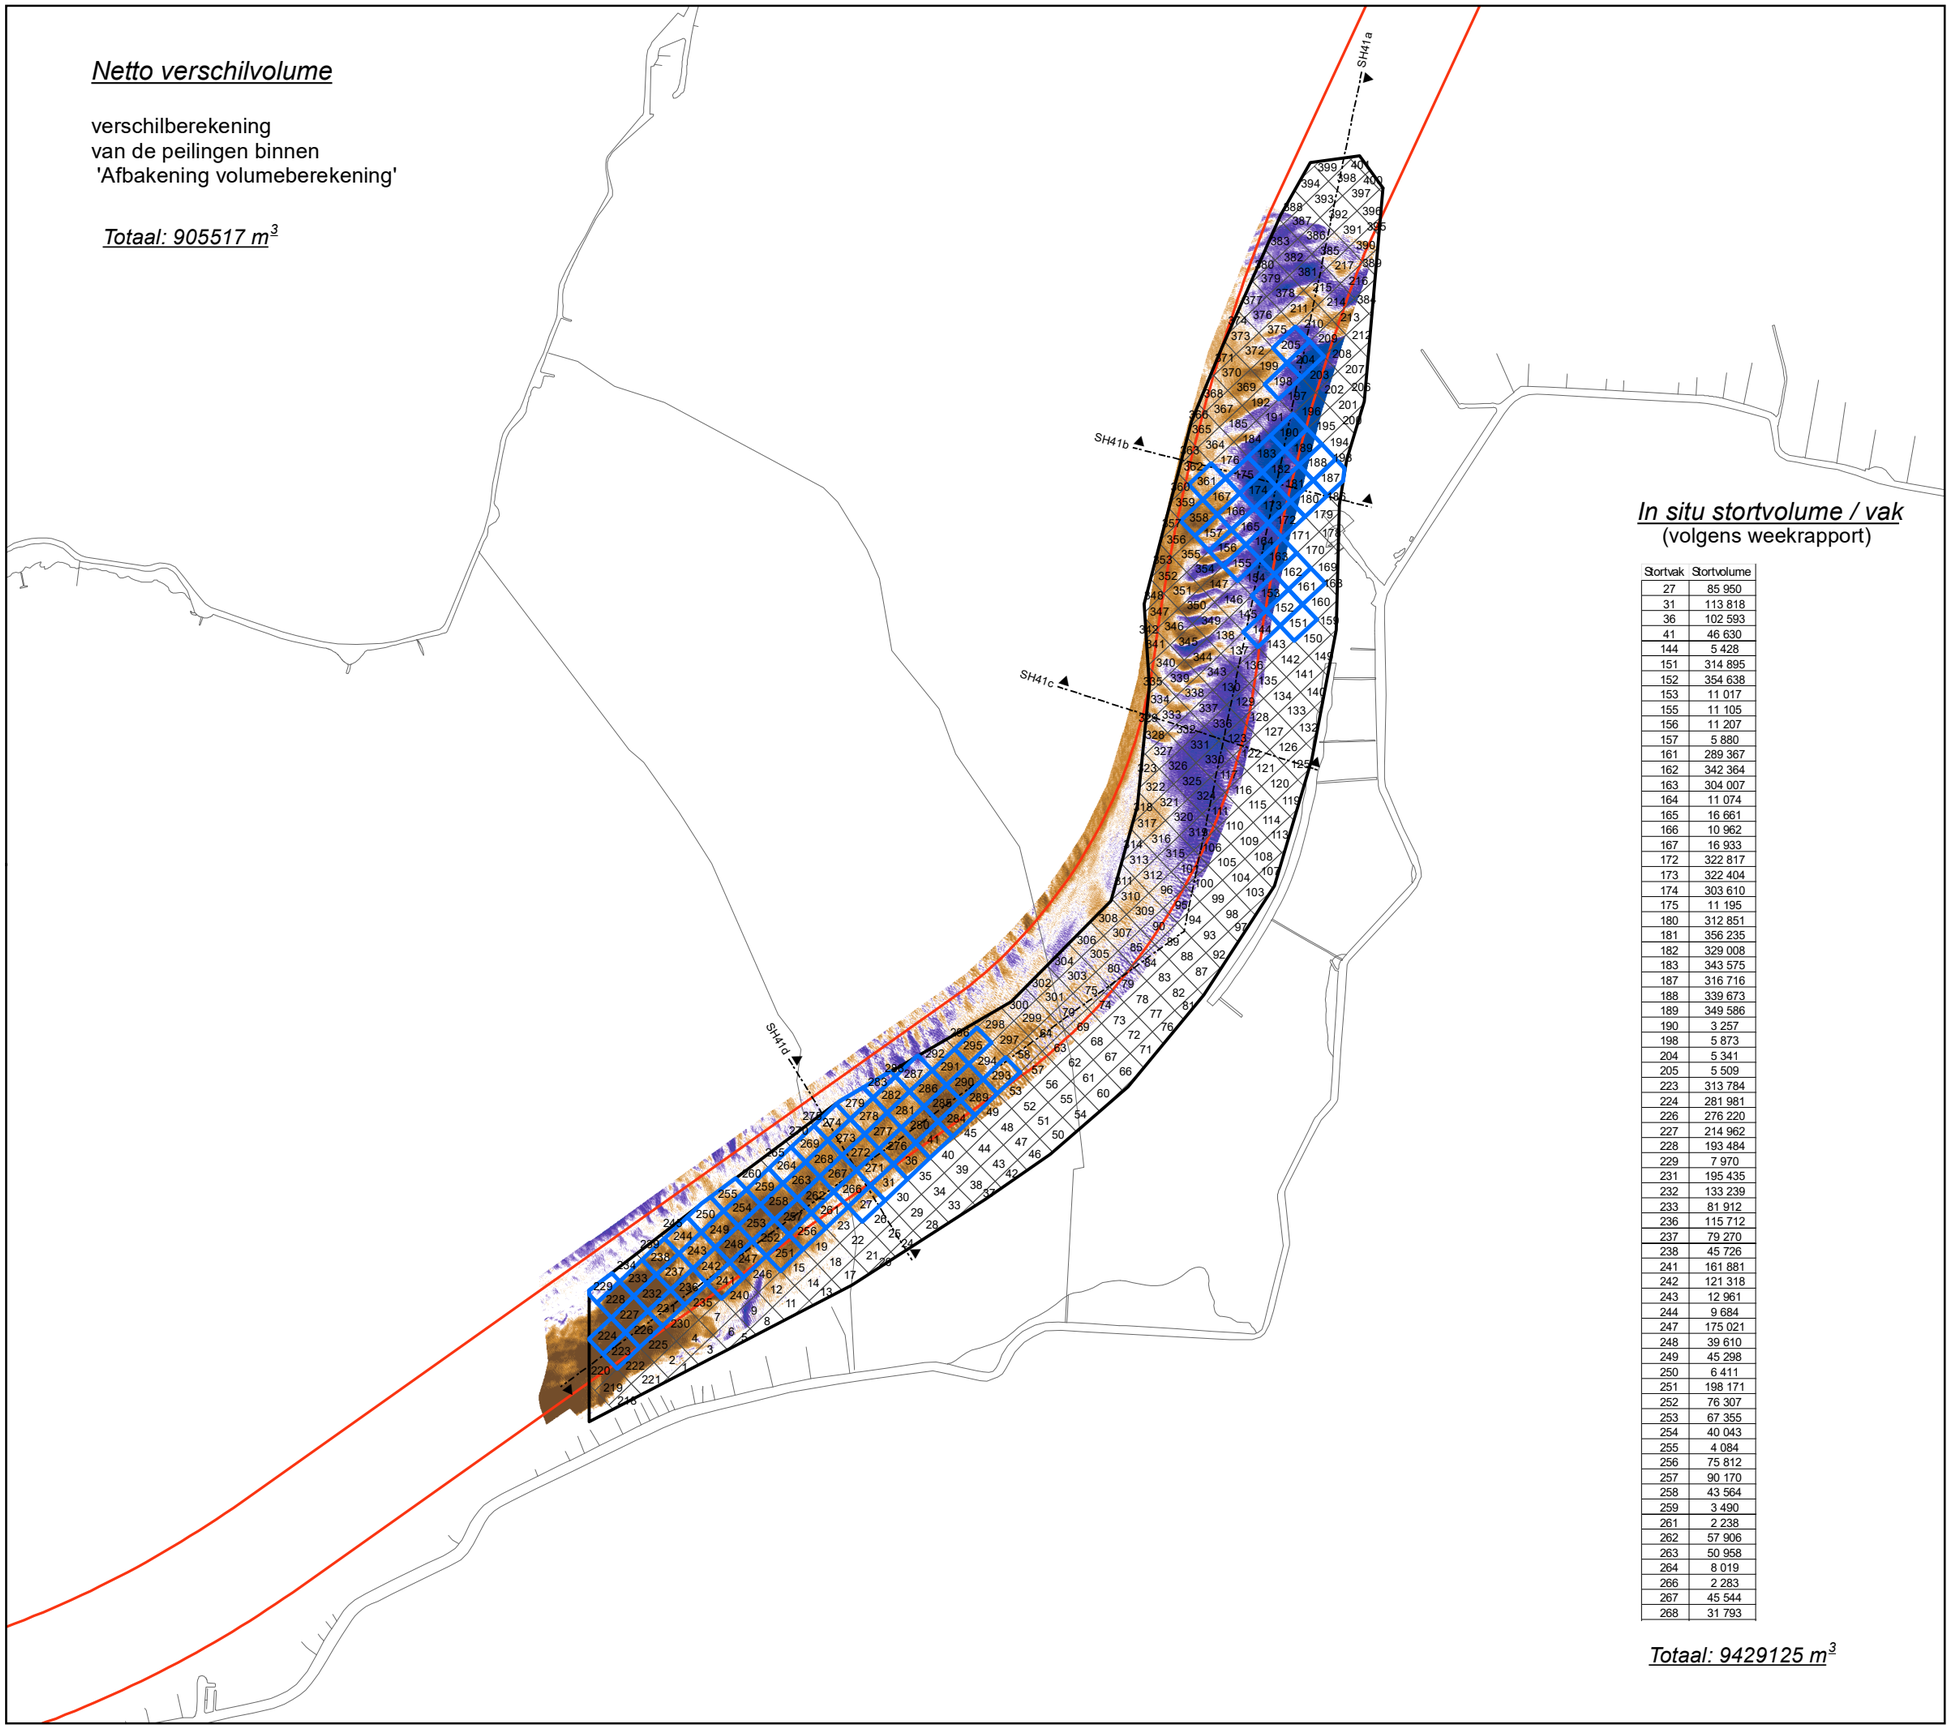

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
27	85 950
31	113 818
36	102 593
41	46 630
144	5 428
151	314 895
152	354 638
153	11 017
155	11 105
156	11 207
157	5 880
161	289 367
162	342 364
163	304 007
164	11 074
165	16 661
166	10 962
167	16 933
172	322 817
173	322 404
174	303 610
175	11 195
180	312 851
181	356 235
182	329 008
183	343 575
187	316 716
188	339 673
189	349 586
190	3 257
198	5 873
204	5 341
205	5 509
223	313 784
224	281 981
226	276 220
227	214 962
228	193 484
229	7 970
231	195 435
232	133 239
233	81 912
236	115 712
237	79 270
238	45 726
241	161 881
242	121 318
243	12 961
244	9 684
247	175 021
248	39 610
249	45 298
250	6 411
251	198 171
252	76 307
253	67 355
254	40 043
255	4 084
256	75 812
257	90 170
258	43 564
259	3 490
261	2 238
262	57 906
263	50 958
264	8 019
266	2 283
267	45 544
268	31 793

Totaal: 9429125 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH41

18/07/2022 (T0) - 08/12/2025 (T9)

11640_SH41_VT9-T0
Rapport nr. 26.015



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	verdieping
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	


N
W E
S

0 500 1000 1500 2000 m

Netto verschilvolume

verschilberekening
van de peilingen binnen
'Afbakening volumeberekening'

Totaal: 140598 m³

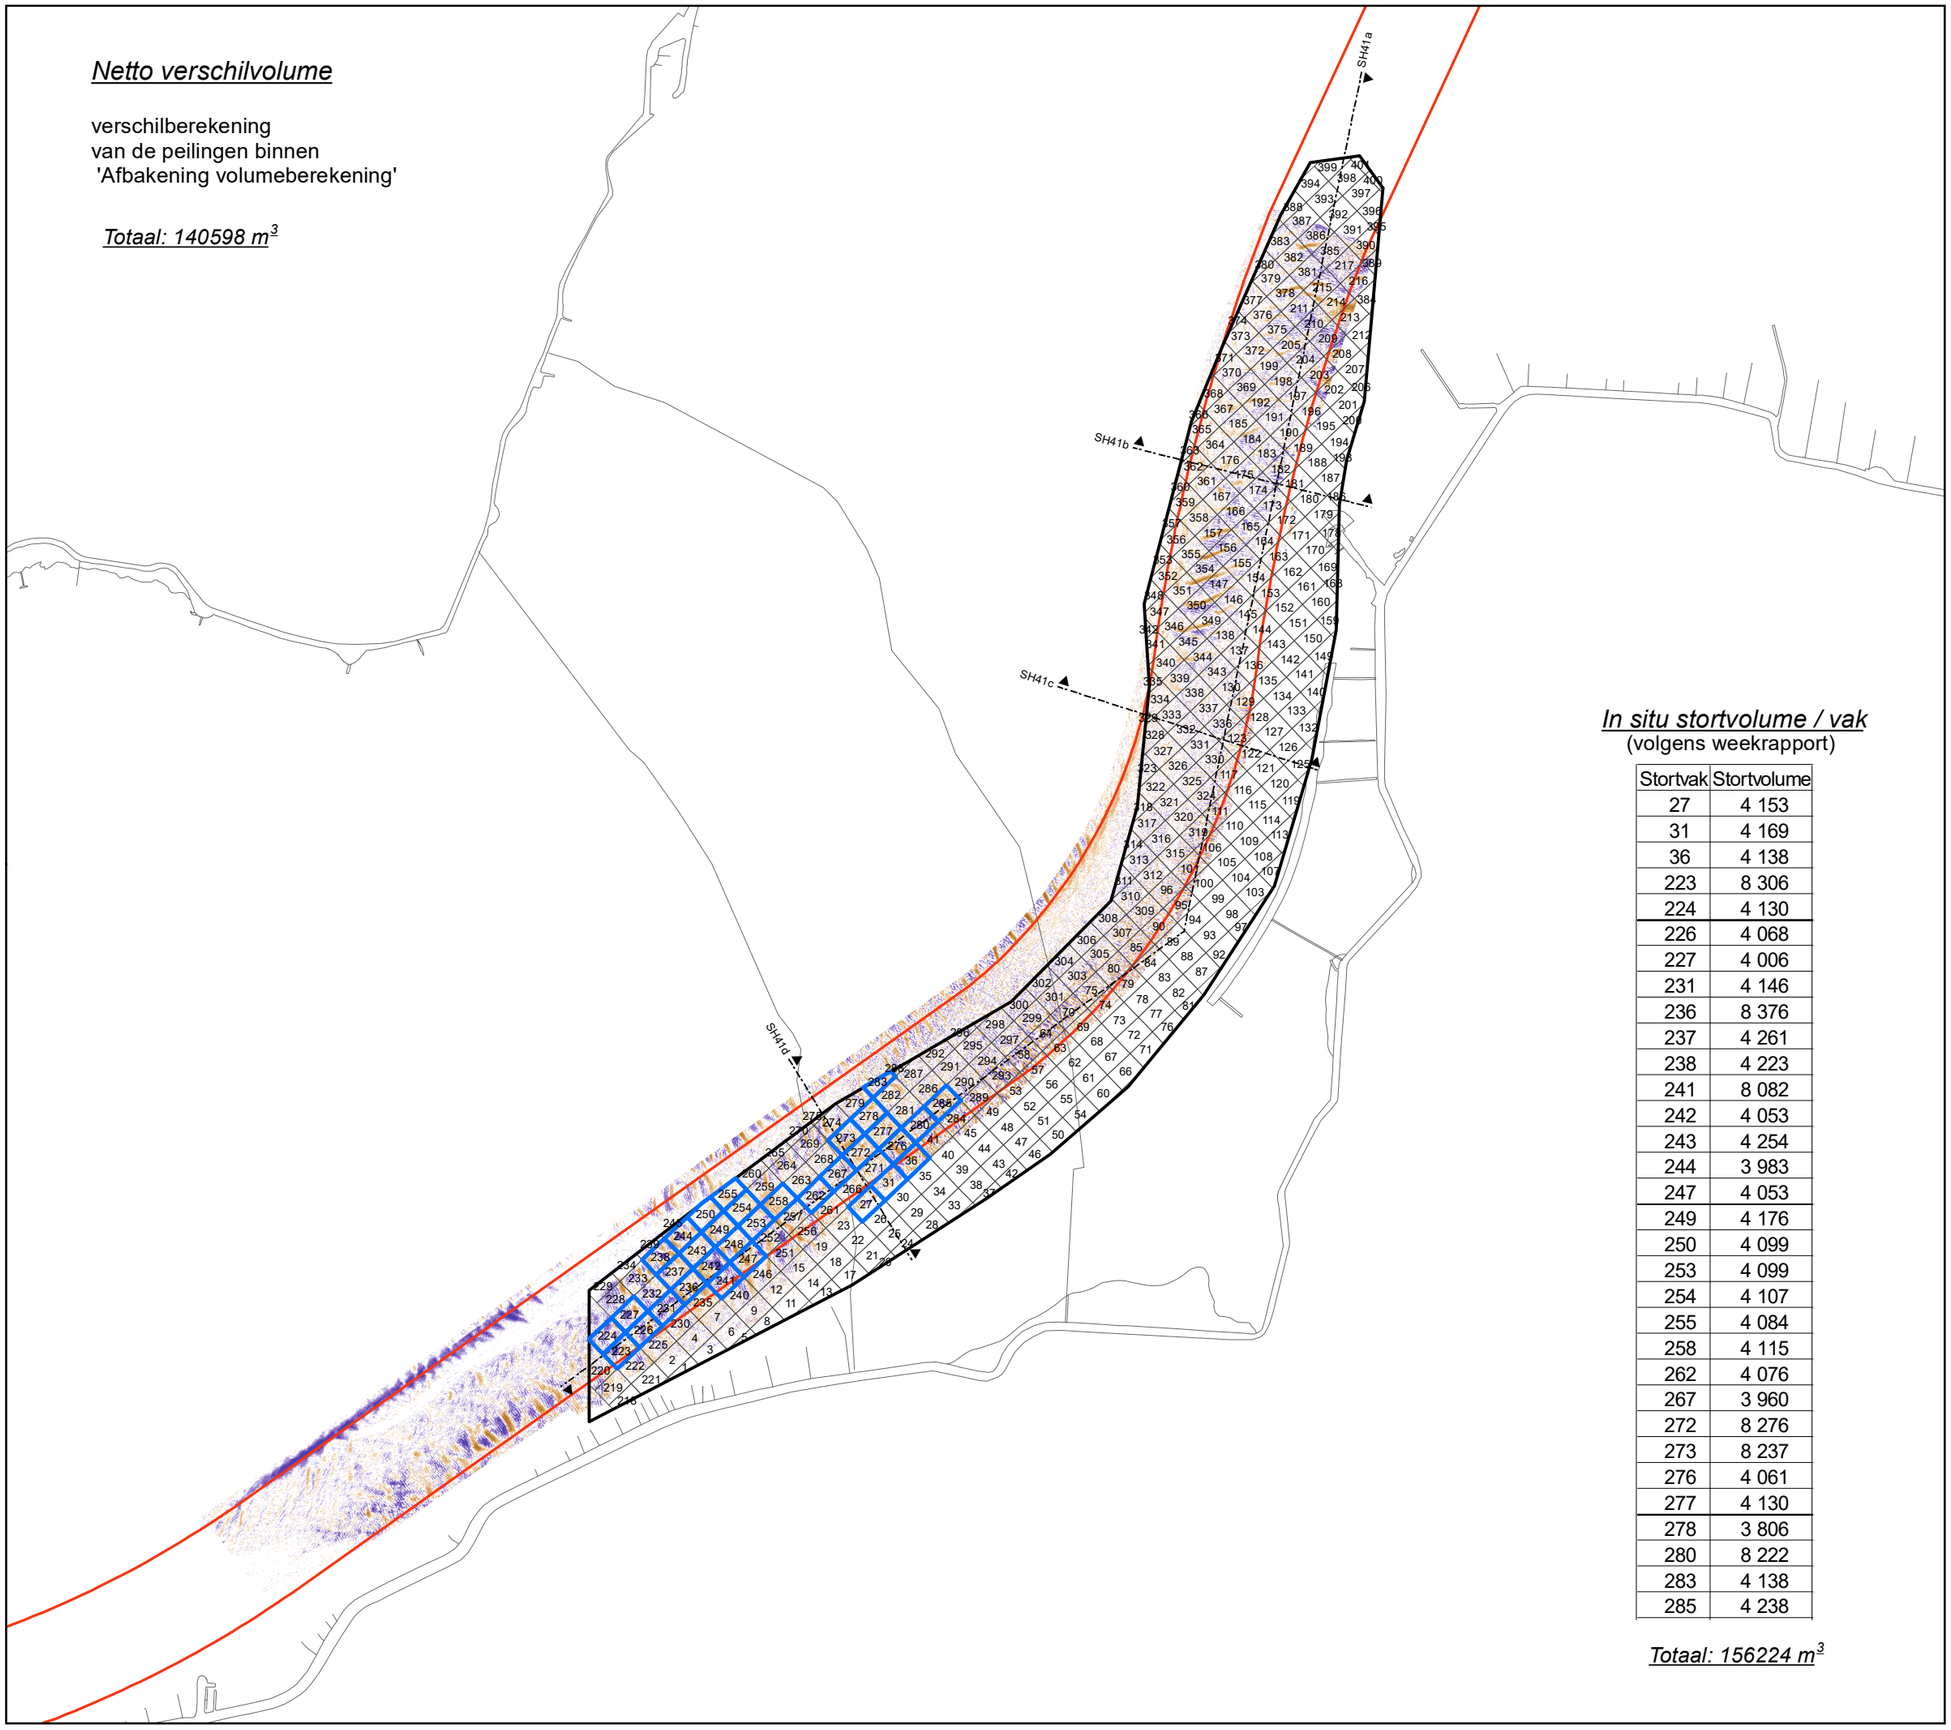

In situ stortvolume / vak
(volgens weekrapport)

Stortvak	Stortvolume
27	4 153
31	4 169
36	4 138
223	8 306
224	4 130
226	4 068
227	4 006
231	4 146
236	8 376
237	4 261
238	4 223
241	8 082
242	4 053
243	4 254
244	3 983
247	4 053
249	4 176
250	4 099
253	4 099
254	4 107
255	4 084
258	4 115
262	4 076
267	3 960
272	8 276
273	8 237
276	4 061
277	4 130
278	3 806
280	8 222
283	4 138
285	4 238

Totaal: 156224 m³

VLAAMSE OVERHEID
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang

Morfologisch monitoringsprogramma plaatrandstortingen Westerschelde

Flexibel storten 2025

Bestek nr. MT/02323_C1_04

Verschilkaart SH41

13/11/2025 (T8) - 08/12/2025 (T9)

11640_SH41_VT9-T8
Rapport nr. 26.015



IMDC
A company of TRACTEBEL ENGIE
Van Immerseelstraat 66
2018 Antwerpen
Tel +32 3 270 92 20
Fax +32 3 235 67 11
E-mail: info@imdc.be

Legende

- Afbakening volumeberekening
- Stortvakken (weekrapport)
- Stortvakken

verschil in m

> +2.51	verondieping
+2.01 - +2.50	
+1.51 - +2.00	
+1.01 - +1.50	
+0.51 - +1.00	
+0.25 - +0.50	
-0.25 - +0.25	
-0.49 - -0.25	verdieping
-0.99 - -0.50	
-1.49 - -1.00	
-1.99 - -1.50	
-2.49 - -2.00	
< -2.50	

N
W E
S

0 500 1000 1500 2000 m

Bijlage B Tripgegevens

Tabel bijlage B-1: Overzicht van de aangeleverde tripgegevens.

Datum ontvangst	Titel	Periode van de gegevens
06/02/2025	202501_tripgegevens	1-31 januari 2025
25/03/2025	202502_tripgegegens	1-28 februari 2025
17/04/2025	202503_tripgegevens	1-31 maart 2025
08/05/2025	202504_tripgegevens	1-30 april 2025
10/06/2025	202505_tripgegevens	1-31 mei 2025
11/07/2025	202506_tripgegevens	1-30 juni 2025
12/08/2025	202507_tripgegevens	1-31 juli 2025
10/09/2025	202508_tripgegevens	1-31 augustus 2025
14/10/2025	202509_tripgegevens	1-30 september 2025
13/11/2025	202510_tripgegevens	1-31 oktober 2025
10/12/2025	202511_tripgegevens	1-30 november 2025
14/01/2026	202512_tripgegevens	1-31 december 2025
